


## Ficha de Proyecto

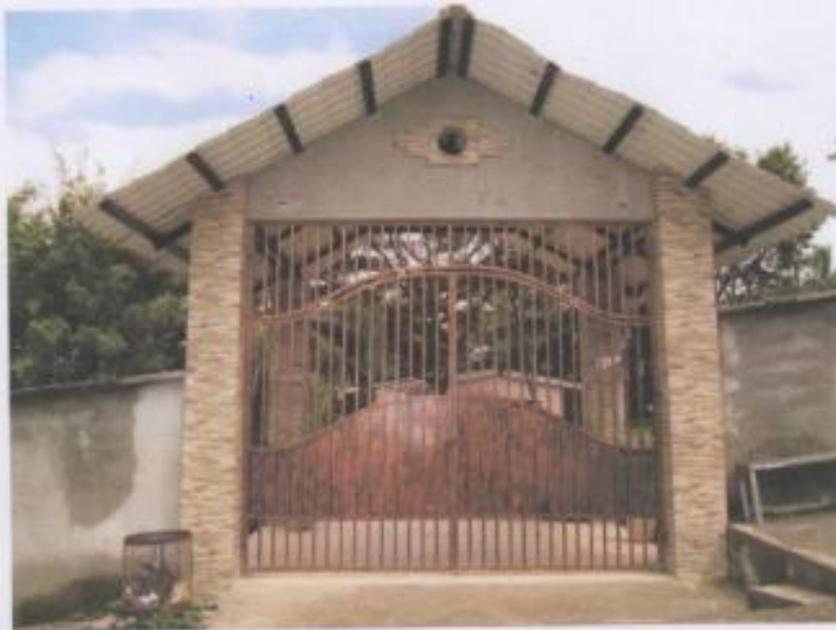

**Construcción de Portón y Base de la Escuela  
Manuel Bonilla, Lepaera, Lempira**

**Lepaera, Lempira Junio 2016**

**Honduras Centro América**

# Ficha de Proyecto

## 1. Identificación del Proyecto:

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Construcción de Portón y Base de la escuela Manuel Bonilla de Lepaera, Lempira

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

## 2.- Sector o Sub sector

Sector: Educación

## 3.- Nombre del Proyecto

**Construcción de Portón y Base de la escuela Manuel Bonilla de Lepaera, Lempira**

## 4.- Ubicación del Proyecto.

El Municipio de Lepaera se encuentra ubicado al Norte del dpto. De Lempira con una extensión territorial de **318.7 Km<sup>2</sup>**

## 5.- Propósito

Mejorar las condiciones físico- pedagógicas para la seguridad de los enseres, niños y maestros que asisten a la Escuela Urbana Mixta Manuel Bonilla en Lepaera, Lempira.

## **6.- Descripción del Proyecto.**

El proyecto consiste en la Construcción de una base con su respectivo Portón con las dimensiones siguientes: 4 columnas con las medidas siguientes: de 4.20 metros lineales de altura de 4.0.50 x 0.50 de grosor forrados con cerámica, construcción de solera, enlazando las columnas frontales de 0.15x 0.20 4 metros cuadrados.-colocación de tubos estructurales de 18 pies de largo y de 2x 4 pulgadas de grosor, colocación de Aluzinc.

Fundición de 4x4 metros de piso con colocación de cerámica.

Construcción de una base pequeña para portón pequeño de las medidas siguientes: 2.30 mtrs de alto, por 0.30 centímetros cuadrados de grosor y fachada pequeña de teja para protección del mismo.

Construcción de una base para portón pequeño de las medidas siguientes: 1.25 metros de ancho x 2.30 metros de alto, con fachada de teja sobre portón.

Repello y pulido de 114 metros cuadrados de muro en la misma pared del portón.

El presente proyecto ha sido gestionado por la sociedad de padres de familia y maestros, obteniendo buenos resultados hasta el momento, a la vez se da a conocer que el proyecto está siendo ejecutado el año 2016.

Este es un proyecto que por ser una necesidad urgente ya está casi finalizado, son pequeños los detalles restantes.

## **7. Elaboración del Proyecto**

### **- Alcance del Proyecto.**

Ya el proyecto ha alcanzado su etapa final (**99.00%**) pero el porcentaje restante es porque faltan algunos detalles del proyecto que no se han ejecutado en estos momentos, pero si está en proceso de construcción.

Antes de contar con esta información la encargada de brindar el reporte técnico hizo una supervisión del proyecto para verificar que el proyecto ha sido ejecutado conforme lo dice el diseño de proyecto. El apoyo de los padres de familia maestros y alumnos no se puede menospreciar ya que son un pilar fundamental para el éxito del proyecto.

### **8. Impacto Ambiental.**

Siempre es necesario para la verificación de que el proyecto se construirá en un terreno que no afecta el medio ambiente se realiza una inspección con los encargados del dpto. de catastro y de la unidad de Medio ambiente a la vez para verificar si no es necesario realizar otras mejoras y si no ha habido

daño posterior al medio ambiente (vegetación) y según informe hasta el momento no se ha causado ningún daño de este tipo.

### **9. Impacto en terreno y asentamientos.**

El terreno ya está legalmente escriturado, no habiendo inconveniente alguno que interrumpa la ejecución del proyecto es necesario mencionar que este terreno se encuentra ubicado en un lugar que reúne las condiciones básicas como ser: Agua Potable, electrificación. No existen asentamientos humanos alrededor del sitio del proyecto y si es cierto que existen viviendas pero están a 8 mtrs de distancia y en ningún momento afecta.

**10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre**

Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

**Correo Electrónico:** [lara.gestion2016@yahoo.com](mailto:lara.gestion2016@yahoo.com)

**Sede:** Municipalidad de Lepaera, Lempira

**Ing. Sonia Murcia**

**Cel.No.97104880**

Mancomunidad Puca

**Fuentes de Financiamiento.**

Es necesario Dar a conocer que la Municipalidad

En este caso asume el costo del proyecto con fondos provenientes de las Transferencias del gobierno central como principal financiador y fondos de laMunicipalidad,apoyando con la mano de Obra Calificada y materiales locales como ser: Piedra, Grava y Arena. Para la ejecución delProyecto, esas actividades a realizar con Fondos propios y fondos provenientes de las transferencias. Es necesario dar a conocer que a la vez los padres de familia apoyan con la mano de obra local.

**11. Presupuesto del Proyecto.**

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal La sociedad de Padres de Familia de la escuela tienen gran responsabilidad se lleve a cabo en tiempo y forma.

Se maneja un monto de **Lps.100,000.00** para iniciar el proyecto.

## **12. Estado del Proyecto actual.**

En este momento este proyecto ya está en su etapa final, faltando solamente detalles los cuales también requieren de un costo considerable.

## **13. Costo de finalización Proyectado**

Costo Total: **Lps.100,000.00 según transferencia positiva**

Vigente: **Lps.76,000.00**

Devengado: **Lps75,239.50**

Pagado **Lps.75,239.50**

Pendiente a Ejecutar: **Lps.760.5**

Fecha de finalización proyectada

**11 de Junio del 2016**

## **14. Ejecución Del Proyecto**

**15. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Este es un proyecto pequeño en comparación con otros ,pero siempre se establecen términos y condiciones por parte del ejecutor en este caso La Municipalidad, se planifico su ejecución en un periodo de dos meses según sea la magnitud del mismo ,pero la ejecución tardo más del tiempo previsto ,como siempre en la compra de materiales y con el pago de maestro de obras existen a la vez otras actividades de menor trascendencia esto a causa de la tardanza en la recepción de las transferencias., por las razones expuestas no se puede enviar los informes de manera trimestral.

Se coordina con el dpto. De contabilidad para llevar un mejor control de gastos realizados.

### **Variación en el costo total del Proyecto.**

Si existen variaciones y es en cuanto a costos más que todo, lo cual lo reflejan los datos contables expuestos a continuación.

Ya en estos momento el proyecto enfrenta su etapa final,como es sabido en las municipalidades se ejecutan los proyectos conforme se reciben las transferencias y aun después de culminados los proyectos,pero los pagos se hacen hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal.

#### **Monto Solicitado:**

**Costo Total: Lps. 100,000.00 según transferencia positiva**

**Vigente: Lps. 76,000.00**

**Devengado: Lps. 75,239.50**

**Pagado Lps.75239.50**

**Pendiente a Ejecutar: Lps.760.5**

Fecha de finalización proyectada

11 de Junio de 2016

**16. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.**

Las variaciones siempre existen y en este caso no hay excepción en cuanto al alcance del proyecto tubo un avance de un **99%** se logró los objetivos propuestos, hubo cumplimiento de parte del maestro de obra, de la sociedad de padres de familia y maestros. En cuanto a materiales se iban comprando conforme se iban necesitando.

En cuanto a la duración podemos decir que se planifico para construirse en un periodo de tres meses máximo iniciando desde el **11 de abril de 2016 y finalizando el 10 de Junio de 2016**, pero se cumplió en construcción de obra gris y otros detalles de la obra en mención que hacían falta.

**17. Razones de los cambios antes mencionados.**

Como mencione anteriormente hubieron algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar, también porque se había solicitado una cerámica que es parte de los detalles de la base del portón, costo un poco que la trajeran. Pero cambios realmente no han existido solamente.

## ANEXOS

### -- Fotografías

Fotografías proyecto Construcción de base y Porton Escuela Urbana Mixta Manuel Bonilla.



