


Ficha de Proyecto

Construcción de Centro de Salud en la Aldea de Rinconada, Lepaera

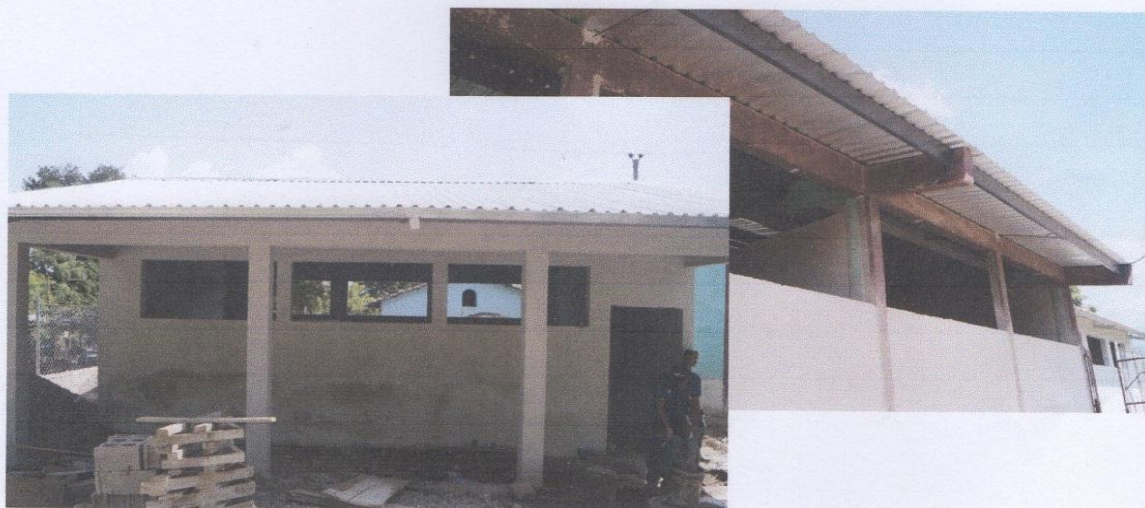

LEPAERA, LEMPIRA JULIO DE 2017

Honduras C. A

[Handwritten signature]



1. Ejecución del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: .-

Construcción de Centro de Salud en la Aldea de Rinconada

Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social (SALUD)

3.- Nombre del Proyecto.

Construcción de Centro de Salud en la comunidad de Rinconada.

4.- Ubicación del Proyecto.

El Proyecto se encuentra localizado en la comunidad de la Rinconada en el Municipio de Lepaera el Dpto. de Lempira, se encuentra a una distancia de **15 kilómetros** de la cabecera municipal.

5.- Propósito

Mejorar la atención que se brinda a los pacientes de la comunidad de Rinconada, por ser un lugar en donde se atienden población de las comunidades de Laguna de Pajapas, San José de Pajapas, Santa Rita y Rinconada del mismo Municipio Lepaera, (en las diferentes especialidades, vacuna, laboratorio, medicina general, farmacia y el área de promoción) brindando una eficiente asistencia médica inmediata en caso de requerirlo, prestando un ambiente agradable y de mucha comodidad para los pacientes.

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la Construcción de un Centro de Salud en la comunidad de Rinconada, Lepaera, Lempira.

El proyecto se está construyendo en el local donde antes funcionaba la escuela Jerónimo J. Reyna y Desarrollándose las siguientes actividades: Construcción de **352** mtrs cuadrados de Repello, y pulido de **244** metros cuadrados de piso con colorante, se construirán **180** metros de Techo con canaletas y alucín, colocar 3 tijeras de Canaleta, colocación 20 canaletas donde se ubica el alucín ,68 metros cuadrados de Techo, colocación de 36 metros de zinc, Construcción de 92 metros lineales de cimentación con una línea de bloque de **30 x30** centímetros con tubo industrial y alambre ciclón de 5 pies con una varilla de cierra en el alambre

Las áreas a construir son : área para recepción de pacientes, Adjunto local para vacunación, Local para Clínica, Modulo Sanitario especialmente construido para los pacientes que asisten diariamente a recibir asistencia médica. A la vez se construirá una cerca Perimetral para asegurar los bienes del Centro de Salud.

En este momento ya se iniciado con las siguientes actividades. Construcción de arranques para la Construcción de sala de espera ,construcción de Clínica ,Construcción de módulos sanitarios, todas estas actividades están en su etapa de inicio anexos ,al concluir el proyecto se presentara un reporte ya con paredes repelladas y pulidas, construcción de Cerca Perimetral, cambio de láminas en mal estado y reparación de 98 metros lineales, de cerca perimetral, anexos en soleras, repello de muros, colocación de tubos de HG, colocación de maya ciclón con tubo de GH en terminal de alambre la cual presta un ambiente agradable y de mucha comodidad para los pacientes.

7. Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto.**
- 1. Se está iniciando un centro de salud que a una vez construido brinde las condiciones óptimas para la atención a los pacientes, asegurando la comodidad de los mismos en las diferentes épocas del año además disminuyendo los daños al establecimiento.
- 2. Mejorada la infraestructura de la unidad de salud en un **95%** contando con un ambiente agradable seguro y en condiciones adecuadas donde la población beneficiaria del municipio se siente contenta esperando ser atendida por el personal de salud.
- **3.- Impacto Ambiental.**

Para la ejecución proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De la Unidad Técnica de Gestión UTG, La Unidad Municipal Ambiental y se hicieron las inspecciones correspondientes, en cuanto a la ejecución del proyecto.

Este tipo de proyecto requiere de análisis ambientales más específicos por eso se levantó un biofísico de la zona en donde se está construyendo el proyecto..

Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara,
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se contó con un banco de Fuente de Financiamiento para la ejecución del proyecto describiéndolas a continuación: Secretaria de Salud, embajada de Japón y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada el financiador directo es la secretaria de Salud como principal financiador, con la contraparte municipalidad, (mano de obra calificada y materiales locales como ser: piedra, grava y arena). Realizándose estas actividades con fondos propios y fondos provenientes de las transferencias.

Presupuesto del Proyecto.

El proyecto fue socializado y aprobado en reunión de Corporación Municipal en donde se aprobaron **Lps.200,000.00** más la transferencia Positiva **L.84,425.50** y para el cual a su vez se llegó a un común acuerdo con Secretaria de Salud y la municipalidad.

Estado Actual del Proyecto.

En este momento la obra lleva un avance de un **5.27%** en cuanto a obra financiera, en cuanto a obra física es más el avance, iniciando ya en este momento con las paredes y parte del techado en el área de recepción iniciándose ya que la población deberá darle el uso correspondiente para que población goce de un establecimiento de salud en buenas condiciones y brinde la atención correspondiente.

8. Costo de finalización Financiera.

Costo Total: Aporte Municipal **Lps.200,000.00**

Transferencia Positiva: **Lps. 84,425.50**

Vigente: **Lps.284,425.50**

Devengado: **Lps.15,000.00**

Pagado: **Lps.15,000.00**

Fecha de finalización

Junio 2017

9. Ejecución Del Proyecto

10. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto esta planificado para ejecutarse en un periodo de **4** meses iniciando el mes de Febrero para finalizar a finales de Junio de 2017

La fecha planificada para culminación el proyecto ya se terminó y la mayoría de actividades en lo físico ya se culminaron en lo financiero falta que liquidar todavía, es por eso que se maneja un porcentaje bajo , los pagos se ejecutan en la misma medida en que ingresan las transferencias que el ingreso de transferencias a la municipalidad es muy lento y por la cantidad de actividades a realizarse en el proyecto y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la fuente financiamiento como ser: **La Secretaria de Salud y la Municipalidad**. Los fondos para este proyecto son fondos ya

comprometidos por parte de la municipalidad y de la secretaria de salud.

Por parte de la secretaria de Salud y la municipalidad se está supervisando el proyecto permanentemente, en vista que en este tipo de instalaciones muchas veces quedan actividades inconclusas que es necesario darles continuidad.

11. Variación en el costo total del Proyecto.

Así como en todo proyecto las variaciones siempre van a existir, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto por el momento no hay variación porque el proyecto todavía está en ejecución.

Monto Solicitado:

Costo Total: Aporte Municipal **Lps.200,000.00**

Transferencia Positiva: **Lps. 84,425.50**

Vigente: **Lps.284,425.50**

Devengado: **Lps.15,000.00**

Pagado: **Lps.15,000.00**

Fecha de finalización proyectada

Junio del 2017

12. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Como en todo proyecto siempre existen variaciones ya sea climáticas o de tipo financiero, en nuestro municipio lo que afecta grandemente es que los proyectos se ejecutan en la medida en que

las transferencias se perciben, esto dificulta grandemente la ejecución de los proyectos, ya que la ferreterías locales con las que contamos no siempre tiene los materiales que necesitamos o no dan al crédito. El proyecto lleva una ejecución satisfactoria por el momento lo que es agradable tanto para la municipalidad como para la fuente financiera Secretaria de Salud, ambas se están portando a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización de la obra en mención.

13. Razones de los cambios antes mencionados.

Es necesario dar a conocer que cambio de relevancia no existen en este proyecto, pero si existen tres razones de peso, a continuación:

- 1.- Lentitud en que llegan las transferencias a la Municipalidad que es uno de los cooperantes del proyecto.
- 2.- El Clima, que es un factor inevitable, y que siempre grandemente.
- 3.- Existen otros proyectos ejecutándose al mismo tiempo, lo que dificulta terminar en el tiempo previsto.

Anexos

Fotografías: avances en la obra física.







Observaciones: Este informe fotográfico refleja el grado de avance , así será presentado hasta que concluya a el proyecto.
