



Cooperación  
Española  
HONDURAS



PROGRAMA  
**EUROJUSTICIA**  
Promoviendo una justicia rápida y accesible en Honduras

**OFICIO-SEDS-EUROJ-024-2018**

Tegucigalpa M.D.C. 07 de Marzo 2018

Ingeniero  
**Rafael Antonio Lanza Hernández**  
Oficina de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública  
Secretaría de Seguridad  
Su Oficina

**REF: Expediente** 2016/SPE/0000400004 "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la Secretaría de Estado de Seguridad para la Lucha contra la Impunidad y Apoyo a la Transparencia", Reporte mes de Febrero de Proyectos y Contratos para Obras de Infraestructura Programa EuroJusticia

Estimado Ingeniero Lanza,

En atención a su Oficio SEDS-OTAIP-23-2018 respecto de Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de Febrero 2018 que se realizaron por parte de la Secretaria de Seguridad, me permito informarlo contratado con fondos del Programa EuroJusticia de la Secretaria de Seguridad y que se encuentran actualmente en ejecución:

No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IDENTIFICACION	CONTRATO	EMPRESA	VALOR DE CONTRATO	FECHA FIRMA DE CONTRATO	VIGENCIA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO
1	PROGRAMA EUROJUSTICIA	Construcción/adequación de Obras de Infraestructura de Una (01) Oficina de la Dirección Policial de Investigación (DPI) Lote 1 Los Dolores - Tegucigalpa.	No.SS- EUROJUSTICIA-CO-011-2017	INGESA S.A. DE C.V.	L. 1.684.996,01	15/11/2017	90 días apartir de la Orden de Inicio	22 de Diciembre 2017
2	"Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la SEDS", Union Europea y Agencia Española de Cooperacion	Construcción/adequación de Obras de Infraestructura de Una (01) Oficina de la Dirección Policial de Investigación (DPI) Lote 2 Choloma.	No.SS- EUROJUSTICIA-CO-006-2017	INGESA S.A. DE C.V.	L. 2.744.314,56	15/11/2017	90 días apartir de la Orden de Inicio	22 de Diciembre 2017
3	Internacional para el Desarrollo	Construcción/adequación de Obras de Infraestructura de Una (01) Oficina de la Dirección Policial de Investigación (DPI) Lote 3 La Ceiba.	No.SS- EUROJUSTICIA-CO-005-2017	CONSTRUCTORA BRISAS S.A.	L. 2.172.781,93	15/11/2017	90 días apartir de la Orden de Inicio	22 de Diciembre 2017
4	PROGRAMA EUROJUSTICIA "Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales de la SEDS", Union Europea y Agencia Española de Cooperacion	Supervisión y Estudios Preliminares (Topográfico, Eléctrico e Hidrosanitario) para tres Obras de Adequación, (DPI's Los Dolores/Tegucigalpa, Choloma y La Ceiba	No.CONTRATO SS- EUROJUSTICIA-PS-003-2017	H.J.J S.A. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION	L. 899,868.74	14/09/2017	180 días a partir de la Orden de Inicio	09 de Octubre 2017
5	Internacional para el Desarrollo	Consultoría para trámites de Diagnosticas ambientales para tres (3) obras de construcción a realizarse DPI's Los Dolores/Tegucigalpa, Choloma y Ceiba.	No.CONTRATO SS- EUROJUSTICIA-CI-002-2017	CARLOS ROBERTO CASTILLO GUTIERRES	L. 175.000,00	14/09/2017	150 días a partir de la Orden de Inicio	02 de Octubre 2017
<b>TOTAL</b>					<b>L. 6.777.092,50</b>			



**Teléfonos: 2229-0003,2229-0786,2229-0727,2229-0896.**

**El Ocotal, Francisco Morazán, Centro América**



Cooperación  
Española  
HONDURAS



PROGRAMA  
**EUROJUSTICIA**  
Promoviendo una justicia rápida y accesible en Honduras


Adicional a la referencia contratada, me permito adjuntar informe de avance de estas obras y pongo a su disposición los expedientes documentales que se tienen en las oficinas del Programa EuroJusticia para su revisión cuando lo estime oportuno.

Quedando a su disposición para cualquier información adicional, me despido de Usted con muestras de consideración y respeto.

Atentamente,

  
  
**LILIÁM M. CANTOR ZELAYA**  
Coordinación Técnica Programa EuroJusticia  
Secretaría de Seguridad

CC: Dirección de Modernización y Cooperación Externa.  
CC: Archivo



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE SEGURIDAD

OFICIO SEDS-OTAIP-23-2018

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de marzo de 2018

Licenciada

**LILIAN MAGDALENA CANTOR**

**COORDINADORA GENERAL PROGRAMA EUROJUSTICIA**

Su Oficina

Distinguida Licenciada Cantor

Por medio de la presente, solicito a usted ordene a quien corresponda, proporcione a esta unidad, un Informe de Proyectos de Infraestructura del mes de FEBRERO del 2018, que se realizaron por parte de la Secretaria de Seguridad, en el deberá incluir el detalle de todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo, en caso de no existir solicito una respuesta el cual confirme que no se realizó ningún cambio en los proyectos anteriores ni proyectos nuevos.

Detallar: **Identificación del Proyecto y Ejecución del Proyecto (monto de cada proyecto).**


La anterior información deberá ser proporcionada a la mayor brevedad posible, lo que deberá ser remitida a esta unidad en forma física o digital. En un término de tiempo de 6 días hábiles, remitiendo la información digital al correo electrónico: [transparencia.seguridad@hotmail.com](mailto:transparencia.seguridad@hotmail.com)

Agradeciendo altamente su valiosa colaboración.

Atentamente,

Ing. Rafael Antonio Lanza Hernández

OIP / SEDS



## INFORME ESTADO ACTUAL

### Avance al 6 de marzo de 2018

ADECUACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DELA DIRECCION DE POLICIAL DE INVESTIGACION LOS DOLORES, TEGUCIGALPA.

El presente informe contiene la información de avance de las obras de adecuación de las oficinas de la DPI Los Dolores, Tegucigalpa.

La obra civil se ejecuta a través de la contratación de la empresa INGESA S. de R.L. de C.V. mediante contrato SS-EUROJUSTICIA-CO-011-2017, la supervisión de la obra está a cargo de la empresa HJJ S.A.

### ACTIVIDADES EN EJECUCION

#### OBRA CIVIL

- Pintura de paredes.
- Instalación de cielo falso.
- Instalación de tomacorrientes e interruptores.
- Instalación de luminarias
- Corrección de inconformidades en acabado de paredes y cielos.
- Instalación de paredes de vidrio.



### OBSERVACIONES

- Durante la visita se observó que el acabado de las paredes de tablayeso es inadecuado, en varios puntos se ha sellado la pared sin haber lijado las mismas antes, se aprecia una deficiente aplicación de masilla en algunas superficies, y en la pared que divide la bodega y archivo de la oficina del encargado se aprecia un fallo en la pared que requiere el arreglo de la misma, estos trabajos se están ejecutando a la fecha.
- Se necesita mejorar la instalación de la estructura de cielo falso en partículas del ángulo perimetral el cual se aprecia irregularidades en el mismo, estos detalles deben ser corregidos, correcciones en ejecución.
- El enchape de baños presenta gradas y algunas piezas aparentan estar huecas, estas deben ser cambiadas, trabajo en proceso de desinstalación de cerámica indicada.
- El enchape utilizado para la pileta y el mueble de cocina no es el aprobado además de estar mal instalado por lo que debe ser reemplazado en su totalidad, demolido el enchape de lavatrastos, pendiente el de la pileta.
- Al momento de la aplicación de pintura en paredes debe protegerse de manera adecuada los pisos para evitar manchar la liga del mismo.

- Debe forrarse la tubería de paneles eléctricos que no pudieron ser empotrados, tanto las líneas de alimentación como la instalación de aterrizaje de cada panel, trabajo en proceso.
- Se solicitó el forrado de la tubería eléctrica y de aire acondicionado en la fachada de la DPI.
- Se aprobó pintar las columnas redondas con el tono de color Persa de la cartilla de color ColorLife de Commex.
- Se solicitó que el desagüe de los aires acondicionados que está cerca de la entrada se conectado a una caja de aguas negras y no desagüe sobre la acera.
- Se solicitó al contratista cotización de pintura de fachada lateral de primer nivel de edificio de Metropolitana #1.

# ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

AL VIERNES 2 de marzo 2017

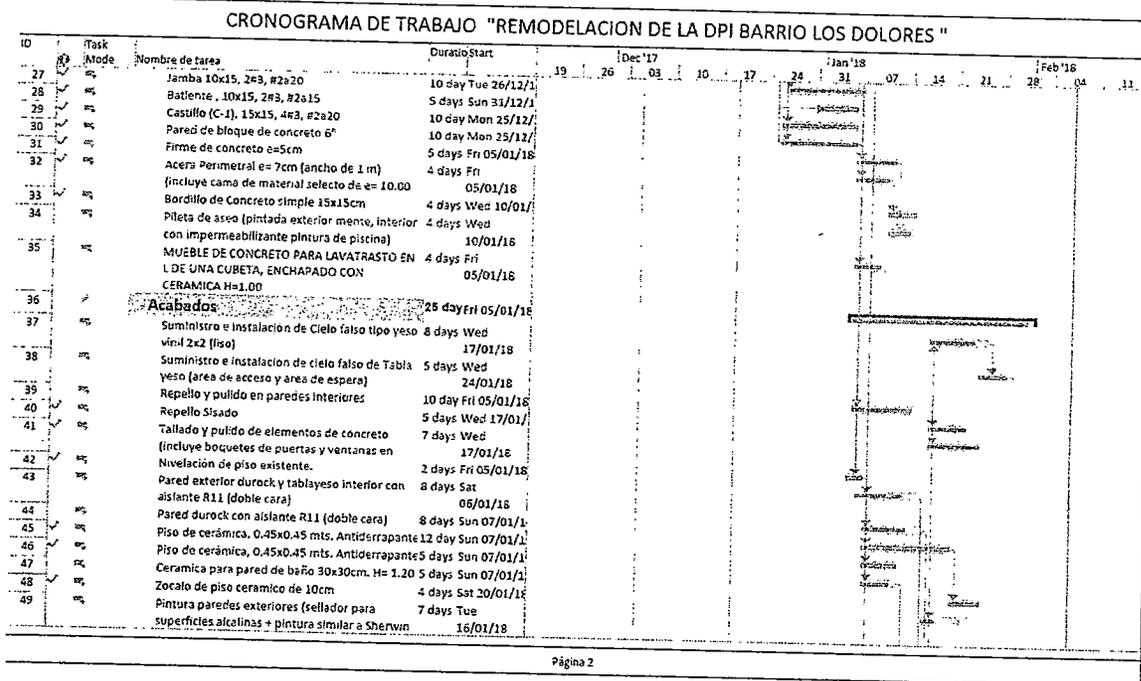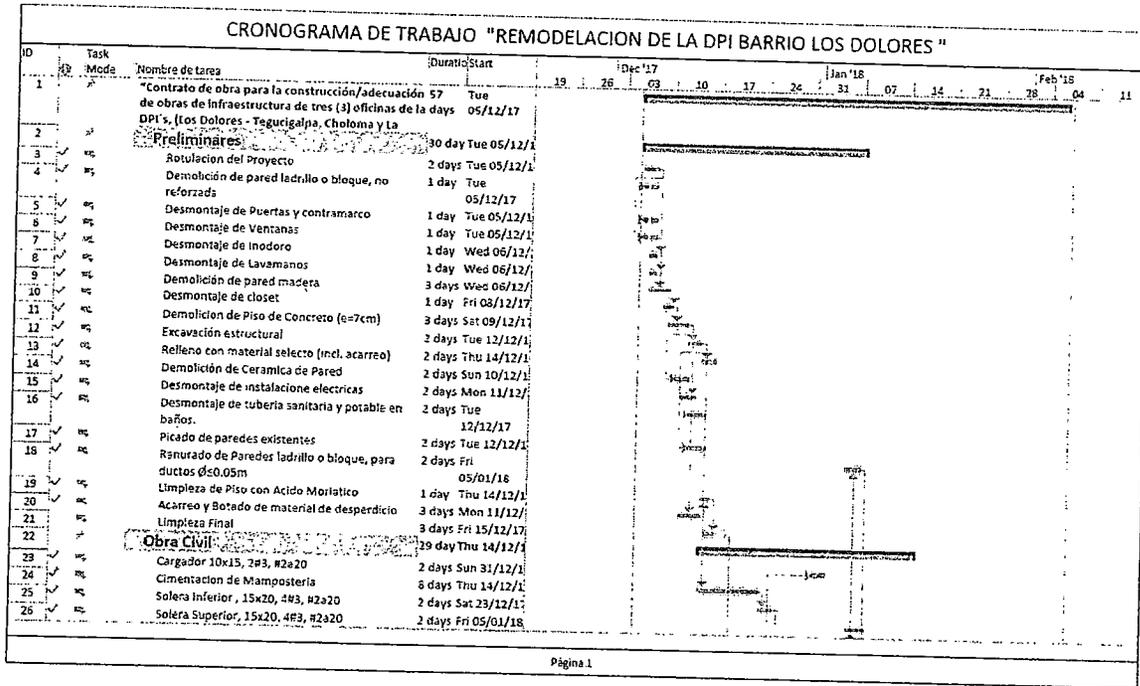

**CRONOGRAMA DE TRABAJO "REMODELACION DE LA DPI BARRIO LOS DOLORES "**



ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duración	Start	Dec '17	Jan '18	Feb '18
50	MC	Pintura paredes interiores (sellador y pintura acrílica lavable similar a sherwin Williams)	12 days	Mon 15/01/18			
51	MC	Pintura de Cielo de Tablayeso	2 days	Sun 28/01/18			
52	MC	Suministro e instalación de inodoros (Modelo Equix, Incesa- American Standard, Sistema de PUSH BOTON el asiento es elongado de 4.8 Lts. de capacidad El tanque o similar)	2 days	Fri 12/01/18			
53	MC	Lavamanos de pedestal ( Modelo Olympus, Incesa- American Standard o similar)	2 days	Fri 12/01/18			
54	MC	Salida Standard, grifo pesado cromado con Suministro e instalación de escudos acrílicos en fachadas	2 days	Mon 15/01/18			
55	MC	Fascia de durock, en fachada	10 day	Wed 17/01/18			
56	MC	Elemento Sisado de durock en fachada	4 days	Wed 17/01/18			
57	MC	Rotulo General de acrílico en interiores	1 day	Sun 28/01/18			
58	MC	Puerta (P-1), Abatible, 1.20x2.10m, Aluminio y vidrio y calcomanía	2 days	Wed 17/01/18			
59	MC	Puerta (P-2), Termoformada metálica, 0.90x2.102	2 days	Fri 19/01/18			
60	MC	Puerta (P-3) metálica 1.00x2.10m tipo troquelada	3 days	Sun 21/01/18			
61	MC	Puerta (P-4), Termoformada metálica, 0.60x2.102	2 days	Sun 21/01/18			
62	MC	Puerta (P-5), Corrediza, 1.05x2.10m, Aluminio, vidrio y calcomanía Sand Blast.	2 days	Wed 24/01/18			
63	MC	Puerta (P-6), Corrediza, 1.43x2.30m, Aluminio, vidrio y calcomanía Sand Blast.	2 days	Wed 24/01/18			
64	MC	Puerta (P-7), Corrediza, 1.50x2.10m, Aluminio, vidrio y calcomanía Sand Blast.	2 days	Sat 27/01/18			
65	MC	Ventana (V-1), Aluminio y vidrio fijo, 2.23x1.60m, + lamina desplegable 1/2 Pulg	2 days	Sat 27/01/18			
66	MC	Ventana (V-2), Aluminio y Vidrio fijo, 1.26x1.60m, + lamina desplegable 1/2 Pulg	1 day	Mon 29/01/18			
67	MC	Ventana (V-3), Aluminio y vidrio corredizo, 1.79x1	1 day	Mon 29/01/18			
68	MC	Ventana (V-4), Aluminio y vidrio corredizo, 1.41x1	1 day	Mon 29/01/18			
69	MC	Ventana (V-5), Aluminio y vidrio corredizo, 1.55x1	1 day	Mon 29/01/18			

Página 3

**CRONOGRAMA DE TRABAJO "REMODELACION DE LA DPI BARRIO LOS DOLORES "**


ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duración	Start	Dec '17	Jan '18	Feb '18
70	MC	Pared (PV-1), Fachada de Aluminio y Vidrio 4.11x2.60m, Con Calcomanía Sand Blast.	1 day	Tue 30/01/18			
71	MC	Pared (PV-2), Fachada de Aluminio y Vidrio 2.79x2.30m, Con Calcomanía Sand Blast.	1 day	Tue 30/01/18			
72	MC	Pared (PV-3), Fachada de Aluminio y Vidrio 1.22x2.60m, Con Calcomanía Sand Blast.	1 day	Tue 30/01/18			
73	MC	<b>Instalaciones Hidrosanitarias</b>	22 days	Mon 18/12/17			
74	MC	Suministro e instalación de Tubería PVC agua potable 1/2" similar a Amanco o Durman	5 days	Mon 18/12/17			
75	MC	Valvula de control de Agua Potable (incluye caja con tapadera)	1 day	Sun 24/12/17			
76	MC	Suministro e instalación de tubería PVC de 2" para drenaje similar a Amanco o Durman	5 days	Sat 23/12/17			
77	MC	Suministro e instalación de tubería PVC de 4" para drenaje similar a Amanco o Durman	6 days	Sun 24/12/17			
78	MC	Suministro e instalación de tubería PVC de 6" para drenaje similar a Amanco o Durman	3 days	Sun 24/12/17			
79	MC	Caja de registro 40x40x60	4 days	Wed 27/12/17			
80	MC	Trampa de Grasas 0.40x0.40	2 days	Sun 31/12/17			
81	MC	Instalaciones Hidrosanitarias, incluye accesorios de drenaje y agua potable, excavaciones, rellenos, resanes en paredes y pisos existentes	12 days	Mon 25/12/17			
82	MC	Suministro e instalación de tubería para Ventilador de PVC 3" similar a Amanco o Durman	4 days	Sat 06/01/18			
83	MC	Suministro e instalación regadera incluye valvula de control y accesorios	1 day	Tue 09/01/18			
84	MC	Suministro e instalación de grifería para patio	1 day	Tue 09/01/18			
85	MC	Suministro e instalación de sifones de piso	1 day	Tue 09/01/18			
86	MC	Suministro e instalación de tapon de registro	1 day	Tue 09/01/18			
87	MC	<b>Instalaciones Eléctricas</b>	27 days	Sun 07/01/18			
88	MC	Tomacorrientes dobles polarizados (incluye cableado 2#10 y 1#12 THHN ) en pared	6 days	Sun 07/01/18			

Página 4

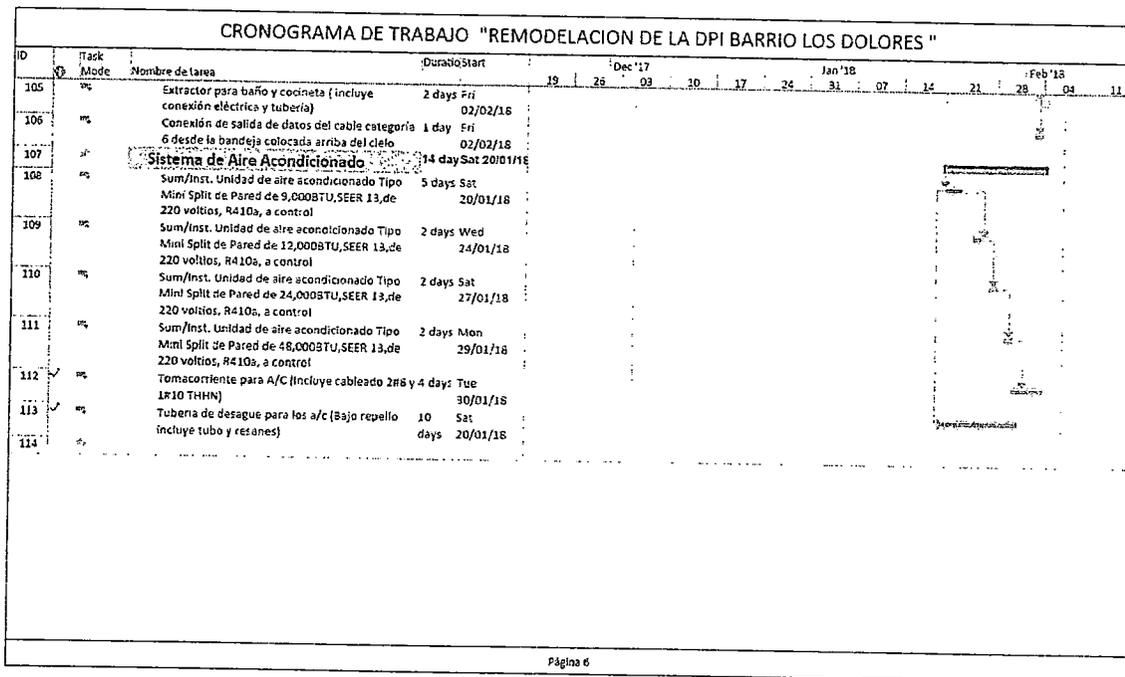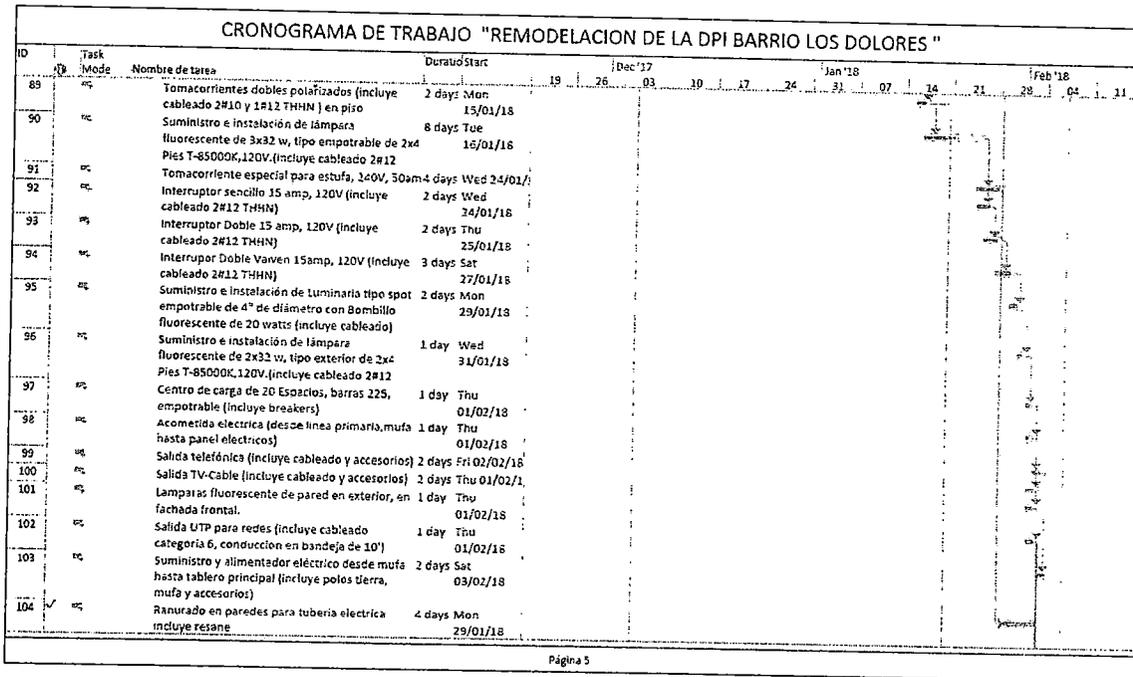


## AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

Ejecutado     Por Ejecutar

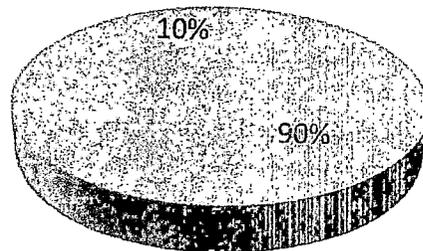

Las correcciones de acabados detalladas en las observaciones deben corregirse a la brevedad para terminar los trabajos de pintura de la remodelación, la subsanación de estos detalles no afectara gravemente el cronograma del proyecto pues los avances oportunos a comienzos del año permiten la corrección de los detalles y terminar el proyecto en el tiempo estipulado. Se encuentra pendiente la instalación de transformador por estudios en proceso por parte de la EEH, a finales de esta semana comenzaran instalación de puertas y ventanas, quedando por último la instalación de los aires para la finalización del proyecto.

Atentamente

  
Ing. Carlos Romero Mejía




Unidad Ejecutora de Proyectos




Secretaría de Seguridad


# ANEXO

## REGISTRO FOTOGRAFICO

### Obra Civil

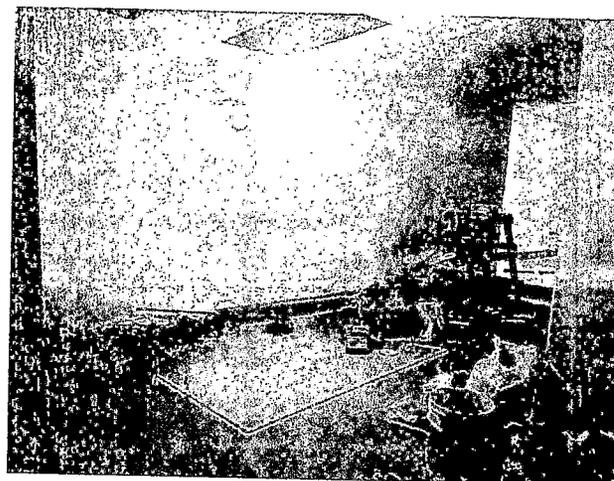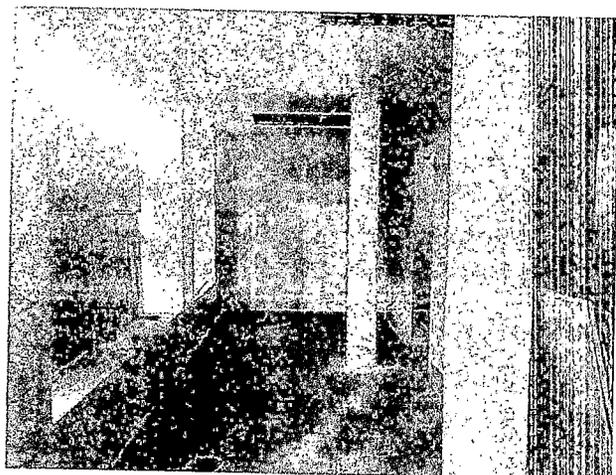

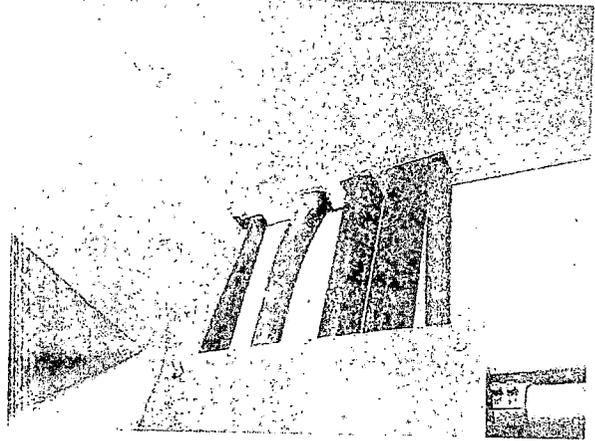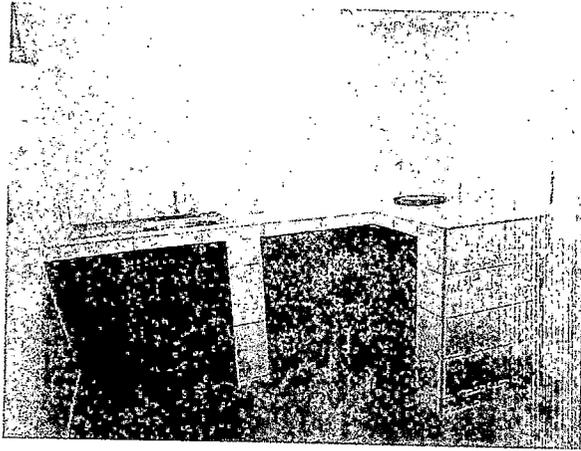



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆☆  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Comayagüela, Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 06 de marzo de 2018

**OFICIO SEDS-UEP No. 139-2018**

Licenciada  
**Liliam Cantor**  
Coordinadora de programa EUROJUSTICIA  
Su oficina. –


Estimada licenciada Cantor:

Reciba un cordial saludo, deseándole en sus delicadas funciones

Por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de remitir informe de estado actual de remodelaciones de instalaciones **DPI Choloma, Cortés y DPI La Ceiba, Atlántida.**

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted con mis más altas muestras de consideración y estima.


Atentamente.

Por:   
\_\_\_\_\_  
Arq. Axel Sierra

**Unidad ejecutora de proyectos SEDS**

AS/Meylin\*

Cc: Archivo



## INFORME ESTADO ACTUAL

### Avance al 6 de marzo de 2018

#### ADECUACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE UNA OFICINA DE LA DIRECCION DE POLICIAL DE INVESTIGACION

El presente informe contiene la información de avance de las obras de adecuación de las oficinas de la DPI Choloma, Departamento de Cortes.

La obra civil se ejecuta a través de la contratación de la empresa INGESA S. de R.L. de C.V. mediante contrato SS-EUROJUSTICIA-CO-006-2017, la supervisión de la obra está a cargo de la empresa HJJ S.A.


#### ACTIVIDADES EN EJECUCION

##### OBRA CIVIL

- Construcción de losa para generador eléctrico.
- Construcción de paredes de tabla yeso.
- Instalación de cielo falso.
- Instalación de ventanas.
- Construcción de fascias de Durock
- Construcción de aceras

## AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

■ Ejecutado    ■ Por Ejecutar

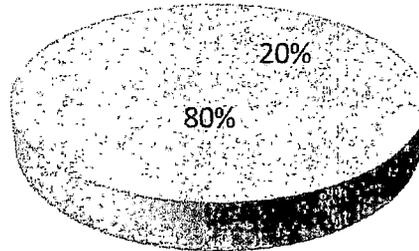

A la fecha están en desarrollo trabajos en fachadas, fascias, aceras e instalación de ventanas de aluminio y vidrio, en el interior se está finalizando la instalación de paredes de tabla yeso y de cielo falso, se está evaluando el aumento de personal para la finalización de las obras en el tiempo estipulado.

Atentamente

Ing. Carlos Romero Mejía





Unidad Ejecutora de Proyectos

Secretaría de Seguridad

# ANEXO

## REGISTRO FOTOGRAFICO

### Obra Civil

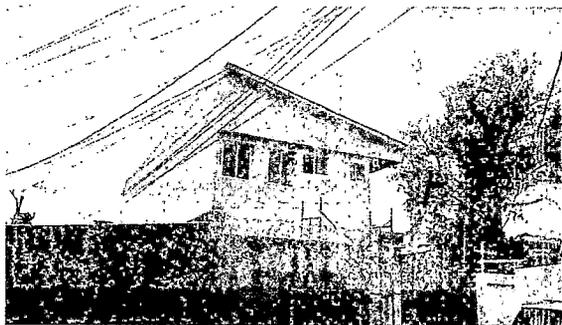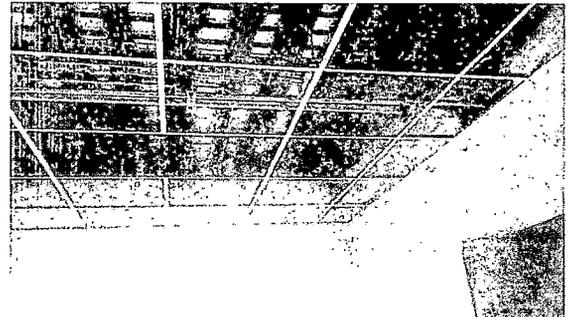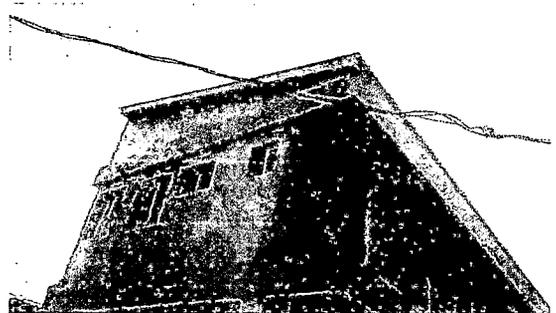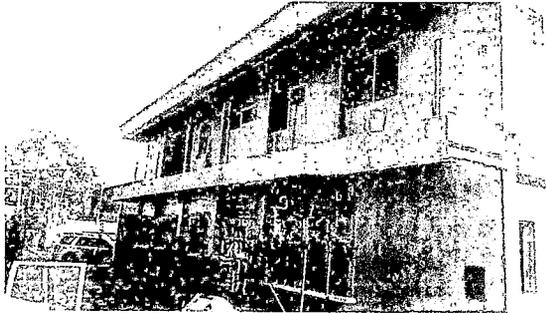

## INFORME ESTADO ACTUAL

**Avance al 6 de marzo de 2018**

ADECUACION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE UNA OFICINA DE LA DIRECCION DE POLICIAL DE INVESTIGACION

El presente informe contiene la información de avance de las obras de adecuación de las oficinas de la DPI La Ceiba, Departamento de Atlántida.

La obra civil se ejecuta a través de la contratación de la empresa Constructora Brisas S.A. mediante contrato SS-EUROJUSTICIA-CO-005-2017, la supervisión de la obra está a cargo de la empresa HJJ S.A.

### ACTIVIDADES EN EJECUCION

#### OBRA CIVIL


- Instalación de ventanearía y puertas de vidrio
- Pintura de paredes internas
- Instalación de aires acondicionados.

### OBSERVACIONES

- En proceso de pintura de paredes.
- Esta semana se comenzara con instalación de equipos de aire acondicionado.
- Instalaciones de internet y redes finalizadas.
- Debe comenzarse proceso de limpieza de áreas externas.

## AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

■ Ejecutado    ■ Por Ejecutar

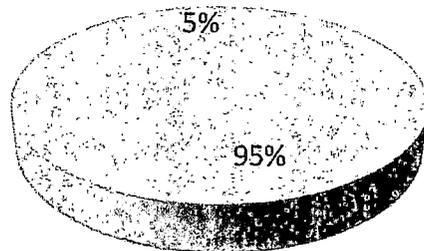

Avance de obras en un 95%, terminando trabajos de pintura e instalación de ventanería, esta semana se comenzará con instalación de equipos de aire acondicionado, trabajos de fuerza y redes terminadas, obras exteriores en un 95%, se proyecta finalizar obras la próxima semana.

Atentamente

  
Ing. Carlos Romero Mejía




**Unidad Ejecutora de Proyectos**


**Secretaría de Seguridad**

# ANEXO

## REGISTRO FOTOGRAFICO

### Obra Civil

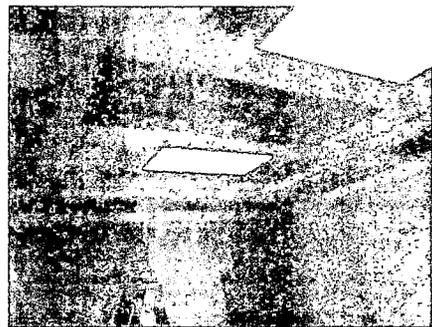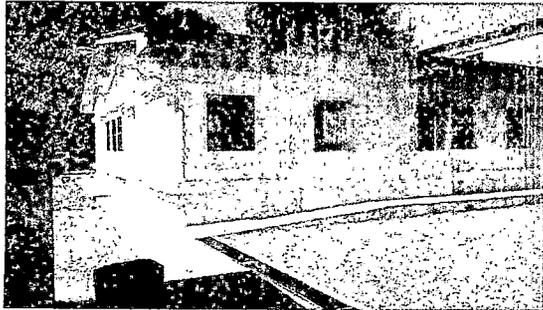



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

☆☆☆☆  
SECRETARIA DE SEGURIDAD

Comayagüela, Aldea El Ocotal, 06 de marzo del 2018.

Oficio SEDS-UEP No. 135-2018.

Ref.: Adecuación de obras de infraestructura oficina DPI Dolores,  
Tgu.

Licenciada  
**Liliam Cantor Zelaya**  
Coordinador Técnico Programa Euro justicia-SEDS  
Su Oficina.

Estimada Licenciada Cantor:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Por este medio me dirijo a usted, con la finalidad de remitirle para conocimiento y demás fines lo que a continuación se detalla:

**1. Informe Estado Actual**

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted con mis más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente.

  
\_\_\_\_\_  
**Arq. Axel Sierra**  
Unidad Ejecutora de Proyectos SEDS

AS/Claudia\*  
Cc. Archivo.

REVISADO	13-49
FECHA	6/3/18
OTRO	Claudia
