


MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE ABRIL AÑO 2018.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Juan Carlos Servellon Méndez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de obra de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	02/10/2017	220,270.24	31,715.54	251,985.78	70.00%	No se ha continuado con el Proyecto por Falta de Materiales
2	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Techo y Tres Puertas de Metal en Proyecto de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	18/01/2018	79,400.00	-	79,400.00	25%	No se avanzado el Proyecto porque el contratista de obra gris no ha continuado por falta de materiales
3	Construcción de Caja Puente	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Milagro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Caja Puente.	04/01/2018	48,798.50	-	48,798.50	100%	-
4	Centro de Capacidades Especiales	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Centro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Capacidades Especiales	29/12/2017	190,687.45	11,000.00	201,687.45	80%	No sé ha continuado con el Proyecto por Falta de Materiales
5	Energía Eléctrica	Fausto Ordoñez	Caserío La Filipinas	Contrato de Mano de Obra de Aplomado de Postes	10/01/2018	60,000.00	-	60,000.00	50%	No se avanzado el Proyecto porque la comunidad no ha podido llevar los postes al sitio donde se hincaran
6	Alcantarillado Sanitario	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Alcantarillado Sanitario	20/03/2018	213,263.33	-	213,263.33	55%	-



REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL

ALDEA DE TABLONES ABAJO



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"




22/02/18



22/02/18


ING. EYNAR RIVERA ARAUJO
INGENIERO CIVIL
C. 27-98-47
26-08-17
C.H. No. 1070

Ing. Eynar Rivera Araujo
Supervisor




REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL

ALDEA DE TABLONES ABAJO



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"




22/02/18



22/02/18


INGENIERO CIVIL
2-06-17
26-08-17

Ing. Eynar Rivera Araujo
Supervisor


ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE YUSUQUE
2014-2022
U.T.M.
TECA, HONDURAS

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL

ALDEA DE TABLONES ABAJO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE												
Descripción: Remodelación y Ampliación Centro Comunal, Tablones Abajo Ejecutor: Juan Carlos Servellón Méndez Monto de Contrato: L. 251,985.78			Aldea: Tablones Abajo Fecha Contrato: 02 de Octubre de 2017 Bo./Colonia: N/A				Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yaguare Periodo del: 23 de Enero al 22 de Febrero del 2018					
ESTIMACIÓN # 05 POR MANO DE OBRA												
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
DEMOLICIONES												
1	Demolición de pared de ladrillo	m²	154.98	55.00	L. 8,523.90	154.98	8,523.90			154.98	L. 8,523.90	100.00%
2	Demolición de piso de concreto (8-10 cm)	m²	16.61	50.00	L. 830.50	16.61	830.50			16.61	L. 830.50	100.00%
3	Demolición general	dia	4.00	495.00	L. 1,980.00	4.00	1,980.00			4.00	L. 1,980.00	100.00%
4	Desmontaje de Tijera	und	3.00	188.50	L. 565.50	3.00	565.50			3.00	L. 565.50	100.00%
5	Desmontaje de lamina de techo (Estruc. Existente)	m²	105.00	35.00	L. 3,675.00	105.00	3,675.00			105.00	L. 3,675.00	100.00%
6	Demolición de piso de mosaico	m²	72.36	27.50	L. 1,989.90	50.00	1,375.00	22.36	L. 614.90	72.36	L. 1,989.90	100.00%
7	Desmontaje de puertas incluye contra marcos	und	3.00	123.75	L. 371.25	3.00	371.25			3.00	L. 371.25	100.00%
8	Desmontaje de ventanas	m²	3.00	77.22	L. 231.66	3.00	231.66			3.00	L. 231.66	100.00%
9	Desmontaje de canaleta	und	14.00	37.30	L. 522.20	14.00	522.20			14.00	L. 522.20	100.00%
10	Acarreo de material de desperdicio	m³	10.00	81.00	L. 810.00	10.00	810.00			10.00	L. 810.00	100.00%
TOTAL						L. 19,499.91	18,885.01		614.90		L. 19,499.91	100.00%
GRADAS												
11	Relleno compactado con material del sitio	m³	L. 43.23	130.00	L. 5,619.90	20.00	2,600.00	23.23	L. 3,019.90	43.23	L. 5,619.90	100.00%
12	Pared de bloque 15 cm, relleno, ref. 1#3 @ 20 y 1#3 @ 1 hilada	m²	L. 19.98	290.00	L. 5,794.20	19.98	5,794.20			19.98	L. 5,794.20	100.00%
13	Losa de concreto e= 10 cm, #3 @ 15 cm. a.s.	m²	L. 4.04	222.81	L. 900.15							
14	Firme de concreto de e= 5.00 cm	m²	L. 36.33	75.00	L. 2,724.75			36.33	L. 2,724.75	36.33	L. 2,724.75	100.00%
15	Piso de granito terrazo 30x30	m²	L. 36.33	120.00	L. 4,359.60							
TOTAL						L. 19,398.60	8,394.20		L. 5,744.65		L. 14,138.85	72.89%
CENTRO COMUNAL												
16	Trazado y marcado	ml	L. 65.60	19.00	L. 1,246.40	65.60	1,246.40			65.60	L. 1,246.40	100.00%
17	Excavación de material no calificado	m³	L. 44.20	260.00	L. 11,492.00	44.20	11,492.00			44.20	L. 11,492.00	100.00%
18	Cimentación de mampostería	m³	L. 15.41	220.00	L. 3,390.20	15.41	3,390.20			15.41	L. 3,390.20	100.00%
19	Zapata aislada 0.80x0.80 cm, e=25 cm, 8#5 a.s	und	L. 19.00	320.00	L. 6,080.00	19.00	6,080.00			19.00	L. 6,080.00	100.00%
20	Columna de 25x25 cm, 6#5 y #3 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	L. 85.00	220.00	L. 18,700.00	59.50	13,090.00	24.50	L. 5,390.00	84.00	L. 18,480.00	98.82%
21	Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	L. 9.62	100.00	L. 962.00	9.62	962.00			9.62	L. 962.00	100.00%
22	Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (inferior)	ml	L. 79.40	101.75	L. 8,078.95	79.40	8,078.95			79.40	L. 8,078.95	100.00%
23	Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (cargador o intermedia)	ml	L. 64.60	101.75	L. 6,573.05	64.60	6,573.05			64.60	L. 6,573.05	100.00%
24	Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (superior)	ml	L. 64.60	101.75	L. 6,573.05	48.35	4,919.61	16.25	L. 1,653.44	64.60	L. 6,573.05	100.00%
25	Solera de 15x15 cm, corona (cierre), 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	L. 16.64	33.69	L. 560.60							
26	Tallados de elementos de 0.15 - 0.25 cm	ml	L. 135.50	63.00	L. 8,536.50							
27	Pared de bloque simple de 15 cm	m²	L. 174.03	180.00	L. 31,325.40	167.93	30,227.40	6.10	L. 1,098.00	174.03	L. 31,325.40	100.00%
28	Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	m²	L. 348.06	99.54	L. 34,645.89	150.00	14,931.00	30.00	L. 2,986.20	180.00	L. 17,917.20	51.72%
29	Pintura en paredes	m²	L. 348.06	24.00	L. 8,353.44							
30	Viga canal de concreto reforzado, pulida, concreto 1:2:2	ml	L. 17.00	123.90	L. 2,106.30							
31	Suministro e instalacion de tubería pvc de 4" RD-26, para bajantes de agua lluvias	ml	L. 5.00	19.79	L. 98.95							
32	Entablicado de bloque 15 cm (INC. REPE./PULIDO)	ml	L. 16.02	100.00	L. 1,602.00							
33	Piso de concreto simple, e= 5 cm	m²	L. 230.62	75.00	L. 17,296.50			23.06	L. 1,729.50	23.06	L. 1,729.50	10.00%
34	Cerámica en piso de 33.00x33.00 cm	m²	L. 230.62	124.48	L. 28,707.58							
TOTAL						L. 196,328.81	100,990.61		L. 12,857.14		L. 113,847.75	57.99%
FACHADA FRONTAL SUPERIOR												

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL


ALDEA DE TABLONES ABAJO


	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		 Vo.Bo. Eynar Rivera Araujo INGENIERO SUPERVISOR C.H., No. 7878
Descripción: Remodelación y Ampliación Centro Comunal, Tablones Abajo Ejecutor: Juan Carlos Servellon Méndez Monto de Contrato: L. 251,985.78	Aldea: Tablones Abajo Fecha Contrato: 02 de Octubre de 2017 Bo./Colonia: N/A	Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Ysguare Periodo del: 23 de Enero al 22 de Febrero del 2018	
ESTIMACIÓN # 05 POR MANO DE OBRA			

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRÉSUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
35	Pared de bloque simple de 15 cm	m²	L. 9.32	180.00	L. 1,677.60							
36	Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	m²	L. 9.32	99.54	L. 927.71							
37	Pintura en paredes y elementos estructurales	m²	L. 27.62	24.00	L. 662.88							
38	Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	L. 4.50	118.00	L. 531.00							
39	Viga para resalte en fachada frontal superior, 0.30X0.30, 6#4 Y #3@ 17.5 cm	ml	L. 36.00	200.00	L. 7,200.00							
40	Tallado de elementos desde 0.15-25 cm	ml	L. 86.00	63.00	L. 5,418.00							
	TOTAL				L. 16,417.19							
LAVANDERÍA Y PILA												
41	Suministro e instalación de inodoro	und	L. 2.00	170.63	L. 341.26							
	TOTAL				L. 341.26							
	GRAN TOTAL				L. 251,985.78	128,269.28		19,216.69		147,486.51	68.53%	

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	128,269.28	19,216.69	147,485.97
Retención por Anticipo	16,953.91	5,168.99	22,122.90
Retención por I.S.R. (12.5%)	36.00		36.00
Retención por Calidad de Obra			-
Retención por Multa			-
Neto a Pagar	111,279.37	14,047.70	125,327.07

<p>JUAN CARLOS SERVELLON CONTRATISTA</p> <p>Firma:  Nombre: Juan Carlos Servellon Méndez FECHA: 22/02/2018</p>	<p>INGENIERO SUPERVISOR</p> <p>Firma:  Nombre: Eynar Rivera Araujo FECHA: 22/02/2018</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>COORDINADOR MAMBOCAURE</p> <p>Firma:  Nombre: Ing. Leonor Martínez FECHA: 22/02/2018</p> <p style="text-align: center;"></p>	<p>ALCALDE MUNICIPAL</p> <p>Firma:  Nombre: Mauricio Turcios S FECHA: 22/02/2018</p> <p style="text-align: center;"></p>
--	---	---	--




REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL
(CONSTRUCCION DE TECHO, ALDEA DE TABLONES ABAJO).



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"




22/02/18




22/02/18


ING. EYNAR RIVERA ARÁUJO
Supervisor




ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE YUSSUARE
U.T.M.
PATATECA, HONDURAS

**REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL
(CONSTRUCCION DE TECHO, ALDEA DE TABLONES ABAJO).**


	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		
	Descripción: Construcción de Techo en Remodelación y Ampliación Centro Comunal, Tablones Abajo Ejecutor: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez Monto de Contrato: L. 79,400.00		
ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRA			

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
TECHO												
1	Techo de canaleta de 2x6" y lamina de aluzinc calibre 26	m ²	269.50	200.00	L. 53,900.00							
2	Cercha con angulos de 2"x2" y de 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" legitima	unidad	3.00	7,000.00	L. 21,000.00			2.80	L. 19,600.00	2.80	L. 19,600.00	93.33%
	TOTAL TECHO				L. 74,900.00				19,600.00		19,600.00	26.17%
PUERTAS												
3	Puerta de metal, lamina troquelada	unidad	L. 3.00	1,500.00	L. 4,500.00							
	TOTAL PUERTAS				L. 4,500.00							
	GRAN TOTAL				L. 79,400.00				19,600.00		19,600.00	24.69%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.


DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	-	19,600.00	19,600.00
Retención por Anticipo	-	2,940.00	2,940.00
Retención por I.S.R. (12.5%)	-		-
Retención por Calidad de Obra	-		-
Retención por Multa	-		-
Neto a Pagar	-	16,660.00	16,660.00

CONTRATISTA

Firma: 
 Nombre: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez

FECHA: 22/02/2018

INGENIERO SUPERVISOR

Firma: 
 Nombre: Eymar Rivera Araujo

FECHA: 22/02/2018

COORDINADOR MAMBOCAURE


Firma: 
 Nombre: Ing. Leonel Martínez

FECHA: 22/02/2018

ALCALDE MUNICIPAL

Firma: 
 Nombre: Mauricio Turcios

FECHA: 22/02/2018




CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, B° EL MILAGRO



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure

"MAMBOCAURE"




RELLENO EN APROXIMACIONES



CAJA PUENTE TERMINADA

[Handwritten Signature]
Ing. Eynar Rivera Araujo



[Handwritten Signature]



CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, B° EL MILAGRO



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



"MAMBOCAURE"



FUNDICIÓN DE LOSA



LOSA FUNDIDA

[Signature]
INGENIERO CIVIL
22-06-17
26-06-17
C.A.C.H. No. 7870

Ing. Eynar Rivera Araujo


[Signature]
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSUPE
2017-2020
U.T.M.
LA BOTIJA, HONDURAS

CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUNTE, B° EL MILAGRO

		ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE											
Descripción: Construcción Caja Punte, Barrio El Milagro Ejecutor: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez Monto de Contrato: L. 48,798.50		Aldea: N/A Fecha Contrato: 22 de Enero 2018 Bo./Colonia: Barrio El Milagro		Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 27 de Febrero al 23 de Marzo del 2018									
ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA													
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%	
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L		
1	Demolición de elementos de concreto/mampostería	m ³	9.27	L. 350.00	L. 3,244.50	9.27	3,244.50			9.27	L. 3,244.50	100.00%	
2	Trazado y marcado	ml	50.00	L. 20.00	L. 1,000.00	50.00	1,000.00			50.00	L. 1,000.00	100.00%	
3	Excavación material tipo I	m ³	45.85	L. 250.00	L. 11,462.50	45.85	11,462.50			45.85	L. 11,462.50	100.00%	
4	Mampostería para estribos y pilastra	m ³	31.40	L. 200.00	L. 6,280.00	31.40	6,280.00			31.40	L. 6,280.00	100.00%	
5	Empedrado 0.20 cm	m ²	18.92	L. 200.00	L. 3,784.00	12.24	2,448.00	6.68	L. 1,336.00	18.92	L. 3,784.00	100.00%	
6	Losa de concreto e=20 cm	m ²	21.50	L. 560.00	L. 12,040.00			21.50	L. 12,040.00	21.50	L. 12,040.00	100.00%	
7	Encofrado de losa monolítica	m ²	21.50	L. 325.00	L. 6,987.50	21.50	6,987.50			21.50	L. 6,987.50	100.00%	
8	Bordillo de concreto 15x15 cm	ml	10.00	L. 100.00	L. 1,000.00			10.00	L. 1,000.00	10.00	L. 1,000.00	100.00%	
9	Relleno y compactado con material selecto	m ³	20.00	L. 100.00	L. 2,000.00	10.00	1,000.00	10.00	L. 1,000.00	20.00	L. 2,000.00	100.00%	
10	Limpieza final de areas exteriores	dia	1.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00			1.00	L. 1,000.00	1.00	L. 1,000.00	100.00%	
GRAN TOTAL						L. 48,798.50		32,422.50		16,376.00		48,798.50	100.00%

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	32,422.50	16,376.00	48,798.50
Retención por Anticipo	4,863.38	2,456.40	7,319.78
Retención por I.S.R. (12.5%)			-
Retención por Calidad de Obra			-
Retención por Multa			-
Neto a Pagar	27,559.13	13,919.60	41,478.73

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

CONTRATISTA  Firma: _____ Nombre: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez FECHA: 23/03/18	INGENIERO SUPERVISOR  Firma: _____ Nombre: Eymar Rivera Araujo FECHA: 23/03/18	COORDINADOR DE MAMBOCAURE  Firma: _____ Nombre: Leonor Martínez FECHA: 23-03-2018	ALCALDE MUNICIPAL  Firma: _____ Nombre: Mauricio Turcios FECHA: 23/03/2018
--	--	--	---

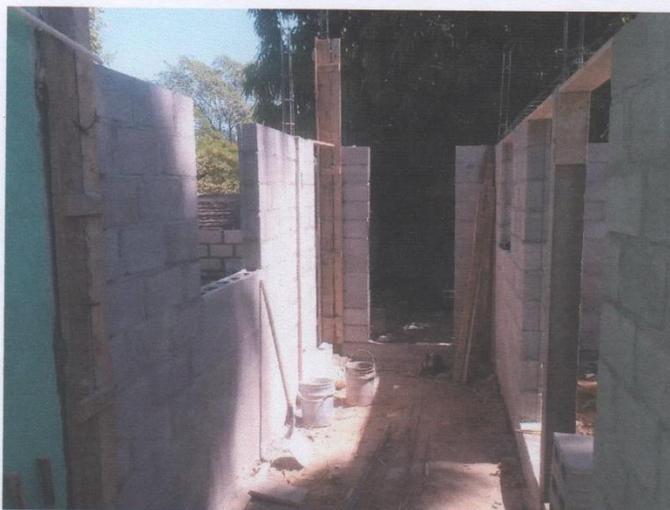


CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES, B° EL CENTRO




Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure


"MAMBOCAURE"



Paredes de bloque repelladas


EYNAR RIVERA ARCE
INGENIERO CIVIL
26-06-17
26-06-17

Ing. Eynar Rivera Arce


ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE YUSUPE
2022-2026
U.T.M.
MONTECAS, HONDURAS

CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES, B° EL CENTRO



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



TECHO E INSTALACIONES ELECTRICAS



INGENIERO CIVIL
23-06-17
28-06-17
EYNAR RIVERA ARAUJO

Ing. Eynar Rivera Araujo


ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE YUSUQUE
2021
U.T.M.
TECA, HONDURAS

CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES, B° EL CENTRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		ALdea: N/A Fecha Contrato: 29 de Diciembre de 2017 Bo./Colonia: Barrio El Centro		Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 09 de Enero al 08 de Mayo de 2018								
Descripción: Construcción Centro de Capacidades Especiales		Aldea: N/A		Departamento: Choluteca								
Ejecutor: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez		Fecha Contrato: 29 de Diciembre de 2017		Municipio: Santa Ana de Yusguare								
Monto de Contrato: L. 190,687.45		Bo./Colonia: Barrio El Centro		Periodo del: 09 de Enero al 08 de Mayo de 2018								
ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA												
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	%
PRELIMINARES												
1	Trazado y Marcado	ml	58.69	20.00	L. 1,173.80	20.32	406.40	38.37	L. 767.40	58.69	L. 1,173.80	100.00%
	TOTAL				L. 1,173.80				L. 767.40		1,173.80	100.00%
CIMENTACIÓN												
2	Excavación de material no calificado	m³	6.34	300.00	L. 1,902.00	4.88	1,464.00	1.46	L. 438.00	6.34	L. 1,902.00	100.00%
3	Cimentación de mampostería	m³	9.11	400.00	L. 3,644.00	6.37	2,548.00	2.74	L. 1,096.00	9.11	L. 3,644.00	100.00%
4	Dado de concreto de 40 x 40 x 40 cm, 3#3 y #2 @20 cm	unidad	21.00	200.00	L. 4,200.00	9.00	1,800.00	12.00	L. 2,400.00	21.00	L. 4,200.00	100.00%
	TOTAL				L. 9,746.00				L. 3,934.00		L. 9,746	100.00%
ESTRUCTURAS												
5	Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	L. 77.34	140.00	L. 10,827.60	20.00	2,800.00	57.34	L. 8,027.60	77.34	L. 10,827.60	100.00%
6	Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (inferior)	ml	L. 45.03	150.00	L. 6,754.50	20.32	3,048.00	24.71	L. 3,706.50	45.03	L. 6,754.50	100.00%
7	Solera 15X15 cm, 4#3 Y #2 @ 15 cm Concreto 1:2:2, (cargador o intermedia)	ml	L. 45.03	150.00	L. 6,754.50			45.03	L. 6,754.50	45.03	L. 6,754.50	100.00%
8	Solera 15X15 cm, 4#3 Y #2 @ 15 cm Concreto 1:2:2, (de cierre)	ml	L. 45.03	150.00	L. 6,754.50			45.03	L. 6,754.50	45.03	L. 6,754.50	100.00%
	TOTAL				L. 31,091.10				L. 25,243.10		L. 31,091.10	100.00%
PAREDES												
9	Pared de bloque simple de 15 cm	m²	L. 119.63	250.00	L. 29,907.50	32.63	8,157.50	87.00	L. 21,750.00	119.63	L. 29,907.50	100.00%
10	Pared de tabla yeso para interiores	m²	L. 41.16	300.00	L. 12,348.00							
11	Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	m²	L. 212.23	110.00	L. 23,345.30			212.23	L. 23,345.30	212.23	L. 23,345.30	100.00%
12	Pintura en paredes	m²	L. 236.65	35.00	L. 8,282.75							
	TOTAL				L. 73,883.55				L. 45,095.30		L. 63,252.80	200.00%
TECHO DE CANALETA Y LAMINA DE ALUZINC												
13	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc calibre 26 legitima	m²	L. 111.07	150.00	L. 16,660.50			111.07	L. 16,660.50	111.07	L. 16,660.50	100.00%
14	Viga canal de concreto reforzado, pulida, concreto 1:2:2	ml	L. 20.37	300.00	L. 6,111.00			20.37	L. 6,111.00	20.37	L. 6,111.00	100.00%
15	Suministro e instalacion de tubería pvc de 4" RD-26, para bajantes de agua lluvias	ml	L. 12.00	30.00	L. 360.00							
16	Entablicado de bloque 15 cm (INC. REPE/PULIDO)	ml	L. 20.68	100.00	L. 2,068.00			20.68	L. 2,068.00	20.68	L. 2,068.00	100.00%
17	Cielo falso fibra mineral de 2x4, y fleje de aluminio	m²	L. 104.30	70.00	L. 7,301.00			70.30	L. 4,921.00	70.30	L. 4,921.00	67.40%
	TOTAL				L. 32,600.50				L. 29,760.50		L. 29,760.50	91.67%
PISOS												
18	Compactación con material del sitio	m³	L. 19.94	200.00	L. 3,988.00			19.94	L. 3,988.00	19.94	L. 3,988.00	100.00%
19	Piso de concreto simple 5 cm de espesor	m²	L. 104.30	80.00	L. 8,344.00			104.30	L. 8,344.00	104.30	L. 8,344.00	100.00%
20	Cerámica en piso de 33.00x33.00 cm	m²	L. 104.30	130.00	L. 13,559.00			73.01	L. 9,491.30	73.01	L. 9,491.30	70.00%
	TOTAL				L. 25,891.00				L. 21,823.30		L. 21,823.30	84.29%
PUERTAS VENTANAS												
21	Puerta de metal, lamina troquelada de 1x2.10 m	unidad	2.00	1,500.00	L. 3,000.00							
22	Puerta termoformada de madera para interiores, 0.80x2.10 cm	unidad	4.00	500.00	L. 2,000.00							
23	Ventanas de aluminio y vidrio fijo	m²	6.60	300.00	L. 1,980.00							
	TOTAL				L. 6,980.00							






 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
 MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE
 U.E.M.
 EDWIN EDGARDO MIRANDA RODRIGUEZ


CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES, B° EL CENTRO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE											
Descripción: Construcción Caja Puente, Barrio El Milagro Ejecutor: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez Monto de Contrato: L. 48,798.50		Aldea: N/A Fecha Contrato: 22 de Enero 2018 Bo./Colonia: Barrio El Milagro										
		Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 27 de Febrero al 23 de Marzo del 2018										
ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA												
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
1	Demolición de elementos de concreto/mampostería	m ³	9.27	L. 350.00	L. 3,244.50	9.27	3,244.50			9.27	L. 3,244.50	100.00%
2	Trazado y marcado	ml	50.00	L. 20.00	L. 1,000.00	50.00	1,000.00			50.00	L. 1,000.00	100.00%
3	Excavación material tipo I	m ³	45.85	L. 250.00	L. 11,462.50	45.85	11,462.50			45.85	L. 11,462.50	100.00%
4	Mampostería para estribos y pilastra	m ³	31.40	L. 200.00	L. 6,280.00	31.40	6,280.00			31.40	L. 6,280.00	100.00%
5	Empedrado 0.20 cm	m ²	18.92	L. 200.00	L. 3,784.00	12.24	2,448.00	6.68	L. 1,336.00	18.92	L. 3,784.00	100.00%
6	Losa de concreto e=20 cm	m ²	21.50	L. 560.00	L. 12,040.00			21.50	L. 12,040.00	21.50	L. 12,040.00	100.00%
7	Encofrado de losa monolítica	m ²	21.50	L. 325.00	L. 6,987.50	21.50	6,987.50			21.50	L. 6,987.50	100.00%
8	Bordillo de concreto 15x15 cm	ml	10.00	L. 100.00	L. 1,000.00			10.00	L. 1,000.00	10.00	L. 1,000.00	100.00%
9	Relleno y compactado con material selecto	m ³	20.00	L. 100.00	L. 2,000.00	10.00	1,000.00	10.00	L. 1,000.00	20.00	L. 2,000.00	100.00%
10	Limpieza final de áreas exteriores	dia	1.00	L. 1,000.00	L. 1,000.00			1.00	L. 1,000.00	1.00	L. 1,000.00	100.00%
GRAN TOTAL					L. 48,798.50		32,422.50		16,376.00		48,798.50	100.00%


En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>RETENCION ANTERIOR</th> <th>RETENCION ACTUAL</th> <th>RETENCION ACUMULADA</th> </tr> <tr> <td>MONTO ESTIMADO</td> <td style="text-align: right;">32,422.50</td> <td style="text-align: right;">16,376.00</td> <td style="text-align: right;">48,798.50</td> </tr> <tr> <td>Retención por Anticipo</td> <td style="text-align: right;">4,863.38</td> <td style="text-align: right;">2,456.40</td> <td style="text-align: right;">7,319.78</td> </tr> <tr> <td>Retención por I.S.R. (12.5%)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Retención por Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Retención por Multa</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Neto a Pagar</td> <td style="text-align: right;">27,559.13</td> <td style="text-align: right;">13,919.60</td> <td style="text-align: right;">41,478.73</td> </tr> </table>	DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA	MONTO ESTIMADO	32,422.50	16,376.00	48,798.50	Retención por Anticipo	4,863.38	2,456.40	7,319.78	Retención por I.S.R. (12.5%)			-	Retención por Calidad de Obra			-	Retención por Multa			-	Neto a Pagar	27,559.13	13,919.60	41,478.73
DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA																										
MONTO ESTIMADO	32,422.50	16,376.00	48,798.50																										
Retención por Anticipo	4,863.38	2,456.40	7,319.78																										
Retención por I.S.R. (12.5%)			-																										
Retención por Calidad de Obra			-																										
Retención por Multa			-																										
Neto a Pagar	27,559.13	13,919.60	41,478.73																										

CONTRATISTA  Firma:  Nombre: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez FECHA: 23/03/18	INGENIERO SUPERVISOR  Firma:  Nombre: Eynar Rivera Araujo FECHA: 23/03/18	COORDINADOR  Firma:  Nombre: Mauricio Turcios FECHA: 23-03-2018
--	--	---

ALCALDE MUNICIPAL  Firma:  Nombre: Mauricio Turcios FECHA: 23/03/2018





CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES, B° EL CENTRO

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		 INGENIERO SUPERVISOR C.I.C.H., No. 7878				
Descripción: Construcción Centro de Capacidades Especiales Ejecutor: Edwin Edgardo Miranda Rodriguez Monto de Contrato: L. 11,000.00	Aldea: N/A Fecha Contrato: 29 de Diciembre de 2017 Bo./Colonia: Barrio El Centro	Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 21 de Febrero al 26 de febrero de 2018					
ADENDUM POR MANO DE OBRA #1 ESTIMACIÓN #1 (FINAL)							
ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO P.U. TOTAL L	EJECUTADO ANTERIOR CANT. TOTAL L	EJECUTADO ESTE PERIODO CANT. TOTAL L	ACUMULADO ACTUAL Cantidad TOTAL L	%
1 Relleno y compactado con material selecto	m ³	L. 55.00	200.00 L. 11,000.00		55.00 L. 11,000.00	55.00 L. 11,000.00	100.00%
GRAN TOTAL			L. 11,000.00		11,000.00	11,000.00	100.00%


<p>En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>RETENCION ANTERIOR</th> <th>RETENCION ACTUAL</th> <th>RETENCION ACUMULADA</th> </tr> <tr> <td>MONTO ESTIMADO</td> <td></td> <td>11,000.00</td> <td>11,000.00</td> </tr> <tr> <td>Retención por Anticipo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retención por I.S.R. (12.5%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retención por Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retención por Multa</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Neto a Pagar</td> <td></td> <td>11,000.00</td> <td>11,000.00</td> </tr> </table>	DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA	MONTO ESTIMADO		11,000.00	11,000.00	Retención por Anticipo				Retención por I.S.R. (12.5%)				Retención por Calidad de Obra				Retención por Multa				Neto a Pagar		11,000.00	11,000.00
DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA																										
MONTO ESTIMADO		11,000.00	11,000.00																										
Retención por Anticipo																													
Retención por I.S.R. (12.5%)																													
Retención por Calidad de Obra																													
Retención por Multa																													
Neto a Pagar		11,000.00	11,000.00																										

<p>CONTRATISTA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Firma: <u>Edwin Edgardo Miranda Rodriguez</u> Nombre: Edwin Edgardo Miranda Rodriguez FECHA: <u>26/02/18</u></p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>INGENIERO SUPERVISOR</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Firma: <u>Eynar Rivera Aguilo</u> Nombre: Eynar Rivera Aguilo FECHA: <u>26/02/18</u></p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>COORDINADOR MAMBOCAURE</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Firma: <u>Mauricio Turcios S</u> Nombre: Mg. Leonel Martinez FECHA: <u>26/02/2018</u></p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>ALCALDE MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Firma: <u>Mauricio Turcios S</u> Nombre: Mauricio Turcios S FECHA: <u>26/02/18</u></p>
---	---	---	--




ENERGÍA ELÉCTRICA, CASERÍO LA FILIPINAS





U.T.M.

Tierra de Amigos y Frutos

ENERGÍA ELÉCTRICA, CASERÍO LA FILIPINAS




U.T.M.



Tierra de Amigos y Frutos

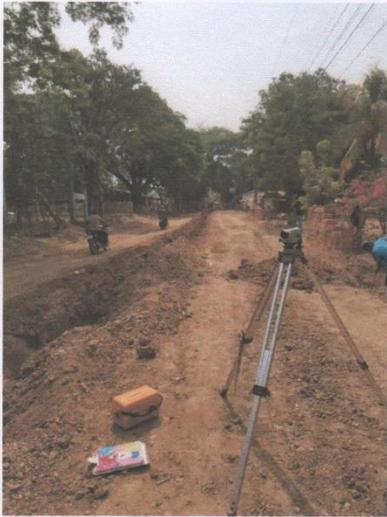
ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO TIERRAS MORENAS



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 6"




INGENIERO CIVIL
No. 17870-17
Ing. Eynal Rivera Araujo


ALCALDIA MUNICIPAL DE
MATA ANA DE YUSUPE
U.T.M.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO TIERRAS MORENAS



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"




POZO DE INSPECCIÓN E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS



EXCAVACIÓN PARA POZO


INGENIERO CIVIL
22-05-17
26-06-17
No. 7070-01

Ing. Eynar Rivera Araujo


ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE YUGUAY
2011-2022
U.T.M.
TEGUCEGA, HONDURAS





ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO TIERRAS MORENAS

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		
Descripción: Construcción Alcantarillado Sanitario Ejecutor: Ramon Enrique Vallejo Reyes Monto de Contrato: L. 213,263.33	Aldea: N/A Fecha Contrato: 20 de Marzo del 2018 Bo./Colonia: Tierras Morenas	Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 14 de Abril al 02 de Mayo del 2018	
ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA			

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
ALCANTARILLADO SANITARIO												
1.00	Trazado y marcado con teolito y nivel	ml	453.09	20.00	L. 9,061.80	237.90	4,758.00	202.20	L. 4,044.00	440.10	L. 8,802.00	97.13%
2.00	Relleno para cama de arena e=40 cm en instalación de tuberías PVC.	m ²	136.73	60.00	L. 8,203.80	71.85	4,311.00	61.06	L. 3,663.60	132.91	L. 7,974.60	97.21%
3.00	Instalación de tubería de PVC de 6"	ml	453.09	32.00	L. 14,498.88	237.90	7,612.80	202.20	L. 6,470.40	440.10	L. 14,083.20	97.13%
4.00	Instalación de tubería de PVC de 4"	ml	384.00	17.00	L. 6,528.00	101.70	1,728.90	112.90	L. 1,919.30	214.60	L. 3,648.20	55.89%
5.00	Instalación de YEE PVC de 6"x4"	unidad	64.00	26.00	L. 1,664.00	16.00	416.00	14.00	L. 364.00	30.00	L. 780.00	46.88%
6.00	Relleno con material del sitio con compactadora ballarina	m ²	886.15	70.00	L. 62,030.50	301.91	21,133.70	397.70	L. 27,839.00	699.61	L. 48,972.70	78.95%
7.00	Cajas de registro de 70x70x65 cm	unidad	64.00	920.00	L. 58,880.00	8.00	7,360.00	4.00	L. 3,680.00	12.00	L. 11,040.00	18.75%
8.00	Pozos de alcantarillado h= 1.50 m	unidad	2.00	3,800.00	L. 7,600.00	0.80	3,040.00		L. 0.00	0.80	L. 3,040.00	40.00%
9.00	Pozos de alcantarillado h= 2.00 m	unidad	4.00	4,500.00	L. 18,000.00	1.60	7,200.00		L. 0.00	1.60	L. 7,200.00	40.00%
10.00	Pozos de alcantarillado h ≤ 2.50 m	unidad	4.00	5,000.00	L. 20,000.00			2.40	L. 12,000.00	2.40	L. 12,000.00	60.00%
11.00	Prueba hidrostática alcantarillado sanitario 4"-12"	ml	453.09	15.00	L. 6,796.35							
GRAN TOTAL						L. 213,263.33	57,560.40	59,980.30		117,540.70	55.12%	

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	57,560.40	59,980.30	117,540.70
Retención por Anticipo	8,634.06	8,997.05	17,631.11
Retención por I.S.R. (12.5%)			-
Retención por Calidad de Obra			-
Retención por Multa			-
Neto a Pagar	48,926.34	50,983.26	99,909.60

CONTRATISTA  Firma: X Nombre: Ramon Enrique Vallejo Reyes FECHA: X 02-05-2018	INGENIERO SUPERVISOR  Firma:  Nombre: Eynar Rivera Araulo FECHA: 02/Mayo/2018	COORDINADOR DE MAMBOCAURE  Firma:  Nombre: Ing. Leonel Martinez FECHA: 02/Mayo/2018	ALCALDE MUNICIPAL  Firma:  Nombre: Mauricio Turcios FECHA: 02/05/18
--	--	---	---

