

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE MAYO AÑO 2018.


N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Juan Carlos Servellon Méndez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de obra de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	02/10/2017	220,270.24	31,715.54	251,985.78	72.18%	No se ha continuado con el Proyecto por Falta de Materiales
2	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Techo y Tres Puertas de Metal en Proyecto de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	18/01/2018	79,400.00	-	79,400.00	67.18%	No se avanzado el Proyecto porque el contratista de obra gris no ha continuado por falta de materiales
3	Construcción de Caja Puente	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Milagro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Caja Puente.	04/01/2018	48,798.50	-	48,798.50	100%	-
4	Centro de Capacidades Especiales	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Centro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Capacidades Especiales	29/12/2017	190,687.45	11,000.00	201,687.45	79.53%	No sé ha continuado con el Proyecto por Falta de Materiales
5	Energía Eléctrica	Fausto Ordoñez	Caserío La Filipinas	Contrato de Mano de Obra de Aplomado de Postes	10/01/2018	60,000.00	-	60,000.00	100%	Terminada la obra pero no cancelado el Contrato
6	Alcantarillado Sanitario	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Alcantarillado Sanitario	20/03/2018	213,263.33	-	213,263.33	100%	-

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA

INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE MAYO AÑO 2018.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
7	Sector Educación	Ronald Alfredo Moreno	Caserío El Zapotillo, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Construcción de Techo y Paredes Falsas con lamina de aluzinc en Bodega Cocina Kínder El Zapotillo	09/05/2018	6,000.00	-	6,000.00	100%	-
8	Mejoramiento de Canchas Deportivas	Ronald Alfredo Moreno	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de reparación de 4 portones e instalacion de una puerta en Campo de Futbol	18/05/2018	2,600.00	-	2,600.00	100%	-
9	Mejoramiento del Edificio de la Municipalidad	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en Bodega Municipal (consiste en cambio e instalacion de dos láminas).	22/05/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%	-
10	Construcción de Centro Comunales y de Usos Múltiples.	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en el Centro Social Municipal (Consiste en sellado y tapado de goteras)	25/05/2018	1,300.00	-	1,300.00	100%	-
11	Mejoramiento del Edificio de la Municipalidad	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en Oficinas Municipales (Consiste en sellado y tapado de goteras en Oficina de Comité	28/05/2018	800.00	-	800.00	100%	-

				de Transparencia, Cocina, O.M.M., U.M.A., U.T.M., P.M.I.A.J., y Desarrollo Comunitario						
12	Alcantarillado Sanitario	Omar Antonio Cabrera Ventura	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusquare.	Servicios de 48.30 Horas de Excavación en Proyecto de Alcantarillado Sanitario	17/05/2018	50,232.00	-	50,232.00	100%	-
13	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba y Caserío La Montaña, Santa Ana de Yusquare.	Servicios de 70.10 Horas de Excavadora cortando material selecto, 6.30 Horas de Retroexcavadora regando material y 6.30 Horas de Patrol Conformando Calle para Mejoramiento de Carretera que conduce a Aldea de Tablones Arriba y Carretera hacia el Relleno Sanitario	18/05/2018	137,586.00	-	137,586.00	100%	-
14	Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	Omar Antonio Cabrera Ventura	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusquare.	Servicios de 50.50 Horas de Excavación en Proyecto de Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Barrio Tierras Morenas.	19/05/2018	46,460.00	-	46,460.00	100%	-




REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL
ALDEA DE TABLONES ABAJO, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




“MAMBOCAURE”




Gradas, repello y tallados



Fachada frontal


Ing. Eynar Rivera Araujo
Supervisor






REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL
AL DEA DE TABLONES ABAJO, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"




Repello y tallado de elementos



Piso concreto simple


INGENIERO CIVIL
22-06-17
26-06-17
No. 1078
Ing. Eynar Rivera Araujo


ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE YUSGUARE
2014-2022
U.T.M.
CHOLUTECA, HONDURAS

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL


ALDEA DE TABLONES ABAJO, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.

No.		ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
					P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
DEMOLICIONES													
1		Demolición de pared de ladrillo	m ²	154.98	55.00	L. 8,523.90	154.98	8,523.90			154.98	L. 8,523.90	100.00%
2		Demolición de piso de concreto (8-10 cm)	m ²	16.61	50.00	L. 830.50	16.61	830.50			16.61	L. 830.50	100.00%
3		Demolición general	dia	4.00	495.00	L. 1,980.00	4.00	1,980.00			4.00	L. 1,980.00	100.00%
4		Desmontaje de Tijera	und	3.00	188.50	L. 565.50	3.00	565.50			3.00	L. 565.50	100.00%
5		Desmontaje de lamina de techo (Estruc. Existente)	m ²	105.00	35.00	L. 3,675.00	105.00	3,675.00			105.00	L. 3,675.00	100.00%
6		Demolición de piso de mosaico	m ²	72.36	27.50	L. 1,989.90	72.36	1,989.90			72.36	L. 1,989.90	100.00%
7		Desmontaje de puertas incluye contra marcos	und	3.00	123.75	L. 371.25	3.00	371.25			3.00	L. 371.25	100.00%
8		Desmontaje de ventanas	m ²	3.00	77.22	L. 231.66	3.00	231.66			3.00	L. 231.66	100.00%
9		Desmontaje de canaleta	und	14.00	37.30	L. 522.20	14.00	522.20			14.00	L. 522.20	100.00%
10		Acarreo de material de desperdicio	m ³	10.00	81.00	L. 810.00	10.00	810.00			10.00	L. 810.00	100.00%
TOTAL						L. 19,499.91		19,499.91				19,499.91	100.00%
GRADAS													
11		Relleno compactado con material del sitio	m ³	L. 43.23	130.00	L. 5,619.90	43.23	5,619.90			43.23	L. 5,619.90	100.00%
12		Pared de bloque 15 cm, relleno, ref. 1#3 @ 20 y 1#3 @ 1 hilada	m ²	L. 19.98	290.00	L. 5,794.20	19.98	5,794.20			19.98	L. 5,794.20	100.00%
13		Losa de concreto e= 10 cm, #3 @ 15 cm. a.s.	m ²	L. 4.04	222.81	L. 900.15			4.04	L. 900	4.04	L. 900.15	100.00%
14		Firme de concreto de e= 5.00 cm	m ²	L. 36.33	75.00	L. 2,724.75	36.33	2,724.75			36.33	L. 2,724.75	100.00%
15		Piso de granito terrazo 30x30	m ²	L. 36.33	120.00	L. 4,359.60							
TOTAL						L. 19,398.60		14,138.85		L. 900.15		L. 15,039.00	77.53%
CENTRO COMUNAL													
16		Trazado y marcado	ml	L. 65.60	19.00	L. 1,246.40	65.60	1,246.40			65.60	L. 1,246.40	100.00%
17		Excavación de material no calificado	m ³	L. 44.20	260.00	L. 11,492.00	44.20	11,492.00			44.20	L. 11,492.00	100.00%
18		Cimentación de mamposteria	m ³	L. 15.41	220.00	L. 3,390.20	15.41	3,390.20			15.41	L. 3,390.20	100.00%
19		Zapata aislada 0.80x0.80 cm, e=25 cm, 8#5 a.s	und	L. 19.00	320.00	L. 6,080.00	19.00	6,080.00			19.00	L. 6,080.00	100.00%
20		Columna de 25x25 cm, 6#5 y #3 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	L. 85.00	220.00	L. 18,700.00	84.00	18,480.00	1.00	L. 220.00	85.00	L. 18,700.00	100.00%
21		Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	L. 9.62	100.00	L. 962.00	9.62	962.00			9.62	L. 962.00	100.00%
22		Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (inferior)	ml	L. 79.40	101.75	L. 8,078.95	79.40	8,078.95			79.40	L. 8,078.95	100.00%
23		Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (cargador o intermedia)	ml	L. 64.60	101.75	L. 6,573.05	64.60	6,573.05			64.60	L. 6,573.05	100.00%
24		Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (superior)	ml	L. 64.60	101.75	L. 6,573.05	64.60	6,573.05			64.60	L. 6,573.05	100.00%
25		Solera de 15x15 cm, corona (cierre), 4#3 y #2 @ 15 cm concreto 1:2:2	ml	L. 16.64	33.69	L. 560.80			16.64	L. 560.60	16.64	L. 561	100.00%
26		Tallados de elementos de 0.15 - 0.25 cm	ml	L. 135.50	63.00	L. 8,536.50			108.40	L. 6,829.20	108.40	L. 6,829	80.00%
27		Pared de bloque simple de 15 cm	m ²	L. 174.03	180.00	L. 31,325.40	174.03	31,325.40			174.03	L. 31,325	100.00%
28		Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	m ²	L. 348.06	99.54	L. 34,645.89	180.00	17,917.20	34.81	L. 3,464.99	214.81	L. 21,382.19	61.72%
29		Pintura en paredes	m ²	L. 348.06	24.00	L. 8,353.44							
30		Viga canal de concreto reforzado, pulida, concreto 1:2:2	ml	L. 17.00	123.90	L. 2,106.30			17.00	L. 2,106.30	17.00	L. 2,106.30	100.00%
31		Suministro e instalacion de tuberia pvc de 4" RD-26, para bajantes de agua lluvias	ml	L. 5.00	19.79	L. 98.95			5.00	L. 98.95	5.00	L. 98.95	100.00%
32		Entabicado de bloque 15 cm (INC. REPE./PULIDO)	ml	L. 16.02	100.00	L. 1,602.00			16.02	L. 1,602.00	16.02	L. 1,602.00	100.00%
33		Piso de concreto simple, e= 5 cm	m ²	L. 230.62	75.00	L. 17,296.50	23.06	1,729.50	207.56	L. 15,567.00	230.62	L. 17,296.50	100.00%
34		Cerámica en piso de 33.00x33.00 cm	m ²	L. 230.62	124.48	L. 28,707.58							
TOTAL						L. 196,328.81		113,847.75		L. 30,449.04		L. 144,296.79	73.50%
FACHADA FRONTAL SUPERIOR													



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE




VoBo. 
INGENIERO CIVIL
N.º 26-64-17
I.C.H., No. 7874

Descripción: Remodelación y Ampliación Centro Comunal, Tablones Abajo
Ejecutor: Juan Carlos Servellon Méndez
Monto de Contrato: L. 251,985.78

Aldea: Tablones Abajo
Fecha Contrato: 02 de Octubre de 2017
Bo./Colonia: N/A


Departamento: Choluteca
Municipio: Santa Ana de Yusguare
Periodo del: 23 de Febrero al 07 de Junio del 2018

ESTIMACIÓN # 06 POR MANO DE OBRA


U.T.M.


REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL

ALDEA DE TABLONES ABAJO, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE											
Descripción: Remodelación y Ampliación Centro Comunal, Tablones Abajo Ejecutor: Juan Carlos Servellón Méndez Monto de Contrato: L. 251,985.78		Aldea: Tablones Abajo Fecha Contrato: 02 de Octubre de 2017 Bo./Colonia: N/A										
		Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 23 de Febrero al 07 de Junio del 2018										
ESTIMACIÓN # 06 POR MANO DE OBRA												
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
35	Pared de bloque simple de 15 cm	m ²	L 9.32	180.00	L 1,677.60							
36	Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	m ²	L 9.32	99.54	L 927.71							
37	Pintura en paredes y elementos estructurales	m ²	L 27.62	24.00	L 662.88							
38	Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	L 4.50	118.00	L 531.00			1.35	L 159.30	1.35	L 159.30	30.00%
39	Viga para resalte en fachada frontal superior, 0.30X0.30, 6#4 Y #3@ 17.5 cm	ml	L 36.00	200.00	L 7,200.00			14.40	L 2,880.00	14.40	L 2,880.00	40.00%
40	Tallado de elementos desde 0.15-25 cm	ml	L 86.00	63.00	L 5,418.00							
	TOTAL				L 16,417.19				L 3,039.30		L 3,039.30	18.51%
LAVANDERIA Y PILA												
41	Suministro e instalación de inodoro	und	L 2.00	170.63	L 341.26							
	TOTAL				L 341.26							
	GRAN TOTAL				L 251,985.78	147,485.97	34,388.49	181,874.46	72.18%			

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	147,485.97	34,388.49	181,874.46
Retención por Anticipo	16,953.91	5,158.27	27,281.17
Retención por I.S.R. (12.5%)	36.00		36.00
Retención por Calidad de Obra			-
Retención por Multa			
Neto a Pagar	130,496.06	29,230.22	154,557.29

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

CONTRATISTA Firma: <u>Juan Carlos Servellón</u> Nombre: Juan Carlos Servellón Méndez FECHA: <u>07/06/18</u>	INGENIERO SUPERVISOR Firma: <u>Eymar Rivera Aranda</u> Nombre: Eymar Rivera Aranda FECHA: <u>07/06/18</u>	COORDINADOR MANCOMUNIDAD Firma: <u>Mario Rodríguez</u> Nombre: Mario Rodríguez FECHA: <u>07/06/2018</u>	ALCALDE MUNICIPAL Firma: <u>Mauricio Turcios</u> Nombre: Mauricio Turcios FECHA: <u>07/06/2018</u>
--	--	--	---



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
C.I.C.H., No. 1870

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL
(CONSTRUCCION DE TECHO, ALDEA DE TABLONES ABAJO).

SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure


"MAMBOCAURE"




07/06/18



07/06/18


INGENIERO CIVIL
22-06-17
26-06-17
No. 1702-07

Ing. Eynar Rivera Afañujo


ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE YUSGUARE
2014-2018
2022-2026
U.T.M.
CHOLUTECA, HONDURAS

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL
(CONSTRUCCION DE TECHO, ALDEA DE TABLONES ABAJO).

SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




“MAMBOCAURE”




07/06/18



07/06/18


INGENIERO CIVIL
29-06-17
26-06-17
C.C.P. H.-No. 7870

Ing. Eynar Rivera Araujo






ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE YUSGUARE
2014-2022
U.T.M.
CHOLUTECA, HONDURAS


**REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO COMUNAL
(CONSTRUCCION DE TECHO, ALDEA DE TABLONES ABAJO).
SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.**

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE 												
Descripción: Construcción de Techo en Remodelación y Ampliación Centro Comunal, Tablones Abajo Ejecutor: Edwin Edgardo Miranda Rodriguez Monto de Contrato: L. 79,400.00				Aldea: Tablones Abajo Fecha Contrato: 22 de Enero 2018 Bo./Colonia: N/A				Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 23 de Febrero al 07 de Junio del 2018				
ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA												
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
TECHO												
1	Techo de canaleta de 2x6" y lamina de aluzinc calibre 26	m ²	269.50	200.00	L. 53,900.00			161.70	L. 32,340.00	161.70	L. 32,340.00	60.00%
2	Cercha con angulos de 2"x2" y de 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" legitima	unidad	3.00	7,000.00	L. 21,000.00	2.80	19,600.00	0.20	L. 1,400.00	3.00	L. 21,000.00	100.00%
	TOTAL TECHO				L. 74,900.00		19,600.00		33,740.00		53,340.00	71.21%
PUERTAS												
3	Puerta de metal, lamina troquelada	unidad	L. 3.00	1,500.00	L. 4,500.00							
	TOTAL PUERTAS				L. 4,500.00							
	GRAN TOTAL				L. 79,400.00		19,600.00		33,740.00		53,340.00	67.18%

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	19,600.00	33,740.00	53,340.00
Retención por Anticipo	2,940.00	5,061.00	8,001.00
Retención por I.S.R. (12.5%)			-
Retención por Calidad de Obra			-
Retención por Multa			-
Neto a Pagar	16,660.00	28,679.00	45,339.00

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

CONTRATISTA Firma:  Nombre: Edwin Edgardo Miranda Rodriguez FECHA: 07/06/18	INGENIERO SUPERVISOR  Firma:  Nombre: Eymar Rivera Aranda FECHA: 07/06/18	COORDINADOR MANCOMUNIDAD  Firma:  Nombre: Mauricio Turcios FECHA: 07/06/2018
	ALCALDE MUNICIPAL  Firma:  Nombre: Mauricio Turcios FECHA: 07/06/18	

**CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES, B° EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA.**




Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



Paredes de bloque repelladas


INGENIERO CIVIL
26-06-17
26-06-17

Ing. Eynar Rivera Aráuz


ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE YUSGUARE
2022
U.T.M.
CHOLUTECA, HONDURAS

**CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES, B° EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA.**



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



"MAMBOCAURE"



PAREDES-PISO-CIELO FALSO



AXANCA
INGENIERO CIVIL
2017
06-17
EYNER RIVERA ARAUJO
Ing. Eynar Rivera Araujo

ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE YUSGUARE
2022
U.T.M.
CHOLUTECA, HONDURAS

**CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES, B° EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA.**



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



TECHO E INSTALACIONES ELECTRICAS


Ing. Eynar Rivera Araujo




ALCALDIA MUNICIPAL DE
SANTA ANA DE YUSGUARE
U.T.M.
CHOLUTECA, HONDURAS

CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES, B° EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.

No.		ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO P.U.	TOTAL L	EJECUTADO ANTERIOR CANT.	TOTAL L	EJECUTADO ESTE PERIODO CANT.	TOTAL L	ACUMULADO ACTUAL Cantidad	TOTAL L	%
PRELIMINARES													
1		Trazado y Marcado	ml	58.69	20.00	L. 1,173.80	20.32	406.40	38.37	L. 767.40	58.69	L. 1,173.80	100.00%
		TOTAL				L. 1,173.80				L. 767.40		1,173.80	100.00%
CIMENTACIÓN													
2		Excavación de material no calificado	m²	6.34	300.00	L. 1,902.00	4.88	1,464.00	1.46	L. 438.00	6.34	L. 1,902.00	100.00%
3		Cimentación de mampostería	m²	9.11	400.00	L. 3,644.00	6.37	2,548.00	2.74	L. 1,096.00	9.11	L. 3,644.00	100.00%
4		Dado de concreto de 40 x 40 x 40 cm, 3#3 y #2 @20 cm	unidad	21.00	200.00	L. 4,200.00	9.00	1,800.00	12.00	L. 2,400.00	21.00	L. 4,200.00	100.00%
		TOTAL				L. 9,746.00				L. 3,934.00		L. 9,746.00	100.00%
ESTRUCTURAS													
5		Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	L. 77.34	140.00	L. 10,827.60	20.00	2,800.00	57.34	L. 8,027.60	77.34	L. 10,827.60	100.00%
6		Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (inferior)	ml	L. 45.03	150.00	L. 6,754.50	20.32	3,048.00	24.71	L. 3,706.50	45.03	L. 6,754.50	100.00%
7		Solera 15X15 cm, 4#3 Y #2 @ 15 cm Concreto 1:2:2, (cargador o intermedia)	ml	L. 45.03	150.00	L. 6,754.50			45.03	L. 6,754.50	45.03	L. 6,754.50	100.00%
8		Solera 15X15 cm, 4#3 Y #2 @ 15 cm Concreto 1:2:2, (de cierre)	ml	L. 45.03	150.00	L. 6,754.50			45.03	L. 6,754.50	45.03	L. 6,754.50	100.00%
		TOTAL				L. 31,091.10				L. 25,243.10		L. 31,091.10	100.00%
PAREDES													
9		Pared de bloque simple de 15 cm	m²	L. 119.63	250.00	L. 29,907.50	32.63	8,157.50	87.00	L. 21,750.00	119.63	L. 29,907.50	100.00%
10		Pared de tabla yeso para interiores	m²	L. 41.16	300.00	L. 12,348.00							
11		Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	m²	L. 212.23	110.00	L. 23,345.30			212.23	L. 23,345.30	212.23	L. 23,345.30	100.00%
12		Pintura en paredes	m²	L. 236.65	35.00	L. 8,282.75							
		TOTAL				L. 73,883.55				L. 45,095.30		L. 53,252.80	200.00%
TECHO DE CANALETA Y LAMINA DE ALUZINC													
13		Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc calibre 26 legitima	m²	L. 111.07	150.00	L. 16,660.50			111.07	L. 16,660.50	111.07	L. 16,660.50	100.00%
14		Viga canal de concreto reforzado, pulida, concreto 1:2:2	ml	L. 20.37	300.00	L. 6,111.00			20.37	L. 6,111.00	20.37	L. 6,111.00	100.00%
15		Suministro e instalacion de tuberia pvc de 4" RD-26, para bajantes de agua lluvias	ml	L. 12.00	30.00	L. 360.00							
16		Entabicado de bloque 15 cm (INC. REPE/PULIDO)	ml	L. 20.68	100.00	L. 2,068.00			20.68	L. 2,068.00	20.68	L. 2,068.00	100.00%
17		Cielo falso fibra mineral de 2x4, y fleje de aluminio	m²	L. 104.30	70.00	L. 7,301.00			70.30	L. 4,921.00	70.30	L. 4,921.00	67.40%
		TOTAL				L. 32,500.60				L. 29,760.60		L. 29,760.60	91.57%
PISOS													
18		Compactación con material del sitio	m²	L. 19.94	200.00	L. 3,988.00			19.94	L. 3,988.00	19.94	L. 3,988.00	100.00%
19		Piso de concreto simple 5 cm de espesor	m²	L. 104.30	80.00	L. 8,344.00			104.30	L. 8,344.00	104.30	L. 8,344.00	100.00%
20		Cerámica en piso de 33.00x33.00 cm	m²	L. 104.30	130.00	L. 13,559.00			73.01	L. 9,491.30	73.01	L. 9,491.30	70.00%
		TOTAL				L. 25,891.00				L. 21,823.30		L. 21,823.30	84.29%
PUERTAS VENTANAS													
21		Puerta de metal, lamina troquelada de 1x2.10 m	unidad	2.00	1,500.00	L. 3,000.00							
22		Puerta termoformada de madera para interiores, 0.80x2.10 cm	unidad	4.00	500.00	L. 2,000.00							
23		Ventanas de aluminio y vidrio fijo	m²	6.60	300.00	L. 1,980.00							
		TOTAL				L. 6,980.00							



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE**




Descripción: Construcción Centro de Capacidades Especiales
Ejecutor: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez
Monto de Contrato: L. 190,687.45

Aldea: N/A
Fecha Contrato: 29 de Diciembre de 2017
Bo/Colonia: Barrio El Centro


Departamento: Choluteca
Municipio: Santa Ana de Yusguare
Periodo del: 09 de Enero al 08 de Mayo de 2018


ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA

CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES, B° EL CENTRO, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.

		ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE										
Descripción: Construcción Centro de Capacidades Especiales Ejecutor: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez Monto de Contrato: L. 190,687.46		Aldea: N/A Fecha Contrato: 29 de Diciembre de 2017 Bo./Colonia: Barrio El Centro		Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 09 de Enero al 08 de Mayo de 2018								
ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA												
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	%
INSTALACIONES ELECTRICAS												
24	Instalacion de lamparas fluorescente 1x40	unidad	L. 7.00	300.00	L. 2,100.00							
25	Interruptor sencillo	unidad	L. 6.00	100.00	L. 600.00							
26	Toma corriente para aire acondicionado	unidad	L. 1.00	250.00	L. 250.00							
27	Toma corriente para estufa	unidad	L. 1.00	250.00	L. 250.00							
28	Circuito de iluminacion, hasta 20 amperios, tubería EMT ½	ml	L. 50.00	30.00	L. 1,500.00			50.00	L. 1,500.00	50.00	L. 1,500.00	100.00%
29	Circuito de fuerza, hasta 20 amperios, tubería EMT ½	ml	L. 60.00	30.00	L. 1,800.00			60.00	L. 1,800.00	60.00	L. 1,800.00	100.00%
30	Centro de carga de 8 espacios	unidad	L. 1.00	1,500.00	L. 1,500.00			1.00	L. 1,500.00	1.00	L. 1,500.00	100.00%
TOTAL									L. 4,800.00		L. 4,800.00	60.00%
MUEBLE DE CONCINA Y DESAYUNADOR												
31	Losa de concreto e=5 cm, #2 @ 30 cm ambos sentidos (a/s)	m²	L. 4.06	80.00	L. 324.80							
32	Azulejo para mueble de concina y desayunador	m²	L. 4.59	130.00	L. 596.70							
33	instalacion de lavatrasto	unidad	L. 1.00	500.00	L. 500.00							
TOTAL									L. 1,422			
GRAN TOTAL						L. 190,687.46		20,223.90	131,423.60		151,647.50	79.53%


En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>RETENCION ANTERIOR</th> <th>RETENCION ACTUAL</th> <th>RETENCION ACUMULADA</th> </tr> <tr> <td>MONTO ESTIMADO</td> <td>20,223.90</td> <td>131,423.60</td> <td>151,647.50</td> </tr> <tr> <td>Retención por Anticipo</td> <td>3,033.59</td> <td>19,713.54</td> <td>22,747.13</td> </tr> <tr> <td>Retención por I.S.R. (12.5%)</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Retención por Calidad de Obra</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Retención por Multa</td> <td></td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Neto a Pagar</td> <td>17,190.32</td> <td>111,710.06</td> <td>128,900.38</td> </tr> </table>	DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA	MONTO ESTIMADO	20,223.90	131,423.60	151,647.50	Retención por Anticipo	3,033.59	19,713.54	22,747.13	Retención por I.S.R. (12.5%)			-	Retención por Calidad de Obra			-	Retención por Multa			-	Neto a Pagar	17,190.32	111,710.06	128,900.38
DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA																										
MONTO ESTIMADO	20,223.90	131,423.60	151,647.50																										
Retención por Anticipo	3,033.59	19,713.54	22,747.13																										
Retención por I.S.R. (12.5%)			-																										
Retención por Calidad de Obra			-																										
Retención por Multa			-																										
Neto a Pagar	17,190.32	111,710.06	128,900.38																										

CONTRATISTA  Firma: _____ Nombre: Edwin Edgardo Miranda Rodríguez FECHA: 08/05/18	 INGENIERO SUPERVISOR Firma: _____ Nombre: Eynar Rivera Aráuz FECHA: 08/05/18	 COORDINADOR DE LA OBRA Firma: _____ Nombre: Edgardo Miranda Rodríguez FECHA: 08/05/2018	ALCALDE MUNICIPAL  Firma: _____ Nombre: Mauricio Turcios FECHA: 08/05/18
--	--	---	---





ENERGÍA ELÉCTRICA, CASERÍO LA FILIPINAS, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.




U.T.M. 

Tierra de Amigos y Frutos

ENERGÍA ELÉCTRICA, CASERÍO LA FILIPINAS, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



Municipalidad de Santa Ana de Yusguare
Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2788-0111, 2788-0107



Tierra de Amigos y Frutos



[Handwritten Signature]
U.T.M.



Tierra de Amigos y Frutos

**ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO TIERRAS MORENAS, SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA.**



Mancomunidad de Mancomunidad de Municipios de La Botija y El
Guanacaure



"MAMBOCAURE"



Excavación de acometidas con retroexcavadora.




Vista de tramo finalizado, incluido el pozo de inspección.



CHOLUTECA, HONDURAS C.A

mambocaure@hotmail.com



ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO TIERRAS MORENAS, SANTA ANA DE YUSGUARE,
CHOLUTECA.



Mancomunidad de Mancomunidad de Municipios de La Botija y El
Guanacaure



"MAMBOCAURE"



Construcción pozo de inspección # 11




Instalación de tubería pvc de 6", y relleno cama de arena.



CHOLUTECA, HONDURAS C.A

mambocaure@hotmail.com


ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO TIERRAS MORENAS, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE		
Descripción: Construcción Alcantarillado Sanitario Ejecutor: Ramon Enrique Vallejo Reyes Monto de Contrato: L. 180,328.63		Aldea: N/A Fecha Contrato: 20 de Marzo del 2018 Bo./Colonia: Tierras Morenas	
		Departamento: Choluteca Municipio: Santa Ana de Yusguare Periodo del: 03 de Mayo al 05 de Junio del 2018	
ESTIMACIÓN # 03 (FINAL) POR MANO DE OBRA			


No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%	
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L		
ALCANTARILLADO SANITARIO													
1.00	Trazado y marcado con teolito y nivel	ml	510.09	20.00	L. 10,201.80	440.10	8,802.00	69.99	L. 1,399.80	510.09	L. 10,201.80	100.00%	
2.00	Relleno para cama de arena e=40 cm en instalación de tuberías PVC.	m³	153.93	60.00	L. 9,235.80	132.91	7,974.60	21.02	L. 1,261.20	153.93	L. 9,235.80	100.00%	
3.00	Instalación de tubería de PVC de 6"	ml	510.09	32.00	L. 16,322.88	440.10	14,083.20	69.99	L. 2,239.68	510.09	L. 16,322.88	100.00%	
4.00	Instalación de tubería de PVC de 4"	ml	293.60	17.00	L. 4,991.20	214.60	3,648.20	79.00	L. 1,343.00	293.60	L. 4,991.20	100.00%	
5.00	Instalación de YEE PVC de 6"x4"	unidad	31.00	26.00	L. 806.00	30.00	780.00	1.00	L. 26.00	31.00	L. 806.00	100.00%	
6.00	Relleno con material del sitio con compactadora bailarina	m³	824.28	70.00	L. 57,699.60	699.61	48,972.70	124.67	L. 8,726.90	824.28	L. 57,699.60	100.00%	
7.00	Cajas de registro de 70x70x65 cm	unidad	31.00	920.00	L. 28,520.00	12.00	11,040.00	19.00	L. 17,480.00	31.00	L. 28,520.00	100.00%	
8.00	Pozos de alcantarillado h= 1.50 m	unidad	1.00	3,800.00	L. 3,800.00	0.80	3,040.00	0.20	L. 760.00	1.00	L. 3,800.00	100.00%	
9.00	Pozos de alcantarillado h= 2.00 m	unidad	4.00	4,500.00	L. 18,000.00	1.60	7,200.00	2.40	L. 10,800.00	4.00	L. 18,000.00	100.00%	
10.00	Pozos de alcantarillado h ≤ 2.50 m	unidad	4.00	5,000.00	L. 20,000.00	2.40	12,000.00	1.60	L. 8,000.00	4.00	L. 20,000.00	100.00%	
11.00	Prueba hidrostática alcantarillado sanitario 4"-12"	ml	510.09	15.00	L. 7,651.35			510.09	L. 7,651.35	510.09	L. 7,651.35	100.00%	
ACTIVIDADES NUEVAS													
12.00	Pozos de alcantarillado h ≤ 1.00 m	unidad	1.00	3,100.00	L. 3,100.00			1.00	L. 3,100.00	1.00	L. 3,100.00	100.00%	
GRAN TOTAL						L. 180,328.63		117,540.70		62,787.93	1.00	L. 180,328.63	100.00%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	117,540.70	62,787.93	180,328.63
Retención por Anticipo	17,631.11	14,358.39	31,989.50
Retención por I.S.R. (12.5%)			-
Retención por Calidad de Obra			-
Retención por Multa			-
Neto a Pagar	99,909.60	48,429.54	148,339.14

CONTRATISTA
 Firma: 
 Nombre: Ramon Enrique Vallejo Reyes
 FECHA: 05/06/18


INGENIERO SUPERVISOR

 Firma: 
 Nombre: Eynar Rivera Araujo
 FECHA: 05/06/2018

COORDINADOR DE MAMBOCAURE

 Firma: 
 Nombre: Eynar Rivera Araujo
 FECHA: 05/06/2018

ALCALDE MUNICIPAL

 Firma: 
 Nombre: Mauricio Turcios
 FECHA: 05/06/2018






Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

PROYECTO : Construcción Alcantarillado Sanitario

FORMULÓ : Ing. Leonel Martínez


UBICACIÓN : Barrio Tierra Morenas, Santa Ana de Yusguare


Fecha: 03-18

No.	NOMBRE	UND	CANT.	PRECIO	TOTAL
1.00	Trazado y marcado con teoilito y nivel	ml	453.09	L. 23.69	L. 10,733.70
2.00	Excavación con retro excavadora, suelo tipo II (Zanjas, pozos y acometidas)	m ³	1177.15	L. 195.04	L. 229,591.34
3.00	Acarreo de material de desperdicio	m ³	223.18	L. 107.60	L. 24,014.17
4.00	Relleno para cama de arena e=40 cm en instalación de tuberías PVC.	m ³	136.73	L. 253.50	L. 34,661.06
5.00	Suministro de tubería de PVC de 6" RD-41	ml	453.09	L. 176.02	L. 79,752.90
6.00	Suministro de tubería de PVC de 4" RD-41	ml	384.00	L. 83.83	L. 32,190.72
7.00	Instalación de tubería de PVC de 6"	ml	453.09	L. 37.41	L. 16,950.10
8.00	Instalación de tubería de PVC de 4"	ml	384.00	L. 22.82	L. 8,762.88
9.00	Suministro e instalación de YEE PVC de 6"x4"	unidad	64.00	L. 427.97	L. 27,390.08
10.00	Relleno con material del sitio con compactadora ballarina	m ³	886.15	L. 89.39	L. 79,212.95
11.00	Cajas de registro de 70x70x65 cm	unidad	64.00	L. 1,900.49	L. 121,631.36
12.00	Pozos de alcantarillado h= 1.50 m	unidad	2.00	L. 13,278.08	L. 26,552.16
13.00	Pozos de alcantarillado h= 2.00 m	unidad	4.00	L. 15,407.78	L. 61,631.12
14.00	Pozos de alcantarillado h ≤ 2.50 m	unidad	4.00	L. 17,541.16	L. 70,164.64
15.00	Prueba hidrostática alcantarillado sanitario 4"-12"	ml	453.09	L. 24.87	L. 11,268.35
TOTAL					L. 834,507.52

OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Longitud total instalación de tubería PVC= 453.09 metros lineales.
 Suministro e instalación de tubería PVC de 4" SDR-41= 384 metros lineales
 Suministro e instalación de tubería PVC de 6" SDR-41= 453.09 metros lineales
 Construcción Pozos de inspección= 10.00 unidades
 Construcción Cajas de registro= 64.00 unidades
 Pozos de 1.50 m= 2.00 unidades
 Pozos de 2.00 m= 4.00 unidades
 Pozos de h ≤ 2.50 m= 4.00 unidades
 Acometidas para conexiones Domiciliarias= 64.00 unidades
 Prueba Hidrostática= 453.09 metros lineales


 ING. LEONEL ANTONIO MARTÍNEZ
 COORDINADOR U.T.M.


 U.T.M.
 SANTA ANA DE YUSGUARE
 DEPARTAMENTO DE YUCA, HONDURAS



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure
"MAMBOCAURE"



PRESUPUESTO POR INSUMOS

PROYECTO : Construcción Alcantarillado Sanitario


FORMULÓ : ING. LEONEL MARTINEZ

UBICACIÓN : Barrio Tierra Morenas, Santa Ana de Yusguare

Fecha: 03-18


No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO	TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPO					
1	RETRO EXCAVADORA DE LLANTAS	HR	256.25	L 920.00	L 235,751.10
2	VOLQUETA DE 5 M3	HR	44.64	L 400.00	L 17,854.40
3	TEODOLITO	DIA	4.53	L 500.00	L 2,265.45
4	NIVEL TOPOGRAFICO	DIA	4.53	L 300.00	L 1,359.27
5	COMPACTADORA BAILARINA	HR	56.00	L 200.00	L 11,200.94
TOTAL DE EQUIPO					L 268,431.16
6	HERRAMIENTA MENOR		%		L 7,904.93
TOTAL DE HERRAMIENTA MENOR					L 7,904.93
MATERIALES					
7	CEMENTO GRIS PORTLAND	BOLSA	390.04	L 207.00	L 80,738.28
8	AREANA DE RIO LAVADA	M3	175.76	L 180.00	L 31,636.80
9	GRAVA DE RIO	M3	8.45	L 320.00	L 2,704.00
10	AGUA	M3	158.40	L 100.00	L 15,840.00
11	ALAMBRE DE AMARRE	LB	99.52	L 15.00	L 1,492.80
12	VARILLA DE 1/4" LEGITIMA	LANCE	21.12	L 39.00	L 823.68
13	VARILLA DE 3/8" CORRUGADA LEGITIMA	LANCE	124.16	L 109.00	L 13,533.44
14	VARILLA DE 1/2" CORRUGADA LEGITIMA	LANCE	2.00	L 188.00	L 376.00
15	VARILLA DE 5/8" CORRUGADA LEGITIMA	LANCE	30.00	L 349.00	L 10,470.00
16	CLAVOS	LB	79.75	L 15.00	L 1,196.25
17	PLYWOOD DE 4'X8'X3/16"	UNIDAD	2.90	L 365.00	L 1,058.50
18	MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	530.33	L 21.00	L 11,137.01
19	LADRILLO RAFON RUSTICO	UNIDAD	11923.36	L 3.00	L 35,770.08
20	TUBERIA DE PVC RSD-41 6"X20'	LANCE	75.67	L 1,054.00	L 79,756.18
21	TUBERIA DE PVC RSD-41 4"X20'	LANCE	64.13	L 502.00	L 32,183.26
22	YEE DE 6"X6"X4"	UNID	64.00	L 362.00	L 23,168.00
23	PEGAMENTO PARA PVC TANGIT	GLN	1.86	L 2,215.00	L 4,119.90
24	LUA DE AGUA PARA PVC #80	UNID	4.83	L 10.50	L 50.72
SUB-TOTAL MATERIALES					L 346,054.89
MANO DE OBRA CALIFICADA					
25	ALBAÑIL	JRD	167.86	L 400.00	L 67,144.00
26	ARMADOR DE HIERRO	JRD	5.60	L 350.00	L 1,960.00
27	FONANERO	JRD	47.86	L 400.00	L 19,143.83
28	TOPOGRAFO	JRD	4.53	L 600.00	L 2,718.54
SUB-TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					L 90,966.37
MANO DE OBRA NO CALIFICADA					
29	AYUDANTE	JRD	219.10	L 250.00	L 54,775.34
30	CADENERO	JRD	9.06	L 300.00	L 2,718.54
31	PEON	JRD	318.23	L 200.00	L 63,646.28
SUB-TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA					L 121,140.16
TOTAL DE COSTO DIRECTO DE LA OBRA					L 634,507.52


Ing. Leonel Antonio Martínez
Coordinador U.T.I. MAMBOCAURE



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
2022
U.T.M.
TECA, HONDURAS

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, TIERRA MORENAS, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA						BARRIO	
ACTIVIDAD	EXCAVACION SUELO TIPO II (SEMI-DURO) CON RETROEXCAVADORA					OBRA	
UNIDAD	M3	N. 2.00				1177.15	
MANO DE OBRA	UNID	REND	DESPER(%)	P/U	SUBTOTAL	TOTAL	
SUB TOTAL DE M.O.							
HER. Y EQUIPO	UNID	REND	DESPER(%)	P/U	SUBTOTAL	TOTAL	
RETROEXCAVADORAR DE LLANTA	HRA	0.212	0	L. 920.00	L. 195.04	L. 229,591.34	
SUB TOTAL HER. Y EQUIPO					L. 195.04	L. 229,591.34	
PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA					L. 0.00	L. 0.00	
PRECIO UNITARIO DE HER. Y EQUIPO					L. 195.04	L. 229,591.34	
PRECIO DIRECTO					L. 195.04	L. 229,591.34	







CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO TIERRA MORENAS, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA						
ACTIVIDAD	ACARREO DE MATERIAL CON VOQUETA 5M3 Y RETROEXCAVADORA					OBRA
UNIDAD	UNIDAD	N. 3.00				223.18
MATERIALES	UNID	REND	DESPER(%)	P/U	SUBTOTAL	TOTAL
SUB TOTAL DE MATERIALES						
MANO DE OBRA	UNID	REND	DESPER(%)	P/U	SUBTOTAL	TOTAL
SUB TOTAL DE M.O.						
HER. Y EQUIPO	UNID	REND	DESPER(%)	P/U	SUBTOTAL	TOTAL
HERMAMIENTA MENOR	%	0.05	0	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
RETROEXCAVADORA	HRA	0.03	0	L. 920.00	L. 27.60	L. 6,159.77
VOLQUETA	HRA	0.2	0	L. 400.00	L. 80.00	L. 17,854.40
SUB TOTAL HER. Y EQUIPO					L. 107.60	L. 24,014.17
PRECIO UNITARIO DE MATERIALES					L. 0.00	L. 0.00
PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA					L. 0.00	L. 0.00
PRECIO UNITARIO DE HER. Y EQUIPO					L. 107.60	L. 24,014.17
PRECIO DIRECTO					L. 107.60	L. 24,014.17



CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO						
TIERRA MORENAS, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA						
ACTIVIDAD	POZOS DE ALCANTARILLADO H ≤ 1.00 M					OBRA
UNIDAD	UND	N: 12.00				1.00
MATERIALES	UNIDAD	REND	DESPER(%)	P/U	SUBTOTAL	TOTAL
CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND	BLOSA	16.1500	3	L. 207.00	L. 3,443.34	L. 3,443.34
ARENA DE RIO LAVADA	M ³	1.6900	7	L. 180.00	L. 325.49	L. 325.49
GRAVA DE RIO	M ³	0.5100	7	L. 320.00	L. 174.62	L. 174.62
AGUA	M ³	0.4700	25	L. 100.00	L. 58.75	L. 58.75
LADRILLO RAFON RUSTICO	UND	305.0000	0	L. 3.00	L. 915.00	L. 915.00
ALAMBRE DE AMARRE	LBS	4.0000	0	L. 15.00	L. 60.00	L. 60.00
VARILLA CORRUGADA 3/8" LEGITIMA	LANCE	8.0000	0	L. 109.00	L. 872.00	L. 872.00
VARILLA CORRUGADA 1/2" LEGITIMA	LANCE	0.2000	0	L. 188.00	L. 37.60	L. 37.60
VARILLA CORRUGADA 5/8" LEGITIMA	LANCE	3.0000	0	L. 349.00	L. 1,047.00	L. 1,047.00
CLAVOS	LBS	0.6500	0	L. 15.00	L. 9.75	L. 9.75
PLYWOOD DE 4'X8'X3/16"	UNIDAD	0.4000	0	L. 265.00	L. 106.00	L. 106.00
MADERA RUSTICA DE PINO	PIE T	17.8500	0	L. 21.00	L. 374.85	L. 374.85
SUB TOTAL DE MATERIALES					L. 7,424.41	L. 7,424.41
MANO DE OBRA	UNID	REND	DESPER(%)	P/U	SUBTOTAL	TOTAL
ALBAÑIL	JOR	5.540	0	L. 400.00	L. 2,216.00	L. 2,216.00
ARMADOR DE HIERRO	JOR	0.560	0	L. 350.00	L. 196.00	L. 196.00
AYUDANTE	JOR	3.550	0	L. 250.00	L. 887.50	L. 887.50
SUB TOTAL DE M.O.					L. 3,299.50	L. 3,299.50
HER. Y EQUIPO	UNID	REND	DESPER(%)	P/U	SUBTOTAL	TOTAL
HERMAMIENTA MENOR	%	0.04	0	L. 3,299.50	L. 131.98	L. 131.98
SUB TOTAL HER. Y EQUIPO					L. 131.98	L. 131.98
PRECIO UNITARIO DE MATERIALES					L. 7,424.41	L. 7,424.41
PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA					L. 3,299.50	L. 3,299.50
PRECIO UNITARIO DE HER. Y EQUIPO					L. 131.98	L. 131.98
PRECIO DIRECTO					L. 10,855.89	L. 10,855.89





ORDEN DE CAMBIO 01, PRESUPUESTO BASE POR ACTIVIDADES

"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO TIERRAS MORENAS, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

Nro.	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO CONTRATADO		ORDEN DE CAMBIO ANTERIOR (ACUMULADA)		NUEVA ORDEN DE CAMBIO		CONTRATADO + ORDENES DE CAMBIO ACUMULADAS		
				Cantidad (Lps)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)	
A ALCANTARILLADO SANITARIO												
1	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO Y NIVEL	M.L	23.69	453.09	10,733.70			57.00	1,350.33	510.09	12,084.03	
2	EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA, SUELO TIPO II (ZANJAS, POZOS Y ACOMETIDAS)	M3	195.04	1,177.15	229,591.34					1,177.15	229,591.34	
3	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO	M3	107.60	223.18	24,014.17					223.18	24,014.17	
4	RELLENO PARA CAMA DE ARENA ø=40 CMS, EN INSTALACIÓN TUBERIAS PVC	M3	253.50	136.73	34,661.06			17.20	4,360.20	153.93	39,021.26	
5	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" RD-41	M.L	176.02	453.09	79,752.90			57.00	10,033.14	510.09	89,786.04	
6	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 4" RD-41	M.L	83.83	384.00	32,190.72			-90.40	-7,578.23	293.60	24,612.49	
7	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 6"	M.L	37.41	453.09	16,950.10			57.00	2,132.37	510.09	19,082.47	
8	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 4"	M.L	22.82	384.00	8,762.88			-90.40	-2,062.93	293.60	6,699.95	
9	SUMINISTRO/INSTALACIÓN DE YEE PVC DE 6"X6"X4"	UNIDAD	427.97	64.00	27,390.08			-33.00	-14,123.01	31.00	13,267.07	
10	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO CON COMPACTADORA BAILARINA	M3	89.39	886.15	79,212.95			-61.87	-5,590.56	824.28	73,682.39	
11	CAJAS DE REGISTRO DE 70X70X65 CMS	UNIDAD	1,900.49	64.00	121,631.36			-33.00	-62,716.17	31.00	58,915.19	
12	POZOS DE ALCANTARILLADO h= 1.50 MT	UNIDAD	13,276.08	2.00	26,552.16			-1.00	-13,276.08	1.00	13,276.08	
13	POZOS DE ALCANTARILLADO h= 2.00 MT	UNIDAD	15,407.78	4.00	61,631.12					4.00	61,631.12	
14	POZOS DE ALCANTARILLADO h= 3.30 MT	UNIDAD	17,541.16	4.00	70,164.64					4.00	70,164.64	
15	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4"-12"	UNIDAD	24.87	453.09	11,268.35				57.00	1,417.59	510.09	12,685.94
ACTIVIDADES NUEVAS												
12	POZOS DE ALCANTARILLADO h= 1.00 MT	UNIDAD	10,855.89	1.00					1.00	10,855.89	1.00	10,855.89
SUB-TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO					834,507.53				-79,107.66		759,370.06	
GRAN TOTAL					834,507.53				-79,107.66		759,370.06	

CONTRATANTE:

FIRMA:

NOMBRE: ENRIQUE VALLEJO REYES

FECHA: 27/04/2018

INGENIERO SUPERVISOR:

FIRMA:

NOMBRE: ING. EYMAR RIVERA ARZU

FECHA: 27/04/18

COORDINADOR U.T.A.:

FIRMA:

NOMBRE: ING. DORELY MARTÍNEZ

FECHA: 27/04/2018

ALCALDE MUNICIPAL:

FIRMA:

NOMBRE: MAURICIO TURCIOS

FECHA: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA, HONDURAS

U.T.M.



ORDEN DE CAMBIO 01, POR MANO DE OBRA

"CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO TIERRAS MORENAS, MUNICIPIO DE SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA".

Tipo de Contrato		Proyecto		Avance Físico = 80.00		Departamento:		CHOLUTECA	
Monto Aprobado		Fecha de Inicio		Avance Financiero = 55.12		Municipio:		Santa Ana de Yaguare	
Monto Contratado		Fecha de Finalización		Multa Diaria		Barrio:		Tierras Morenas	
Duración del Contr				Monto Ampliación = 0.00					
45 DIAS CALENDARIO		04 de Mayo del 2018							

Nro.	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO CONTRATADO		ORDEN DE CAMBIO ANTERIOR (ACUMULADA)		NUEVA ORDEN DE CAMBIO		CONTRATADO + ORDENES DE CAMBIO ACUMULADAS	
				Cantidad (Lps)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)
A	ALCANTARILLADO SANITARIO										
1	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO Y NIVEL	M.L	20.00	453.09	9,061.80			57.00	1,140.00	510.09	10,201.80
2	RELLENO PARA CAMA DE ARENA ø=40 CMS, EN INSTALACIÓN TUBERIAS PVC	M3	60.00	136.73	8,203.80			17.20	1,032.00	153.93	9,235.80
3	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 6"	M.L	32.00	453.09	14,498.88			57.00	1,824.00	510.09	16,322.88
4	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC DE 4"	M.L	17.00	384.00	6,528.00			-90.40	-1,536.80	293.60	4,991.20
5	INSTALACIÓN DE YEE PVC DE 6"x6"x4"	UNIDAD	26.00	64.00	1,664.00			-33.00	-858.00	31.00	806.00
6	RELLENO CON MATERIAL DEL SITO CON COMPACTADORA BAILARINA	M3	70.00	896.15	62,030.50			-61.87	-4,330.90	824.28	57,699.60
7	CAJAS DE REGISTRO DE 70X70X65 CMS	UNIDAD	920.00	64.00	58,880.00			-33.00	-30,360.00	31.00	28,520.00
8	POZOS DE ALCANTARILLADO h= 1.50 MT	UNIDAD	3,800.00	2.00	7,600.00			-1.00	-3,800.00	1.00	3,800.00
9	POZOS DE ALCANTARILLADO h= 2.00 MT	UNIDAD	4,500.00	4.00	18,000.00			-	-	4.00	18,000.00
10	POZOS DE ALCANTARILLADO h= 2.50 MT	UNIDAD	5,000.00	4.00	20,000.00			-	-	4.00	20,000.00
11	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO 4"-12"	UNIDAD	15.00	453.09	6,796.35			57.00	855.00	510.09	7,651.35
ACTIVIDADES NUEVAS											
12	POZOS DE ALCANTARILLADO h= 1.00 MT	UNIDAD	3,100.00	1.00				1.00	3,100.00	1.00	3,100.00
SUB-TOTAL ALCANTARILLADO SANITARIO					213,263.33				-32,896.76		180,328.63
GRAN TOTAL					213,263.33				-32,896.76		180,328.63

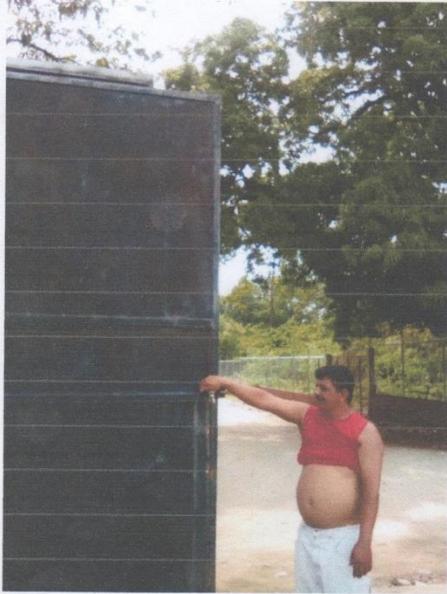
CONTRATISTA MANO DE OBRA
 FIRMA:
 NOMBRE: RAMON ENRIQUE DE VALLEJO REYES
 FECHA: 27/04/2018

INGENIERO SUPERIOR CIVIL
 FIRMA:
 NOMBRE: ING. ELYVIA RIVERA ARAUJO
 FECHA: 27/04/18

COORDINADOR MUNICIPAL
 FIRMA:
 NOMBRE: MAURICIO TURCIOS
 FECHA: 27/04/2018

ALCALDE MUNICIPAL
 FIRMA: _____
 NOMBRE: MAURICIO TURCIOS
 FECHA: _____

REPARACION DE 4 PORTONES E INSTALACION DE UNA PUERTA EN CAMPO DE FUTBOL
BARRIO LOS MANGOS, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.



**REPARACION DE 4 PORTONES E INSTALACION DE UNA PUERTA EN CAMPO DE FUTBOL
BARRIO LOS MANGOS, SANTA ANA DE YUSGUARE, CHOLUTECA.**

