

INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE JULIO AÑO 2018.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
1	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Juan Carlos Servellon Méndez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de obra de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	02/10/2017	220,270.24	31,715.54	251,985.78	82.93%	No se ha continuado con el Proyecto por Falta de Materiales
2	Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	Aldea de Tablones Abajo	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Techo y Tres Puertas de Metal en Proyecto de Remodelación y Ampliación de Centro Comunal	18/01/2018	79,400.00	-	79,400.00	67.18%	No se avanzado el Proyecto porque el contratista de obra gris no ha continuado por falta de materiales
3	Construcción de Caja Puente	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Milagro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Caja Puente.	04/01/2018	48,798.50	-	48,798.50	100%	-
4	Centro de Capacidades Especiales	Edwin Edgardo Miranda Rodríguez	B° El Centro	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Capacidades Especiales	29/12/2017	190,687.45	27,888.60	218,576.05	100%	Se realizó orden de cambio por L. – 3,480.00, quedando el contrato por L. 215,096.05
5	Energía Eléctrica	Fausto Ordoñez	Caserío La Filipinas	Contrato de Mano de Obra de Aplomado de Postes	10/01/2018	60,000.00	-	60,000.00	100%	Terminada la obra pero no cancelado el Contrato
6	Alcantarillado Sanitario	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Barrio Tierras Morenas	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Alcantarillado Sanitario	20/03/2018	213,263.33	-32,934.70	180,328.63	100%	-

7	Sector Educación	Ronald Alfredo Moreno	Caserío El Zapotillo, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Construcción de Techo y Paredes Falsas con lamina de aluzinc en Bodega Cocina Kinder El Zapotillo	09/05/2018	6,000.00	-	6,000.00	100%	-
8	Mejoramiento de Canchas Deportivas	Ronald Alfredo Moreno	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de reparación de 4 portones e instalacion de una puerta en Campo de Futbol	18/05/2018	2,600.00	-	2,600.00	100%	-
9	Mejoramiento del Edificio de la Municipalidad	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en Bodega Municipal (consiste en cambio e instalacion de dos láminas).	22/05/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%	-
10	Construcción de Centro Comunales y de Usos Múltiples.	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en el Centro Social Municipal (Consiste en sellado y tapado de goteras)	25/05/2018	1,300.00	-	1,300.00	100%	-
11	Mejoramiento del Edificio de la Municipalidad	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de Obra de Reparación de Techo en Oficinas Municipales (Consiste en sellado y tapado de goteras en Oficina de Comité de Transparencia, Cocina, O.M.M., U.M.A., U.T.M., P.M.I.A.J., y Desarrollo Comunitario	28/05/2018	800	-	800	100%	-
	Alcantarillado Sanitario	Omar Antonio Cabrera Ventura	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 48.30 Horas de Excavación en Proyecto de Alcantarillado	02/05/2018	56,028.00	-	56,028.00	100%	-

				Sanitario						
	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba y Caserío La Montaña, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 70.10 Horas de Excavadora cortando material selecto, 6.30 Horas de Retroexcavadora regando material y 6.30 Horas de Patrol Conformando Calle para Mejoramiento de Carretera que conduce a Aldea de Tablones Arriba y Carretera hacia el Relleno Sanitario	18/05/2018	137,586.00	-	137,586.00	100%	-
	Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable	Omar Antonio Cabrera Ventura	Barrió Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 50.50 Horas de Excavación en Proyecto de Construcción y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Barrio Tierras Morenas.	19/05/2018	46,460.00	-	46,460.00	100%	-
15	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 21.60 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	01/06/2018	37,260.00	-	37,260.00	100%	-

16	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 67.30 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	01/06/2018	61,916.00	-	61,916.00	100%	
17	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Aldea de Tablones Arriba	Servicios de 85.50 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba	04/06/2018	73,743.75	-	73,743.75	100%	-
18	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 58.60 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	14/06/2018	53,912.00	-	53,912.00	100%	-
19	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 44.70 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	14/06/2018	38,553.75	-	38,553.75	100%	
20	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Abajo	Servicios de 46.60 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	19/06/2018	80,385.00	-	80,365.00	100%	


21	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 58.60 Horas de alquiler de Retro excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Abajo	27/06/2018	15,640.00	-	15,640.00	100%
22	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 19.60 Horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a El Barrio El Guapinol, San Antonio y Barrio Los Mangos.	27/06/2018	16,905.00	-	16,905.00	100%
23	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	Servicios de 22.30 Horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce a B° El Guapinol, San Antonio y B° Los Mangos	27/06/2018	38,467.50	-	38,467.50	100%
24	Mejoramiento de Canchas Deportivas	Ronald Alfredo Moreno	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Construcción de dos cajas de protección de breaker en campo de futbol del B° Los Mangos.	29/06/2018	2,500.00	-	2,500.00	100%

25	Fortalecimiento Catastral	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Todo El Municipio	Servicios profesionales para elaboración de plano de Delimitación del Municipio de Santa Ana de Yusguare	18/07/2018	5,000.00	-	5,000.00	100%
26	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de iluminación de calles principales del B° El Centro y Boulevard del Municipio de Santa Ana de Yusguare	01/07/2018	31,740.00	-	31,740.00	100%
27	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de construcción de puertas y ventanas en el Bar del Centro Comunal Municipal	09/07/2018	15,153.70	-	15,153.70	100%
28	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de mejoramiento e instalacion de cerámica en piso, pilas y mostrador del Bar del Centro Social Municipal	03/07/2018	5,100.00	-	5,100.00	100%
29	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de módulos sanitarios en Centro Comunal Municipal	06/07/2018	24,365.00	-	24,365.00	100%
30	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de techo y canal de aguas lluvias en el Centro Social Municipal	09/07/2018	27,640.00	-	27,640.00	100%

31	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de mejoramiento del Sistema Eléctrico en Parque Municipal	02/07/2018	5,750.00	-	5,750.00	100%
32	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de construcción de dos canastas protectoras de bomba y reflector en fuente de Plaza Cívica Municipal	06/07/2018	800.00	-	800.00	100%
33	Mejoramiento de Parques y Plaza Cívica, Boulevard	Osmin Odilón Jiménez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare	Mano de Obra de instalacion de reflectores, fotoceldas y flotador en Parque y Plaza Cívica Municipal	10/07/2018	2,875.00	-	2,875.00	100%
34	Mejoramiento y Apertura de Calles	Mario Enrique Ordoñez Ordoñez	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Servicios de 12.00 horas maquinas cargando material selecto a las volquetas en Banco de material para el mejoramiento de carretera que conduce a Tablones Arriba sector hacia La Tajeada	02/07/2018	16,905.00	-	16,905.00	100%
35	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de iluminación de calles en B° Tierras Morenas	19/07/2018	21,562.50	-	21,562.50	100%
36	Construcción de Centros Comunales y de Usos Múltiples	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de construcción de base para rotoplas en el Centro Social Municipal	19/07/2018	2,500.00	-	2,500.00	100%

37	Cultura	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Mano de obra de construcción de escenario para eventos culturales	17/07/2018	20,000.00	-	20,000.00	100%
38	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Servicios de 88.30 horas de alquiler de excavadora para mejoramiento de carretera que conduce hacia la Aldea La Tajeada	02/07/2018	152,317.50	-	152,317.50	100%
39	Mejoramiento y Apertura de Calles	Omar Antonio Cabrera Ventura	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Servicios de 61.80 horas de alquiler de Retro-excavadora para mejoramiento de carretera que conduce hacia la Aldea La Tajeada	04/07/2018	56,856.00	-	56,856.00	100%
40	Construcción y Ampliación de Proyectos de Energía Eléctrica	Eléctrica Medina S. de R.L. (ELECME)	Barrio San Antonio, Santa Ana de Yusguare	Construcción de Proyecto de Energía Eléctrica	09/07/2018	343,748.40	-	343,748.40	100%
41	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 61 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajeada.	03/07/2018	63,135.00	-	63,135.00	100%
42	Mejoramiento y Apertura de Calles	Santos Lucio Flores Espinal	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 13 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	7,475.00	-	7,475.00	100%

43	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 04 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	2,300.00	-	2,300.00	100%
44	Mejoramiento y Apertura de Calles	Josué Miguel Pastor Ortiz	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 11 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajeada.	03/07/2018	11,385.00	-	11,385.00	100%
45	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Barrio El Guapinol, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 05 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce al Barrio El Guapinol	09/07/2018	2,875.00	-	2,875.00	100%
46	Mejoramiento y Apertura de Calles	Héctor Leonel Colindres Guillen	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare	Acarreo de 24 viajes de balastre (material selecto), para mejoramiento de carretera que conduce de la Aldea de Tablones Arriba hacia la Aldea La Tajeada.	03/07/2018	24,840.00	-	24,840.00	100%
47	Iluminación de Villas Publicas	Osmin Odilón Jiménez	Aldea de Tablones Abajo, Santa Ana de Yusguare	Mano de obra de iluminación de calles en la Aldea de Tablones Abajo	22/07/2018	20,125.00	-	20,125.00	100%





ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Eymar Rivera Araujo
INGENIERO CIVIL
22-06-17
26-06-17
C.H., No. 7870

Descripción: Mejoramiento Centro Comunal (Techo)
Ejecutor: Ronal Alfredo Moreno
Monto de Contrato: L. 27,640.00

Aldea: N/A
Fecha Contrato: 05 de Julio de 2018
Bo/Colonia: Barrio El Centro

Departamento: Choluteca
Municipio: Santa Ana de Yusguare
Periodo del: 09 de Julio al 16 Julio de 2018

ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRA

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
TECHO												
1.00	Demolición piso de concreto 8-10 cm	m ²	3.00	L. 50.00	L. 150.00			3.00	L. 150.00	3.00	L. 150.00	100.00%
2.00	Excavación de material no calificado	m ³	1.50	L. 200.00	L. 300.00			1.50	L. 300.00	1.50	L. 300.00	100.00%
3.00	Dado de concreto de 50 x 50 x 50 cm, concreto simple	unidad	12.00	L. 160.00	L. 1,920.00			12.00	L. 1,920.00	12.00	L. 1,920.00	100.00%
4.00	Columna de canaleta de 4" doble H=2.70-3.00	unidad	14.00	L. 107.00	L. 1,498.00			14.00	L. 1,498.00	14.00	L. 1,498.00	100.00%
5.00	Techo de Canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc legitima	m ²	130.23	L. 100.00	L. 13,023.00			91.16	L. 9,116.00	91.16	L. 9,116.00	70.00%
	TOTAL				L. 16,891.00				L. 12,984.00		L. 12,984.00	76.87%
CANAL DE AGUAS LLUVIAS												
6.00	Demolición piso de concreto 8-10 cm	m ²	5.84	L. 50.00	L. 292.00							
7.00	Excavación de material no calificado	m ³	1.63	L. 200.00	L. 326.00							
8.00	Canal de aguas lluvias	ml	80.13	L. 100.00	L. 8,013.00							
9.00	Bajante A.L.L. PVC 3"	ml	30.00	L. 50.00	L. 1,500.00							
10.00	Relleno y compactado con material del sitio	m ³	3.80	L. 30.00	L. 114.00							
11.00	Piso de concreto simple e=8.00 cm	m ²	6.00	L. 84.00	L. 504.00							
	TOTAL				L. 10,749.00							
	GRAN TOTAL				L. 27,640.00				L. 12,984.00		12,984.00	46.98%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	-	12,984.00	12,984.00
Retención por Anticipo	-	1,947.60	1,947.60
Retención por I.S.R. (12.5%)	-	91.75	91.75
Retención por Calidad de Obra	-	-	-
Retención por Multa	-	-	-
Neto a Pagar	-	10,944.65	10,944.65

CONTRATISTA

Firma: *Ronal Alfredo Moreno*
Nombre: Ronal Alfredo Moreno
FECHA: 16/07/18

INGENIERO SUPERVISOR INGENIERO CIVIL
22-06-17
26-06-17
Firma: *Eymar Rivera Araujo*
Nombre: Eymar Rivera Araujo
FECHA: 16/07/18

COORDINADOR MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA REGIÓN DE MAMBOCAURE U.T.A.
Firma: *Mauricio Turiso*
Nombre: Mauricio Turiso
FECHA: 16/07/2018

ALCALDE MUNICIPAL
Firma: *Mauricio Turiso*
Nombre: Mauricio Turiso
FECHA: 16/07/18

W. Valencia
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
U.T.M.
REGIÓN DE MAMBOCAURE, HONDURAS



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"




16.07.18, Columnas de canaleta y estruc. De Techo




16.07.18, Columnas de canaleta y estruc. De Techo


INGENIERO CIVIL
22-06-17
26-06-17
Ing. Eynar Rivera Aráuz No. 7094


UNIVERSIDAD MUNICIPAL DE
LA ANA DE YUSUPUR
U.T.M.
TECA, HONDURAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Mejoramiento Centro Comunal (Techo)
Ejecutor: Ronal Alfredo Moreno
Monto de Contrato: L. 27,640.00

Aldea: N/A
Fecha Contrato: 05 de Julio de 2018
Bo/Colonia: Barrio El Centro

Departamento: Cholúteca
Municipio: Santa Ana de Yaguare
Periodo del: Del 17 al 23 de Julio de 2018

ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA (FINAL)

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
TECHO												
1.00	Demolición piso de concreto 8-10 cm	m²	3.00	L. 50.00	L. 150.00	3.00	L. 150.00			3.00	L. 150.00	100.00%
2.00	Excavación de material no calificado	m³	1.50	L. 200.00	L. 300.00	1.50	L. 300.00			1.50	L. 300.00	100.00%
3.00	Dado de concreto de 50 x 50 x 50 cm, concreto simple	unidad	12.00	L. 160.00	L. 1,920.00	12.00	L. 1,920.00			12.00	L. 1,920.00	100.00%
4.00	Columna de canaleta de 4" doble H=2.70-3.00	unidad	14.00	L. 107.00	L. 1,498.00	14.00	L. 1,498.00			14.00	L. 1,498.00	100.00%
5.00	Techo de Canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc legitima	m²	130.23	L. 100.00	L. 13,023.00	91.16	L. 9,116.00	39.07	L. 3,907.00	130.23	L. 13,023.00	100.00%
	TOTAL				L. 16,891.00		L. 12,984.00		L. 3,907.00		L. 16,891.00	100.00%
CANAL DE AGUAS LLUVIAS												
6.00	Demolición piso de concreto 8-10 cm	m²	5.84	L. 50.00	L. 292.00			5.84	L. 292.00	5.84	L. 292.00	100.00%
7.00	Excavación de material no calificado	m³	1.63	L. 200.00	L. 326.00			1.63	L. 326.00	1.63	L. 326.00	100.00%
8.00	Canal de aguas lluvias	ml	80.13	L. 100.00	L. 8,013.00			80.13	L. 8,013.00	80.13	L. 8,013.00	100.00%
9.00	Bajante A.L.L. PVC 3"	ml	30.00	L. 50.00	L. 1,500.00			30.00	L. 1,500.00	30.00	L. 1,500.00	100.00%
10.00	Relleno y compactado con material del sitio	m³	3.80	L. 30.00	L. 114.00			3.80	L. 114.00	3.80	L. 114.00	100.00%
11.00	Piso de concreto simple e=8.00 cm	m²	6.00	L. 84.00	L. 504.00			6.00	L. 504.00	6.00	L. 504.00	100.00%
	TOTAL				L. 10,749.00				L. 10,749.00		L. 10,749.00	100.00%
	GRAN TOTAL				L. 27,640.00		12,984.00		L. 14,656.00		27,640.00	100.00%

En virtud de doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	12,984.00	14,656.00	27,640.00
Retención por Anticipo	1,947.60	2,198.40	4,146.00
Retención por I.S.R. (12.5%)	91.75	582.00	673.75
Retención por Calidad de Obra			
Retención por Multa			
Neto a Pagar	10,944.65	11,875.60	22,820.25

CONTRATISTA

Firma:
Nombre: Rolando Alfredo Moreno

FECHA: 23/07/18

INGENIERO SUPERVISOR

Firma:
Nombre: Eynar Rivera Araujo

FECHA: 23/07/18

COORDINADOR MAMBOCAURE

Firma:
Nombre: Leonel Rodríguez

FECHA: 23/07/18

ALCALDE MUNICIPAL

Firma:
Nombre: Mauricio Turcios S

FECHA: 23/07/18

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MAMBOCAURE
U.F.M.
CHOLUTECA, HONDURAS



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



"MAMBOCAURE"



23.07.18, TECHO TERMINADO



23.07.18, TECHO TERMINADO

INGENIERO CIVIL
22-06-17
26-06-17

[Handwritten signature]

ALCALDIA MUNICIPAL DE
MAYOR ANA DE JUSGADO
U.T.M.
MAYAGUA, HONDURAS



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Remodelación y Ampliación Centro Comunal, Tablones Abajo
Ejecutor: Juan Carlos Servellón Méndez
Monto de Contrato: L. 251,985.78

Aldea: Tablones Abajo
Fecha Contrato: 02 de Octubre de 2017
Bo./Colonia: N/A

Departamento: Choluteca
Municipio: Santa Ana de Yusguare
Periodo del: 08 de Junio al 12 de Julio del 2018

ESTIMACIÓN # 07 POR MANO DE OBRA

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
DEMOLICIONES												
1	Demolición de pared de ladrillo	m²	154.98	55.00	L. 8,523.90	154.98	8,523.90			154.98	L. 8,523.90	100.00%
2	Demolición de piso de concreto (8-10 cm)	m²	16.61	50.00	L. 830.50	16.61	830.50			16.61	L. 830.50	100.00%
3	Demolición general	dia	4.00	495.00	L. 1,980.00	4.00	1,980.00			4.00	L. 1,980.00	100.00%
4	Desmontaje de Tijera	und	3.00	188.50	L. 565.50	3.00	565.50			3.00	L. 565.50	100.00%
5	Desmontaje de lamina de techo (Estruc. Existente)	m²	105.00	35.00	L. 3,675.00	105.00	3,675.00			105.00	L. 3,675.00	100.00%
6	Demolición de piso de mosaico	m²	72.36	27.50	L. 1,989.90	72.36	1,989.90			72.36	L. 1,989.90	100.00%
7	Desmontaje de puertas incluye contra marcos	und	3.00	123.75	L. 371.25	3.00	371.25			3.00	L. 371.25	100.00%
8	Desmontaje de ventanas	m²	3.00	77.22	L. 231.66	3.00	231.66			3.00	L. 231.66	100.00%
9	Desmontaje de canaleta	und	14.00	37.30	L. 522.20	14.00	522.20			14.00	L. 522.20	100.00%
10	Acarreo de material de desperdicio	m³	10.00	81.00	L. 810.00	10.00	810.00			10.00	L. 810.00	100.00%
	TOTAL				L. 19,499.91		19,499.91				19,499.91	100.00%
GRADAS												
11	Relleno compactado con material del sitio	m³	L. 43.23	130.00	L. 5,619.90	43.23	5,619.90			43.23	L. 5,619.90	100.00%
12	Pared de bloque 15 cm,relleno, ref. 1#3 @ 20 y 1#3 @ 1 hilada	m²	L. 19.98	290.00	L. 5,794.20	19.98	5,794.20			19.98	L. 5,794.20	100.00%
13	Losa de concreto e= 10 cm, #3 @ 15 cm. a.s.	m²	L. 4.04	222.81	L. 900.15	4.04	900.15			4.04	L. 900.15	100.00%
14	Firme de concreto de e= 5.00 cm	m²	L. 36.33	75.00	L. 2,724.75	36.33	2,724.75			36.33	L. 2,724.75	100.00%
15	Piso de granito terrazo 30x30	m²	L. 36.33	120.00	L. 4,359.60							
	TOTAL				L. 19,398.60		15,039.00				L. 15,039.00	77.53%
CENTRO COMUNAL												
16	Trazado y marcado	ml	L. 65.60	19.00	L. 1,246.40	65.60	1,246.40			65.60	L. 1,246.40	100.00%
17	Excavación de material no calificado	m³	L. 44.20	260.00	L. 11,492.00	44.20	11,492.00			44.20	L. 11,492.00	100.00%
18	Cimentación de mampostería	m³	L. 15.41	220.00	L. 3,390.20	15.41	3,390.20			15.41	L. 3,390.20	100.00%
19	Zapata aislada 0.80x0.80 cm, e=25 cm, 8#5 a.s	und	L. 19.00	320.00	L. 6,080.00	19.00	6,080.00			19.00	L. 6,080.00	100.00%
20	Columna de 25x25 cm, 6#5 y #3@15 cm, concreto 1:2:2	ml	L. 85.00	220.00	L. 18,700.00	85.00	18,700.00			85.00	L. 18,700.00	100.00%
21	Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ml	L. 9.62	100.00	L. 962.00	9.62	962.00			9.62	L. 962.00	100.00%
22	Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (inferior)	ml	L. 79.40	101.75	L. 8,078.95	79.40	8,078.95			79.40	L. 8,078.95	100.00%
23	Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (cargador o intermedia)	ml	L. 64.60	101.75	L. 6,573.05	64.60	6,573.05			64.60	L. 6,573.05	100.00%
24	Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (superior)	ml	L. 64.60	101.75	L. 6,573.05	64.60	6,573.05			64.60	L. 6,573.05	100.00%
25	Solera de 15x15 cm, corona (cierre), 4#3 y #2 @ 15 cm concreto 1:2:2	ml	L. 16.64	33.69	L. 560.60	16.64	560.60			16.64	L. 560.60	100.00%
26	Tallados de elementos de 0.15 - 0.25 cm	ml	L. 135.50	63.00	L. 8,536.50	108.40	6,829.20	27.10	L. 1,707.30	135.50	L. 8,536.50	100.00%
27	Pared de bloque simple de 15 cm	m²	L. 174.03	180.00	L. 31,325.40	174.03	31,325.40			174.03	L. 31,325.40	100.00%
28	Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	m²	L. 348.06	99.54	L. 34,645.89	214.81	21,382.19	98.44	L. 9,798.72	313.25	L. 31,180.91	90.00%
29	Pintura en paredes	m²	L. 348.06	24.00	L. 8,353.44							
30	Viga canal de concreto reforzado, pulida, concreto 1:2:2	ml	L. 17.00	123.90	L. 2,106.30	17.00	2,106.30			17.00	L. 2,106.30	100.00%
31	Suministro e instalacion de tubería pvc de 4" RD-26, para bajantes de agua lluvias	ml	L. 5.00	19.79	L. 98.95	5.00	98.95			5.00	L. 98.95	100.00%
32	Entablicado de bloque 15 cm (INC. REPE./PULIDO)	ml	L. 16.02	100.00	L. 1,602.00	16.02	1,602.00			16.02	L. 1,602.00	100.00%
33	Piso de concreto simple, e= 5 cm	m²	L. 230.62	75.00	L. 17,296.50	230.62	17,296.50			230.62	L. 17,296.50	100.00%
34	Cerámica en piso de 33.00x33.00 cm	m²	L. 230.62	124.48	L. 28,707.58							
	TOTAL				L. 196,328.81		144,296.79	23.06	L. 2,870.51	23.06	L. 158,673.32	80.82%
FACHADA FRONTAL SUPERIOR												

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
U.T.M.
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA DE YUSGUARE



**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE**



INGENIERO CIVIL
 No. 22-06-17
 26-06-17
 INGENIERO SUPERVISOR

Descripción: Remodelación y Ampliación Centro Comunal, Tablones Abajo
 Ejecutor: Juan Carlos Servellón Méndez
 Monto de Contrato: L. 251,985.78

Aldea: Tablones Abajo
 Fecha Contrato: 02 de Octubre de 2017
 Bo./Colonia: N/A

Departamento: Choluteca
 Municipio: Santa Ana de Yaguare
 Periodo del: 08 de Junio al 12 de Julio del 2018

ESTIMACIÓN # 07 POR MANO DE OBRA

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	%
35	Pared de bloque simple de 15 cm	m ²	L. 9.32	180.00	L. 1,677.60			9.32	L. 1,677.60	9.32	L. 1,677.60	100.00%
36	Repello y pulido de paredes e= 2.00 cm, mortero 1:4	m ²	L. 9.32	99.54	L. 927.71			9.32	L. 927.71	9.32	L. 927.71	100.00%
37	Pintura en paredes y elementos estructurales	m ²	L. 27.62	24.00	L. 662.88							
38	Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	m ²	L. 4.50	118.00	L. 531.00	1.35	L. 159.30	3.15	L. 371.70	4.50	L. 531.00	100.00%
39	Viga para resalte en fachada frontal superior, 0.30X0.30, 6#4 Y #3@ 17.5 cm	ml	L. 36.00	200.00	L. 7,200.00	14.40	L. 2,880.00	21.60	L. 4,320.00	36.00	L. 7,200.00	100.00%
40	Tallado de elementos desde 0.15-25 cm	ml	L. 86.00	63.00	L. 5,418.00			86.00	L. 5,418.00	86.00	L. 5,418.00	100.00%
	TOTAL				L. 16,417.19		L. 3,039.30		L. 12,715.01		L. 15,754.31	96.96%
LAVANDERIA Y PILA												
41	Suministro e instalación de inodoro	und	L. 2.00	170.63	L. 341.26							
	TOTAL				L. 341.26							
	GRAN TOTAL				L. 251,985.78		181,874.46		27,091.54		208,966.00	82.93%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	181,874.46	27,091.54	208,966.00
Retención por Anticipo	27,281.17	4,063.73	31,344.90
Retención por I.S.R. (12.5%)	36.00		36.00
Retención por Calidad de Obra			
Retención por Multa			
Neto a Pagar	154,557.29	23,027.81	177,585.10

CONTRATISTA

Firma: Juan Carlos Servellón
 Nombre: Juan Carlos Servellón Méndez
 FECHA: 12/07/2018

INGENIERO SUPERVISOR

Firma: Eynar Rivera Araujo
 Nombre: Eynar Rivera Araujo
 FECHA: 12/07/18

COORDINADOR MAMBOCAURE

Firma: Leonel Martínez
 Nombre: Ing. Leonel Martínez
 FECHA: 12/07/2018

Firma: Mario Tzucos

FECHA: _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
 MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE
U.T.M.
 MAMBOCAURE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, HONDURAS



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



"MAMBOCAURE"



12.07.18



12.07.18

Eynar Rivera Aratijo
INGENIERO CIVIL
22-06-17
26-08-17
C.A. EYNAR RIVERA ARATIJO

Ing. Eynar Rivera Aratijo, No. 7870

[Signature]
C.A. EYNAR RIVERA ARATIJO
INGENIERO CIVIL
22-06-17
26-08-17
C.A. EYNAR RIVERA ARATIJO



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"




12.07.18





12.07.18


INGENIERO CIVIL
26-06-17
26-06-17
Ing. Eynar Rivera Araujo


MAYORÍA MUNICIPAL DE
LA ANA DE
U. T. M.
TEGUCIGALPA, HONDURAS

INSTALACION DE CERAMICA EN PISO Y PILAS DEL BAR DEL CENTRO SOCIAL MUNICIPAL

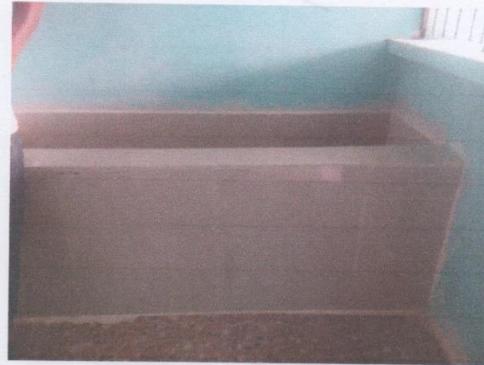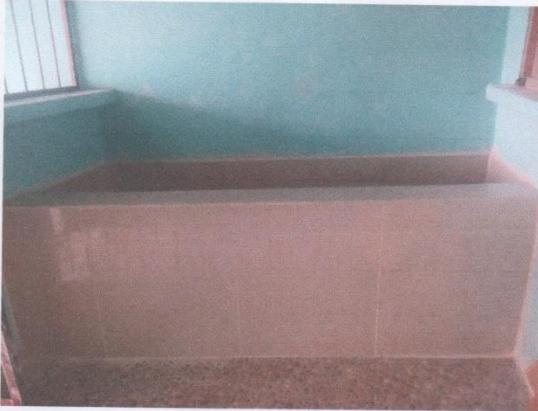

VENTANAS Y PUERTAS DEL BAR DEL CENTRO SOCIAL MUNICIPAL



CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO SOCIAL MUNICIPAL



ALCALDIA MUNICIPAL
SANTA ANA DE
2019
U.T.A.
CHOLUTEGA, HOUILLOS
