


Municipio de Lepaera Departamento de Lempira

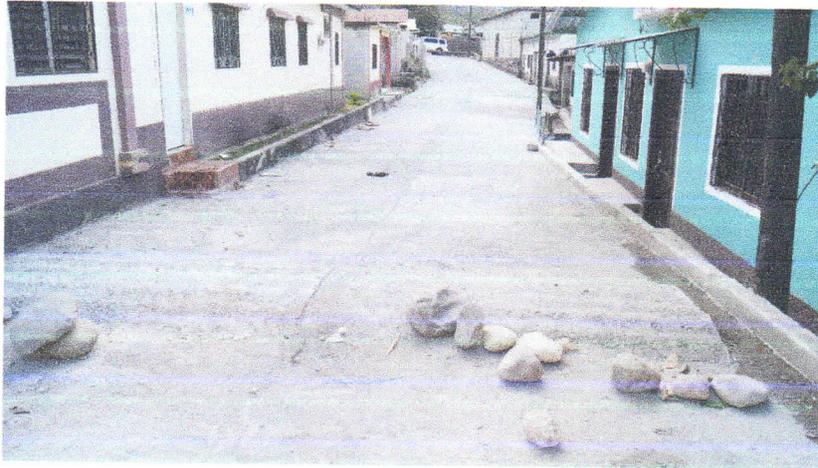

NOMBRE DEL PROYECTO:

Pavimentación de Calles de Bodega Gerardo Hernandez a-
Parque de Vida Mejor en Barrio San Juan Lepaera en el Dpto.
de Lempira

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Barrio San Juan del Municipio de Lepaera, Lempira.

ORGANIZACIÓN PROPONENTE Y RESPONSABLE:

La Municipalidad de Lepaera, Lempira

Email: lepaera2006@yahoo.com



[Firma manuscrita]
Mariano Rosales
Jefe Unidad
de Gestión

Lepaera Lempira

Agosto de 2018.

Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Pavimentación de Calles desde Bodega Gerardo Hernandez a Parque Vida Mejor en Barrio San Juan.

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social (componente Vial)

3.- Nombre del Proyecto

Pavimentación de Calles desde Bodega Gerardo Hernandez a Parque Vida Mejor en el Barrio San Juan.

4.- Ubicación del Proyecto.

El municipio de Lepaera se encuentra ubicado al norte del departamento de Lempira en el occidente de Honduras C. A. El proyecto se pretende realizar en el Barrio San Juan específicamente de calle que conduce desde Gerardo Hernandez a Parque Vida Mejor en Casco Urbano del municipio de Lepaera.

5.- Propósito

Mejorar las condiciones del municipio a través de la pavimentación de **87.10** metros lineales de calle y **822.87** mtrs cuadrados de calle que desde bodega del Sr. Gerardo Hernandez conduce al Parque de Vida Mejor ubicados en el Barrio San Juan del municipio Lepaera, dpto. De Lempira.

6.- Descripción del Proyecto.

Este proyecto consiste en la construcción de **87.10** Mtrs Lineales de Calle, **822.87 mtrs** cuadrados de pavimento desarrollado de la siguiente manera : construcción de **0.60** centímetros de ancho ,construcción de banca de media luna de cemento ,forrada de cerámica, el piso y el asiento de 0.50 metros de Largo ,en el construcción de 4 jardineras de cementó de las medidas siguientes : 1.60 x 1.60 metros cuadrados., iniciando frente a la

bodega del sr. Gerardo Hernandez y concluyendo en Parque Vida Mejor en barrio San Juan, Barrio este proyecto se necesita porque en invierno se dificulta el tránsito para los pobladores ya que podrán tener una mejor comunicación y acceso en el municipio es necesario mencionar que ya cuenta con un buen porcentaje de calles pavimentadas en este año 2018. Y ya se tiene BV de la Corporación Municipal para darle seguimiento en el 2019 a este tipo de proyecto.

En la actualidad urge la pavimentación de estas carreteras para poder restablecer la comunicación - con la ejecución de este proyecto se estarán beneficiando unos **50 familias directamente y 1,000 habitantes** que indirectamente usan diariamente estas vías de comunicación para el traslado de sus bienes de consumo , La modalidad para Construcción de este tramo será con mano de obra comunitaria y así beneficiar a **20 Familias** por un espacio de 2 meses o según sea la duración del proyecto en mención., ya que cada ruta tiene su duración respectiva eso depende la cantidad de metros a ejecutar y así mismo se realizan los pagos

7. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto.

La mayoría de municipios de lempira enfrentan problemas de infraestructura de las calles municipales debido a las fuertes tormentas, y los barrios y colonias son los que sufren las consecuencias debido a que no puede haber comunicación, el invierno copioso causo severo daños a red vial de la zona urbana el cual destruye dicha calles.

Con esta modalidad **Pavimentación de calles** buscamos mejorar la comunicación del Barrio el centro San Juan a los diferentes barrio que tiene el municipio de Lepaera lempira el cual incorporaremos a la población a las actividades de mejora y rehabilitación de sus vías de acceso además generar empleo temporal para aquellas familias que se encuentran en rango de pobreza.

Para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto, que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser Recolección de información para llevar a cabo el presente proyecto, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede a informar a la población de Lepaera como ser: beneficiarios directos para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras

preliminares. Pero el ejecutor directo es la Municipalidad que es quien contrata el personal especializado para este tipo de proyecto.

8. Impacto Ambiental.

El presente proyecto por ser un proyecto de infraestructura por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección de la zona donde se ejecutara el proyecto de pavimentación para verificar que no sean destruida las áreas verdes esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la pavimentación no se haga en una zona de riesgo sea donde hayan viviendas que puedan quedar a la deriva o donde ya está el proyecto de alcantarillado. Ya que si no existe un alcantarillado Sanitario no es posible ejecutar el proyecto.

Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente ya se cuenta con la supervisión directa del Ing. de la Mancomunidad Puca en donde se define claramente que no hay problemas con alguna propiedad ya que la ruta a pavimentar son calles establecidas y bien definidas por el dpto. De catastro. Y a la vez ya se cuenta con los permisos respectivos, en caso de que fuese necesario.

9. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo,

Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara,
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Francisco Lara.

Gerente de la Mancomunidad Puca

Cel. 9451-4754

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: FHIS, SOPTRAVI Municipalidad, Fondo Vial y FONDO CAFETERO NACIONAL.

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo el principal financiador es FHIS y la Municipalidad, ya sea con fondos propios o fondos provenientes de las transferencias ya que cuenta con su propia maquinaria, a la vez brinda su aporte El Fondo Cafetero, el comité de desarrollo Comunal **CODECO** y beneficiarios apoyan con el cuneteo y con la alimentación de las personas que operan la maquinaria a utilizar.

10. Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal, se realizaron las respectivas cotizaciones, y luego de su análisis se procedió a la elección de la cotización mas baja.

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal con la presencia de representantes de la comisión Ciudadana de Transparencia, que siempre están presentes en cualquier reunión que se realiza en la municipalidad.

Estado del Proyecto actual.

En este momento el proyecto ya está ejecutado en un 3.75% en su aporte financiero, un **100%** ejecución. Es necesario mencionar que falta pavimentar varias calles pero por falta del sistema de Alcantarillado por el momento no se realizó conforme a lo aprobado.

Costo de finalización Proyecto

Costo Total: **Lps. 400,000.00**

Vigente: Lps. 400,000.00

Devengado; Lps. 15,000.00

Ejecutado: L. **15,000.00**

Pendiente a ejecutar: Lps. 385,000.00

Fecha de finalización proyectada

Junio de 2018

11. Ejecución Del Proyecto

12. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 4 meses , por ser un proyecto que no es muy complicado realizarse en el proyecto y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la **Municipalidad**. Podemos mencionar que en la ruta ejecutada fueron pocos los detalles restantes, es decir que el proyecto está acorde a lo planteado en el contrato mpal, lógicamente existen variaciones pero no de mucha relevancia, el proyecto en mención quedo a ser concluido en el primer semestre del **2018**. Y se logró y Lógicamente el presupuesto ya estaba aprobado. Pero no se puede entregar el informe a la fecha porque los materiales se pagan en las ferreterías al crédito y hasta que es pagado el último fondo se puede dar un reporte claro de lo invertido.

Variación en el costo total del Proyecto.

Las variaciones han existido como en todo proyecto, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia no es muy grande ya que se tenía que ejecutar **Lps.400,000** según lo asignado y se ejecutó **:Lps.15,000.00** que dando pendiente de ejecutar **Lps: 385,000.00** este es de acuerdo al avance el cuales muy significativo. Pero los pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal. Ya que es un proyecto que continúa. Y el costo es muy elevado.

Monto Solicitado:

Total del proyecto Pavimentación de Calle desde bodega de Gerardo Hernandez a Parque Vida Mejor de Lepaera:

Costo Total: **Lps. 400,000.00**

Vigente: Lps. 400,000.00

Devengado; Lps. 15,000.00

Ejecutado: L. 15,000.00

Pendiente a ejecutar: Lps. 385,000.00

Fecha de finalización proyectada

Junio de 2018

13. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Existieron algunas variaciones en cuanto a la parte técnica, como ser en grosor de rodillos pero fueron resueltas de manera satisfactoria entre el maestro de obra e ing. a cargo del proyecto, en cuanto a la duración hubo variaciones ya que la exigencia era que se debía terminar unos tramos en un periodo 4 meses , pero si se cumplió en 1 tramo por ser de menor magnitud, podemos decir que si se cumplió en periodo todas las actividades relacionadas con el proyecto, algo que afecto un poco fueron las condiciones climáticas de la zona.



Al final se le dio un avance significativo al proyecto lo que es de mucha satisfacción para la municipalidad como para los habitantes del casco urbano, y es necesario mencionar que la municipalidad cumplió con los pagos hasta la etapa en que el proyecto se encuentra actualmente. , porque aunque bien es cierto de la lentitud en los pagos estos no se retrasan mucho porque de ello depende la continuidad del proyecto.


Razones de los cambios antes mencionados.


Como mencione anteriormente hubieron algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar que afecto en el sentido que al haber lluvia se detienen los proyectos., pero fue en un tiempo corto. Ya que no se puede posponer mucho tiempo. Hubo variación también en cuanto al pago de la obra física ya que esta se paga conforme ingresan las transferencias a la municipalidad.

ANEXOS

-- Fotografías Proyecto Pavimentación de Calles en Barrio San Juan.

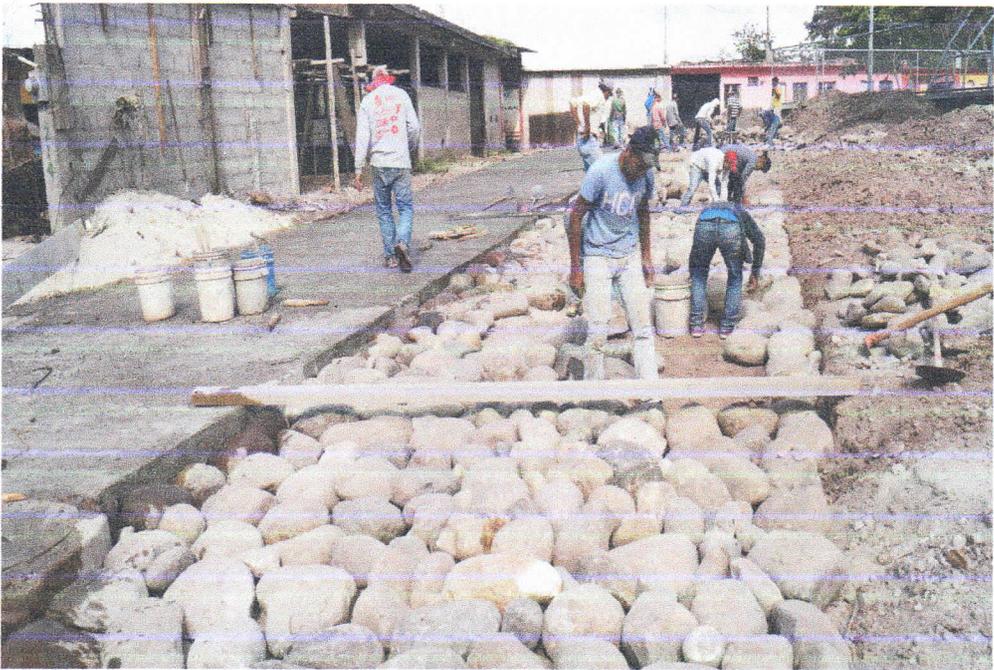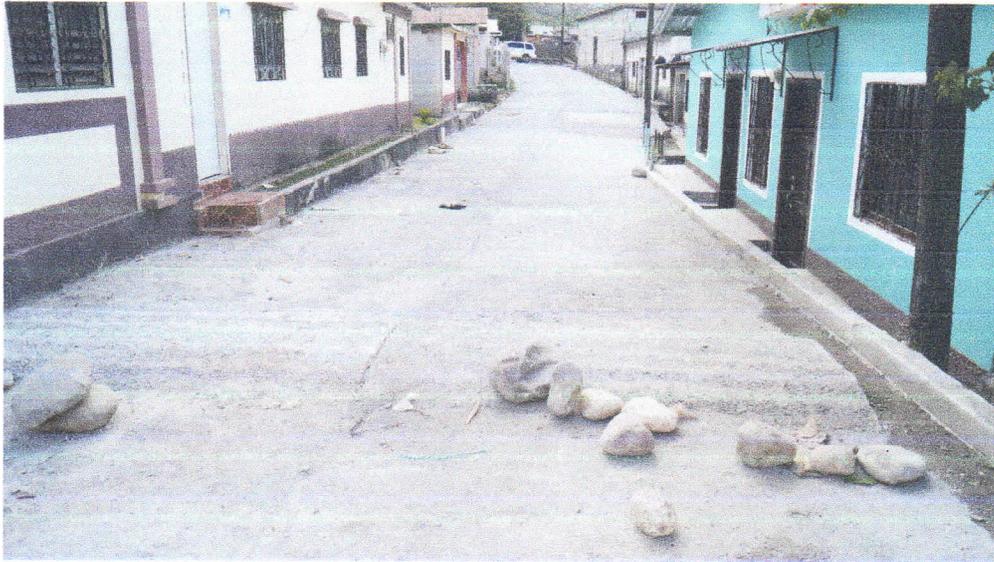

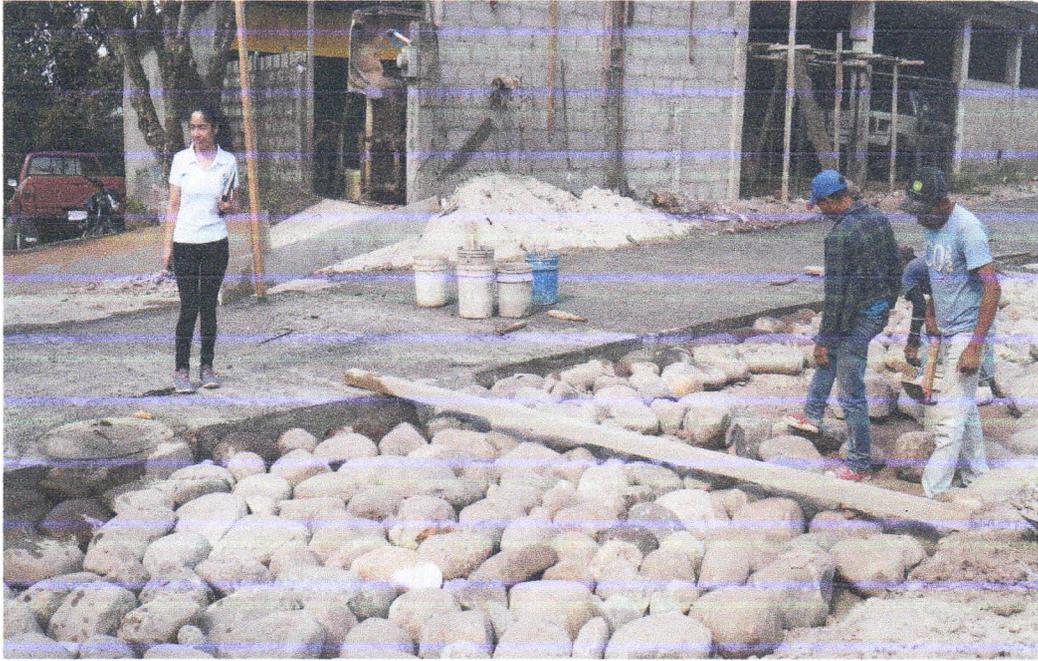

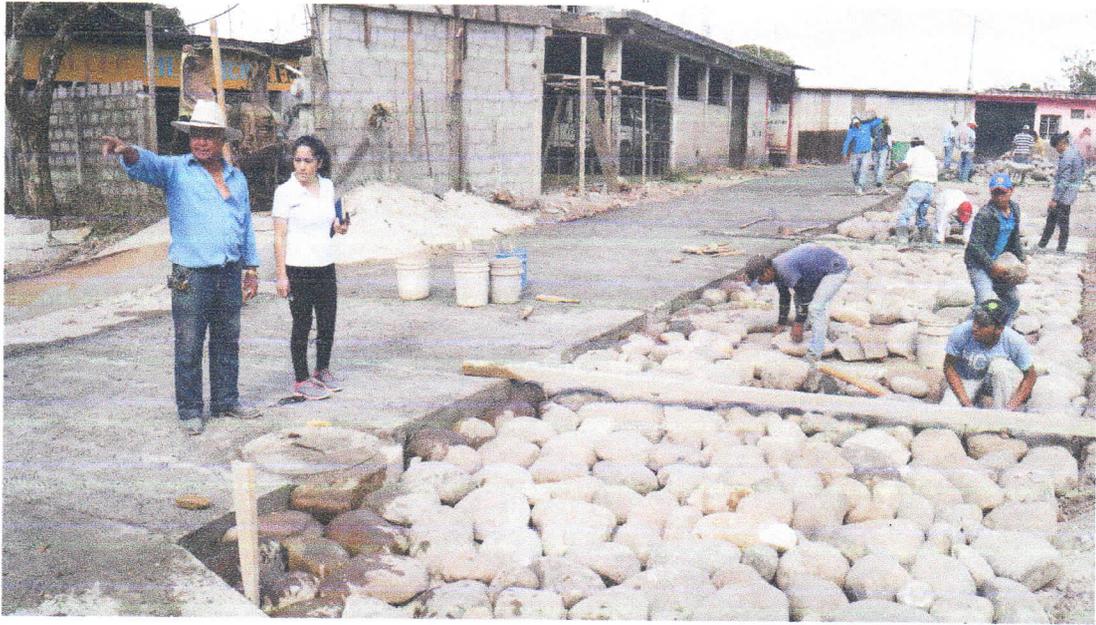



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de Biblioteca Pública Virtual

BENEFICIARIOS.

HABITANTES DE LEPAERA, LEMPIRA

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA Agosto de 2018

HONDURAS C.A



[Handwritten signature]
Hasta la vista
Jefe de la Unidad Técnica
de Gestión al PD

FICHA DE PROYECTO

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PÚBLICA VIRTUAL EN LEPAERA, LEMPIRA

1. Identificación del Proyecto

Encargado de la ejecución del proyecto
Alcalde Municipal
Edgar Antonio Murillo

2. Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social

3. Nombre del Proyecto

Construcción de Proyecto de Construcción de Biblioteca Pública Virtual en Lepaera, Lempira

4. Ubicación del Proyecto.

Barrió San Juan, Municipio de Lepaera

5. Propósito

Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes aumenten los niveles de lectura dentro del municipio través de la adquisición de una Biblioteca Pública para la consulta de todo tipo de información

Descripción del Proyecto.

El presente proyecto consiste en la construcción de una Biblioteca Publica Virtual en el Municipio de Lepaera Dpto. de Lempira, para los pobladores del municipio de Lepaera es un avance en infraestructura y elevar el grado de cultura en los

pobladores para que no pierdan el hábito a la lectura tanto para los visitantes como para los vecinos de Lepaera.

Es necesario mencionar que el proyecto se está ejecutando con fondos de Plan en Honduras y con fondos municipales mediante transferencia a la municipalidad, la misma aporta la mano de obra calificada y el terreno,.

El presente proyecto consta de sala principal, recepción, sala de cómputo, sala para biblioteca, jardines, área de recreación. Estos proyectos no son posibles sin el apoyo de la municipalidad, obteniendo los materiales y mano de obra del municipio. Dicho proyecto se desarrollara de la siguiente manera, construcción de:

General .. Módulo de biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados x 4.85 metros de altura.

Realizando las siguientes actividades:

- 1.- Adecuación de terreno, trazar, marcar y nivelar.
- 2.-Excavacion, cimentación y dados de concreto.
- 3.-Construccion de columnas, castillos, soleras inferiores y superiores.
- 4.-Contruccion de paredes de bloque y vigas reforzado con tabiques
- 5.-Contruccion de contrafuerte de concreto armados de 0.15 x0.50 centímetros.
- 6.- Construcción de loza de loza de concreto y canal perimetral de 0.15x0.50 centímetros.
- 7.- Colocación de techo de alucín según plano.
- 8.-Contruccion de Redes hidrosanitarias, fluviales, griferías y accesorios.
- 9.- Instalación eléctrica, iluminación y estructurado
- 10.- acabado de elementos, soleras, vigas y columnas.
11. Acabado de Contrafuertes y Jardín según planos.
- 12.-Repellos, pulidos y pintado en general.
- 13.-Nivelacion y firmes de concreto
- 14.- Pegado de cerámica y molduras, según plano.
- 15.- acabado interiores, divisiones y sanitarios.
- 16.-exteriores, fundición de aceras y cerámicas antiderrapantes.
17. limpieza general.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto.

Para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, es necesario el involucramiento de toda la población del Casco Urbano, que son aproximadamente 1,200 hogares que son los beneficiarios directos del proyecto.

Se realizaron varias reuniones para hacer conciencia a la población que el Municipio necesita promover la mejora educativa y cultural contando a la vez con áreas de recreación y para realizar labores meramente educativas para los visitantes y mismos habitantes de la ciudad.

El Gobierno mediante transferencia y la municipalidad de Lepaera ha sido la que brinda el terreno y otros fondos tanto municipales como transferencias del Gob. Central.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. Esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad. A la vez mantener la zona limpia contando con sus respectivos depósitos de basura, vigilancia permanente para que no se dañe la vegetación.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Dpto. Municipal de Catastro y La UMA de Lepaera Hizo verificación de terrenos, en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se dañan Terrenos, Viviendas y bosque natural

En la parte legal ya se hizo los tramites respectivos los beneficiarios se les solicita su apoyo para visitar a los dueños de terrenos por donde pasara el proyecto, en este caso servicio de servidumbre.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara Castro, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión. Teléfono No. 9807-2593, 2655-50-90 Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com, Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira.

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: Plan en Honduras, Gobierno de la Republica, Municipalidad.

11.Presupuesto del Proyecto.

El Año 2017 se inició por medio de la Municipalidad.

12.Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre de 2017

13. Estado del Proyecto actual.

El proyecto Construcción de Biblioteca Pública Municipal está ya en su etapa final.se están terminando los últimos detalles de la construcción.

14.Costo de finalización Proyectado

Costo Total Primera Etapa:

Aporte Municipal:

Presupuestado: Lps. 200,000.00

Ampliación: 1,099.049.65

Transferencia Positiva: L.110,550.00

Vigente: Lps. 1,409,599.70

Con material Local:

Arena, grava piedra

Fecha de finalización proyectada:

31 de Julio de 2018.

15.Ejecución Del Proyecto

16.Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 6 meses por la dimensión del proyecto a ejecutar.

De lo planificado apenas se ha ejecutado en un la parte financiera 13.84% sumando el avance del mes anterior ,la parte física en un 90%.

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps. 200,000.00 pero según transferencias asciende a la cantidad de Lps.1,409,599.70**

Variación en el costo total del Proyecto.

Ha existido variación en cuanto a la ejecución Financiera y física del proyecto, ya que se está realizando bien todo de acuerdo a lo planificado. Solamente que lo que refleja el porcentaje de ejecución es el movimiento financiero nada más, En la ejecución física lleva un 90% de avance

Costo Total Primera Etapa:

Aporte Municipal:

Presupuestado: Lps. 200,000.00

Ampliación: 1,099.049.65

Transferencia Positiva: L.110,550.00

Vigente: Lps. 1,409,599.70

Con material Local:

Arena, grava y piedra

Fecha de finalización programada

31 de Julio de 2018

17. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Han habido variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto ya que se tenía planificado para estar concluido en el mes de Julio es decir en seis meses, tiempo máximo; ya que todos los materiales y mano de obra estaban a disposición inmediata en el municipio. Pero se tardara un poquito más por algunos detalles.

La parte física ya tiene un avance considerable y de manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para la fuente financiera externa, ambos partes se han portado a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó hasta la etapa donde se encuentra el proyecto en este momento.

18. Razones de los cambios antes mencionados.



El cambio existente por el momento es la fecha de finalización del proyecto, el ejecutor y co-ejecutor es el mismo en otro aspecto no hubo cambios porque todo el proyecto se está ejecutando de acuerdo a lo planificado.

A continuación fotografías del avance del proyecto, como se encuentra en estos momentos.

Anexos





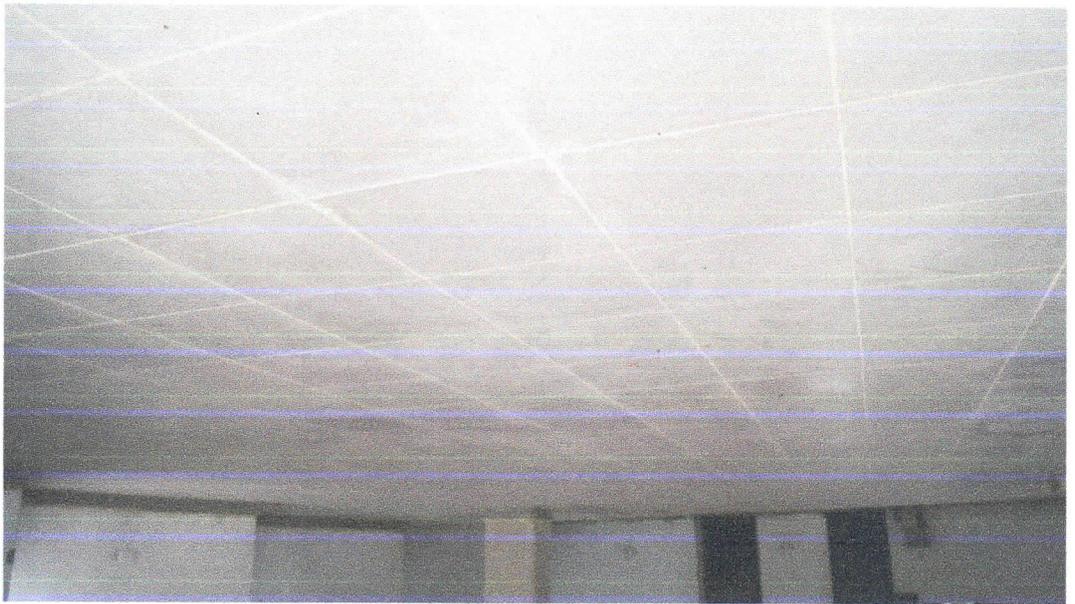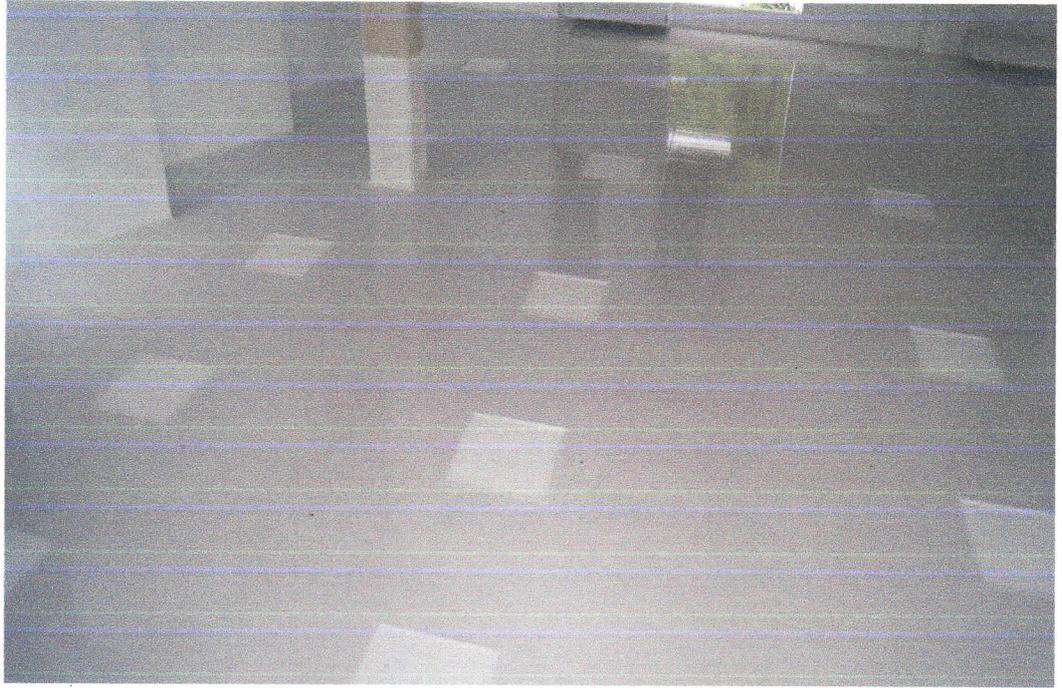



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de Sistema de Electrificación Rural Plan Grande

BENEFICIARIOS.

Habitantes de Plan Grande

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.A Agosto de 2018

[Handwritten signature]
Mara Rosalva
Jefe Unidad al Tecm
Gestión

Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Proyecto Electrificación en la comunidad de Plan Grande.

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Electrificación en la comunidad de Plan Grande

4.- Ubicación del Proyecto.

La comunidad de Plan Grande, Lepaera se encuentra ubicada a 27 Kilómetros de la cabecera municipal.

5.- Propósito

Mejorar el nivel de vida de los habitantes de las comunidades de Plan Grande en el Municipio de Lepaera, mediante la construcción del Proyecto Electrificación, a través de fondos Municipales y del Gob. Central

6.- Descripción del Proyecto.

El Proyecto Consiste en la Instalación de Sistema de electrificación Rural de la comunidad de Plan Grande en el municipio de Lepaera, el cual ya cuenta con un estudio detallado en donde se describe claramente el tipo de Instalación a realizar y a la vez presenta un listado de materiales que serán necesarios para la construcción de este tipo de proyecto, el trabajo a realizar es el siguiente: se hará un replanteo, hincado y aplomado postes de madera de **30,35 y 40 pies**, montaje de **3.5** Kilómetros de Red Primaria y secundaria de distribución de energía, instalación de Lámparas y conexión de transformadores, para lo cual se requiere la participación de **1 ingeniero Electricista** el cual teniendo los conocimientos necesarios realizará un trabajo de calidad.

La Municipalidad se responsabiliza por el traslado de materiales de Lepaera a Plan Grande y al mismo tiempo por la ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

Para la ejecución de un proyecto de este tipo es necesario contar con líderes con capacidad de gestión y un gobierno local comprometido con su pueblo. La ejecución del presente proyecto Inicialmente se realizaron varias reuniones en donde a su vez se elaboraron varias solicitudes, esto para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto , que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser Recolección de información (Diseño del proyecto) para la Ejecución del presente proyecto, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede a informar al comité de Desarrollo Comunal CODECO, la sociedad de padres de familia y miembros de la comunidad como beneficiarios directos para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras preliminares .

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección de los terrenos por donde pasara el proyecto, o donde se harán las mejoras para verificar que no sea destruida la vegetación esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la construcción no se haga en una zona de riesgo. En este caso no fue necesario tanto tramite porque solamente es colocación de postes y lo que hizo la comunidad beneficiaria fue solicitar permisos de servidumbre a las personas por donde serían colocados postes en caso de pasar por terrenos privados.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente no se causa ningún problema legal tanto en terrenos como en ninguna población determinada, este proyecto se construirá en un lugar que reúne las condiciones básicas necesarias para este tipo de proyecto. Las Propiedades por donde pasa el proyecto al ser propiedades privadas se extienden el respectivo permiso de servidumbre.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros.

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: ENEE, FHIS, comunidad y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando ENEE y la municipalidad como principal financiador,

La Comunidad y la Municipalidad, apoyando con la mano de Obra Calificada y no calificada para la ejecución del Proyecto, esas actividades a realizar con Fondos propios y fondos provenientes de las transferencias. Es necesario dar a conocer que a la vez los padres de familia apoyan con la mano de obra local.

11. Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal y para el cual a su vez se firmó un compromiso con los beneficiarios Directos también firman constancias de Aporte para la ejecución del proyecto.

12. Estado del Proyecto actual.

En este momento ya está Finalizado

13. Costo de finalización Proyectado

Costo Total: Lps.375, 759.00

Aporte Municipal _Transferencia positiva: Lps.**375,759.00**

Ejecutado: Lps. **140,250.00**

Pagado: Lps.140,250.00

Fecha de finalización proyectada

Julio de 2018

14. Ejecución Del Proyecto

El presente proyecto ya está finalizada la etapa presupuestada en lo que corresponde a la parte física ya que en lo financiero todavía se están realizando los pagos.

15. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 3.5 meses por la cantidad de actividades a realizarse en el proyecto y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la fuente financiamiento como ser La ENEE , Municipalidad y la comunidad. No se pudo enviar una información anteriormente porque aunque ya se había concluido el proyecto de cuál sería el costo real del proyecto porque no se habían pagado algunas facturas de materiales eléctricos. Ya que lo que se planifico no se compara con lo que ya se Ejecutó.

Vale la pena mencionar que ya se le envió informe de proyecto ejecutado a la fuente financiera, por no contar con el reporte adecuado de costos mismos que son proporcionados por el dpto. De Contabilidad no se había enviado información al portal de transparencia, pero a partir de la fecha se llevara un mejor control de los proyectos ya sea sociales, productivos y otros a ejecutarse en el Municipio de Lepaera.

16. Variación en el costo total del Proyecto.

Si como en todo proyecto hay variaciones, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, pero en este no hubo esa diferencia porque se utilizó tal y como se tenía planificado, por esta razón no existe ninguna diferencia, para este proyecto se habían presupuestado en el aporte municipal **Lps.200,000.00** y lo cual ha sido ejecutado hasta la fecha en su totalidad.

Monto Solicitado:

Costo Total: **Lps.375,759.00**

Aporte Municipal _Transferencia positiva: **Lps.375,759.00**

Ejecutado: Lps. 140,250.00

Pagado : Lps. 140,250.00

Pendiente: Lps. 235,509.00

Fecha de finalización proyectada

Julio de 2018

17. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Si hubo variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto en vista que se tenía planificado para terminar en tres y medio meses tiempo máximo, pero se tardó más mas de tres meses todas las actividades del proyecto, por las condiciones climáticas de la zona y por la parte de la municipalidad que se le dificulto el acarreo de materiales hasta su sitio de proyecto. Por ser este un terreno muy angosto se dificulto mucho la entrada de los postes.

Al final se concluyó el proyecto de una manera satisfactoria es este caso especialmente para la municipalidad, cumpliendo esta organización participante con los que se le encomendó desde el inicio hasta la finalización.

Al final la única variación que existe es en la parte financiera. Ya que la parte física se ha ejecutado.

18. Razones de los cambios antes mencionados.

Como mencione anteriormente hubieron algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar, también por el acarreo de materiales esto porque las comunidad en donde se ubica el proyecto está en un terreno muy difícil en el municipio de Lepaera lo cual dificulta la entrada de vehículo en época de lluvia. A la vez lo único que cambia es la fecha de pago de la obra física y esta se seguirá dando cada vez que se reciban las transferencias.



