



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09532

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 73886671

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 147,808.75

PAGUESE A: Juan Gabriel Arqueta Montoya

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento cuarenta y siete mil ochocientos ochenta y cinco con 75/100  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>11</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>09</u>	COD. <u>23</u>

Gasto Corriente \_\_\_\_\_  
 Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_  
 Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social Cultural y Comunit.</u>	<u>147,808.75</u>	
<u>09</u>	<u>Seguridad ciudadana.</u>		
<u>11</u>	<u>fondos Propios</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const. Adicion y mejora Edif. y Obras p.</u>		
<u>467</u>	<u>Const. Adicion y mejora Obras y Equipos para</u>		
<u>23</u>	<u>Mantenimiento campo de futbol los planes</u>		
	<u>Seg. 2017</u>		
	<u>Pago de Sexta Estimacion de</u>		
	<u>Dicho Proyecto.</u>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b><u>147,808.75</u></b>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-3026, F.T.N. 08019999408325

Fecha 04-09-2018

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

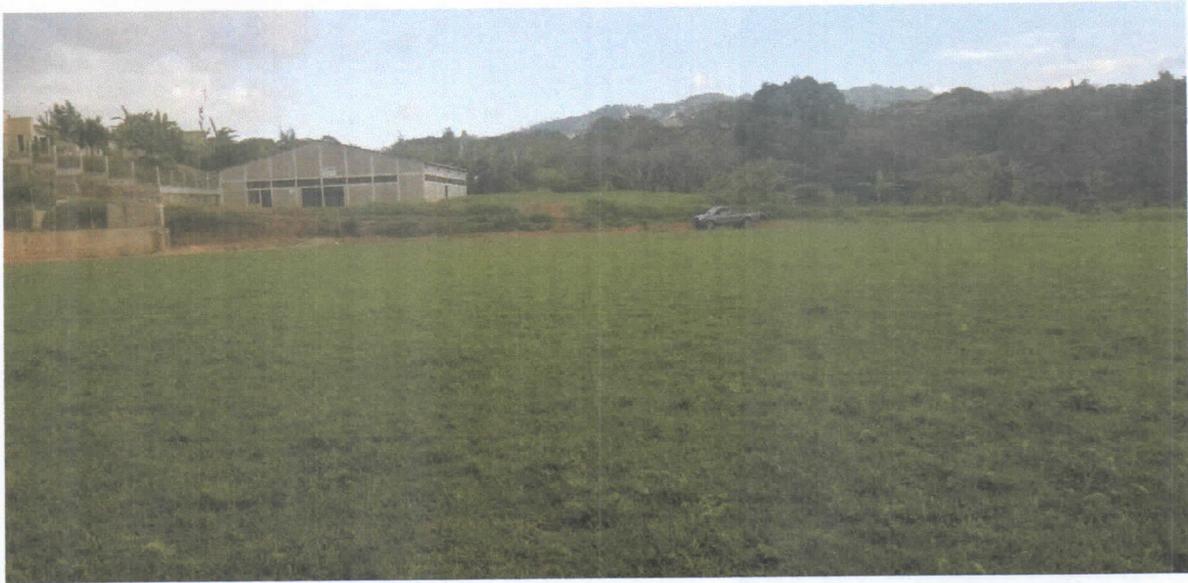
Recibido por (f)

Identidad No.

Solvencia No.

Juan Gabriel Arqueta  
1212-197700090





ENGRAMADO CAMPO DE FUTBOL



SE MUESTRA LA INSTALACION DE GRAMA YA FERTILIZADA

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 01 de Septiembre del 2018.

Recibo por: Lps. 147,808.75

Recibí de la Municipalidad de Santa María, La Paz la cantidad de Ciento cuarenta y siete mil ochocientos ochocientos con 75/100

(Lps. 147,808.75 ) correspondiente al pago de la Estimación,

# 06 de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ proyecto

Mejoramiento Campo de futbol los Planes Seg-2017

Con Numero 23 Ubicado en Los planes Municipio De Santa María del Departamento de La Paz.

**Desglose del pago**

<b>MONTO ESTIMADO</b>	L. 155,588.16
-Menos deducción de anticipo	
-Menos deducción de ISR	
-Menos 5% Calidad de Obra	7,779.41
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	L. 147,808.75

Firma del Contratista:

Nombre del cotrastista:

Juan G. Siquiera

Identidad #:

012-1977-00090



**PROYECTO; MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL PLANES**



**PORTON DE ACCESO A CAMPO**



**CERCO DE MALLA CICLON Y TUBO GALVANIZADO**



que estan ejecutando la obra?\*

3. Los desechos de la construcción se están disponiendo adecuadamente en un sitio fuera de la obra, sin causar impactos negativos en el ambiente?\*

Si  No

\* Si la respuesta es no, favor explique ¿Qué medidas se estan tomando?

---

---

---

Nombre del supervisor:

LUHA MEDINA

Firma y sello del Supervisor MAMCEPAZ



Se adjuntan cuatro fotografías a color

11-304-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
9965-2258  
2754-8870

CHEQUE No. 73886671

PLANES, LA PAZ 07. Septiembre-2018  
Lugar y Fecha

Paguese a la orden de Juan Gabriel Arqueta Montoya. L 147,809.75

Ciento cuarentaysiete mil ochocientos ocho lemp. con 75/100  
Cantidad en letras Lempiaras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

*J. Arqueta*  
Firma(s)

⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆7388667⑆

# Alcaldía Municipal de Santa María La Paz

## INFORME DE SUPERVISION DE CAMPO ESTIMACION VI

Periodo del:

06/JULIO/2017 AL 23/AGOSTO/2018

PROYECTO:  EN TIEMPO  DESFASADO  INCUMPLIMIENTO

Contrato: \_\_\_\_\_

Departamento: LA PAZ

Nombre: MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL

Municipio: SANTA MÁRIA

Fase: Ejecucion

Ubicacion: LOS PLANES

No. Visita	Mes de Visitas	Hora de Llegada	Hora de Salida	Fecha de Presentación
1	agosto			23/08/2018

### CONTRATO DE INVERSION

Contratista: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

MONTO CONTRATADO L. 1843,057.43  
O.C L. 15,769.26

Fecha Inicio: 16-oct

PORCENTAJE AVANCE: 100.00 %

Plazo: 120 DIAS CALENDARIO

### OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Clima	Rótulo	Personal en Obra	Materiales	Calidad de Obra	Proyecto paralizado
<input type="checkbox"/> Sin lluvia <input checked="" type="checkbox"/> Con lluvia	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No En Carretera <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Rotulo Pare <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Placa	<input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Maestro de obra: <u>1</u> Albañiles: <u>3</u> Peones: <u>6</u> Mujeres: ..... Otros: .....	<input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Insuficiente Material Rechazado _____ _____ _____	<input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo Proyecto terminado <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Doc. De Cierre ingre: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Razón Falta de fondos <input type="checkbox"/> Imputable ejecuto <input type="checkbox"/> Falta acceso <input type="checkbox"/> Mal clima <input type="checkbox"/> Otra: _____ _____

### OBRA EJECUTADA EN EL PERIODO DE ESTIMACION:

En este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:

En esta estimacion se cancelan las actividades aprobadas en orden de cambio, cisterna, excavacion de material para mejorar la nivelacion relleno compactado con material del sitio para nivelacion y mamposteria en muro.

### OBSERVACIONES EN LA OBRA

Situaciones

### Soluciones propuestas

### Calificación Contratista

Calidad de obra: 60 / 60 Cump Plazos: 20 / 20 Tramites Oportunos 20 / 20

### ASPECTOS AMBIENTALES

1. ¿Incide negativamente sobre el ambiente la ejecucion de este proyecto?  Si  No  
Si la respuesta es si, ¿Qué medidas se estan tomando?

2. ¿Existen en el lugar de la construcción letrinas o servicios sanitarios, que pueden ser utilizados por los trabajadores  Si  No

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA PAZ

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO					
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL			
DEPARTAMENTO:		LA PAZ			
MUNICIPIO:		SANTA MARIA			
UBICACION:		LOS PLANES			
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	ESTIMACION DEL:	06/07/2018	AL:	23/08/2018
		LPS			
	Monto Inicial de Contrato	1843,057.43			
	Anticipo Neto Entregado	276,458.61			
	Monto Acumulado por O/C	34,376.16			
	Monto Acumulado por Adendum				
	Monto Final	1877,433.59			
	Monto de Sexta Estimacion	155,588.16			

VoBo

SUPERVISOR DE PROYECTO



	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	8.44%	1.25	11%	276,458.61	29,172.78
					1843,057.43

Retencion de Impuesto Sobre La Renta	UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PERI	S.R 12,5%

RESUMEN

Monto Estimado	155,588.16
Menos Deducion de Anticipo	
Menos Deducion 5% CALIDAD DE OBRA	7,779.41
Menos Impuesto Sobre La Renta	
<b>TOTAL A PAGAR SEXTA ESTIMACION</b>	<b>147,808.75</b>

Monto del Anticipo	276,458.61	14.73%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	51,905.38	18.78%
AMORTIZACION 2da. ESTIMACION	65,709.38	23.77%
AMORTIZACION 3ra. ESTIMACION	65,856.45	23.82%
AMORTIZACION 4ta. ESTIMACION	47,622.63	17.23%
AMORTIZACION 5ta. ESTIMACION	45,364.78	16.41%
<b>TOTAL AMORTIZADO</b>	<b>276,458.61</b>	<b>100.00%</b>
<b>FALTA POR AMORTIZAR</b>	<b>0.00</b>	

2. ¿ Existen en el lugar de la construcción letrinas o servicios sanitarios, que pueden ser utilizados por los trabajadores que estan ejecutando la obra?\*

Si  No

3. Los desechos de la construcción se están disponiendo adecuadamente en un sitio fuera de la obra, sin causar impactos negativos en el ambiente?\*

Si  No

\* Si la respuesta es no, favor explique ¿Qué medidas se estan tomando?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nombre del supervisor:

LUHA MEDINA

Firma y sello del Supervisor MAMCEPAZ



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MANCOMUNIDAD DEL CENTRO DE MAMCEPAZ' around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style.

Se adjuntan cuatro fotografias a color



**ESTIMACION DE OBRA**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ  
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ (MAMCEPAZ)

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL  
UBICACIÓN: Los Planes, Santa María, La Paz  
EJECUTOR: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA  
ESTIMACION: 6  
PERIODO DEL: 06/07/2018 HASTA 23/08/2018

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	220.24	L. 105.23	L. 23,175.86	245.67	L. 25,851.85	-25.43	L. -2,676.00	220.24	L. 23,175.86	100.00
2	TRAZADO Y MARCADO	M.L	252.12	L. 23.25	L. 5,861.79	270.00	L. 6,277.50	-17.88	L. -415.71	252.12	L. 5,861.79	100.00
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	270.89	L. 165.57	L. 44,851.26	319.37	L. 52,878.09	-48.48	L. -8,026.83	270.89	L. 44,851.26	100.00
4	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	521.31	L. 1,752.25	L. 913,465.45	503.92	L. 882,993.82	17.39	L. 30,471.63	521.31	L. 913,465.45	100.00
5	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID	109	L. 198.67	L. 21,655.03	109.00	L. 21,655.03	0.00	L. 0.00	109.00	L. 21,655.03	100.00
6	SUM/INST MALLA CICLON 6, TUBO HG2, DOBLE REF.	ML	252.12	L. 635.64	L. 160,257.56	270.00	L. 171,622.80	-17.88	L. -11,365.24	252.12	L. 160,257.56	100.00
7	JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2	ML	252.12	L. 197.50	L. 49,793.70	270.00	L. 53,325.00	-17.88	L. -3,531.30	252.12	L. 49,793.70	100.00
8	COLUMNA 30 X 30 4Nú4, Nú2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L	0	L. 725.32	L. -	6.20	L. 4,496.98	-6.20	L. -4,496.98	0.00	L. 0.00	#DIV/0
9	PORTON DE TUBO ESTRUCTURAL Y LAMINA TROQUELADA	UND	1	L. 17,896.35	L. 17,896.35	1.00	L. 17,896.35	0.00	L. 0.00	1.00	L. 17,896.35	100.00
10	ENGRAMILLADO DE CAMPO FUTBOL	M2	7446	L. 78.75	L. 586,372.50	6,156.80	L. 484,848.00	1,289.20	L. 101,524.50	7,446.00	L. 586,372.50	100.00
SUB TOTAL ACTIVIDADES CONTRATADAS					L. 1823,329.49		L. 1721,845.43		L. 101,484.06		L. 1823,329.49	100.00
11	CONSTRUCCION DE CISTERNA	UND	1	L. 9,500.00	L. 9,500.00			1.00	L. 9,500.00	1.00	L. 9,500.00	100.00
12	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (NIVELACION DE TERRENO)	M3	180	L. 105.23	L. 18,941.40			180.00	L. 18,941.40	180.00	L. 18,941.40	100.00
13	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	150.25	L. 170.80	L. 25,662.70			150.25	L. 25,662.70	150.25	L. 25,662.70	100.00
SUB TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS					L. 54,104.10		L. -		L. 54,104.10		L. 54,104.10	100.00
TOTAL					L. 1877,433.59		L. 1721,845.43		L. 155,588.16		L. 1877,433.59	100.00

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

FIRMA: 	SUPERVISION MAMCEPAZ 	ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA 
NOMBRE: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	NOMBRE: NORMA LUHATANY MEDINA RAMOS	NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ
FECHA: 23-AGOSTO-2018	FECHA: 23-AGOSTO-2018	FECHA: 23-AGOSTO-2018

# Alcaldia Municipal de Santa Maria La Paz

## INFORME DE ORDEN DE CAMBIO

Periodo del: 03-ago-18

PROYECTO:  EN TIEMPO  DESFASADO  INCUMPLIMIENTO

Contrato: \_\_\_\_\_ Departamento: LA PAZ  
 Nombre: MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL Municipio: SANTA MARIA  
 Fase: Ejecucion Ubicacion: LOS PLANES

No. Visita	Mes de Visitas	Hora de Llegada	Hora de Salida	Fecha de Presentación
1	agosto			03/08/2018

**CONTRATO DE INVERSION**

Contratista: JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA  
 Fecha Inicio: 16-oct  
 Plazo: 120 DIAS CALENDARIO

MONTO CONTRATADO	L. 1843,057.43
O.C	L. 15,769.26
PORCENTAJE AVANCE:	<u>100.00</u> %

**OBSERVACIONES GENERALES DEL PROYECTO**

<b>Clima</b> <input type="checkbox"/> Sin lluvia <input checked="" type="checkbox"/> Con lluvia	<b>Rótulo</b> <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No En Carreter <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Rotulo Pare <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Placa	<b>Personal en Obra</b> <input checked="" type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Insuficiente Maestro de obra: <u>1</u> Albañiles: <u>3</u> Peones: <u>6</u> Mujeres: ..... Otros: .....	<b>Materiales</b> <input checked="" type="checkbox"/> Aprobado <input type="checkbox"/> Suficiente <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/> Insuficiente Material Rechazado _____ _____ _____	<b>Calidad de Obra</b> <input checked="" type="checkbox"/> Bueno <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Malo Proyecto terminado <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No Doc. De Cierre ingre: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<b>Proyecto paralizado</b> <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No Razón Falta de fondos <input type="checkbox"/> Imputable ejecuto <input type="checkbox"/> Falta acceso <input type="checkbox"/> Mal clima <input type="checkbox"/> Otra: _____ _____
---	---	---	--	---	---

**OBRA EJECUTADA EN ORDEN DE CAMBIO:**

En este periodo se ejecutaron las siguientes actividades:  
 Se presenta esta orden de cambio por las actividades medidas en sitio las cuales varian de las presupuestadas, excavacion de material no se realizo por completo en el muro pero si se requirio mas para la nivelacion del terreno para el engramillado, por las condiciones del terreno aumento la mamposteria en el muro, disminuyo el engramillado y el suministro e instalacion de malla ciclon, se contempla como activades nuevas la construccion de una siterma para riego del campo la cual no fue considerada en presupuesto, al igual que el relleno con material del sitio para nivelacion del terreno.

**OBSERVACIONES EN LA OBRA**

Situaciones  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Soluciones propuestas**

\_\_\_\_\_

**Calificación Contratista**

Calidad de obra: 60 / 60 Cump Plazos: 20 / 20 Tramites Oportunos 20 / 20

**ASPECTOS AMBIENTALES**

1. ¿Incide negativamente sobre el ambiente la ejecucion de este proyecto?  Si  No  
 Si la respuesta es si, ¿Qué medidas se estan tomando?  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



**ORDEN DE CAMBIO #1**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ  
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE LA PAZ (MAMCEPAZ)

PROYECTO:  
UBICACIÓN:  
EJECUTOR :  
FECHA:

MEJORAMIENTO CAMPO DE FUTBOL  
Los Planes, Santa María, La Paz  
JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA  
03/08/2018

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	PRESUPUESTO CONTRATADO +		ESTA ORDEN DE CAMBIO (OC)	
						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
<b>A. MODULO DE ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>									
1	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	245.67	L. 105.23	L. 25,851.85	220.24	L. 23,175.86	-25.43	-2,676.00
2	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	270	L. 23.25	L. 6,277.50	252.12	L. 5,861.79	-17.88	-415.71
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	319.37	L. 165.57	L. 52,878.09	270.89	L. 44,851.26	-48.48	-8,026.83
4	MURO DE MAMPOSTERIA	M3	503.92	L. 1,752.25	L. 882,993.82	521.31	L. 913,465.45	17.39	30,471.63
5	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID	109	L. 198.67	L. 21,655.03	109.00	L. 21,655.03		0.00
6	SUM/INST MALLA CICLON 6, TUBO HG2, DOBLE REF.	ML	270	L. 635.64	L. 171,622.80	252.12	L. 160,257.56	-17.88	-11,365.24
7	JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2	ML	270	L. 197.50	L. 53,325.00	252.12	L. 49,793.70	-17.88	-3,531.30
8	COLUMNA 30 X 30 4Nú4, Nú2 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L.	6.2	L. 725.32	L. 4,496.98	0.00	L. 0.00	-6.20	-4,496.98
9	PORTON DE TUBO ESTRUCTURAL Y LAMINA TROQUELADA	UND	1	L. 17,896.35	L. 17,896.35	1.00	L. 17,896.35		0.00
10	ENGRAMILLADO DE CAMPO FUTBOL	M2	7696	L. 78.75	L. 606,060.00	7,446.00	L. 586,372.50	-250.00	-19,687.50
SUB TOTAL MODULO OBRAS CONTRATADAS					L. 1843,057.43		L. 1823,329.49		L. -19,727.94
<b>B. MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS</b>									
11	CONSTRUCCION DE CISTERNA	UND		L. 9,500.00		1.00	L. 9,500.00	1.00	9,500.00
12	EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (NIVELACION DE TERRENO)	M3		L. 105.23		180.00	L. 18,941.40	180.00	18,941.40
13	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO	M3		L. 170.80		150.25	L. 25,662.70	150.25	25,662.70
SUB TOTAL MODULO DE ACTIVIDADES NUEVAS					L. 0.00		L. 54,104.10		L. 54,104.10
<b>TOTAL</b>					L. 1843,057.43		L. 1877,433.59		L. 34,376.16

EJECUTOR		SUPERVISION MAMCEPAZ		ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA	NOMBRE:	LUHATANY MEDINA RAMOS	NOMBRE:	GABINO ARGUETA GALVEZ
	03 DE AGOSTO 2018		03 DE AGOSTO 2018		03 DE AGOSTO 2018
