



NOTIFICACION DEL PROYECTO

En respuesta a la solicitud No OIP-005-01-11-2018 enviada el día 01 Noviembre del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla los detalles del proyecto.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	Ing. Yessica Medina Claros
Sector	Sur del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	Pavimentación ciclópea calle de acceso al cristo el mirador.
Ubicación del proyecto	Barrió san francisco, calle principal hacia el cristo el cerrito.
Descripción del proyecto	Este proyecto se lleva acabo para mejorar el sistema de viva de las personas vecinas, mejorar la vía de acceso, y también promocionar el turismo en el municipio.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Preveer el deterioro de la sub rasante de las calles y la provocación de charcos e en las calles que provocan el criadero de zancudos y posteriormente las enfermedades en las personas del municipio.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Ing. Yessica medina claros
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 1,969,276.78
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2017
Estado actual del proyecto	Ejecutado aproximadamente en un 32.77%
Estimación del proyecto	Lps. 492,006.48
Deducción del 15%	Lps. 120,985.20
Retención del 5%	Lps. 32,262.72
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA
Fecha de finalización	6 enero 2019
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	



UC. FRANCISCO BUSTILLO GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 09 días del mes de Octubre del año 2018



Fernando Martínez Ávila
Cargado Comunitario/Proyectos

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

18-10-12

Supervisor

Retencion Sobre AnticipoRetencion de Impuesto Sobre La Renta

	Monto Estimado	645,254.39
	Menos Deducion de Anticipo	120,985.20
	Menos Deducion 5% Calidad de Obra	32,262.72
	Menos Otras Deduciones	
	TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	492,006.48

ITEM	VALOR
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	492.006.48

INGENIERO CIVIL
18-10-12
23-10-12

NOMBRE SUPERVISOR

SUPERVISOR

ESTIMACION DE OBRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE

PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO

CALLE DE ACCESO AL MIRADOR CRISTO DEL CERRITO

ING. YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

1

PROYECTO:

UBICACION:

EJECUTOR:

ESTIMACION:

PERIODO DEL:

06/09/2018

HASTA

25/10/2018

49.00

DIAS

No.	PRESUPUESTO DE OFERTA		UNIDAD	PRECIO UNITARIO		CANTIDAD	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO	
	CONCEPTO	Descripción		Unidad	Precio			CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
1	TRAZADO Y MARCADO												
2	CORTE DE MATERIAL CON TRACTOR D-6			M/L	75.84	348	26280.32	0.00		346.80	26280.32	346.80	26280.32
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)			M3	100.00	591.45	59145.00	0.00		591.45	59145.00	591.45	59145.00
4	ESCARIFICACION, CONFORMACION Y COMPACTACION			M2	76.00	768.89	58435.26	0.00		768.89	58435.26	768.89	58435.26
5	SUM Y COLOCACION DE MATERIAL SELECTO			M2	23.15	1971.50	45640.23	0.00		1971.50	45640.23	1971.50	45640.23
6	CONCRETO CICLOPEO E=15CM P/PAVIMENTOS			M2	459.41	295.73	135861.32	0.00		295.73	135861.32	295.73	135861.32
7	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms			M/L	626.03	1971.5	1234218.15	0.00		348.70	218296.66	348.70	218296.66
8	BORDILLO DE CONCRETO DE 15x15 cms			M/L	196.88	696	136889.28	0.00		75.00	14751.00	75.00	14751.00
9	TAPADERA Y CASQUETE DE POZO			UN	3447.87	2	6895.74	0.00		0.00		0.00	
10	IMPREVISTOS			GLB	1000.00	2	2000.00	0.00		1.00	1000.00	1.00	1000.00
11	LIQUEZAS DE CALLES (INCLUYE ACARREO HASTA 20 MTS.)			M2	2.20	1971.5	4337.30	0.00		1.00	2200.00	1.00	2200.00
12	TRANSPORTE DE MAQUINARIA (LOW-BOY)			VIA	10000.00	1	10000.00	0.00		0.00		0.00	
SUB-TOTAL							1712414.59	0.00		0.00		0.00	
UTILIDAD							256862.19	0.00		0.00		0.00	
TOTAL							1969276.78	0.00		0.00		0.00	

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor

FIRMA: ING. YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS FECHA: 25 OCTUBRE 2018	FIRMA: WALTER DAVID GUZMAN FECHA: 25 OCTUBRE 2018	FIRMA: FRANCISCO BUSTILLO FECHA: 25 OCTUBRE 2018	FIRMA: LUIS MEDIANO MORALES FECHA: 25 OCTUBRE 2018
---	--	---	---

INFORME DE SUPERVISIÓN 1

**PROYECTO: PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO,
CALLE DE ACCESO AL MIRADOR CRISTO DEL CERRITO,
MUNICIPIO DE CANE, DEPARTAMENTO DE LA PAZ.**

CODIGO DEL PROYECTO: LPR-CANE-01-2018

SUPERVISOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN SALINAS

CICH: 5828



INFORME 1

PERIODO DEL 6 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DE 2018

FINANCIAMIENTO: FONDOS MUNICIPALES

**SUPERVISOR: ING. WALTER DAVID GUZMAN
CICH 5828**

**CONSTRUCTOR: ING. YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS
CONTRATISTA**

MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ

25 DE OCTUBRE DE 2018



BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

Consiste en la pavimentación con concreto ciclópeo en calle de acceso al Mirador Cristo del Cerrito, Municipio de Cane, Departamento de La Paz. Con longitud de 348.00 metros lineales haciendo un área total a pavimentar de 1,971.50 m² de la siguiente forma: TRABAJOS PRELIMINARES: 1 global con limpieza, trazo y replanteo topográfico y movilización de maquinaria, MOVIMIENTO DE TIERRAS: Corte de material común con tractor D-6 de 0.30 m de profundidad, la subrasante así formada será compactada, CAPA DE BASE: con material selecto 0.15 m de espesor será compactado y afinado, CARPETA DE RODADURA: de concreto ciclópeo con 0.15 m de espesor, bombeo definido del centro a los extremos en su sección transversal. La mezcla ciclópea estará formada por piedra de 10 cms separadas con 5 cms de espesor de concreto. BORDILLOS DE CONCRETO: de 15x15 cms, conos de reducción, tapadera y casquetes de pozo.

El proyecto será construido con Fondos Municipales.



INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA

CONCEPTO	CONTRATISTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS
FECHA DE INICIO	6 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE TERMINACION	120 DIAS CALENDARIO
MONTO CONTRACTUAL (LPS)	1,969,276.78
MODIFICACIONES DE PLAZO (INDICAR NUEVA FECHA DE TERMINACION)	NO HAY
MODIFICACIONES EN MONTO (INDICAR NUEVO MONTO CONTRACTUAL)	NO HAY
MONTO ANTICIPO (LPS)	295,391.52
MONTO FACTURADO (LPS)	645,254.39
% DE AVANCE FISICO PROGRAMADO	32.77
% DE AVANCE FISICO EJECUTADO	32.77
% DE AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	32.77
% DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	32.77
PLAZO CONTRACTUAL ORIGINAL	120 DIAS CALENDARIO
PLAZO CONTRACTUAL MODIFICADO	NO HAY



Breve descripción de las labores del Supervisor

Dentro del periodo que comprende el informe del supervisor se realizó las siguientes actividades:

- Visitas a la zona del proyecto.
- Cuantificación de daños.
- Revisión de las cantidades de obra.
- Control y evaluación de Suelos.
- Reuniones con el Contratista, personal Técnico de la Alcaldía Municipal de Cane y Alcalde Municipal, para coordinar de forma eficiente el desarrollo de las obras que forman parte del proyecto en referencia.
- Evaluaciones técnicas, económicas y de campo de las actividades de construcción del proyecto.
- Elaboración del informe de soporte de estimación.
- Evaluación de los Trabajos en ejecución.
- Gestión ante las autoridades Locales.
- Inspección de materiales, personal y equipo trasladado al proyecto.
- Registro Fotográfico.
- Llenado de Bitácora.
- Registro del Estado del Tiempo.
- Informe Soporte Técnico Financiero para tramitar la estimación No. 1

Problemas encontrados

Durante el periodo no se trabajó aproximadamente 10 días debido a las fuertes lluvias durante día y noche.

Actividades ejecutadas durante el periodo:

- ✓ Replanteo topográfico.
- ✓ Corte de material suave de 30 cms con motoniveladora 140G.
- ✓ Acarreo de material de desperdicio con volqueta de 5m3.
- ✓ Compactación de subrasante con vibro-compactador.
- ✓ Reparación de tuberías de aguas negras dañadas durante el corte de material suave.
- ✓ Base de material selecto de 15 cms de espesor compactada y afinada.
- ✓ Encofrado con canaleta de 6" para la fundición de losa.
- ✓ Colocación de piedra.
- ✓ Fundición de losa de concreto ciclopeo.
- ✓ Curado de losa con aserrín.
- ✓ Construcción de bordillos de 15x15 cms.
- ✓ Reparación de tubería de agua potable.



Personal del contratista

A continuación se indica el personal que a la fecha el contratista asigno al proyecto.

Categoría	Cantidad
Ingeniero Residente	1
Maestro de Obra	1
Albañil	3
Ayudantes	13
Topógrafo	1
Cadenero	2
Operador de Equipo	3
Vigilante	1

Equipo utilizado

- 1 Motoniveladora CAT 140G.
- 1 Volqueta de 5 m3.
- 1 Concretera de 1 Saco.
- Herramientas Menores.
- 1 Vehículos Pick Up 4x4.
- 1 Retroexcavadora John Deere 310E.
- 1 Vibro-compactadora.
- 1 tanque cisterna.




Conclusiones

- ✓ El material utilizado por el contratista reúne los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del contrato.
- ✓ Se está dando trabajo a la mano de obra no calificada de la comunidad.
- ✓ El contratista cuenta con el equipo mínimo requerido para este tipo de proyectos.
- ✓ El personal del contratista es eficiente en sus labores, mostrando un buen rendimiento.
- ✓ Se lleva con forme a lo planificado las actividades con forme a lo establecido en el contrato.
- ✓ Presenta buena calidad de obra.



3. Botado de material.

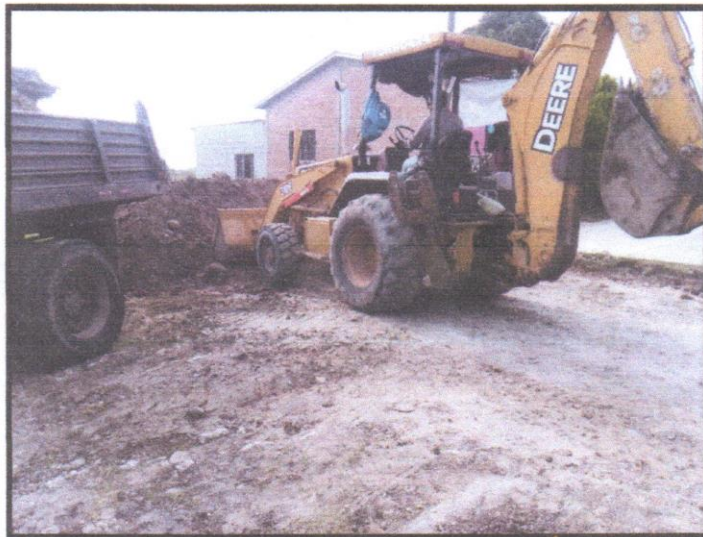

4. Escarificación



6 de Septiembre del 2018

Hoja Nº 000001

Proyecto: Pavimentación concreto ciclopeo

Ubicación: Calle al Mirador Cristo del Cerro, con
La Paz.

Este día se procede a aperturar este libro de bitácora para hacer las anotaciones más relevantes de dicho proyecto, así como avances y modificación/adiciones si las obrece. quedando establecido también este día como orden de inicio, se establece una duración de 120 días calendario para la ejecución de dicho proyecto.

Ente

Nombre

Firma

Contratante:

Contratista:

Jessica del Socorro Medina



Ejecutor Resident:

Supervisor de obra: Walter David Guzmán



U. Municipal.



Sábado 8 de Septiembre 2013

Hoja N° 000002

Proyecto: pavimentación con concreto ciclopeo, calle hacia mirador Cristo del cenito, municipio de Cane, La Paz.

Este día continuamos las actividades con el replanteo topográfico y realizando removiendo cerros de algunas solares baldíos, identificando las calles así como también rectificando planes y cantidades de obra proporcionados por la municipalidad.

El clima está soleado, apto para realizar cualquier actividad de construcción.



[Handwritten signature]
Contratista



Martes 11 de Septiembre del 2013

El día de hoy se realizó el análisis de las calles, en donde se van a pavimentar 2 calles abdañías al cristo de Este a Oeste C₁ y C₂ y 1 calle de Norte a Sur C₃. cabe mencionar que según topografía las calles C₁ y C₂ se prestan para un ancho de calle de 5.30mt. cada una, teniendo en cuenta C₁ 77.24 y C₂ tiene 79.12mt de largo, la C₃ son 2 cuadras y la calle se presta para un $A_c = 6.30mt$, longitud de la misma de $16.30mt$ y $197.65mt \pm 90.39$ haciendo un calculo que habria un incremento $54.38m^2$ de obra, también se considera dejar proyectadas las bocas calles (en este caso 2) de 1.2×5.30 ch.



Viernes 14/sept/2018

Hoja N° 000003

El día de hoy se continuó con las actividades de corte y relleno de material con motoniveladora 140G también se realizó el acarreo de material de desperdicio. Cabe destacar que durante el corte de material se dañaron 3 tuberías de 4" de aguas residuales las cuales fueron reparadas en el momento.

Equipo en el proyecto:


Motoniveladora 140G

Tanque Cisterna

Vibro-compactador



Volquete 5M³

Retra excavadora.




Martes 18/sept/2018

Se continuó con el trabajo de colocación de material selecto y se afinó el cimiento totalmente despijado.




20/sept/2018


Hoja N° 000004

el día de hoy se
terminó de colocar la base en un
100 %




22 / Sept / 2018

Se comenzó el día con un clima soleado, se
repararon tuberías dañadas por la maquinaria, se hicieron
tumbos en la calle pavimentada con la retroexcavadora
para evitar daños en la terracería, también se preparó
todo la cancheta para el encochado de las pastillas.


Ing. Residente

25 / 09 / 2018.

Se comenzaron las actividades en el área de trabajo con lo
que es el encochado con cancheta de 6" un total de
81.03 m², también se colocaron 50.2 m² de
piedra respetando la separación entre las mismas
las pastillas son de 2.50 x 3 x 0.15



Ing. Residente



04 / oct. / 2018

Hoja N° 000006

Se comenzó el día con un clima opaco nublado
se fundieron 4 pastillas 2.50×3.15 y 5 pastillas
de 2.50×2.65 respetando las indicaciones técnicas
con el uso de los materiales y la colocación y fabricación
del concreto, se fundieron 5 mt. de mampostera para
la estabilización del halo sabroso este tiene $5 \times 0.40 \times 0.20$.



Ing. Presidente

15 / oct / 2018

Clima: Nublado por el día con lluvias
el día anterior.

El día de hoy se fundieron 2 pastillas
de 2.65×2.5 y se encofraron bordillos.

Nota: los días 5 y 6 de octubre
no se trabajó por feriado morazaniano
y la feria portuaria, y la semana
del 8 al 13 del presente mes no se
trabajó debido a las fuertes lluvias
las cuales ocasionan saturación e lo
terraceros.




Ing. Supervisor



27/sept/2018

Hoja N° 000005

El día de hoy estuvo soleado.
Es importante mencionar que se rompió un
tubo de $\frac{1}{2}$ el cual provocó que se saturaron
las terracerías por el lado del bordillo.
Se fundieron 2 postillos $2.50 \times 3.15 = 15.75 m^2$
de los cuales se gastó 20.5 bolsa de
cemento y por otra parte se fundieron 2
postillos de $2.5 \times 2.65 = 13.25 m^2$ de los
cuales se gastó 15.50 bolsa de cemento.



Ing. Supervisor



2/oct/2018

El día estuvo soleado.
Debido a las lluvias se estuvo arreglando
material saturado en ciertos tramos de las
barras - se fundieron 2 postillos de 2.5×3.15
y se encofró $31.80 m^2$ con canalote de 6"
y se hidrante el concreto fundido.



Ing. Supervisor




7. Colocación de piedra.




8. Losa de concreto ciclópeo.



5. Suministro y colocación de material selecto.

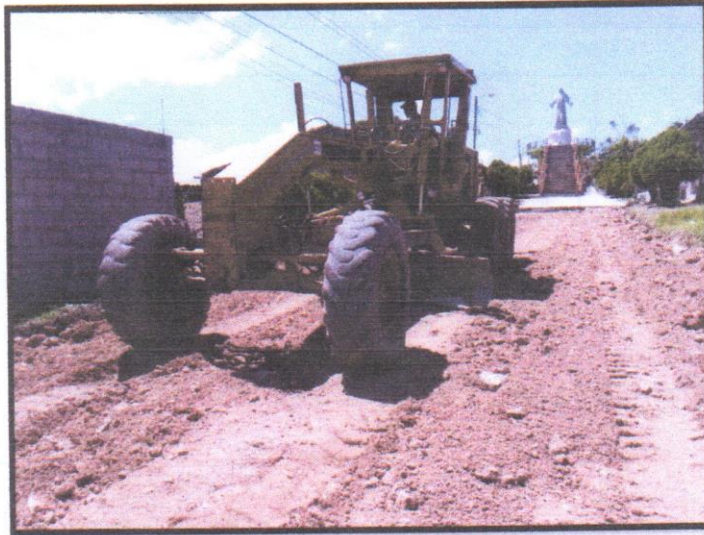

6. Compactación de base.

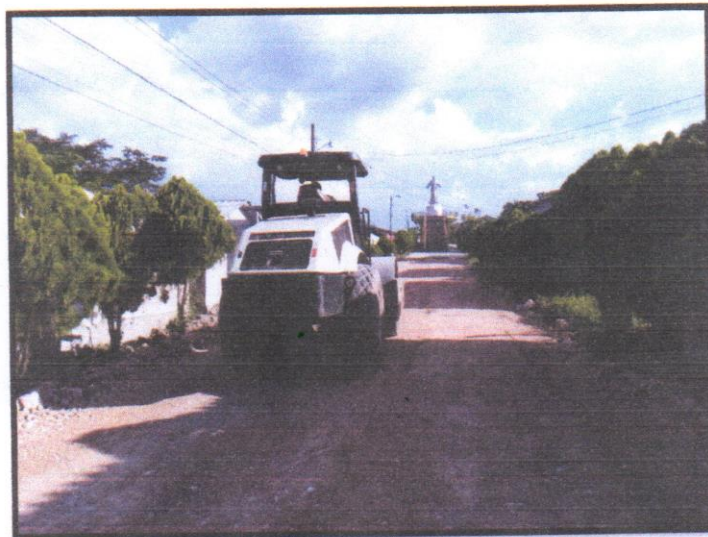

3. Botado de material.




4. Escarificación




WALTER DAVID GUZMAN SALINAS
INGENIERO
CIVIL
18-10-12
24-10-12



9. Curado de losa con aserín.

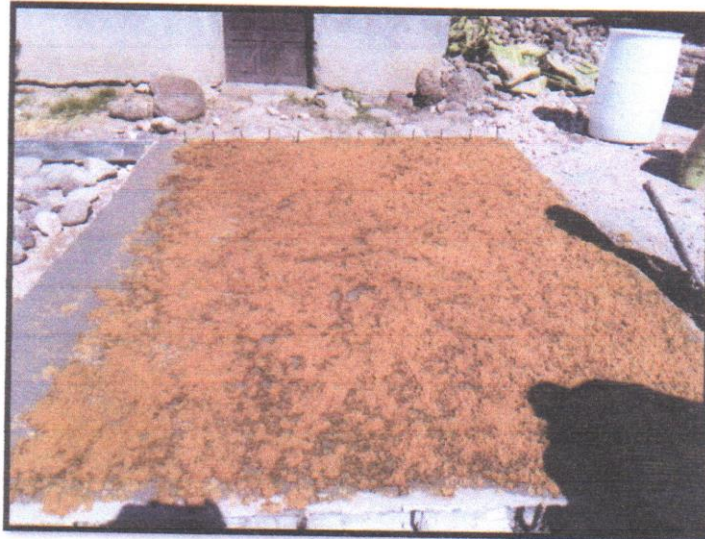




Ing. Walter David Guzman Salinas

Supervisor






CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-54423

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MEDINA CLAROS YESSICA DEL SOCORRO**
Con Registro Tributario Nacional: **12011985004816**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-54423 en fecha 26/10/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25713300602 de fecha 25/09/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201801, según declaración 27717649863, presentada el 27/04/2018, la presente Constancia vence el 31/12/2018.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-18-10500-54423** o mediante el siguiente código QR:

