



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com
cel. 9484-0531



CONSTANCIA

De: María Maricela Hernández López
Unidad Técnica Municipal

Edwin Alexander Sanchez Argueta
Técnico de Proyectos

Para: Nelson Alfredo Gómez Yánez
Oficial de Acceso a la Información Pública

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido a ley de transparencia y Acceso a la Información Pública, remito constancia de fondos ejecutados en proyectos durante el mes de Noviembre para que sea cargada a la plataforma del portal Único de Transparencia.

Y para los fines legales que al interesado estime conveniente se extiende la presente constancia en el Municipio de Colomoncagua departamento de Intibucá a los 30 días del mes de noviembre del año 2018.


Unidad Técnica Municipal




Técnico de Proyectos



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

corp.municolomoncagua@gmail.com

Teléfonos: 9679-0015



Gastos Ejecutados en proyectos en mes de Noviembre

N.	Nombre del Proyecto	Ubicación de proyecto	Proposito	Descripción proyecto	Fuentes de Financiamiento	Monto Presuestado del proyecto	Ampliación de proyecto.	Monto ejecutado en el mes	Estado del proyecto	observaciones
1	Mejoramiento de edificio municipal	barrio san Pedro	Mejorar la infraestructura del edificio municipal	Compra de materiales de construcción, pago por mano de obra	Municipales	300,000.00		23,669.00	En ejecución	
2	Mejoramiento de carretera	Caserío La tejera	Mejorar y dar seguridad a los habitantes de este caserío	Compra de materiales de construcción para caja puesta	Municipales	50,000.00	30254.31	80,187.67	Ejecutado	
3	Muro de constención	LA Travesía	Dar una mayor Seguridad para los habitantes de este barrio	Compra de materiales de construcción.	Municipales	100,000.00		21,000.00	En ejecución	
4	Mejoramiento de vivienda	Todo el Municipio	Dar una mejor calidad a las personas que no tienen recursos suficientes	Compra de materiales para mejoramiento de viviendas de personas de escasos recursos económicos	Municipales	636,057.06	163,745.69	44,785.00	En ejecución	
5	Construcción de cerca de predio escolar	Piedra parada	Construcción de cerca perimetral para dar una mejor infraestructura del centro educativo	Compra de materiales de construcción	Municipales	95,000.00		10,000.00	En ejecución	etapa final
6	Construcción de casa comunal	El Almendro	Construir un lugar donde los habitantes puedan reunirse y realizar sus reuniones	compra de materiales de construcción	Municipales	250,000.00		47,408.00	En ejecución	
7	proyecto compra de transformador y accesorios para sistema de bombeo de agua proyecto los mangos	Llano Grande	Ayudar a las familias que no son beneficiadas con el sistema de agua para que lo puedan tener a través del sistema de agua por bombeo	Compra de materiales de electrificación para poder ejecutar este proyecto	Municipales	100,000.00	15660.68	115,660.68	En ejecución	fase final de la ejecución
8	Construcción de casa comunal	Barrio Nuevo	Construir un lugar donde los habitantes puedan reunirse y realizar sus reuniones	compra de materiales de construcción	Municipales		60,000.00	3,874.00	En ejecución	fase final de la ejecución
9	Mejoramiento de carretera y cerca perimetral, cerca de cementerio	El Castaño I	mejorar la carretera y construir una cerca	Compra de Materiales de construcción,	Municipales	120,000.00		32,674.00	En ejecución	
10	Mejoramiento de carretera	Los Amates	Dar mantenimiento a esta carretera para que se mantenga en buen estado	acarreo de material para dar mantenimiento a la carretera	Municipales	175,000		10,000.00	ejecutado	
11	Construcción de pilas y baños	Potrerosillos	Dar una mejor calidad de vida a los beneficiarios de este proyecto	Compra de materiales de construcción	Municipales	50,000		30,472.00	Ejecutado	

Firma encargado de UTM



Firma encargado de Proyectos



**Informe de Supervisión
Municipalidad de Colomoncagua**

Fecha de Supervisión: 16 de Noviembre del 2018

Hora de llegada al proyecto 10:00 AM Hora de salida 10:00 AM

Nombre del proyecto: Cerca del Predio Escolar

Ubicación: Piedra Parada

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

No encontramos a nadie trabajando lo que
podimos observar es que ya tienen la arena
Piedra y cemento y Sanguiado por donde
van hacer la cerca del predio escolar
pero nos comento ma vicenta que para
el dia Sabado 17 de Noviembre tienen
convocada a todos los habitantes de piedra
Parada para una reunion todo van a elaborar
el rol de trabajo y para mayor evidencia firmas y
toma de fotografias

[Firma]
Firma del Supervisor Asignado

Contratista

ma vicenta Amari
Visto Bueno de:

de _____





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com
Teléfonos: 9484-0531

Municipalidad de Colomoncagua departamento de Intibucá

ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Yo Apolonio Del Cid Guzman Presidente de Patronato de la comunidad de Barrio Nuevo con tarjeta de Identidad: 1003-1958-00006 hago constar que recibí de conformidad los materiales según detalle o/factura comercial., Adjunta No _____

Los cuales que serán utilizados en el Proyecto:

Mejoramiento de Casa Comunal

Cantidad	Descripción:
1	Camionada de Grava (100 cargas)
1	Camionada de arena (100 cargas)
1	camionado de arena (100 cargas)
1000	Bloques de 6 pulgadas
100	bolgas de cemento
(26)	Varillas 3/8 Corrugadas

Para lo cual doy fe a los 01 días del mes de Noviembre del año 2018

[Firma]
Encargado de Proyectos

Apolonio del Cid
Presidente de Patronato



[Firma]
Proveedor



**Informe de Supervisión
Municipalidad de Colomoncagua**

Fecha de Supervisión: 01 de Noviembre 2018

Hora de llegada al proyecto 11:30am Hora de salida 12:20PM

Nombre del proyecto: Mejoramiento de Carretera

Ubicación: El Copinol, Niposoro


Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se supervisó el lugar de donde se está sacando el balastro encontrando en el lugar al operador de máquina Retro-excavadora quien estaba trabajando en la excavación de balastro, La volqueta está regando el balastro en el sector de niposoro y los habitantes lo están regando también se está balastro en el sector de copinol en las partes más feas de la carretera. Firma el operador de la volqueta para dar fe y se agregan fotografías.


Firma del Supervisor Asignado


Contratista

Visto Bueno de:

de _____



**Informe de Supervisión
Municipalidad de Colomoncagua**

Fecha de Supervisión: 06 de noviembre de 2018

Hora de llegada al proyecto 11:30 am Hora de salida 12:00 PM

Nombre del proyecto: Mejoramiento de Casa Comunal

Ubicación: Barrio Nuevo


Descripción del estado en que se encuentra la obra:


En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se supervisó el proyecto de reconstrucción de casa comunal, se encontró en el lugar que se está trabajando en la construcción de los muros de arriague para las paredes. Hay cinco personas de la comunidad trabajando de manera voluntaria en el lugar, se han tomado fotografías para dar evidencia y también firmará el presidente de patronato para dar fe de que se supervisó este proyecto


Firma del Supervisor Asignado


Contratista


Visto Bueno de:
de Presidente de Patronato





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com
Teléfonos: 9980-8430

Acta de Recepción

Yo Magin Gómez mayor de edad, hondureño con Tarjeta de Identidad 1003-1985-00663 en carácter de Presidente de patronato de la comunidad Piedra Parada recibí el siguiente material de construcción:

Cantidad	Descripción de Material	Precio Unitario	Costo Total Lps
2	Camionadas de Arena		
	Ultima línea		

Fecha de entrega: 08 de Noviembre del año 2018.

[Firma]
Firma del Proveedor

Magin Gómez
Firma del presidente de patronato.









ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com




ACTA DE RECEPCION DE MATERIALES

Yo Magin Gomez Presidente de Patronato de
la comunidad de Piedra Parada con tarjeta de Identidad:
1003-1985-00663 hago constar que recibí de conformidad los
materiales según detalle o/factura comercial., Adjunta No _____
Los cuales que serán utilizados en el Proyecto:
Cerca del predio Escolar

Cantidad	Descripción
155	Bolsas de Cemento

Para lo cual doy fe a los 15 días del mes de Noviembre de 2018


Encargado de Proyectos


presidente del Patronato



Firma Proveedor

Fotos de Mejoramiento de Copinol hasta Callejones Parte Inicial







ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com



Municipalidad de Colomoncagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: 15 de Noviembre de 2018

Hora de llegada al proyecto 10:00 am Hora de salida 11:20 am

Nombre del proyecto: Mejoramiento de Carretera

Ubicación: El Apintal

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

- Se superviso el proyecto de carretera el cual se le esta dando continuación despues de haberlo suspendido semanas anteriores debido a las fuertes lluvias las cuales impedian la continuación del proyecto "Mejoramiento de carretera en este sector".
Se está trabajando en este momento desde el desvío de Llano Grande hacia la comunidad de Apintal se encontro al Presidente de Patronato y demas miembros quienes supervisan la ejecución de este proyecto.

Firma del supervisor Asignado

Florencia Benavides

Visto bueno

De Presidente de Patronato

Firma del Contratista

W. M. M. M.

Supervisión de Mejoramiento de carretera en El Apintal





Municipalidad de Colomoncagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: 19 de noviembre de 2018

Hora de llegada al proyecto 12:30 PM Hora de salida 1:00 PM

Nombre del proyecto: Mejoramiento de Carretera

Ubicación: El Apintal

Descripción del estado en que se encuentra la obra:


En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se supervisó este proyecto y se encontró que si se está ejecutando, días anteriores se terminó lo que es el raspado y cunclado de la carretera por lo que en este momento se está balastroando la carretera para que esta este en mejores condiciones. Los habitantes de esta comunidad han salido a regar el balastro por lo que están colaborando al mejoramiento de su carretera. Hay tres volquetas que están regando el balastro y una retro-excavadora, la cual avanza y carga a las volquetas. Muchos habitantes están regando el balastro y manifiestan estar contentos con el proyecto. Se tomaron fotografías y firma de Presidente de Patronato y contratista.


Firma del supervisor Asignado


Contratista


Visto bueno

De Presidente de Patronato.

Fotos de Balastrero de Carretera En La Comunidad Dei Apintai





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

corp.municolomoncagua@gmail.com

Teléfonos: 9795-2403

Municipalidad de Colomoncagua departamento de Intibucá

ACTA DE RECEPCION

Yo Santos Marquez Lemus Presidente de patronato de la
comunidad de El Castaño con tarjeta de
Identidad: 1003-1993-00360 hago constar que recibí de la
Municipalidad de Colomoncagua, Materiales de construcción, los cuales
serán utilizados
en Proyecto Apertura de Carretera y Cerca de Cementerio.

Cantidad	Descripción
<u>40</u>	<u>Tubo galvanizado</u>
<u>8</u>	<u>Rollo Alambre</u>
<u>50</u>	<u>Bloque 6plg</u>
<u>26</u>	<u>Cemento</u>
<u>6</u>	<u>Varilla 3/8 Corrugada</u>
<u>3</u>	<u>Libras de grapa.</u>
<u>5</u>	<u>Libras de alambre.</u>

Para lo cual doy fe a los 26 días del mes de Noviembre del
año 2012


Encargado de Proyectos

Santos Marquez Lemus
Representante de Patronato



Fotos de recepción de Materiales El Castaño







Municipalidad de Colomoncagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: - Lunes 26 de noviembre

Hora de llegada al proyecto 12:15 PM Hora de salida 12:50 PM

Nombre del proyecto: - Muro de Contención en la Cancha


Ubicación: San Miguelito

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

- Se supervisó por primera vez el proyecto Muro de contención en la Cancha de San Miguelito. Se encontró que los habitantes ya han trabajado en la sanjeadura para poder dar comienzo con los arranques del muro. Se supervisó ~~en~~ conjunto con el ingeniero ~~el~~ quien tomó medidas para poder contruir el muro. Se tomó fotografías, y firma el tesorero de patronato, como visto bueno.


Firma del supervisor Asignado

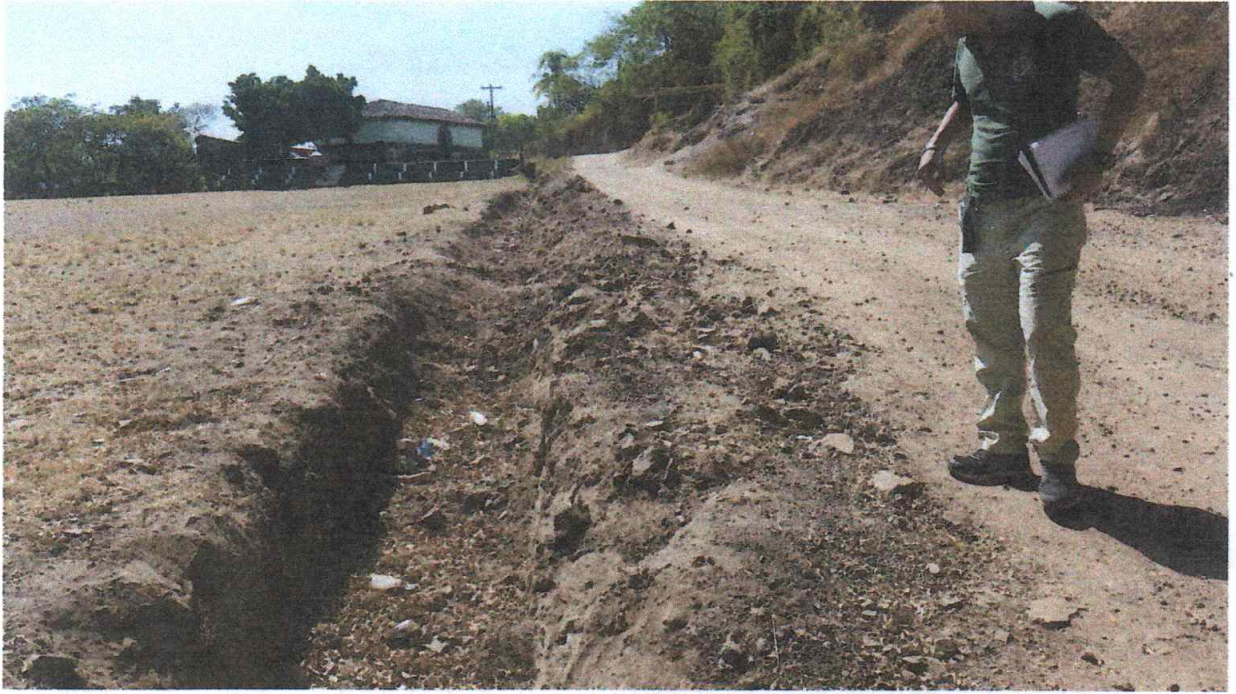
Contratista

Rosmar Marquetti
Visto bueno

De Tesorero Pto.

Fotos por supervisión de proyecto de Muro de Cancha de Futbol en san Miguelito







Municipalidad de Colomoncagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: Lunes 26 de noviembre

Hora de llegada al proyecto 10:00 am Hora de salida 10:45 am.

Nombre del proyecto: Mejoramiento de Centro de Salud

Ubicación: San Miguelito

Descripción del estado en que se encuentra la obra:


En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

El día lunes se supervisó el proyecto mejoramiento de centro de salud con el propósito de sacar mediciones y avance de proyecto, junto al Ingeniero Ever que tomó medidas sobre el avance del muro para cerca de centro de salud.

Se toman fotografías para evidenciar la supervisión del proyecto el cual a estado suspendido por unos días pero se reiniciará en seguida para darlo por finalizado.

Firma Doctor para dar visto bueno de la ejecución de este proyecto.

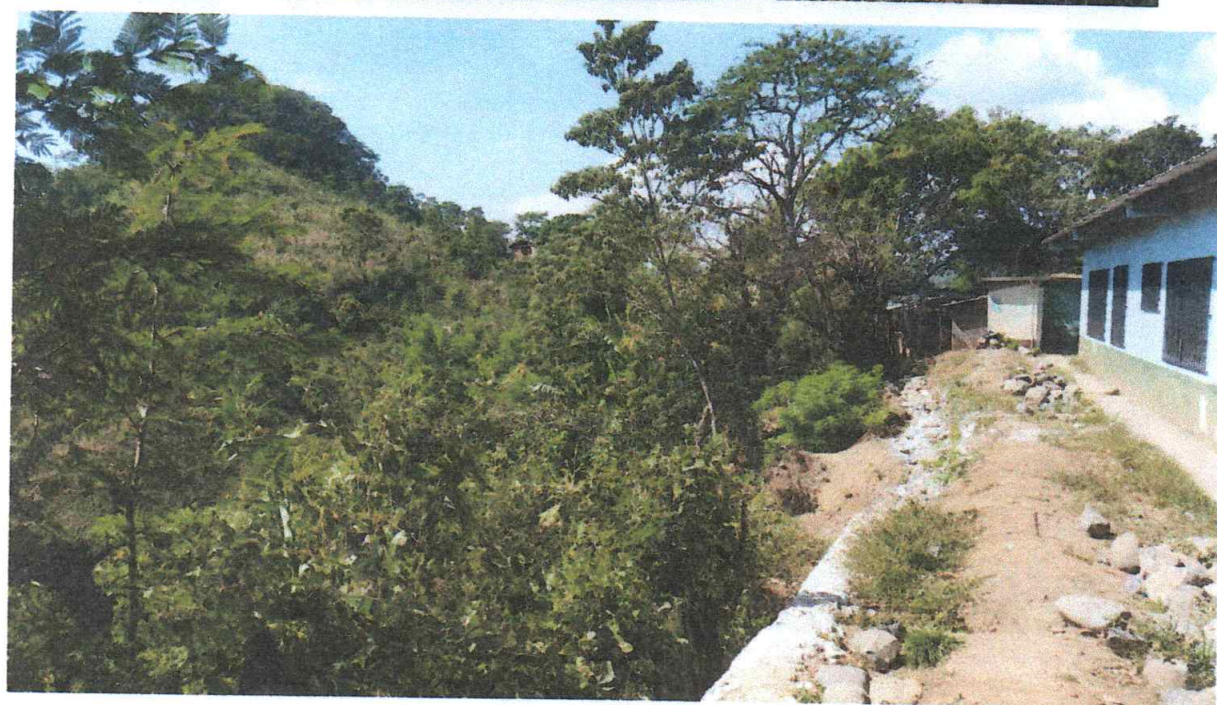

Firma del supervisor Asignado


Contratista


Visto bueno

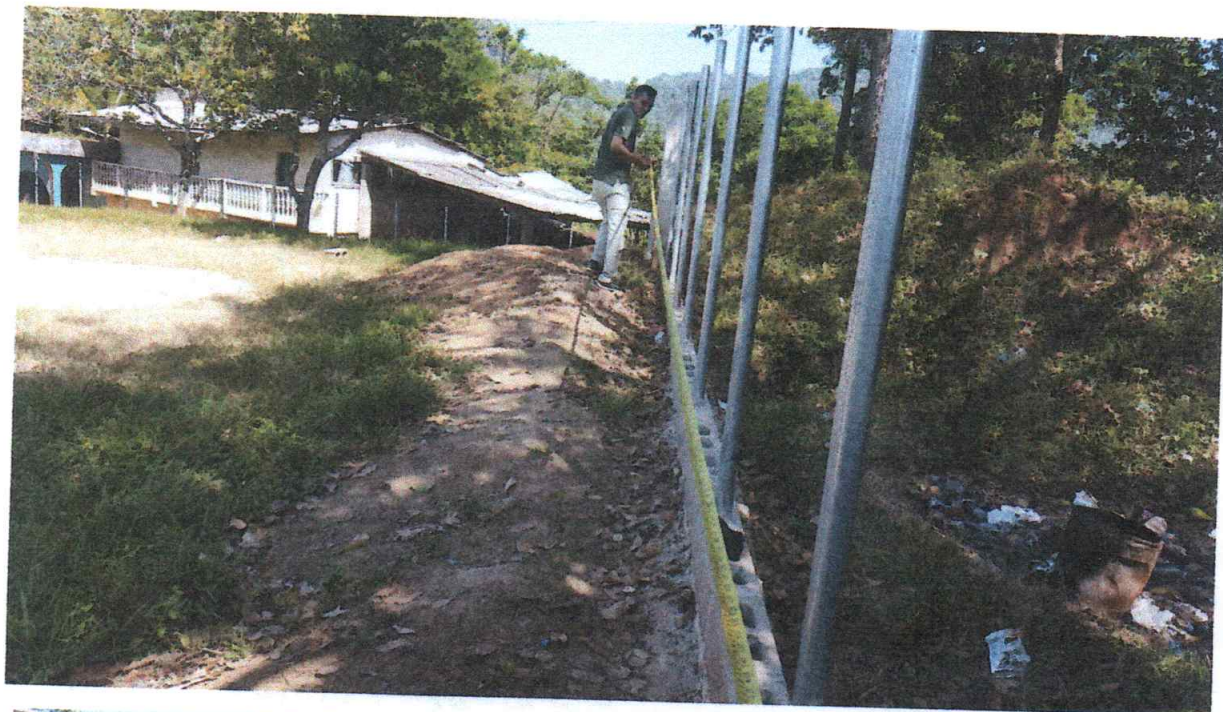
De Doctor.

Fotos por supervisión de proyecto Mejoramiento de Centro de salud



FOTOS DE RECEPCION DE MATERIALES SAN ANTONIO VADOS







Municipalidad de Colomoncagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: 29-11-2018

Hora de llegada al proyecto 9:50 am Hora de salida 11:30 am

Nombre del proyecto: Cerca de predio escolar

Ubicación: Pueblo Viejo

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se supervisó el proyecto construcción de cerca del predio escolar y mejoramiento de cocina comunitaria, los cuales darán comienzo en los próximos días.

Se hizo la ficha de supervisión junto al ingeniero Herrer quien tomó medidas para poder dar inicio al proyecto. Se encontró y nos acompañó durante la visita el vicepresidente y secretario del patronato.

Se tomaron fotografías y se añaden a la ficha para mayor evidencia de la supervisión.

Firma tesoro. Visto bueno secretario de patronato.


Firma del supervisor Asignado

Francisco J. J. J.

Visto bueno

De Vice-presidente, S.

Contratista





**FOTOS DE SUPERVISION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA DE
CENRTO EDUCATIVO Y MEJORAMIENTO DE COCINA COMUNITARIA**





Municipalidad de Colomoncagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: 27 de Noviembre de 2018

Hora de llegada al proyecto 2:00PM Hora de salida 2:50PM

Nombre del proyecto: Construcción de casa Comunal

Ubicación: El Almendro

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se visitó el lugar donde se está ejecutando el proyecto encontrando que este día no están trabajando. Se verificó el avance de la obra estando hasta el momento en un 70% de la finalización del proyecto. La construcción de la casa comunal está avanzando ya que ya se le fundió la terraza. Solo falta construir la galera en la terraza donde se realizarán distintos eventos comunitarios. Se toman fotografías para mayor evidencia de que el proyecto fue supervisado.


Firma del supervisor Asignado

Contratista

Morcelina Lemos
Visto bueno

De Agente Pastoral de Iglesia Católica

**FOTOS DE SUPERVISION DE PROYECTO COSNTRUCCION DE CASA
COMUNAL.**

