



Municipalidad de Santa María, La Paz
Email: munisantamaria@yahoo.com
Tel. 2717-7803

Santa María, La Paz 08 de Enero del 2018

SOLICITUD DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Señor(s):

Diseños, Construcciones y Consultorías (DICONCO) S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C

Su Oficina

Reciban un cordial y respetuoso saludo deseándole muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarles el trámite de la garantía de Cumplimiento de Contrato de obra del Proyecto: **CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS NEGRAS**, Ubicado en **CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ**; CÓDIGO: LPR121701-2018

Esto con el objetivo de asegurar el cumplimiento del contrato del proyecto antes mencionado, dicha garantía será emitida por un valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 39/100 (L. 269,355.39)** equivalente al 15% del valor total del proyecto el cual asciende a **UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 60/100 (L. 1,795,702.60)**

LA GARANTÍA DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Atentamente;


GABINO ARGÜETA GALVEZ
Alcalde Municipal
Municipalidad de Santa María, La Paz



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Santa María, La Paz 08 de Enero del 2018

SOLICITUD DE GARANTIA DE ANTICIPO

Señor(s):

Diseños, Construcciones y Consultorías (DICONCO) S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C

Su Oficina


Reciban un cordial y respetuoso saludo deseándole muchos éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarles el trámite de la garantía de Anticipo de Contrato de obra Proyecto: **CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS NEGRAS**, Ubicado en **CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ**; CÓDIGO: **LPR121701-2018**

Esto con el objetivo de asegurar el anticipo del contrato del proyecto antes mencionado, dicha garantía será emitida por un valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 39/100 (L. 269,355.39)** equivalente al 15% del valor total del proyecto el cual asciende a **UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 60/100 (L. 1,795,702.60)**

LA GARANTÍA DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA DE CIENTO VEINTE (120) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION.

Atentamente;


GABINO ARQUETA GALVEZ
Alcalde Municipal
Municipalidad de Santa María, La Paz



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Santa María, La Paz 08 de Enero del 2018

Señor:

ING CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA

Marcala, La Paz


Su Oficina

Estimado señor Molina;

Por este medio, me dirijo a usted, con referencia a la **LPR- SANTA MARIA-01-2018**, Proyecto: **CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS NEGRAS**, Ubicado en **CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ; CÓDIGO: LPR121701-2018**

Al respecto, me permito comunicarle que la **LICITACION** en mención le ha sido adjudicada a la empresa **Diseños, Construcciones y Consultorías (DICONCO) S. de R.L.** en atención al Dictamen de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto, por un monto evaluado de **UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 60/100 (L. 1,795,702.60)** dicha evaluación se realizó en base a criterios de elegibilidad, experiencia, comprobantes legales, capacidad financiera, disposición de equipo adecuado entre otras, por lo tanto su oferta no fue la mejor evaluada, agradeciendo así mismo su participación en el proceso.

Atentamente;


GABINO ARGUETA GALVEZ
Alcalde Municipal
Santa María, La Paz



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

Santa María, La Paz 08 de Enero del 2018

Señor (s):

Diseños, Construcciones y Consultorías (DICONCO) S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C.

Su Oficina


Estimados señor (s);

Por este medio, me dirijo a usted (s), con referencia a la **LPR- SANTA MARIA-01-2018, PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO PARA AGUAS NEGRAS**, Ubicado en **CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ; CÓDIGO: LPR121701-2018**

Al respecto, me permito comunicarle que la **LICITACION** en mención le ha sido adjudicada en atención al Dictamen de la Comisión de Evaluación nombrada para tal efecto, por un monto evaluado de **UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 60/100 (L. 1,795,702.60)** por lo anterior solicito a usted, pasar por las oficinas de la **MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA**, para recibir la respectiva Solicitud para el trámite de la garantía de Cumplimiento y Anticipo.

Una vez entregada las respectivas garantías se procederá a la firma del Contrato.

Atentamente;


GABINO ARGUETA GALVEZ
Alcalde Municipal
Santa María, La Paz



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09942

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 75750494

Valor Efectivo: _____

Lps. 323.058.-89

PAGUESE A: DICONCO

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trescientos Veintitres mil Cincuenta y ocho 89/100.
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 06	COD. 01	COD. 29

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
06	Infraestructura Municipal	L.	323,058.-89
01	Const. Supervi. obras y vias de com.		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adm. y Mejora edif. Obras Urb.		
465	Const. Adm. y Mejora Sistema Alcantarill.		
29	Construccion Segunda Etapa		
	Alcantarillado Sanitario Aguas		
	Negras / Casco Urbano Sta Maria		
	Pago de Primera Estimacion		
	Avance de obra.		
	TOTAL A PAGAR	L.	323.058.-89

Fecha 12/02/2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) _____

Identidad No. _____

Solvencia No. _____

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 12 de febrero del 2019.

Recibo por: Lps. 323.058.89

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

Trescientos Veintitres mil Cincuenta
y ocho lempiras con 89/100

(Lps. 323.058.89) correspondiente al pago de la Estimación,

01 de Avance de obra del proyecto

Construcción Segunda Etapa Alcantarillado
Sanitario Aguas Negras

Con Numero 29 Ubicado en Casco Urbano Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	L. 423,683.80
-Menos deducción de anticipo	79,440.71
-Menos deducción de ISR	— 0 —
-Menos 5% Calidad de Obra	21,184.19
MONTO NETO A PAGAR	L. 323,058.89

Firma del Contratista: [Firma]

Nombre del cotrastista: FONOTO RUIPIS

Identidad #:

0801-1960-00325



11-304-000001-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
9065-2258
2754-8870


CHEQUE No. 75150494


PLANES, LA PAZ 12 Febrero 2019
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de DICONCO L 323,058.89

=Trescientos Veintitres mil Cincuenta y ocho con 89/100
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆75⑆50494

22





Barrio Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, 1/2 cuadra al norte
Gasolinera Puma Guadalupe, Casa # 123.

Fecha: 12/02/2019

FACTURA

Nº 000-001-01-00000115

Tegicigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Correo: diconco@yahoo.es

Tel: (504) 2220-5600

R.T.N.: 08019008162208

CAI: 5326D5-4843DB-DF479C-692AD9-A8DA2C-63

Fecha Limite de Emision: 12/07/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA	OBRAS REALIZADA/SERVICIO PRESTADO
Domicilio: DEPIO DE LA PAZ	CONSTRUCCION
Ciudad: CAI:	SEGUNDA ETAPA
RTN:	ALCANTARILLADO SANITA- RIO RIO MUJOS NEGROS

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	POZO DE ESTIMACION N°1		323,058.89
	DEL PROYECTO "CONSTRUCCION		
	SEGUNDA ETAPA DEL		
	ALCANTARILLADO SANITARIO		
	MUJOS NEGROS EN EL		
	MUNICIPIO DE SANTA		
	MARIA DEPIO DE LA PAZ		
	SON: TRECIENTOS VEINTE TRES		
	MIL CINCUENTA Y OCHO		
	CON 89/100		

Forma de pago:

Firma



Valor Exento L.

Valor Gravado L.

15% Imp. S/V L.

Total a Pagar L. 323,058.89

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"Esta factura no es valida sin sello y firma autorizada"

IMPRESA Y PAPELERIA DAYMON TEL: 2238-6078 RTN: 08019999409878 CERTIFICADO: 9231-15-10500-119

La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	LPR121701-2018				
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS				
DEPARTAMENTO:	LA PAZ				
MUNICIPIO:	SANTA MARIA				
ALDEA:	CASCO URBANO SANTA MARIA, LA PAZ				
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	PRIMERA ESTIMACION DEL:	26/01/19	AL:	11/02/19
CREDITO:	LPS				
Monto Inicial de Contrato	1795,702.60				
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	0.00				
Anticipo del 15% del Monto del Contrato	269,355.39				
Monto Acumulado por O/C					
Monto Acumulado por Adendum					
Monto Final	1795,702.60				
Monto de Primera Estimacion	423,683.80				

VoBo

SUPERVISOR MUNICIPALIDAD

	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	23.59%	1.25	29%	269,355.39	79,440.71
				1795,702.60	

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PERIODO	I.S.R 12.5%
EJECUTOR CON CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA				

	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
Retencion de Calidad de obra	1.050	5.00%	423,683.80	
			1795,702.60	

RESUMEN

Monto Estimado	423,683.80
Menos Deducion de Anticipo	79,440.71
Menos Deducion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	21,184.19
TOTAL A PAGAR PRIMERA ESTIMACION	323,058.89

Monto del Anticipo	269,355.39	100.00%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	79,440.71	29.49%
TOTAL AMORTIZADO	79,440.71	29.49%
FALTA POR AMORTIZAR	189,914.68	70.51%

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 12 de febrero del 2019.

GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA LA PAZ
Su oficina.


Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **CONSTRUCCION II ETAPA
ALCANTARILLADO SANITARIO DE
AGUAS NEGRAS, CASCO URBANO SANTA
MARIA, LA PAZ.**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la Municipalidad de Santa María, La Paz. me permito entregar el INFORME N°1, del proyecto en mención; comprende el periodo del 26 de ENERO al 11 de FEBRERO del 2019.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.


ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
UNIDAD DE PROYECTOS.
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803



RESUMEN EJECUTIVO

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION II ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS NEGRAS			
UBICACIÓN:	CASCO URBANO SANTA MARIA, LA PAZ			
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:	El proyecto consiste en la construcción de una etapa del sistema de alcantarillado sanitario, incluyendo la planta de tratamiento esta en su primera etapa consiste en construcción del DESARENADOR, REACTOR ANAEROBIO, MUROS DE RETENCION. En una primera etapa la cual se le dará el tratamiento primario del tratamiento. Por las condiciones topográficas del sitio donde se ubica la comunidad de Santa María, se ha diseñado el sistema de alcantarillado sanitario utilizando metodología convencional.			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de La Unidad De Proyectos De La Municipalidad en acompañamiento de mancomunidad MAMCEPAZ.			
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L. 1,795,702.60	L. 1,795,702.60	L. 0.00	L. 1,795,702.60
COSTO DE SUPERVISION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L. 1,795,702.60

1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR:	DICONCO S, DE R.L.
SUPERVISION	UNIDAD DE PROYECTOS ALCALDIA MUNICIPAL: ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	15 DE ENERO DEL 2019
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	15 DE ENERO DEL 2019

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



FECHA DE ORDEN DE INICIO	26 DE ENERO DEL 2019
PLAZO CONTRACTUAL	120 días
FECHA DE FINALIZACION	26 DE MAYO DEL 2019

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA: se prepara el informe que corresponde a la estimación número uno del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 24% del proyecto de las actividades contratadas como ser:

PRESENTANDO UN AVANCE FÍSICO DE UN 24%

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.

FOTOGRAFIAS





FOTOS I ESTIMACION PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS

Observación fotografía Superior En la fotografías superiores podemos observar el relleno y compactado con material Selecto y Relleno compactado con Material de Sitio de la calle #7



Observación fotografía Inferior En la fotografías Inferiores podemos observar la Actividad de Cajas de las Acometidas Domiciliarias y construcción de Pozos de Inspeccion de la Calle #7

FOTOGRAFIAS

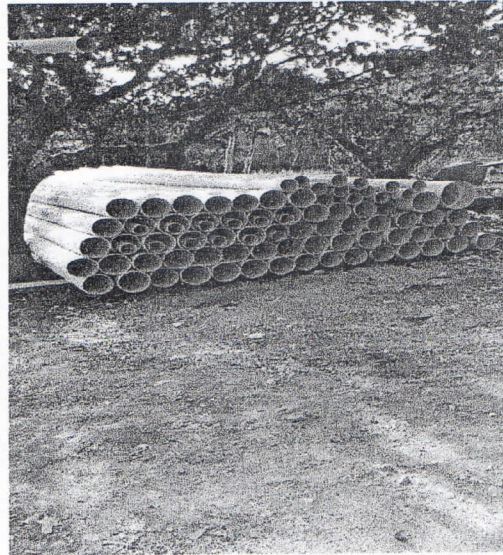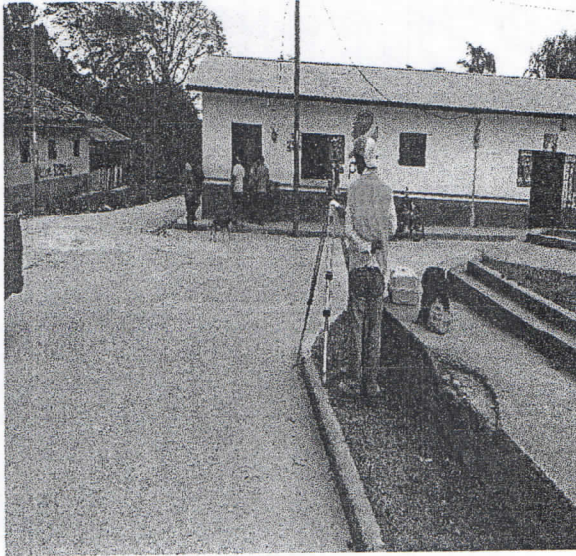

FOTOS I ESTIMACION PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS


Observación fotografía Superior En la fotografías superiores podemos observar la actividad de Trazado y Marcado Realizando el respectivo Replanteo Topografico con Estacion Total. Y Suministro de Tuberia PVC de 6" , 4" , 3" Y 2"



Observación fotografía Inferior

En la fotografías Inferiores podemos observar la actividad de excavacion en Calle #7 del proyecto.

FOTOGRAFIAS

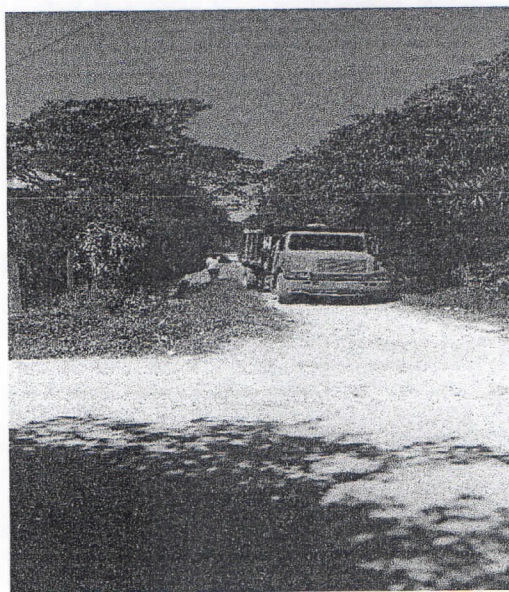

FOTOS I ESTIMACION PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS

Observación fotografía Superior En la fotografías superiores podemos observar el acarreo de los diferentes materiales como ser Arena y Material Selecto para la elaboracion de los trabajos.



Observación fotografía Inferior
Excavacion en Avenida #7

En la fotografías Inferiores podemos observar que se ha realizado la actividad de



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019008162208

DICONCO S DE R L
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores

Prestamista
Fecha de Emisión: 201111100

Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002 Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 869423

Transacción: 14B8CB

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08011960003253

RODOLFO RAUDALES MARADIAGA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores

Fecha de Emisión: 20130225

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 de 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97 Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1280648

Transacción: BABAB5



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RODOLFO RAUDALES MARADIAGA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 19 ENERO 1960
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 02 ABRIL 1997

0801-1960-00325



02193917-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Raudales
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

RODOLFO / RAUDALES MARADIAGA
0801-1960-00325





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-6865

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DICONCO S DE R L**

Con Registro Tributario Nacional: **08019008162208**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-6865 en fecha 14/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417494855 de fecha 14/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.


ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35735346080, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-6865** o mediante el siguiente código QR:



Hoja Nº 000001

2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -0.5$

[illegible]

collezione se questo è quello che desideriamo
e della de. Teodoros il solo del progetto.

En esta fecha se realizaron los trabajos correspondientes a la extracción de material suelto en un banco de material ubicado entre Santa María de la Cruz y San José de la Cruz donde por intermedio por parte de la Municipalidad de Santa María que el material es apto para los trabajos a realizar. También en esta fecha se comenzaron trabajos de excavación en el lugar donde se ubica la planta de Tratamiento de aguas Residuales.

1940

Bitácora N.º 029349

ORIGINAL EN EXPEDIENTE

30 de mayo del 2019

Hoja Nº 000002

Este día se realizó la excavación
con retroexcavadora en la calle #7

del pozo 21 existente al pozo #14, colocando cinta
de precaución para evitar accidentes, se sostuvo

una reunión reunida por parte de la municipalidad de
Santa María representada por el Ing. Fernando y por parte de

el dueño con el Ingeniero Benjamín Castellanos con respecto
a posibles mal entendidos con una de las colindantes

donde se ubica la planta de tratamiento, solicitando así
por parte de la municipalidad detener los trabajos de excavación

en este día, hasta poder resolver el mal entendido con
el vecino colindante. Pasando así a realizar trabajos en calle de
acceso a la planta solicitada por municipalidad.

Se Visto El Acta

en la que se va

a construir planta de


tratamiento. Por lo tanto

se suspenden las obras de

obra de acceso que

los límites de propiedad se

estaban respetando


Ing. Luis AMADOR

ORIGINAL EN EXPEDIENTE

Periodo del 30 de Enero del 2019
al 1 de Febrero del 2019

Hoja Nº 000003

En estas días se realizaron las
excavaciones del Pozo #19 y Avenida #7 así como
sus respectivas actividades complementarias.

29

Periodo del 1 de Febrero al 5 de Febrero del 2019
en estos días se continuaron con las excavaciones en la
zona del Pozo #19 al Pozo #17 de la Avenida #7.
También se continuaron las actividades de excavación en la
planta de Tratamiento, obteniendo el permiso para poder hacer
un acceso desde los terrenos colindantes a la planta
pertencientes a Toluca y Zucua con quienes se
firmó una repetida reunión acordándonos el ingreso
firmado por parte de la Municipalidad de Santa María de la
Paz con dicha reunión se dejó estipulado la delimitación
de la zona excavadora por los terrenos colindantes, así como
a la misma cabe mencionar que la zona excavadora
se utilizará en esta zona con el fin de utilizar
los trabajos de excavación también se realizaron trabajos
de instalación de tubería en la calle #7 como
se especifica una de 3m de diámetro, tubería compactada
con material selecto, tubería compactada con material de
sello, tubería de inspección, tubería de registro de calle #7.
También se realizó una visita solicitando al representante
de la UPA el permiso correspondiente para retirar archivos
que se encuentran en la zona de construcción de la planta de
Tratamiento.

29

Bitácora Nº 029349

ORIGINAL EN EXPEDIENTE

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE LA PAZ												
PROYECTO:			CONSTRUCCION II ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS									
UBICACIÓN:			CASCO URBANO SANTA MARIA, LA PAZ									
EJECUTOR:			DICONCO S, DE R.L.									
CODIGO:			LPR121701-2018									
ESTIMACIO Nº			1									
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
A. MODULO TRAMO: CENTRO SALUD - COMERCIAL H. H (CALLE #5)												
1	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	109.15	L 15.61	L 1,703.83		L -	109.15	L 1,703.83	109.15	L 1,703.83	100%
2	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	116.76	L 555.00	L 64,801.80		L -		L -	0	L -	0%
3	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	63.05	L 225.56	L 14,221.56		L -		L -	0	L -	0%
4	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	3.17	L 869.20	L 2,755.36		L -		L -	0	L -	0%
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	46.70	L 413.11	L 19,292.24		L -		L -	0	L -	0%
6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	70.06	L 61.33	L 4,296.78		L -		L -	0	L -	0%
7	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	mL	105.55	L 212.25	L 22,402.99		L -	105.55	L 22,402.99	105.55	L 22,402.99	100%
8	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	mL	105.55	L 36.25	L 3,826.19		L -		L -	0	L -	0%
9	POZO #15 DE ALCANTARILLADO H= 1.5M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 14,453.68	L 14,453.68		L -		L -	0	L -	0%
10	POZO #16 DE ALCANTARILLADO H= 1.5M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 14,453.68	L 14,453.68		L -		L -	0	L -	0%
11	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	109.15	L 29.60	L 3,230.84		L -		L -	0	L -	0%
SUB TOTAL- A. MODULO TRAMO: CENTRO SALUD - COMERCIAL H. H (CALLE #5)					L 165,438.95	L -	L -	24,106.82	L -	24,106.82	15%	
B. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #5												
12	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	32	L 15.61	L 499.52		L -	24	L 374.64	24	L 374.64	75%
13	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	20.67	L 555.00	L 11,471.85		L -		L -	0	L -	0%
14	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	0.96	L 869.20	L 834.43		L -		L -	0	L -	0%
15	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	11.66	L 225.56	L 2,630.03		L -		L -	0	L -	0%
16	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	mL	32	L 98.21	L 3,142.72		L -	32	L 3,142.72	32	L 3,142.72	100%
17	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	mL	32	L 25.69	L 822.08		L -		L -	0	L -	0%
18	YEE DE PVC DE 4"X6"X6" (SUM E INST)	Unid	8	L 398.10	L 3,184.80		L -		L -	0	L -	0%
19	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	8.64	L 413.11	L 3,569.27		L -		L -	0	L -	0%
20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	7.68	L 61.33	L 471.01		L -		L -	0	L -	0%
21	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	8	L 2,209.63	L 17,677.04		L -		L -	0	L -	0%
22	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	32	L 29.60	L 947.20		L -		L -	0	L -	0%
SUB TOTAL- B. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #5					L 45,249.96	L -	L -	3,517.36	L -	3,517.36	8%	
C. MODULO TRAMO: ESQUINA COMERCIAL H.H -ESQUINA CASA DON TACHO (AVENIDA #7)												
23	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	157	L 15.61	L 2,450.77		L -	157	L 2,450.77	157	L 2,450.77	100%
24	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	165.67	L 555.00	L 91,946.85		L -	123.28	L 68,420.40	123.28	L 68,420.40	74%
25	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	89.46	L 225.56	L 20,178.60		L -		L -	0	L -	0%
26	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	4.6	L 869.20	L 3,998.32		L -	1.92	L 1,668.86	1.92	L 1,668.86	42%
27	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	66.27	L 413.11	L 27,376.80		L -	17.18	L 7,097.23	17.18	L 7,097.23	26%
28	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	99.4	L 61.33	L 6,096.20		L -	56.34	L 3,455.33	56.34	L 3,455.33	57%
29	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	mL	153.4	L 212.25	L 32,559.15		L -	153.4	L 32,559.15	153.4	L 32,559.15	100%
30	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	mL	153.4	L 36.25	L 5,560.75		L -	64	L 2,320.00	64	L 2,320.00	42%
31	POZO #17 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1	L 22,586.65	L 22,586.65		L -		L -	0	L -	0%



32	POZO #18 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1	L 22,586.65	L 22,586.65		L -	1	L 22,586.65	1	L 22,586.65	100%
33	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	153.4	L 29.60	L 4,540.64		L -		L -	0	L -	0%
SUB TOTAL- C. MODULO TRAMO: ESQUINA COMERCIAL H.H -ESQUINA CASA DON TACHO (AVENIDA #7)					L 239,881.38		L -		L 140,558.40		L 140,558.40	59%
D. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AVENIDA #7												
34	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	28	L 15.61	L 437.08		L -	28	L 437.08	28	L 437.08	100%
35	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	18.09	L 555.00	L 10,039.95		L -	16.2	L 8,991.00	16.2	L 8,991.00	90%
36	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	0.84	L 869.20	L 730.13		L -	0.72	L 625.82	0.72	L 625.82	86%
37	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	19.28	L 225.56	L 4,348.80		L -		L -	0	L -	0%
38	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	mL	28	L 98.21	L 2,749.88		L -	28	L 2,749.88	28	L 2,749.88	100%
39	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	mL	28	L 25.69	L 719.32		L -	24	L 616.56	24	L 616.56	86%
40	YEE DE PVC DE 4"X6"X6" (SUM E INST)	Unid	7	L 398.10	L 2,786.70		L -	6	L 2,388.60	6	L 2,388.60	86%
41	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	7.56	L 413.11	L 3,123.11		L -	5.04	L 2,082.07	5.04	L 2,082.07	67%
42	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	6.72	L 61.33	L 412.14		L -	5.76	L 353.26	5.76	L 353.26	86%
43	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	7	L 2,209.63	L 15,467.41		L -	6	L 13,257.78	6	L 13,257.78	86%
44	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	28	L 29.60	L 828.80		L -		L -	0	L -	0%
SUB TOTAL- D. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AVENIDA #7					L 41,643.31		L -		L 31,502.06		L 31,502.06	76%
E. MODULO TRAMO: ESQUINA CASA DON TACHO HASTA POZO EXISTENTE FRENTE A CASA DON GABINO (CALLE #7)												
45	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	105.72	L 15.61	L 1,650.29		L -	105.72	L 1,650.29	105.72	L 1,650.29	100%
46	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	105.3	L 555.00	L 58,441.50		L -	73.71	L 40,909.05	73.71	L 40,909.05	70%
47	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	56.86	L 225.56	L 12,825.34		L -	56.86	L 12,825.34	56.86	L 12,825.34	100%
48	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	3.06	L 869.20	L 2,659.75		L -	3.06	L 2,659.75	3.06	L 2,659.75	100%
49	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	42.12	L 413.11	L 17,400.19		L -	42.12	L 17,400.19	42.12	L 17,400.19	100%
50	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	63.18	L 61.33	L 3,874.83		L -	63.18	L 3,874.83	63.18	L 3,874.83	100%
51	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	mL	102.12	L 212.25	L 21,674.97		L -	102.12	L 21,674.97	102.12	L 21,674.97	100%
52	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	mL	102.12	L 36.25	L 3,701.85		L -	102.12	L 3,701.85	102.12	L 3,701.85	100%
53	POZO #19 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1	L 22,586.65	L 22,586.65		L -	1	L 22,586.65	1	L 22,586.65	100%
54	POZO #20 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1	L 22,586.65	L 22,586.65		L -	1	L 22,586.65	1	L 22,586.65	100%
55	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	105.72	L 29.60	L 3,129.31		L -		L -	0	L -	0%
SUB TOTAL- E. MODULO TRAMO: ESQUINA CASA DON TACHO HASTA POZO EXISTENTE FRENTE A CASA DON GABINO (CALLE #7)					L 170,531.34		L -		L 149,869.58		L 149,869.58	88%
F. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #7												
56	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	16	L 15.61	L 249.76		L -	8	L 124.88	8	L 124.88	50%
57	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	10.33	L 555.00	L 5,733.15		L -	5.165	L 2,866.58	5.165	L 2,866.58	50%
58	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	0.48	L 869.20	L 417.22		L -	0.24	L 208.61	0.24	L 208.61	50%
59	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	5.83	L 225.56	L 1,315.01		L -	2.915	L 657.51	2.915	L 657.51	50%
60	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	mL	16	L 98.21	L 1,571.36		L -	8	L 785.68	8	L 785.68	50%
61	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	mL	16	L 25.69	L 411.04		L -	8	L 205.52	8	L 205.52	50%
62	YEE DE PVC DE 4"X6"X6" (SUM E INST)	Unid	4	L 398.10	L 1,592.40		L -	2	L 796.20	2	L 796.20	50%
63	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	4.32	L 413.11	L 1,784.64		L -	2.16	L 892.32	2.16	L 892.32	50%
64	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	3.84	L 61.33	L 235.51		L -	1.92	L 117.75	1.92	L 117.75	50%
65	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	4	L 2,209.63	L 8,838.52		L -	2	L 4,419.26	2	L 4,419.26	50%
66	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	16	L 29.60	L 473.60		L -	0	L -	0	L -	0%
SUB TOTAL- F. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #7					L 22,622.20		L -		L 11,074.30		L 11,074.30	49%

22-

G. DESARENADOR												
67	TRAZADO Y MARCADO	mL	31.22	L 20.13	L 628.46		L -	31.22	L 628.46	31.22	L 628.46	100%
68	EXCAVACION DE MATERIAL CON CANTERO SUELO DURO	m3	34.05	L 795.00	L 27,069.75		L -		L -	0	L -	0%
69	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	5.34	L 1,936.73	L 10,342.14		L -		L -	0	L -	0%
70	LOSA E=15 CM, #4 @ 0.20 A.S. DOBLE PETATE	m2	8.92	L 1,163.67	L 10,379.94		L -		L -	0	L -	0%
71	PARED DE BLOQUE 15 CM, RELLENO, 1#3 @20 Y 1#3@ 2 HILADAS	m2	20.13	L 800.00	L 16,104.00		L -		L -	0	L -	0%
72	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	m2	28.76	L 235.01	L 6,758.89		L -		L -	0	L -	0%
73	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2CM MORTERO DE 1:4	m2	18.21	L 184.88	L 3,366.66		L -		L -	0	L -	0%
74	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	m2	27.97	L 206.67	L 5,780.56		L -		L -	0	L -	0%
75	COMPUERTA METALICA PARA CANAL	Unid	4	L 4,600.00	L 18,400.00		L -		L -	0	L -	0%
76	REJILLA METALICA DESARENADOR	Unid	1	L 6,670.00	L 6,670.00		L -		L -	0	L -	0%
77	MEDIDOR PARSHAL (PREFABRICADO)	Unid	1	L 37,950.00	L 37,950.00		L -		L -	0	L -	0%
78	LOSA DE CONCRETO e=5 cm #3@30 cm A/S.	m2	0.25	L 554.00	L 138.50		L -		L -	0	L -	0%
79	ACERA DE CONC. e=7.5cm,#2@20cm A.S. CONC 1:2:2	m2	23.83	L 415.00	L 9,889.45		L -		L -	0	L -	0%
SUB TOTAL- G. DESARENADOR					L 153,478.35		L -		L 628.46		L 628.46	0%
H. REACTOR ANAEROBIO												
80	TRAZADO Y MARCADO	mL	19	L 20.13	L 382.47		L -	19	L 382.47	19	L 382.47	100%
81	EXCAVACION DE MATERIAL CON CANTERO SUELO DURO	m3	72	L 795.00	L 57,240.00		L -		L -	0	L -	0%
82	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	9.1	L 1,936.73	L 17,624.24		L -		L -	0	L -	0%
83	ZAPATA AISLADA 0.60 x 0.60, e=0.20 , 8 N°4, a.s.	Unid	1	L 677.15	L 677.15		L -		L -	0	L -	0%
84	LOSA INFERIOR E=30CM, #5@25CM A.S SUP/INF	m2	22.75	L 1,859.21	L 42,297.03		L -		L -	0	L -	0%
85	LOSA DE CONCRETO e=10 CM #3 @15 CM A/S.	m2	22.75	L 669.33	L 15,227.26		L -		L -	0	L -	0%
86	PARED DE CONCRETO e=15CM 2#4@20 A/S Y #4@40 A/S	m2	93.1	L 1,734.21	L 161,454.95		L -		L -	0	L -	0%
87	VIGA TRIANGULAR B=1.06M, P=0.41, 6#4, #2@15 CM	mL	12	L 977.36	L 11,728.32		L -		L -	0	L -	0%
88	SEPARADOR TRIFACICO + CANAL RECOLECTOR INT DETALLE	mL	6	L 7,322.31	L 43,933.86		L -		L -	0	L -	0%
89	CANAL DE SALIDA #3@15 A.S, B 0.55 E=15, P=0.71E=10	mL	3.5	L 1,850.21	L 6,475.74		L -		L -	0	L -	0%
90	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	m2	115.85	L 206.67	L 23,942.72		L -		L -	0	L -	0%
91	IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO	m2	115.85	L 174.90	L 20,262.17		L -		L -	0	L -	0%
92	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	1	L 2,209.63	L 2,209.63		L -		L -	0	L -	0%
93	ESCOTILLA DE MANTENIMIENTO	Unid	1	L 25,829.00	L 25,829.00		L -		L -	0	L -	0%
94	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	mL	10	L 32.62	L 326.20		L -	10	L 326.20	10	L 326.20	100%
95	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	mL	10	L 18.87	L 188.70		L -		L -	0	L -	0%
96	SUM E INST. TUBERIA PVC DE 6" RD-41	mL	6	L 248.49	L 1,490.94		L -		L -	0	L -	0%
97	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	mL	6	L 36.25	L 217.50		L -		L -	0	L -	0%
98	ACCESORIOS SISTEMA EXTRACCION DE NATAS	glb	1	L 1,048.65	L 1,048.65		L -		L -	0	L -	0%
99	ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE LODOS, MUESTREOS Y VACIADO DEL REACTOR (SUM/ INST)	gLb	1	L 7,947.65	L 7,947.65		L -		L -	0	L -	0%
100	ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES DEL REACTOR (SUM/ INST)	glb	1	L 748.37	L 748.37		L -		L -	0	L -	0%
101	ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE AGUA DEL REACTOR (SUM/ INST)	glb	1	L 268.30	L 268.30		L -		L -	0	L -	0%
102	ACCESORIOS REACTOR INGRESO DE AGUA (SUM/ INST)	glb	1	L 6,626.30	L 6,626.30		L -		L -	0	L -	0%

22-

SUB TOTAL- H. REACTOR ANAEROBIO					L	448,147.14		L	-		L	708.67		L	708.67	0%	
I. MUROS DE RETENCION																	
103	TRAZADO Y MARCADO	mL	57.5	L	20.13	L	1,157.48		L	-	57.5	L	1,157.48	57.5	L	1,157.48	100%
104	EXCAVACION DE MATERIAL CON CANTERO SUELO DURO	m3	177.5	L	795.00	L	141,112.50		L	-	106.5	L	84,667.50	106.5	L	84,667.50	60%
105	MURO DE MAMPOSTERIA	m3	182.12	L	2,012.08	L	366,440.01		L	-		L	-	0	L	-	0%
SUB TOTAL- I. MUROS DE RETENCION						L	508,709.98		L	-		L	85,824.98		L	85,824.98	17%
SUB TOTAL					L	1795,702.60		L	-	L	423,683.80		L	423,683.80		24%	
RETENCION DE CALIDAD DE OBRA PRIMERA 5%					L	89,785.13		L	-	L	21,184.19		L			21,184.19	
RETENCION DE ANTICIPO 15%					L	269,355.39		L	-	L	79,440.71		L			79,440.71	
RETENCION DE ISR EN MANO DE OBRA 12.5%					L	-		L	-	L	-		L			-	
RETENCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 15%					L	-		L	-	L	-		L			-	
MONTO A PAGAR PRIMERA ESTIMACION					L	1436,562.08		L	-	L	323,058.89		L			323,058.89	

EJECUTOR		SUPERVISION MAMGEPAZ		ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA DE SANTA MARIA	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE: DICONCO S. DE R.L.		NOMBRE: LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO		NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ	
FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2019		FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2019		FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2019	



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 09975

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

Orden de Pago No. _____

Cheque No. 75750542

Valor Efectivo: _____

Lps. 299,597.94

PAGUESE A:

DICONCO

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Doscientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Noventa y cinco
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS. con 94/100

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>06</u>	COD. <u>01</u>	COD. <u>29</u>

Gasto Corriente _____

Gasto de Inversión Social _____

Gasto por Deuda Pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>06</u>	<u>Infraestructura Municipal</u>	<u>1.</u>	<u>299,597.94</u>
<u>01</u>	<u>Const. Supervi. Obras y vias de Com.</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes Capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const. Adición y Mejora Edif. Obras U.</u>		
<u>465</u>	<u>Const. Adición y Mejora Sistema Alcantarill.</u>		
<u>29</u>	<u>Construcción Segunda Etapa Alcan-</u>		
	<u>tarrillado Sanitario Aguas Negras /</u>		
	<u>Casco Urbano. Sta. Maria.</u>		
	<u>Pago de Segunda Estimación</u>		
	<u>de avance de obra.</u>		
	TOTAL A PAGAR	<u>1.</u>	<u>299,597.94</u>

Fecha 28-02-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (R) _____

Identidad No. 0801-1960-00325

Solvencia No. 689813

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 28 de Febrero del 2019.

Recibo por: Lps. 299,597.94

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

Doscientos Noventa y Nueve mil Quinientos
Noventa y siete con 94/100

(Lps. 299,597.94) correspondiente al pago de la Estimación,

02 de Avance de obra del proyecto

construcción segunda etapa Alcantarillado
Sanitario Aguas Negras

Con Numero 29 Ubicado en Casco Urbano Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.


Desglose del pago

MONTO ESTIMADO	<u>392,915.33</u>
-Menos deducción de anticipo	<u>73,671.62</u>
-Menos deducción de ISR	
-Menos 5% Calidad de Obra	<u>19,645.77</u>
MONTO NETO A PAGAR	<u>299,597.94</u>

Firma del Contratista: 

Nombre del cotrastista: Rodolfo Fuentes

Identidad #: 0801- 1960- 00325





Barrio Guadalupe, Ave. Juan Manuel Galvez, 1/2 cuadra al norte
Gasolinera Puma Guadalupe, Casa # 123.

Fecha: 28 / FEB / 2019

Tegicigalpa M.D.C., Honduras, C.A.

Correo: diconco@yahoo.es

Tel: (504) 2220-5600

R.T.N.: 08019008162208

CAI: 5326D5-4843DB-DF479C-692AD9-A8DA2C-63

Fecha Limite de Emision: 12/07/2019

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00000101 AL 000-001-01-00000150

FACTURA

Nº 000-001-01-00000118

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA	OBRAS REALIZADA/SERVICIO PRESTADO
Domicilio: DEPTO DE LA PAZ	CONSTRUCCION SEGUINDA
Ciudad: CAI:	ETAPA ACAPULCANO
RTN:	SANITARIO AGUAS NEGRAS

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
	PAGO DE ESTIMACION N°2		299,597.94
	DEL PROYECTO "CONSTRUCCION		
	SEGUNDA ETAPA DEL		
	ACAPULCANO SANITARIO		
	AGUAS NEGRAS EN EL		
	MUNICIPIO DE SANTA		
	MARIA DEPTO DE LA		
	PAL		
	SON: DOCIENTOS NOVENTA Y		
	NOVE MIL QUINIENTOS		
	NOVENTA Y SIETE Lps.		
	CON 94/100		

Forma de pago:	Valor Exento L.
Firma	Valor Gravado L. 299,597.94
	15% Imp. S/V L.
	Total a Pagar L. 299,597.94

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"


"Esta factura no es valida sin sello y firma autorizada"

IMPRESA Y PAPELERIA DAYMON TEL: 2238-6078 RTN: 08019999409878 CERTIFICADO: 9231-15-10500-119

RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO	LPR121701-2018
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	SANTA MARIA
UBICACION:	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ
FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD
	SEGUNDA ESTIMACION DEL:
	11/02/19
	AL:
	28/02/19
	LPS
Monto Inicial de Contrato	1795,702.60
Anticipo Neto Entregado	269,355.39
Monto Acumulado por O/C	
Monto Acumulado por Adendum	
Monto Final	1795,702.60
Monto de Segunda Estimacion	392,915.33

VoBo


SUPERVISOR DE PROYECTO

% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
21.88%	1.25	27%	269,355.39	73,671.62
Retencion Sobre Anticipo			392,915.33	
			1795,702.60	

Retencion de Impuesto Sobre La Renta

UTILIDAD GLOBAL	MONTO ESTIM	UTILIDAD GLOBAL	UTILIDAD DEL PERIODO	I.S.R 12.5%
<i>Ejecutor con constancia de pagos a cuenta</i>				

RESUMEN

Monto Estimado	392,915.33
Menos Deducion de Anticipo	73,671.62
Menos Deducion 5% CALIDAD DE OBRA	19,645.77
Menos Impuesto Sobre La Renta	
TOTAL A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION	299,597.94

Monto del Anticipo	269,355.39	15.00%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	79,440.71	29.49%
AMORTIZACION 2DA. ESTIMACION	73,671.62	27.35%
TOTAL AMORTIZADO	153,112.34	56.84%
FALTA POR AMORTIZAR	116,243.05	


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
CARJETA DE IDENTIDAD

RODOLFO RAUDALES MARADIAGA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 19 ENERO 1960
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 02 ABRIL 1997

0801-1960-00325



02193917-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad o de la persona, sino en virtud de Ley o sentencia judicial en Litigio. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Raudales
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

RODOLFO / RAUDALES MARADIAGA

0801-1960-00325





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-6865

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DICONCO S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019008162208**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-6865 en fecha 14/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417494855 de fecha 14/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35735346080, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-6865** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08011960003253

RODOLFO RAUDALES MARADIAGA

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores

Emisión: 20130225



Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 107 de 18 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas Art. 56 del Decreto 22-97 Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1280648

Transacción: BABAB5



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019008162208

DICONCO S DE R L
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores

Prestamista
Fecha de Emisión: 20111100

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973



Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEL cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEL-412- 869423

Transacción 14B8CB



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: munisantamaria@yahoo.com

Tel. 2717-7803

PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Nombre del Negocio: **"DICONCO CONSTRUCTORA"**

Otorgado a: **"Rodolfo Raudales Maradiaga"**

Identidad: **08019008162208**

N°. De Permiso: **231**

Solvencia: **689813**

Ubicación: **Santa María, La Paz**

Clase De Negocio: **Constructora.**

Conforme reglamento para apertura de establecimientos comerciales en el municipio de Santa María Departamento de La Paz.

El director municipal de justicia de este término municipal concede el presente permiso de operación de negocio, que es **válido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019**, el cual deberá ser colocado en un lugar visible.

Este permiso está sujeto a suspensión y cancelación, en caso de no cumplimiento con las reglas establecidas según Artículo N° 27 y 28 de la ley de policía y convivencia social.

Dado en Santa María, Departamento De La Paz a los 28 días del mes de Febrero del año 2019.


Director Municipal De Justicia


Jefe De Administración Tributaria

11-304-000061-1
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
SANTA MARIA LA PAZ
3065-2258
2754-8370

CHEQUE No. 75150542


PLANES, LA PAZ 28 Febrero 2019
Lugar y Fecha


Páguese a la orden de DICONCO

L 299,597.94

= Docientos noventa y nueve mil quinientos noventa y siete 94/100
Cantidad en letras Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑆01304079⑆00113040000611⑆75150542⑆

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 28 de Febrero del 2019.

GABINO ARGUETA GALVEZ
ALCALDE MUNICIPAL
SANTA MARIA LA PAZ
Su oficina.


Ref. Supervisión de infraestructura Del
proyecto: **CONSTRUCCIÓN II ETAPA
ALCANTARILLADO SANITARIO AGUAS
NEGRAS, CASCO URBANO, SANTA MARÍA,
LA PAZ.**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la unidad de proyectos alcaldía municipal, me permito entregar el INFORME N°2, del proyecto en mención; comprende el periodo del 11 DE FEBRERO DE 2019 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING LUIS AMADOR
UNIDAD DE PROYECTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



RESUMEN EJECUTIVO

1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.				
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN II ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO AGUAS NEGRAS		
UBICACIÓN:		CASCO URBANO, SANTA MARÍA, LA PAZ.		
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO:		El Proyecto Consiste En La Construcción De Un Desarenador, Reactor Anaeróbico, Muros De Retención. Y Líneas De Conducción De Alcantarillado Sanitario. Este Proyecto Es Una Segunda Etapa En El Sistema De Alcantarillado. Y En La Planta Como Una Primera Etapa.		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervision está a cargo de la mancomunidad MAMCEPAZ y Unidad de proyectos alcaldía Municipal.		
CONCEPTO	FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDA D	SUB-TOTAL
COSTO DE INFRAESTRUCUTRA	L 1,795,702.60	L 1,795,702.60	L, 0.00	L 1,795,702.60
COSTO DE SUPERVICION (10% del monto del proyecto)	L. 0.00			L. 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA				L 1,795,702.60

1.2- INFORMACION CONTRACTUAL.	
NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):	CONSTRUCTORA DICONCO S DE R.L.
SUPERVISION	UNIDAD DE PROYECTOS ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA. ING. LUIS AMADOR
CONTRATO ORIGINAL	
FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	15 DE ENERO 2019
FECHA DE ENTREGA DE CHEQUE DE ANTICIPO	15 DE ENERO 2019
FECHA DE ORDEN DE INICIO	26 DE ENERO 2019
PLAZO CONTRACTUAL	120

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
TEL. 2717-7803**



FECHA DE FINALIZACION

26 DE MAYO DEL 2019

1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

OBRA EJECUTADA: Se prepara el informe que corresponde a la estimación número dos del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 45.48%. En este periodo se realizó un avance en la red de alcantarillado sanitario. Al igual que avances en la excavación de la panta de tratamiento y levantamiento de muros.

PRESENTANDO UN AVANCE FÍSICO DE UN 45.48%

SITUACIONES PRESENTADAS:

Se solicito al ejecutor que se realizaran algunas actividades de reparación y mejoramiento de observaciones.

SOLUCIONES PROPUESTAS:

Reparar los sanitarios en mal estado.

PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVICION.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.

FOTOGRAFIAS



FOTOS II ESTIMACION PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS

Observación fotografía Superior En la fotografías superiores podemos observar la actividad de Excavacion en Calle #5 y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales



Observación fotografía Inferior En la fotografías Inferiores podemos observar la actividad de Relleno compactado con Material Selecto en calle #5 y Avenida #7


FOTOGRAFIAS



FOTOS II ESTIMACION PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS

Observación fotografía Superior
desperdicio de la calle #5

En la fotografías superiores podemos observar el acarreo finalizado de material

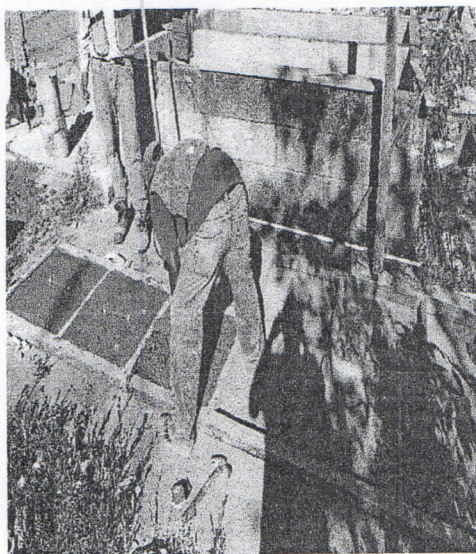

Observación fotografía Inferior
Domiciliarias y construcción de sus Tapaderas de la Calle #7 y Calle #5


En la fotografías Inferiores podemos observar la Actividad de Cajas de las Acometidas Domiciliarias y construcción de sus Tapaderas de la Calle #7 y Calle #5

FOTOGRAFIAS



FOTOS II ESTIMACION PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS

Observación fotografía Superior En la fotografías superiores podemos observar la actividad de Pozo de Inspeccion y Caja de Acometida Domiciliaria

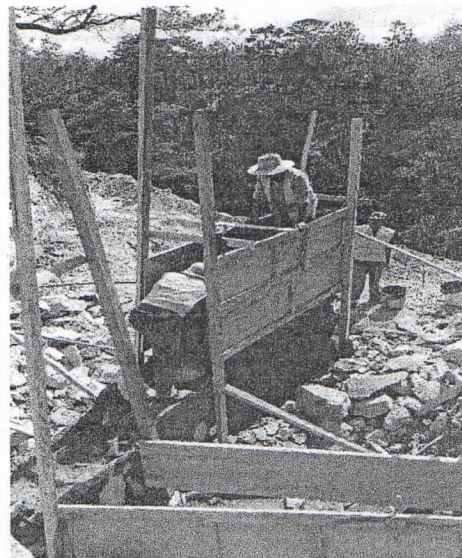

Observación fotografía Inferior En la fotografías Inferiores podemos observar que se ha realizado la actividad de Muro de Mamposteria en Planta de Tratamiento

Periodo del 13 al 16 de febrero del 2019

Hoja N° 000005


Se iniciaron las actividades de excavación en la calle #5, Construcción de los pozos numero 17 y 16 Aterrado y compactado con material de sitio y selecto en la avenida numero 7, Excavación en la planta de tratamiento para los componentes de desarenador y reactor anaerobico. Se Solicito una Constancia a la alcaldia de Santa Maria de la paz que deje en claro que los trabajos realizados en la planta de Tratamiento, se encuentran dentro de los limites del Terreno que la Municipalidad compro en su momento para la construccion de dicha planta

LA UNIDAD DE CATASTRO
SUPERVISO EL AREA DEL
TERRENO PARA DEMOSTRAR



Periodo del 17 al 23 de febrero del 2019

Se continuaron las actividades de excavación, Aterrados Instalación en la calle #5, Así como excavación en la planta de Tratamiento, realizando una reunión en el sitio de la planta con el Ingeniero Fernando Supervisor por parte de la alcaldia Municipal de Santa Maria de la paz, el cual Manifesto verbalmente una platica sostenida con el alcalde de Santa Maria en la cual Solicito al ingeniero Fernando comunicarnos de su excavación para los componentes de la planta de Tratamiento que se realizaran en las siguientes etapas de la planta.




Bitácora N° 029349

Periodo del 24 al 26 de febrero
al 2019

Hoja Nº 000006

En este periodo se realizaron las actividades de
bata de material desperdiciado en la calle #5, excavación
e instalación de tubería en la avenida #7 del
pozo #18 al pozo #17, excavación en planta de
tratamiento y inscripciones en muro de contención, también
se habla con el ingeniero Fernando Representante por
parte de la alcaldía de Santa Rosa de la Paz
sobre cambiar el espesor de pared de concreto
armado del reactor Anaerobio de flujo ascendente
de 15 centímetros de espesor a 25 centímetros de
espesor como lo indica los planos, con el fin de
asegurar el trabajo a realizarse.



ESTIMACION DE OBRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ

PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS

UBICACIÓN: CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ

EJECUTOR: CONSTRUCTORA DICONCO S DE R.L.

ESTIMACION: 2

PERIODO DEL: 11/02/19 HASTA 28/02/19

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
A. MODULO TRAMO: CENTRO SALUD - COMERCIAL H. H (CALLE #5)												
1	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	109.15	L 15.61	L 1,703.83	109.15	L 1,703.83		L -		L -	0.00%
2	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	116.76	L 555.00	L 64,801.80		L -	116.76	L 64,801.80	116.8	L 64,801.80	100.00%
3	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	63.05	L 225.56	L 14,221.56		L -	63.05	L 14,221.56	63.1	L 14,221.56	100.00%
4	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	3.17	L 869.20	L 2,755.36		L -	3.17	L 2,755.36	3.2	L 2,755.36	100.00%
5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	46.70	L 413.11	L 19,292.24		L -	46.70	L 19,292.24	46.7	L 19,292.24	100.00%
6	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	70.06	L 61.33	L 4,296.78		L -	70.06	L 4,296.78	70.1	L 4,296.78	100.00%
7	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	mL	105.55	L 212.25	L 22,402.99	105.55	L 22,402.99		L -		L -	0.00%
8	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	mL	105.55	L 36.25	L 3,826.19		L -	105.55	L 3,826.19	105.6	L 3,826.19	100.00%
9	POZO #15 DE ALCANTARILLADO H= 1.5 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 14,453.68	L 14,453.68		L -	1.00	L 14,453.68	1.0	L 14,453.68	100.00%
10	POZO #16 DE ALCANTARILLADO H= 1.5 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 14,453.68	L 14,453.68		L -	1.00	L 14,453.68	1.0	L 14,453.68	100.00%
11	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	109.15	L 29.60	L 3,230.84		L -		L -	0.0	L -	0.00%
SUB TOTAL- A. MODULO TRAMO: CENTRO SALUD - COMERCIAL H. H (CALLE #5)					L 165,438.95		L 24,106.82		L 138,101.29		L 138,101.29	83.48%
B. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #5												
12	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	32.00	L 15.61	L 499.52	24.00	L 374.64		L -	24.0	L 374.64	75.00%
13	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	20.67	L 555.00	L 11,471.85		L -	15.50	L 8,602.50	15.5	L 8,602.50	74.99%
14	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	0.96	L 869.20	L 834.43		L -	0.72	L 625.82	0.7	L 625.82	75.00%
15	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	11.66	L 225.56	L 2,630.03		L -	8.75	L 1,973.65	8.8	L 1,973.65	75.04%
16	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	mL	32.00	L 98.21	L 3,142.72	32.00	L 3,142.72		L -	32.0	L 3,142.72	100.00%
17	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	mL	32.00	L 25.69	L 822.08		L -	24.00	L 616.56	24.0	L 616.56	75.00%
18	YEE DE PVC DE 4"x6"x6" (SUM E INST)	Unid	8.00	L 398.10	L 3,184.80		L -	6.00	L 2,388.60	6.0	L 2,388.60	75.00%
19	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	8.64	L 413.11	L 3,569.27		L -	6.48	L 2,676.95	6.5	L 2,676.95	75.00%
20	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	7.68	L 61.33	L 471.01		L -	5.76	L 353.26	5.8	L 353.26	75.00%
21	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	8.00	L 2,209.63	L 17,677.04		L -	8.00	L 17,677.04	8.0	L 17,677.04	100.00%
22	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	32.00	L 29.60	L 947.20		L -		L -	0.0	L -	0.00%
SUB TOTAL- B. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #5					L 45,249.96		L 3,517.36		L 34,914.39		L 38,431.75	84.93%
C. MODULO TRAMO: ESQUINA COMERCIAL H.H -ESQUINA CASA DON TACHO (AVENIDA #7)												
23	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	157.00	L 15.61	L 2,450.77	157.00	L 2,450.77		L -	157.0	L 2,450.77	100.00%
24	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	165.67	L 555.00	L 91,946.85	123.28	L 68,420.40	11.00	L 6,105.00	134.3	L 74,525.40	81.05%
25	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	89.46	L 225.56	L 20,178.60		L -	49.46	L 11,156.20	49.5	L 11,156.20	55.29%
26	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	4.60	L 869.20	L 3,998.32	1.92	L 1,668.86	1.08	L 938.74	3.0	L 2,607.60	65.22%
27	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	66.27	L 413.11	L 27,376.80	17.18	L 7,097.23	8.64	L 3,569.27	25.8	L 10,666.50	38.96%
28	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	99.40	L 61.33	L 6,096.20	56.34	L 3,455.33	31.75	L 1,947.23	88.1	L 5,402.56	88.62%
29	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	mL	153.40	L 212.25	L 32,559.15	153.40	L 32,559.15		L -	153.4	L 32,559.15	100.00%
30	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	mL	153.40	L 36.25	L 5,560.75	64.00	L 2,320.00	36.00	L 1,305.00	100.0	L 3,625.00	65.19%
31	POZO #17 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 22,586.65	L 22,586.65		L -	1.00	L 22,586.65	1.0	L 22,586.65	100.00%
32	POZO #18 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 22,586.65	L 22,586.65	1.00	L 22,586.65		L -	1.0	L 22,586.65	100.00%
33	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	153.40	L 29.60	L 4,540.64		L -		L -	0.0	L -	0.00%
SUB TOTAL- C. MODULO TRAMO: ESQUINA COMERCIAL H.H -ESQUINA CASA DON TACHO (AVENIDA #7)					L 239,881.38		L 140,558.40		L 47,608.08		L 188,166.48	78.44%
D. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AVENIDA #7												
34	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	28.00	L 15.61	L 437.08	28.00	L 437.08		L -	28.0	L 437.08	100.00%
35	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	18.09	L 555.00	L 10,039.95	16.20	L 8,991.00	1.89	L 1,048.95	18.1	L 10,039.95	100.00%
36	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	0.84	L 869.20	L 730.13	0.72	L 625.82		L -	0.7	L 625.82	85.71%
37	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	19.28	L 225.56	L 4,348.80		L -	9.28	L 2,093.20	9.3	L 2,093.20	48.13%



Handwritten signature or initials.

ESTIMACION DE OBRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ

PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS

UBICACIÓN: CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ

EJECUTOR: CONSTRUCTORA DICONCO S DE R.L.

ESTIMACION: 2

PERIODO DEL: 11/02/19 HASTA 28/02/19

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
38	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	mL	28.00	L 98.21	L 2,749.88	28.00	L 2,749.88		L -	28.0	L 2,749.88	100.00%
39	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	mL	28.00	L 25.69	L 719.32	24.00	L 616.56		L -	24.0	L 616.56	85.71%
40	YEE DE PVC DE 4"x6"x6" (SUM E INST)	Unid	7.00	L 398.10	L 2,786.70	6.00	L 2,388.60		L -	6.0	L 2,388.60	85.71%
41	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	7.56	L 413.11	L 3,123.11	5.04	L 2,082.07		L -	5.0	L 2,082.07	66.67%
42	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	6.72	L 61.33	L 412.14	5.76	L 353.26		L -	5.8	L 353.26	85.71%
43	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	7.00	L 2,209.63	L 15,467.41	6.00	L 13,257.78	1.00	L 2,209.63	7.0	L 15,467.41	100.00%
44	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	28.00	L 29.60	L 828.80		L -		L -	0.0	L -	0.00%
SUB TOTAL- D. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS AVENIDA #7					L 41,643.31		L 31,502.06		L 5,351.78		L 36,853.84	88.50%
E. MODULO TRAMO: ESQUINA CASA DON TACHO HASTA POZO EXISTENTE FRENTE A CASA DON GABINO (CALLE #7)												
45	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	105.72	L 15.61	L 1,650.29	105.72	L 1,650.29		L -	105.7	L 1,650.29	100.00%
46	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	105.30	L 555.00	L 58,441.50	73.71	L 40,909.05		L -	73.7	L 40,909.05	70.00%
47	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	56.86	L 225.56	L 12,825.34	56.86	L 12,825.34		L -	56.9	L 12,825.34	100.00%
48	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	3.06	L 869.20	L 2,659.75	3.06	L 2,659.75		L -	3.1	L 2,659.75	100.00%
49	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	42.12	L 413.11	L 17,400.19	42.12	L 17,400.19		L -	42.1	L 17,400.19	100.00%
50	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	63.18	L 61.33	L 3,874.83	63.18	L 3,874.83		L -	63.2	L 3,874.83	100.00%
51	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 6" RD-41	mL	102.12	L 212.25	L 21,674.97	102.12	L 21,674.97		L -	102.1	L 21,674.97	100.00%
52	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	mL	102.12	L 36.25	L 3,701.85	102.12	L 3,701.85		L -	102.1	L 3,701.85	100.00%
53	POZO #19 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 22,586.65	L 22,586.65	1.00	L 22,586.65		L -	1.0	L 22,586.65	100.00%
54	POZO #20 DE ALCANTARILLADO H=2 M. INC. EXC. Y ACA. VER PLANO	Unid	1.00	L 22,586.65	L 22,586.65	1.00	L 22,586.65		L -	1.0	L 22,586.65	100.00%
55	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	105.72	L 29.60	L 3,129.31		L -		L -	0.0	L -	0.00%
AL- E. MODULO TRAMO: ESQUINA CASA DON TACHO HASTA POZO EXISTENTE FRENTE A CASA DON GABINO (CALLE #7)					L 170,531.34		L 149,869.58		L -		L 149,869.58	87.88%
F. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #7												
56	TRAZADO Y MARCADO CON NIVEL	mL	16.00	L 15.61	L 249.76	8.00	L 124.88		L -	8.0	L 124.88	50.00%
57	EXCAVACION MATERIAL DURO ROCA	m3	10.33	L 555.00	L 5,733.15	5.17	L 2,866.58		L -	5.2	L 2,866.58	50.00%
58	CAMA ARENA COMPAC. E=5CM.	m3	0.48	L 869.20	L 417.22	0.24	L 208.61		L -	0.2	L 208.61	50.00%
59	ACARREO DE MATERIAL DESPERDICIO	m3	5.83	L 225.56	L 1,315.01	2.92	L 657.51		L -	2.9	L 657.51	50.00%
60	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	mL	16.00	L 98.21	L 1,571.36	8.00	L 785.68		L -	8.0	L 785.68	50.00%
61	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	mL	16.00	L 25.69	L 411.04	8.00	L 205.52		L -	8.0	L 205.52	50.00%
62	YEE DE PVC DE 4"x6"x6" (SUM E INST)	Unid	4.00	L 398.10	L 1,592.40	2.00	L 796.20		L -	2.0	L 796.20	50.00%
63	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	m3	4.32	L 413.11	L 1,784.64	2.16	L 892.32		L -	2.2	L 892.32	50.00%
64	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	3.84	L 61.33	L 235.51	1.92	L 117.75		L -	1.9	L 117.75	50.00%
65	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	4.00	L 2,209.63	L 8,838.52	2.00	L 4,419.26		L -	2.0	L 4,419.26	50.00%
66	PRUEBA HIDROSTATICA ALCANTARILLADO SANITARIO	mL	16.00	L 29.60	L 473.60		L -		L -	0.0	L -	0.00%
SUB TOTAL- F. ACOMETIDAS DOMICILIARIAS CALLE #7					L 22,622.20		L 11,074.30		L -		L 11,074.30	48.95%
G. DESARENADOR												
67	TRAZADO Y MARCADO	mL	31.22	L 20.13	L 628.46	31.22	L 628.46		L -	31.2	L 628.46	100.00%
68	EXCAVACION DE MATERIAL CON CANTERO SUELO DURO	m3	34.05	L 795.00	L 27,069.75		L -	34.05	L 27,069.75	34.1	L 27,069.75	100.00%
69	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	5.34	L 1,936.73	L 10,342.14		L -		L -	0.0	L -	0.00%
70	LOSA E=15 CM, #4 @ 0.20 A.S. DOBLE PETATE	m2	8.92	L 1,163.67	L 10,379.94		L -		L -	0.0	L -	0.00%
71	PARED DE BLOQUE 15 CM, RELLENO, 1#3 @20 Y 1#3 @ 2 HILADAS	m2	20.13	L 800.00	L 16,104.00		L -		L -	0.0	L -	0.00%
72	SOLERA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	m2	28.76	L 235.01	L 6,758.89		L -		L -	0.0	L -	0.00%
73	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2CM MORTERO DE 1:4	m2	18.21	L 184.88	L 3,366.66		L -		L -	0.0	L -	0.00%
74	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	m2	27.97	L 206.67	L 5,780.56		L -		L -	0.0	L -	0.00%
75	COMPUERTA METALICA PARA CANAL	Unid	4.00	L 4,600.00	L 18,400.00		L -		L -	0.0	L -	0.00%
76	REJILLA METALICA DESARENADOR	Unid	1.00	L 6,670.00	L 6,670.00		L -		L -	0.0	L -	0.00%
77	MEDIDOR PARSHAL (PREFABRICADO)	Unid	1.00	L 37,950.00	L 37,950.00		L -		L -	0.0	L -	0.00%

ESTIMACION DE OBRA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, LA PAZ

PROYECTO: CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO AGUAS NEGRAS




UBICACIÓN: CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ

EJECUTOR: CONSTRUCTORA DICONCO S DE R.L.

ESTIMACION: 2

PERIODO DEL: 11/02/19 HASTA 28/02/19

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNIT	COSTO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
78	LOSA DE CONCRETO e=5 cm #3@30 cm A/S.	m2	0.25	L 554.00	L 138.50		L -		L -	0.0	L -	0.00%
79	ACERA DE CONC. e=7.5cm, #2@20cm A.S. CONC 1:2:2	m2	23.83	L 415.00	L 9,889.45		L -		L -	0.0	L -	0.00%
SUB TOTAL- G. DESARENADOR					L 153,478.35		L 628.46		L 27,069.75		L 27,698.21	18.05%
H. REACTOR ANAEROBIO												
80	TRAZADO Y MARCADO	mL	19.00	L 20.13	L 382.47	19.00	L 382.47		L -	19.0	L 382.47	100.00%
81	EXCAVACION DE MATERIAL CON CANTERO SUELO DURO	m3	72.00	L 795.00	L 57,240.00		L -	72.00	L 57,240.00	72.0	L 57,240.00	100.00%
82	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	m3	9.10	L 1,936.73	L 17,624.24		L -		L -	0.0	L -	0.00%
83	ZAPATA AISLADA 0.60 x 0.60, e=0.20, 8 N°4, a.s.	Unid	1.00	L 677.15	L 677.15		L -		L -	0.0	L -	0.00%
84	LOSA INFERIOR E=30CM, #5@25CM A.S SUP/INF	m2	22.75	L 1,859.21	L 42,297.03		L -		L -	0.0	L -	0.00%
85	LOSA DE CONCRETO e=10 CM #3 @15 CM A/S.	m2	22.75	L 669.33	L 15,227.26		L -		L -	0.0	L -	0.00%
86	PARED DE CONCRETO e=15CM 2#4@20 A/S Y #4@40 A/S	m2	93.10	L 1,734.21	L 161,454.95		L -		L -	0.0	L -	0.00%
87	VIGA TRIANGULAR B=1.06M, P=0.41, 6#4, #2@15 CM	mL	12.00	L 977.36	L 11,728.32		L -		L -	0.0	L -	0.00%
88	SEPARADOR TRIFACICO + CANAL RECOLECTOR INT DETALLE	mL	6.00	L 7,322.31	L 43,933.86		L -		L -	0.0	L -	0.00%
89	CANAL DE SALIDA #3@15 A.S, B 0.55 E=15, P=0.71E=10	mL	3.50	L 1,850.21	L 6,475.74		L -		L -	0.0	L -	0.00%
90	REPELLO 1:4 e=2 CM Y AFINADO	m2	115.85	L 206.67	L 23,942.72		L -		L -	0.0	L -	0.00%
91	IMPERMEABILIZACION EPOXICO GRADO SANITARIO	m2	115.85	L 174.90	L 20,262.17		L -		L -	0.0	L -	0.00%
92	CAJA DE REGISTRO DE 80X80X85m	Unid	1.00	L 2,209.63	L 2,209.63		L -		L -	0.0	L -	0.00%
93	ESCOTILLA DE MANTENIMIENTO	Unid	1.00	L 25,829.00	L 25,829.00		L -		L -	0.0	L -	0.00%
94	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	mL	10.00	L 32.62	L 326.20	10.00	L 326.20		L -	10.0	L 326.20	100.00%
95	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	mL	10.00	L 18.87	L 188.70		L -		L -	0.0	L -	0.00%
96	SUM E INST. TUBERIA PVC DE 6" RD-41	m2	6.00	L 248.49	L 1,490.94		L -		L -	0.0	L -	0.00%
97	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 6"	m2	6.00	L 36.25	L 217.50		L -		L -	0.0	L -	0.00%
98	ACCESORIOS SISTEMA EXTRACCION DE NATAS	glb	1.00	L 1,048.65	L 1,048.65		L -		L -	0.0	L -	0.00%
99	ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE LODOS, MUESTREOS Y VACIADO DEL REACTOR (SUM/ INST)	glb	1.00	L 7,947.65	L 7,947.65		L -		L -	0.0	L -	0.00%
100	ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES DEL REACTOR (SUM/ INST)	glb	1.00	L 748.37	L 748.37		L -		L -	0.0	L -	0.00%
101	ACCESORIOS SISTEMA DE EXTRACCION DE AGUA DEL REACTOR (SUM/ INST)	glb	1.00	L 268.30	L 268.30		L -		L -	0.0	L -	0.00%
102	ACCESORIOS REACTOR INGRESO DE AGUA (SUM/ INST)	glb	1.00	L 6,626.30	L 6,626.30		L -		L -	0.0	L -	0.00%
SUB TOTAL- H. REACTOR ANAEROBIO					L 448,147.14		L 708.67		L 57,240.00		L 57,948.67	12.93%
I. MUROS DE RETENCION												
103	TRAZADO Y MARCADO	mL	57.50	L 20.13	L 1,157.48	57.50	L 1,157.48		L -	57.5	L 1,157.48	100.00%
104	EXCAVACION DE MATERIAL CON CANTERO SUELO DURO	m3	177.50	L 795.00	L 141,112.50	106.50	L 84,667.50	71.00	L 56,445.00	177.5	L 141,112.50	100.00%
105	MURO DE MAMPOSTERIA	m3	182.12	L 2,012.08	L 366,440.01		L -	81.65	L 164,286.33	81.7	L 164,286.33	44.83%
SUB TOTAL- H. REACTOR ANAEROBIO					L 508,709.98		L 85,824.98		L 220,731.33		L 306,556.31	60.26%
TOTAL COSTO DEL PROYECTO					L 1,795,702.60		L 423,683.80		L 392,915.33		L 816,599.12	45.48%

EJECUTOR		SUPERVISION-ALCALDIA		ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE: DICONCO S, DE R.L.		NOMBRE: LUIS AMADOR		NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ	
FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2019					
