

MEMORANDUM

Ingeniería IN 046-2019

PARA: Lic. Dilia Martínez
Oficial de Información Pública

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Ingeniería

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 02 de Abril 2019



Por medio de la presente le estoy enviando el Cuadro de Avance Físico y Financiero mensual de los proyectos en ejecución del mes de Marzo del 2019.

Atentamente.

Cc. Dirección Ejecutiva
Cc. Archivo



COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de sula

Departamento de ingeniería

Resumen de la Ejecución Física y financiera de proyectos

Periodo: Mes de Marzo/2019

PROGRAMA 22. Obras para el Control de Inundaciones del Valle de Sula				DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES VIGENTES		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE MES		ACUMULADO A LA FECHA		%AVANCE	
INST.	GA	UE	ACT/OBRA			Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera	Fisica	Financiera
120	08	38	002	CANALIZACIONES	M ²	287,866	32,344,600.00	53,170	5,661,272.00	2,062	L1,281,227.00	55,232	6,942,499.00	19%	21%
120	08	38	004	ESPIGONES	M ²	78,938	19,253,000.00	16,329	3,486,699.00	2,499	L412,568.00	18,828	3,899,267.00	24%	20%
120	08	38	006	ALCANTARILLAS	ML	43	3,511,600.00	0	0.00	0	L0.00	0	0.00	0%	0%
120	08	38	008	BORDOS	M ²	367,520	56,543,000.00	9,193	1,296,606.00	0	0.00	9,193	1,296,606.00	3%	2%

Ing. Neil Patrick Díaz Rodríguez
Jefe Depto. Ingeniería



LEYENDA:

INST. = Institucion

GA = Gerencia Administrativa

UE = Unidad Ejecutora

ACT/OBRA =Actividad/ obra

OBSERVACIONES: El avance financiero reflejado es de conformidad con los precios contractuales y el avance fisico parcial a la fecha de 2 proyectos adjudicados en el mes de diciembre del 2018.

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE MARZO DEL 2019

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	NUEVA CANTIDAD VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO MARZO	ACUMULADO A MARZO	% AVANCE
02	CANALIZACIONES	M ³	287,866	53,170	2,062	55,232	19.2%
04	ESPIGONES	M ³	78,938	16,329	2,499	18,828	23.9%
06	ALCANTARILLAS	ML	43	0	0	0	0.0%
08	BORDOS	M ³	367,520	9,193	0	9,193	2.5%


Ing. Neil Patrick Díaz R.
Jefe departamento Ingeniería.



Observaciones: La ejecución física del mes de Febrero de 2019 corresponden a 2 proyectos adjudicados y contratados en el mes de diciembre del 2018.

Ingeniero Coordinador de Proyectos: ING HARRY LOBO

Año 2019




CUADRO DE AVANCE FISICO

Periodo: 01 al 31 de febrero 2019

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Monto del contrato	Monto Obra adicional	Nuevo Monto del Contrato	Obra Contratada				Avance físico				Avance financiero				Observaciones	
		Departamento	Municipio						Descripción	Unidad	Cantidad	Obra adicional	Nuevas cantidades	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades acumuladas	% Físico efectuado acumulado	Acumulado anterior	Este periodo	Acumulado		% Financiero efectuado acumulado
1 Espigones																						
1.1	Construcción de Escollera de piedra margen derecha de losa sector la venta	Cortes	Pimienta	Cardem Negro Equipments S. de RL de CV.	74-018-2018	L. 1.420,025.10	L. 0.00	L. 1,420,025.10	Escollera	M3	8,601.00	0.00	8,601.00	860.10	2,498.90	3,359.00	39.05%	L. 142,002.51	L. 142,568.39	L. 554,570.90	39.05%	obra en actual ejecución
2 Canalizaciones																						
2.1	Construcción de drenaje puntal colonia cruz roja barrio el centro	Cortes	Pimienta	CONREAL	09-021-2018	L. 3,771,740.95	L. 131,777.23	L. 3,884,518.16	Canalización	M3	6,072.00	179.94	6,251.94	4,189.72	2,062.22	6,251.94	100.00%	L. 2,603,291.43	L. 1,281,226.63	L. 3,884,518.16	100.00%	obra ejecutada satisfactoriamente

Verbo

Avance físico marzo 2019 proyecto: Construcción de drenaje pluvial colonia cruz roja-barrio el centro

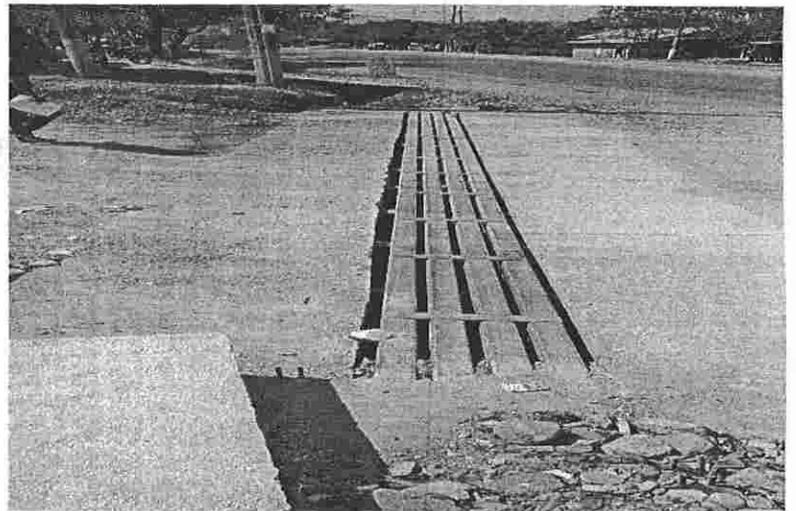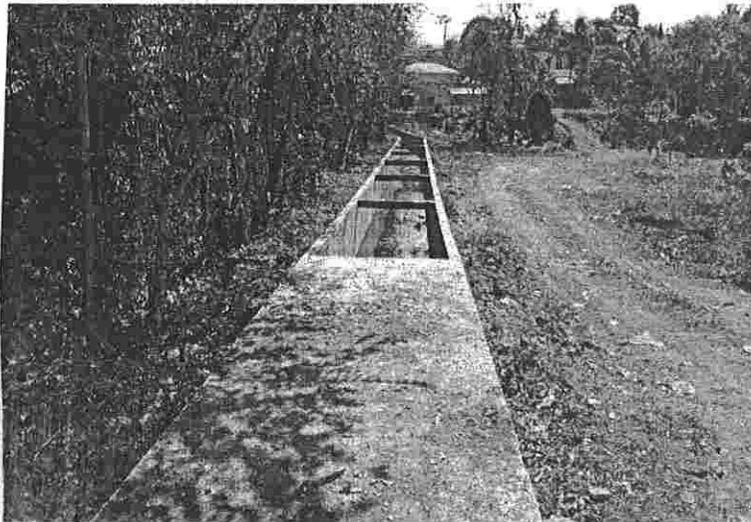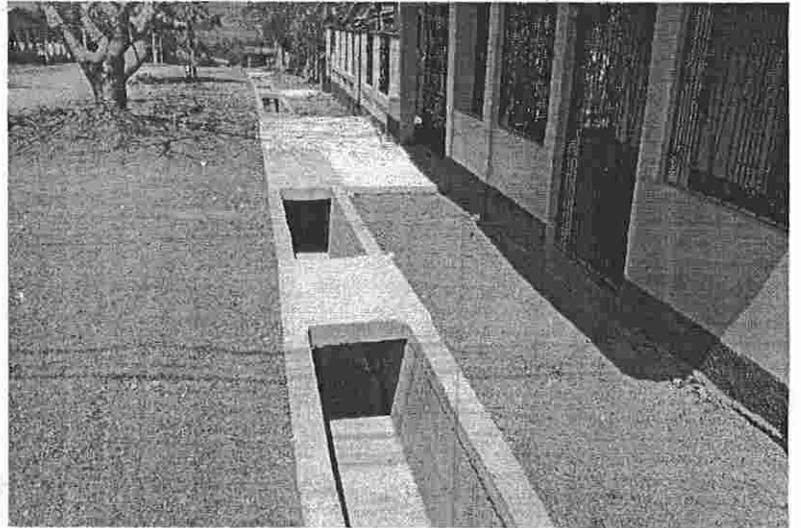

Avance físico marzo 2019 proyecto: Construcción de Escollera de piedra margen derecho Ulúa sector la venta



PROGRAMAS Y PROYECTOS

IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Sector, Sub-Sector	Infraestructura Productiva
Nombre del Proyecto	"Construcción de drenaje pluvial colonia cruz roja-barrio el centro "
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de Pimienta, departamento de Cortes.
Propósito	Construcción de canales de drenaje pluvial colonia cruz roja-barrio el centro.
Descripción del Proyecto	Construcción de canales de drenaje pluvial
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto	Construcción de canales de drenaje pluvial colonia cruz roja-barrio el centro.
Impacto Ambiental	
Impacto en el Terreno y Asentamientos	
Detalles de Contactos (Nombre Completo, No. Telefónico, Correo, entre otros)	Ing. Neil Díaz. Dirección Bº El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066
Fuentes de Financiamiento	Fondos Nacionales
Presupuesto del Proyecto (Estimado)	L. 3,534,569.43
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	octubre de 2018
Estado del Proyecto (Actual)	Finalizado
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 3,884,518.16
Fecha de Finalización (Proyectada)	1 de abril de 2019
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	De conformidad
Variación en el Costo Total del Proyecto	Si
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	Si
Razones de los Cambios antes mencionados	La Municipalidad de Pimienta solicito ampliar longitud de canales de drenaje



PROGRAMAS Y PROYECTOS

IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Propietario del Proyecto	Comisión Para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
Sector, Sub-Sector	Infraestructura Productiva
Nombre del Proyecto	"Construcción de Escollera de piedra margen derecha río ulua, sector la venta "
Ubicación del Proyecto	Jurisdicción de Pimienta, departamento de Cortes.
Propósito	Construcción de Escollera de piedra margen derecha río ulua
Descripción del Proyecto	Construcción de Escollera de piedra margen derecha río ulua
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Proyecto	Construcción de Escollera de piedra margen derecha río ulua, sector la venta
Impacto Ambiental	
Impacto en el Terreno y Asentamientos	
Detalles de Contactos (Nombre Completo, No. Telefónico, Correo, entre otros)	Ing. Neil Díaz, Dirección B° El Benque 7 y 8 calle 8Ave. Tel. 25579066
Fuentes de Financiamiento	Fondos Nacionales
Presupuesto del Proyecto (Estimado)	L. 2,231,529.45
Fecha de Aprobación de Presupuesto del Proyecto	octubre de 2018
Estado del Proyecto (Actual)	en ejecución
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 1,420,025.10
Fecha de Finalización (Proyectada)	17 de abril de 2019
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	De conformidad
Variación en el Costo Total del Proyecto	probablemente ocurra
Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto	Si hay
Razones de los Cambios antes mencionados	Se presenta problemas con Empresa que se comprometio a donar piedra

