



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 09985

## MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 75750549

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 133,654.36

GUESE A: Cristian Emmanuel Molina Urguia  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento treinta y tres mil Seiscientos cincuenta y cuatro <sup>36/100</sup>  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. <u>12</u>	COD. <u>03</u>	COD. <u>09</u>	COD. <u>35</u>

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
<u>03</u>	<u>Desarrollo Social cultural y comunitario</u>	<u>133,654.36</u>	
<u>09</u>	<u>Seguridad Ciudadana</u>		
<u>12</u>	<u>Transferencia Gobierno Central</u>		
<u>400</u>	<u>Bienes capitalizables</u>		
<u>460</u>	<u>Const. Pducion y Mejora obras urb.</u>		
<u>467</u>	<u>Const. aduon y Mejora lugares de recreo</u>		
<u>35</u>	<u>Construccion il etapa Estadco Municipal</u>		
	<u>Caso urbano Sta Maria</u>		
	<u>pago de Segunda Estimacion</u>		
	<u>Avance de obra de ho</u>		
	<u>proyecto.</u>		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 133,654.36</b>	

Fecha 08-03-2019

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f) \_\_\_\_\_

Identidad No. 1208-1982-00001

Solvencia No. \_\_\_\_\_

EN.A.G. Tel.: 2230-8767, R.T.N. 08019999408325

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 18 de Marzo del 2019.

Recibo por: Lps. 133,654.36

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de  
Ciento treinta y tres mil Seiscientos  
Cincuenta y cuatro lempiras con 36/100.  
(Lps. 133,654.36 ) correspondiente al pago de la Estimación,  
# 02 de Avance de Obra del proyecto  
Construcción II etapa Estadio Municipal

Con Numero 35 Ubicado en C. Urbano Sta María Municipio  
De Santa María del Departamento de La Paz.

**Desglose del pago**

<b>MONTO ESTIMADO</b>	<u>175,284.40</u>
-Menos deducción de anticipo	<u>32,865.83</u>
-Menos deducción de ISR	<u>— . —</u>
-Menos 5% Calidad de Obra	<u>8,764.22</u>
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	<u>L. 133,654.36</u>

Firma del Contratista:  \_\_\_\_\_

Nombre del cotrastista: Cristian Emmanuel Molina

Identidad #: 1208-1987-00001

11-304-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
3665-2238  
2754-8970


CHEQUE No. 75150549


PLANES, LA PAZ  
Lugar y Fecha


08 Marzo 2019

Páguese a la orden de Cristian Emmanuel Molina Orquía L. 133,654.36

Cantidad en letras = Ciento treinta y tres mil Seiscientos cincuenta y cuatro 36/100 Lempiras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

  
Firma(s)



⑆0⑆304079⑆00⑆⑆30400006⑆⑆⑆75⑆50549

RR Donatario de Honduras, S.A. de C.V.

**Cristian Enmanuel Molina Urquia**  
**Cel. 9785-5990 / R.T.N. 12081987000010**  
CAI:42183B-A6902E-B04295-653E6F-B2405B-05  
Marcala, La Paz  
E-mail:crisenmol1987@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS  
N° 000-001-04-00000085

Fecha, 08 de MARZO del 2019

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA, LA PAZ

R.T.N. 12179003434704

La cantidad de: CIENTO TREINTAYTRESMILSEISCIENTOS CINCUENTAYCUATRO <sup>36</sup>/<sub>100</sub>

Por concepto de: PAGO SEGUNDA ESTIMACION DE PROYECTO  
SEGUNDO ETAPA ESTADIO MUNICIPAL

Total por Honorarios L.	<u>133,654.36</u>
Total Neto Recibido L.	<u>133,654.56</u>

Fecha Limite de Emisión:29/05/2019

Rango otorgado:000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100

Imp. La Independencia, Bo. Abajo, Frente a las Oficinas de la E.N.E.E., Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

  
Firma

# RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:		LPR-ALCALDIA DE SANTA MARIA-01-2019	
NOMBRE DEL PROYECTO:		CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL	
DEPARTAMENTO:		LA PAZ	
MUNICIPIO:		SANTA MARIA	
ALDEA:		CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ	
CONTRATISTA: ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA			
FECHA DE INICIO:		07/02/2019	
PLAZO:		120	
FECHA DE FINALIZACION:		07/06/2019	
FUENTE FINANCIAMIENTO: MUNICIPALIDAD			
CREDITO: LPS			
Monto Inicial de Contrato		L 1,129,020.86	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%		L 169,353.13	
Retencion de calidad de obra		L 56,451.04	
Anticipo del 15% del Monto del Contrato		L 169,353.13	
Monto Acumulado por O/C			
Monto Acumulado por Adendum			
Monto Final		L 1,129,020.86	
Monto de segunda Estimacion		L 175,284.40	

RETENCION SOBRE ANTICIPO		L 175,284.40	
% DE AVANCE	15.53%	FACTOR DE REAL	1.25
% RETENCION	19.41%	MONTO ANTICIPO	169,353.13
RETENCION			32,865.83

MONTO DEL ANTICIPO		L 169,353.13	
100%			
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	L38,016.68		22.45%
AMORTIZACION 2da. ESTIMACION	L32,865.83		19.41%
TOTAL AMORTIZADO	L70,882.51		41.86%
FALTA POR AMORTIZAR	L98,470.62		58.15%


RETENCION DE CALIDAD DE OBRA		L 175,284.40	
FACTOR DE REAL	1.050	% RETENCION	5.00%
MONTO ESTIMACION	175,284.40	RETENCION	8,764.22

CALIDAD DE OBRA		DE:		A:	
1 ESTIMACION	07/02/2019	20/02/2019	L 10,137.78		
2 ESTIMACION	20/02/2019	07/03/2019	L 8,764.22		
3 ESTIMACION					
RETENIDO TOTAL		L 18,902.00			

RESUMEN	
Monto Estimado	L 175,284.40
Menos Deducion de Anticipo	L 32,865.83
Menos Deducion I.S.R 12.5%	
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%	
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 8,764.22
TOTAL A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION	L 133,654.36

Vobo

SUPERVISOR MUNICIPALIDAD



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA**

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA												
PROYECTO:		CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL										
UBICACIÓN:		CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ										
EJECUTOR:		ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA										
CODIGO:		COT121701-2019										
ESTIMACION Nº 2												
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
<b>CAMERINOS JUGADORES</b>												
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	66.8	L 21.35	L 1,426.18	66.8	L 1,426.18		L -	66.8	L 1,426.18	100%
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	13.78	L 81.75	L 1,126.52	13.78	L 1,126.52		L -	13.78	L 1,126.52	100%
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	17.91	L 65.37	L 1,170.78	17.91	L 1,170.78		L -	17.91	L 1,170.78	100%
4	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	13.77	L 1,825.34	L 25,134.93	13.77	L 25,134.93		L -	13.77	L 25,134.93	100%
5	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	12.99	L 1,825.34	L 23,711.17	12.99	L 23,711.17		L -	12.99	L 23,711.17	100%
6	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID	11	L 141.32	L 1,554.52	11	L 1,554.52		L -	11	L 1,554.52	100%
7	SOLERA 20X20, 4#3, #2@0.20, CONC 1:2:4	ML	27.76	L 310.15	L 8,609.76	27.76	L 8,609.76		L -	27.76	L 8,609.76	100%
8	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4	ML	4.69	L 110.47	L 518.10	4.69	L 518.10		L -	4.69	L 518.10	100%
9	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	19.27	L 527.34	L 10,161.84	19.27	L 10,161.84		L -	19.27	L 10,161.84	100%
10	CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4	ML	35.8	L 245.31	L 8,782.10	35.8	L 8,782.10		L -	35.8	L 8,782.10	100%
11	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	83.33	L 510.78	L 42,563.30	75	L 38,308.50	8.33	L 4,254.80	83.33	L 42,563.30	100%
12	SOLERA 15X15 4 Nú3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	27.76	L 273.51	L 7,592.64	27.76	L 7,592.64		L -	27.76	L 7,592.64	100%
13	CARGADOR DE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	4.4	L 201.25	L 885.50	4.4	L 885.50		L -	4.4	L 885.50	100%
14	BATIENTE C/PESTAÑA 10X15cm,2#3,#2@25,CONC 1:2:2	ML	12.08	L 230.74	L 2,787.34		L -	12.08	L 2,787.34	12.08	L 2,787.34	100%
15	JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2	ML	12.7	L 165.20	L 2,098.04	12.7	L 2,098.04		L -	12.7	L 2,098.04	100%
16	SOLERA 20X20, 4#3, #2@0.20, CONC 1:2:4	M.L.	24.13	L 325.21	L 7,847.32	24.13	L 7,847.32		L -	24.13	L 7,847.32	100%
17	PUERTA METALICA P-1 (1.00 X 2.10 M)	UND	2	L 4,525.61	L 9,051.22		L -	0.4	L 1,810.24	0.4	L 1,810.24	20%
18	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID	2	L 4,255.02	L 8,510.04		L -	0.4	L 1,702.01	0.4	L 1,702.01	20%
19	VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE)	M2	13.29	L 1,625.34	L 21,600.77		L -		L -	0	L -	0%
20	BALCONES (SUMINISTRO/INSTALACIONES)	M2	13.29	L 1,109.78	L 14,748.98		L -		L -	0	L -	0%
21	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	166.66	L 145.35	L 24,224.03		L -	166.66	L 24,224.03	166.66	L 24,224.03	100%
22	PINTURA DE ACEITE	M2	166.66	L 65.64	L 10,939.56		L -		L -	0	L -	0%
23	TECHO CANALETA 6 Y ALUZINC	M2	84.48	L 610.37	L 51,564.06		L -	84.48	L 51,564.06	84.48	L 51,564.06	100%
24	CANAL DE PVC ( SUM / INST )	M.L.	16	L 210.34	L 3,365.44		L -		L -	0	L -	0%
25	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M.L.	2	L 230.85	L 461.70		L -		L -	0	L -	0%
26	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	56.6	L 370.48	L 20,969.17		L -	15	L 5,557.20	15	L 5,557.20	27%
27	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	23.37	L 530.12	L 12,388.90		L -		L -	0	L -	0%
28	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	23.7	L 125.37	L 2,971.27		L -		L -	0	L -	0%
29	BANCA RECTANGULAR,CONCRETO(SUM/INST)	ML	15	L 1,225.04	L 18,375.60		L -		L -	0	L -	0%
30	ARMARIO METALICO	UNID	2	L 10,000.00	L 20,000.00		L -		L -	0	L -	0%
31	DUCHA TIPO	UNID	4	L 1,825.94	L 7,303.76		L -	3.5	L 6,390.79	3.5	L 6,390.79	88%
32	URINARIO COLECTIVO CERAMICA DE L=0.90MTS (INCLUYE ACCESORIOS)	UNID	2	L 5,525.64	L 11,051.28		L -		L -	0	L -	0%
33	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	2	L 3,525.19	L 7,050.38		L -		L -	0	L -	0%
34	TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96(SUM/INST)	UNID	3	L 380.74	L 1,142.22		L -	3	L 1,142.22	3	L 1,142.22	100%
35	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	50	L 21.32	L 1,066.00		L -	25	L 533.00	25	L 533.00	100%

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA**

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA												
PROYECTO:		CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL										
UBICACIÓN:		CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ										
EJECUTOR:		ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA										
CODIGO:		COT121701-2019										
ESTIMACION Nº 2												
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
36	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	50	L 85.46	L 4,273.00	25	L 2,136.50	25	L 2,136.50	50	L 4,273.00	100%
37	LAVAMANOS DE CONCRETO L=1.65 MTS (INC. ACCESORIOS)	M.L.	2	L 2,920.37	L 5,840.74		L -		L -	0	L -	0%
38	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	50	L 18.21	L 910.50		L -	50	L 910.50	50	L 910.50	100%
39	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	50	L 35.72	L 1,786.00		L -	50	L 1,786.00	50	L 1,786.00	100%
40	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	32	L 81.75	L 2,616.00		L -	32	L 2,616.00	32	L 2,616.00	100%
41	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	400	L 12.15	L 4,860.00	300	L 3,645.00		L -	300	L 3,645.00	75%
42	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	400	L 25.13	L 10,052.00	300	L 7,539.00		L -	300	L 7,539.00	75%
43	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	3	L 1,598.32	L 4,794.96		L -	1.5	L 2,397.48	1.5	L 2,397.48	50%
44	TANQUE SEPTICO 4M3 46-60 PERSONAS PARED DE LADRILL	UNID	1	L 25,512.37	L 25,512.37		L -		L -	0	L -	0%
45	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1	L 28,564.30	L 28,564.30		L -	0.25	L 7,141.08	0.25	L 7,141.08	25%
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 481,964.28</b>		<b>L 152,781.39</b>	<b>L 116,953.24</b>	<b>L 269,734.64</b>	<b>56%</b>		
<b>CAMERINOS ARBITRO</b>												
46	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	18.40	L 21.35	L 392.84	18.4	L 392.84		L -	18.4	L 392.84	100%
47	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	4.79	L 81.75	L 391.58	4.79	L 391.58		L -	4.79	L 391.58	100%
48	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	6.22	L 65.37	L 406.60	6.22	L 406.60		L -	6.22	L 406.60	100%
49	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	4.79	L 1,825.34	L 8,743.38	4.79	L 8,743.38		L -	4.79	L 8,743.38	100%
50	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	5.00	L 1,825.34	L 9,126.70	5	L 9,126.70		L -	5	L 9,126.70	100%
51	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID	5.00	L 141.32	L 706.60	5	L 706.60		L -	5	L 706.60	100%
52	SOLERA 20X20, 4#3, #2@0.20, CONC 1:2:4	ML	7.20	L 325.21	L 2,341.51	7.2	L 2,341.51		L -	7.2	L 2,341.51	100%
53	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4	ML	1.20	L 110.47	L 132.56		L -	1.2	L 132.56	1.2	L 132.56	100%
54	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	3.18	L 527.34	L 1,676.94	3.18	L 1,676.94		L -	3.18	L 1,676.94	100%
55	CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4	ML	22.40	L 245.31	L 5,494.94	22.4	L 5,494.94		L -	22.4	L 5,494.94	100%
56	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	23.46	L 510.78	L 11,982.90	20	L 10,215.60	3.46	L 1,767.30	23.46	L 11,982.90	100%
57	SOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.48	L 273.51	L 4,233.93	15.48	L 4,233.93		L -	15.48	L 4,233.93	100%
58	CARGADOR DE 10X15 2#3, #2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	2.60	L 201.25	L 523.25	2.6	L 523.25		L -	2.6	L 523.25	100%
59	BATIENTE C/PESTAÑA 10X15cm, 2#3, #2@25, CONC 1:2:2	ML	1.00	L 230.74	L 230.74		L -	1	L 230.74	1	L 230.74	100%
60	JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2	ML	8.40	L 165.20	L 1,387.68	8.4	L 1,387.68		L -	8.4	L 1,387.68	100%
61	SOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	10.56	L 258.78	L 2,732.72	10.56	L 2,732.72		L -	10.56	L 2,732.72	100%
62	PUERTA METALICA P-1 (1.00 X 2.10 M)	UND	1.00	L 4,525.61	L 4,525.61		L -	0.3	L 1,357.68	0.3	L 1,357.68	30%
63	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID	2.00	L 4,255.02	L 8,510.04		L -	0.6	L 2,553.01	0.6	L 2,553.01	30%
64	VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE)	M2	0.40	L 1,625.34	L 650.14		L -		L -	0	L -	0%
65	BALCONES (SUMINISTRO/INSTALACIONES)	M2	0.40	L 1,109.78	L 443.91		L -		L -	0	L -	0%
66	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	56.31	L 145.35	L 8,184.66		L -	56.31	L 8,184.66	56.31	L 8,184.66	100%
67	PINTURA DE ACEITE	M2	56.31	L 65.64	L 3,696.19		L -		L -	0	L -	0%
68	TECHO CANALETA 4 Y ALUZINC	M2	21.12	L 485.32	L 10,249.96		L -	21.12	L 10,249.96	21.12	L 10,249.96	100%
69	CANAL DE PVC ( SUM / INST )	M.L.	13.45	L 210.34	L 2,829.07		L -		L -	0	L -	0%

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA**

PROYECTO:	CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL
UBICACIÓN:	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ
EJECUTOR:	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA
CODIGO:	COT121701-2019

**ESTIMACION Nº 2**

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
70	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M.L.	2.00	L 230.85	L 461.70							0%
71	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	12.32	L 370.48	L 4,564.31			4	L 1,481.92	4	L 1,481.92	32%
72	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	4.80	L 530.12	L 2,544.58					0	L -	0%
73	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	3.35	L 105.11	L 352.12					0	L -	0%
74	BANCA RECTANGULAR, CONCRETO(SUM/INST)	ML	1.50	L 1,225.04	L 1,837.56					0	L -	0%
75	ARMARIO METALICO	UNID	1.00	L 10,000.00	L 10,000.00					0	L -	0%
76	DUCHA TIPO	UNID	1.00	L 1,825.94	L 1,825.94					0	L -	0%
77	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	1.00	L 3,525.19	L 3,525.19					0	L -	0%
78	TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96(SUM/INST)	UNID	1.00	L 380.74	L 380.74			1	L 380.74	1	L 380.74	100%
79	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	12.00	L 21.32	L 255.84	6	L 127.92	6	L 127.92	12	L 255.84	100%
80	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	12.00	L 85.46	L 1,025.52	6	L 512.76	6	L 512.76	12	L 1,025.52	100%
81	LAVAMANOS DE CONCRETO L=1.00 MTS (INC. ACCESORIOS)	M.L.	1	L 2,920.37	L 2,920.37					0	L -	0%
82	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	12.00	L 18.21	L 218.52			12	L 218.52	12	L 218.52	100%
83	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	12.00	L 35.72	L 428.64			12	L 428.64	12	L 428.64	100%
84	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	1.80	L 81.75	L 147.15			1.8	L 147.15	1.8	L 147.15	100%
85	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	12.00	L 12.15	L 145.80	6	L 72.90	6	L 72.90	12	L 145.80	100%
86	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	12.00	L 25.13	L 301.56	6	L 150.78	6	L 150.78	12	L 301.56	100%
87	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	1.00	L 1,598.32	L 1,598.32					0	L -	0%
88	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1.00	L 14,285.64	L 14,285.64			0.3	L 4,285.69	0.3	L 4,285.69	30%
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 136,413.96</b>		<b>L 49,238.64</b>	<b>L 32,282.94</b>	<b>L 81,521.58</b>	<b>60%</b>		
<b>SISTEMA DE RIEGO</b>												
89	CISTERNA DE 10,000 LITROS/EQUIPO NEHUMATICO	GLOBAL	1	L 33,237.34	L 33,237.34			0.1	L 3,323.73	0.1	L 3,323.73	10%
90	SISTEMA DE RIEGO PARA CAMPO DE FUTBOL	GLOBAL	1	L 104,256.51	L 104,256.51					0	L -	0%
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 137,493.85</b>	<b>L -</b>	<b>L 3,323.73</b>	<b>L 3,323.73</b>	<b>L 3,323.73</b>	<b>2%</b>		
<b>BANCA</b>												
91	CUBICULO PARA SUPLENTES	UND	2	L 29,281.85	L 58,563.70			0.5	L 14,640.93	0.5	L 14,640.93	25%
92	CUBICULO PARA SUPLENTES L. 2.00 MTS	UND	1	L 20,208.91	L 20,208.91			0.4	L 8,083.56	0.4	L 8,083.56	40%
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 78,772.61</b>	<b>L -</b>	<b>L 22,724.49</b>	<b>L 22,724.49</b>	<b>29%</b>			
<b>MODULO SANITARIO</b>												
93	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	39.90	L 21.35	L 851.87					0	L -	0%
94	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	9.22	L 81.75	L 753.74					0	L -	0%
95	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	11.52	L 65.37	L 753.06					0	L -	0%
96	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	1.48	L 52.80	L 78.14					0	L -	0%
97	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	8.34	L 1,825.34	L 15,223.34					0	L -	0%
98	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	6.95	L 1,825.34	L 12,686.11					0	L -	0%
99	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nú3, Nú2 @ 20 cm	UNID	6.00	L 579.10	L 3,474.60					0	L -	0%
100	DADO DE CONCRETO 40 X40 X 30, 4 Nú3, Nú2 @ 20 cm	UNID	3.00	L 141.32	L 423.96					0	L -	0%





**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA**

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA												
PROYECTO:		CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL										
UBICACIÓN:		CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ										
EJECUTOR:		ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA										
CODIGO:		COT121701-2019										
ESTIMACION Nº 2												
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
101	SOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	20.50	L 273.51	L 5,606.96		L -	L -	L -	0	L -	0%
102	CASTILLO 20X20 4NÚ3 Y NÚ2 @ 15 CM. CONCRETO 1:2:2	M.L.	31.14	L 310.15	L 9,658.07		L -	L -	L -	0	L -	0%
103	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.50	L 245.31	L 3,802.31		L -	L -	L -	0	L -	0%
104	SOLERA SUPERIOR 15X15, 4#3, #2" 20 CM	ML	25.50	L 268.68	L 6,878.84		L -	L -	L -	0	L -	0%
105	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	18.78	L 325.21	L 6,107.44		L -	L -	L -	0	L -	0%
106	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2	ML	2.40	L 201.25	L 483.00		L -	L -	L -	0	L -	0%
107	BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm, 2#3, #2@20cm, CONC 1:2:2	ML	6.30	L 230.74	L 1,453.66		L -	L -	L -	0	L -	0%
108	ENTABICADO DE BLOQUE 15cm(INC.REPELLO/PULIDO)	ML	4.60	L 141.61	L 651.41		L -	L -	L -	0	L -	0%
109	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.(**)	M2	42.92	L 510.78	L 21,922.68		L -	L -	L -	0	L -	0%
110	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	77.84	L 145.35	L 11,314.04		L -	L -	L -	0	L -	0%
111	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.10m	ML	6.28	L 45.03	L 282.79		L -	L -	L -	0	L -	0%
112	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 m	ML	36.40	L 50.17	L 1,826.19		L -	L -	L -	0	L -	0%
113	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	83.78	L 53.74	L 4,502.34		L -	L -	L -	0	L -	0%
114	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.25m	ML	37.56	L 58.20	L 2,185.99		L -	L -	L -	0	L -	0%
115	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	4.62	L 629.56	L 2,908.57		L -	L -	L -	0	L -	0%
116	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	27.54	L 530.12	L 14,599.50		L -	L -	L -	0	L -	0%
117	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	25.06	L 105.11	L 2,634.06		L -	L -	L -	0	L -	0%
118	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4	ML	9.00	L 110.47	L 994.23		L -	L -	L -	0	L -	0%
119	PINTURA DE ACEITE MATE	M2	130.07	L 65.64	L 8,537.79		L -	L -	L -	0	L -	0%
120	CERAMICA DE 20X30 cm (SUM/INST)	M2	20.90	L 325.47	L 6,802.32		L -	L -	L -	0	L -	0%
121	TECHO CANALETA 4", LAMINA ESM IND. MEDIO MOD SANIT	M2	41.29	L 485.32	L 20,038.86		L -	L -	L -	0	L -	0%
122	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP.	M2	7.03	L 1,625.34	L 11,426.14		L -	L -	L -	0	L -	0%
123	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2	7.03	L 1,109.78	L 7,801.75		L -	L -	L -	0	L -	0%
124	CANCEL METALICO PARA MODULO SANIT. PROMINE	UND	2.00	L 2,518.09	L 5,036.18		L -	L -	L -	0	L -	0%
125	CANCEL METALICO PARA DIVISION DE BAÑOS FRONTAL C/P	UND	3.00	L 1,625.38	L 4,876.14		L -	L -	L -	0	L -	0%
126	DIVISION METALICA PARA URINARIOS	UND	1.00	L 1,374.67	L 1,374.67		L -	L -	L -	0	L -	0%
127	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	15.94	L 5.50	L 87.67		L -	L -	L -	0	L -	0%
128	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	11.60	L 5.50	L 63.80		L -	L -	L -	0	L -	0%
129	LOSA DE CONCRETO E= 7 cms.	M2	5.30	L 801.37	L 4,247.26		L -	L -	L -	0	L -	0%
130	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	6.20	L 287.64	L 1,783.37		L -	L -	L -	0	L -	0%
131	BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UND	2.00	L 375.94	L 751.88		L -	L -	L -	0	L -	0%
132	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	2.23	L 88.44	L 197.22		L -	L -	L -	0	L -	0%
133	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	1.90	L 65.37	L 124.20		L -	L -	L -	0	L -	0%
134	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	19.55	L 25.13	L 491.29		L -	L -	L -	0	L -	0%
135	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	19.55	L 12.15	L 237.53		L -	L -	L -	0	L -	0%
136	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	15.93	L 19.20	L 305.86		L -	L -	L -	0	L -	0%

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA**

PROYECTO:	CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL
UBICACIÓN:	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ
EJECUTOR:	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA
CODIGO:	COT121701-2019
ESTIMACION N°:	2

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
137	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	15.93	L 11.30	L 180.01		L -		L -	0	L -	0%
138	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	12.15	L 71.81	L 872.49		L -		L -	0	L -	0%
139	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	12.15	L 14.91	L 181.16		L -		L -	0	L -	0%
140	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	4.00	L 3,525.19	L 14,100.76		L -		L -	0	L -	0%
141	LAVAMANOS DE CONCRETO (C.E.B.)	ML	2.00	L 1,210.82	L 2,421.64		L -		L -	0	L -	0%
142	URINARIO COLECTIVO CERAMICA DE L=0.90MTS (INCLUYE ACCESORIOS)	UNID	2.00	L 5,525.64	L 11,051.28		L -		L -	0	L -	0%
143	PILETA DE ASEO 80X80X45 cm	und	1.00	L 987.34	L 987.34		L -		L -	0	L -	0%
144	CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m	UND	2.00	L 2,100.87	L 4,201.74		L -		L -	0	L -	0%
145	CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR	UND	1.00	L 2,214.97	L 2,214.97		L -		L -	0	L -	0%
146	SIFON DE 3" HG EN PISO	UND	2.00	L 110.78	L 221.56		L -		L -	0	L -	0%
147	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO ø	M.L.	26.10	L 62.84	L 1,640.12		L -		L -	0	L -	0%
148	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	3.00	L 210.32	L 630.96		L -		L -	0	L -	0%
149	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	6.00	L 549.14	L 3,294.84		L -		L -	0	L -	0%
150	TANQUE SEPTICO 7M3 91-120 PERSONAS PARED DE BLOQUE	UNIDA	1.00	L 28,730.08	L 28,730.08		L -		L -	0	L -	0%
151	POZO ABSO 4.5x1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UNID	1.00	L 16,378.54	L 16,378.54		L -		L -	0	L -	0%
152	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	7.00	L 81.75	L 572.25	5	L 408.75		L -	5	L 408.75	71%
153	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	7.00	L 65.37	L 457.59	5	L 326.85		L -	5	L 326.85	71%
<b>SUB TOTAL</b>					<b>L 294,376.16</b>		<b>L 735.60</b>	<b>L -</b>	<b>L -</b>	<b>L 735.60</b>	<b>0%</b>	
MONTO A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION					L 1,129,020.86	L	202,755.63	L	175,284.40	L	378,040.04	33.48%

<b>EJECUTOR</b>	<b>SUPERVISION ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA</b>
FIRMA: 	FIRMA: 	FIRMA: 
ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	NOMBRE: LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO	NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ
FECHA: 07 DE MARZO 2019		

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 08 de febrero del 2019.

GABINO ARGUETA GÁLVEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA MARÍA LA PAZ  
Su oficina.

Ref. Supervisión de infraestructura Del  
proyecto: **CONSTRUCCIÓN II ETAPA  
ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO,  
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ.**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, me permito entregar el INFORME N°2, del proyecto en mención; comprende el periodo del 21 de enero al 07 de marzo del 2019.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



**ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO**  
UNIDAD DE PROYECTOS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



RESUMEN EJECUTIVO

<b>1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.</b>				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL</b>			
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b>			
<b>BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:</b>	El proyecto consiste en la construcción de camerinos para jugadores, camerinos para árbitros. Modulo sanitario para el público. Bancas de concreto, y sistema de riego.			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervisión está a cargo de la Unidad De Proyectos De La Alcaldía Municipal			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD</b>	<b>APORTE MUNICIPALIDAD</b>	<b>APORTE COMUNIDAD</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
<b>COSTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	L 1,129,020.86	L 1,129,020.86	L, 0.00	L 1,129,020.86
<b>COSTO DE SUPERVISIÓN (10% del monto del proyecto)</b>	L. 0.00			L. 0.00
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>				<b>L 1,129,020.86</b>

<b>1.2- INFORMACIÓN CONTRACTUAL.</b>	
<b>NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):</b>	<b>ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUÍA</b>
<b>SUPERVISIÓN</b>	UNIDAD DE PROYECTOS DE LA alcaldía Municipal ING. LUIS AMADOR.
<b>CONTRATO ORIGINAL</b>	
<b>FECHA DE FIRMA DE CONTRATO</b>	07 DE FEBRERO 2019
<b>FECHA DE ORDEN DE INICIO</b>	07 DE FEBRERO 2019
<b>PLAZO CONTRACTUAL</b>	120 días
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	08 DE MAYO 2019

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



**1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.**

**OBRA EJECUTADA:** se prepara el informe que corresponde a la estimación número uno del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 17.96% de las actividades del proyecto las cuales comprenden:

**CAMERINOS JUGADORES:**

- PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm
- BATIENTE C/PESTAÑA 10X15cm,2#3, #2@25, CONC 1:2:2
- PUERTA METÁLICA P-1 (1.00 X 2.10 M)
- PUERTA METÁLICA P-3 (2.1 X 0.8 M)
- REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4
- TECHO CANALETA 6 Y ALUZINC
- PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO
- DUCHA TIPO
- TUBERÍA PVC 2" P/VENTILACIÓN M.S. W-96(SUM/INST)
- INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4"
- SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 4" RD-41
- INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2"
- SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 2" RD-41
- EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMÚN)
- CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

**CAMERINOS ARBITRO**

- BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4
- PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm
- BATIENTE C/PESTAÑA 10X15cm,2#3, #2@25, CONC 1:2:2
- PUERTA METÁLICA P-1 (1.00 X 2.10 M)
- PUERTA METÁLICA P-3 (2.1 X 0.8 M)
- REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4
- TECHO CANALETA 4 Y ALUZINC
- PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO
- TUBERÍA PVC 2" P/VENTILACIÓN M.S. W-96(SUM/INST)
- INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4"
- SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 4" RD-41
- INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2"
- SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 2" RD-41
- EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMÚN)
- INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø"
- SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1/2" RD-13.5
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PRESENTANDO UN AVANCE FÍSICO DE UN 15.53%

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**

---



**SITUACIONES PRESENTADAS:**

No Hay

**SOLUCIONES PROPUESTAS:**

No Hay

**PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:**

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

**1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.


**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**

---



## **FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO**

**PROYECTO CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL**

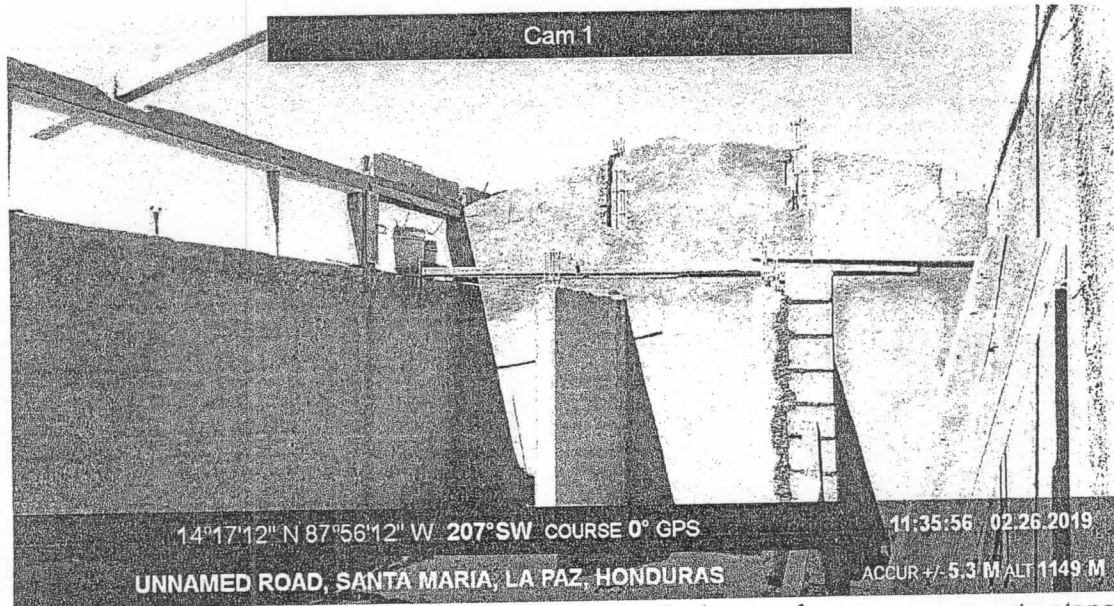

Repello de pared de Camerinos para árbitros, a la ves Podemos observar que en esta etapa las paredes están casi terminadas.



Puertas de camerinos.





Batiente y techo c. Jugadores



14°16'40" N 87°56'5" W 253°W COURSE 0° GPS

11:02:30 03.07.2019

V-478, HONDURAS

ACCUR +/- 2522.0 M ALT 0 M

Construcción De Batientes En Los Camerinos

Cam Jug



14°17'12" N 87°56'12" W 88°E COURSE 0° GPS

09:33:07 03.04.2019


UNNAMED ROAD, SANTA MARIA, LA PAZ, HONDURAS

ACCUR +/- 12.1 M ALT 1156 M

Instalacion De Techo



Construcción De Batientes En Los Camerinos

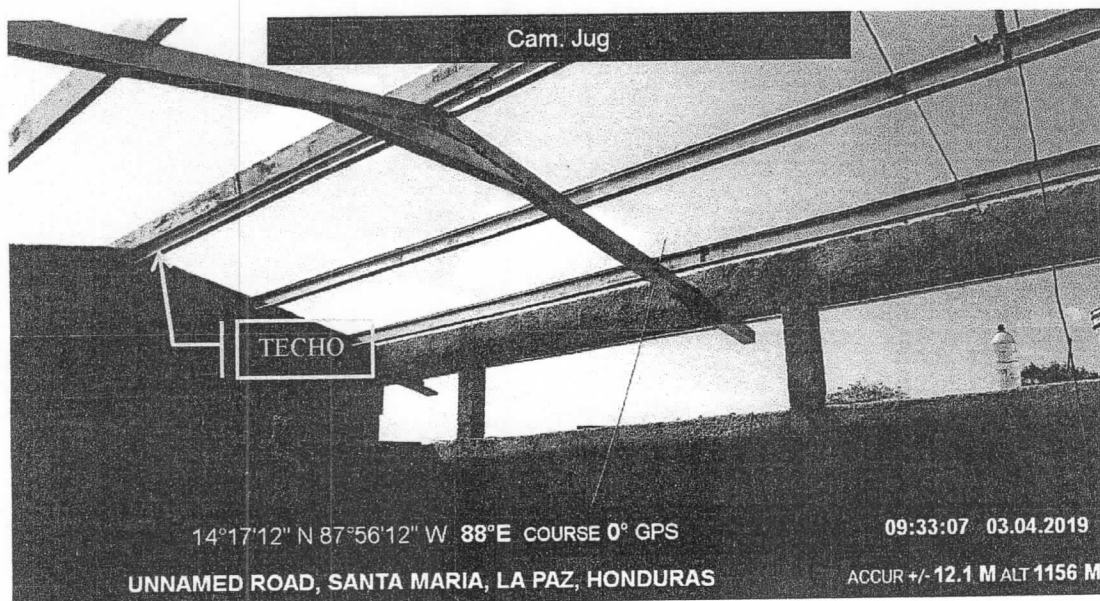

Instalacion De Techo

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

*Cristian Emmanuel Molina*

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2019 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 689987

*Santa Maria la Paz*  
Lugar y Fecha *07-03-19*

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

CRISTIAN ENMANUEL / MOLINA URQUIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL 21 DICIEMBRE 1987  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 27 FEBRERO 2011

1208-1987-00001



12899180-01

VALIDO HASTA *31-12-2019*



*Roberto Bigueta Ruiz*  
Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1208  
CRISTIAN ENMANUEL / MOLINA URQUIA  
1208-1987-00001



*Municipalidad de Santa María, La Paz*

*Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)*

*Tel. 2717-7803*

## **PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO**

Nombre del Negocio: **"Constructora Molina Urquía"**

Otorgado a: **"Cristian Enmanuel Molina Urquía"**

Identidad: **1208198700001**

N°. De Permiso: **250**

Solvencia: **689987**

Ubicación: **Santa María, La Paz**

Clase De Negocio: **Constructora.**

Conforme reglamento para apertura de establecimientos comerciales en el municipio de Santa María Departamento de La Paz.

El director municipal de justicia de este término municipal concede el presente permiso de operación de negocio, que es **válido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019**, el cual deberá ser colocado en un lugar visible.

**Este permiso está sujeto a suspensión y cancelación, en caso de no cumplimiento con las reglas establecidas según Artículo N° 27 y 28 de la ley de policía y convivencia social.**

Dado en Santa María, Departamento De La Paz a los 07 días del mes de Marzo del año 2019.

  
  
**Director Municipal De Justicia**

  
  
**Jefe De Administración Tributaria**



REPUBLICA DE HONDURAS  
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 COMISIONADA PRESIDENCIAL  
 ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 20160518

RTN:  
 12081987000010


**CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA**  
 Nombre o Razón Social

**Inscripciones**

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

*[Handwritten Signature]*



Comisionada Presidencial

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la CPAT cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento CPAT-412- 2277403

Transacción: D1F11B



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-19-10500-9380**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MOLINA URQUIA CRISTIAN ENMANUEL**  
Con Registro Tributario Nacional: **12081987000010**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-9380 en fecha 30/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417587553 de fecha 30/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.


Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 27717657345, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.






(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-9380** o mediante el siguiente código QR:




# BITÁCORA DE OBRA






FECHA 05 / 02 / 2019

<p>BITACORA DE PROYECTO CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA ESTADIO MUNICIPAL SANTA MARIA, LA PAZ. A LOS CINCO DIAS DEL</p>	
<p>MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, EN ESTE DIA SE CONTO CON LA PRESENCIA DEL ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO Y DEL SEÑOR ALCALDE EL SR. GABINO</p>	
<p>ARGUETA GANUEZ EN EL CUDI SE DESARROLA LA LOCALIZACION Y TRAZADO Y MARCADO DE LO QUE SERAN LOS CAMERINOS. ENCONTRANDOSE EL PROBLEMA DE QUE</p>	
<p>PONDE ESTAN DISEÑADOS SE PERDIA MUCHO ESPACIO UTIL DEL CAMPO Y EN EL DISEÑO NO SE PUEDE SACAR LA ELECTRICIDAD PARA DICHA CAMBRINOS Y HABRIDA</p>	
<p>QUE HACER UN PROYECTO DE ELECTRIFICACION, POR LO QUE SE TOMO A BIEN REUBICARLOS EN EL OTRO EXTREMO DEL CAMPO Y ASI SOLVERTAR LOS</p>	
<p>PROBLEMAS POR LO QUE SE PROCURIO A EL TRAZADO Y MARCADO.</p>	
 ING. LUIS F. PORTILLO	 ING. CRISTIAN E. MOUNA
<p>06 / 02 / 2019</p>	
<p>EN ESTE DIA SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD DE TRAZADO Y MARCADO ASI COMO TAMBIEN SE COMENZO CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) DE LOS CAMERINOS PARA PROSEGUIR</p>	
<p>CON LA CIMENTACION, SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO UN CLIMA SIN HUYA Y SIN OTROZOS EN EL MISMO</p>	
 ING. CRISTIAN MOUNA	

# BITÁCORA DE OBRA



FECHA 05 / 02 / 2019

	BITÁCORA DE PROYECTO CONSTRUCCIONES SEGUNDA ETAPA ESTADIO MUNICIPAL SANTA MARIA, LA PAZ.	ALOS CINCO DIAS DEL	
	MES DE FEBRERO DEL DOS MIL DIECINUEVE, EN ESTE DIA SE CONTO CON LA PRESENCIA DEL ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO Y DEL SEÑOR ALCALDE EL SR. GABINO ARGUETA GANUEZ EN EL CUDI SE DESARROLLO LA LOCALIZACION Y TRAZADO Y MARCADO DE LO QUE SERAN LOS CAMERINOS. ENCONTRANDOSE EL PROBLEMA DE QUE		
	DONDE ESTAN DISEÑADOS SE PERDIA MUCHO ESPACIO UTIL DEL CAMPO Y EN EL DISEÑO NO SE PUEDE SACAR LA ELECTRICIDAD PARA DICHA CAMERINOS Y HABRIA QUE HACER UN PROYECTO DE ELECTRIFICACION, POR LO QUE SE TOMO A BIEN REUBICARLOS EN EL OTRO EXTREMO DEL CAMPO Y ASI SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS POR LO QUE SE PROCEGIO A EL TRAZADO Y MARCADO.		
	 ING. LUIS F. PORTILLO	 ING. CRISTIAN E. MOUÑA	
	06 / 02 / 2019		
	EN ESTE DIA SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD DE TRAZADO Y MARCADO ASI COMO TAMBIEN SE COMENZO CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN) DE LOS CAMERINOS PARA PROSEGUIR CON LA CIMENTACION, SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO UN CIAMA SIN MUJAS Y SIN BTROZOS EN EL MISMO		
	 ING. CRISTIAN MOUÑA		



# BITÁCORA DE OBRA



N° 02

FECHA 07/02/2019

EN ESTE DIA SE PROCEGIO CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIA COMUN) EN LO QUE ES LOS CAMERINOS DE LOS JUGADORES Y DE LOS ARBITROS PARA NEGRO, PROCEGUIR CON LA ACTIVIDAD DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIAS. ENCONTRANDOSE EN EL SITIO UN CLIMA SIN LLUVIA

ING. CRISTIAN MOLINA

08/02/2019

EN ESTE DIA SE TERMINO CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIA COMUN) EN LO QUE ES LOS CAMERINOS TAMTO DE JUGADORES COMO DE ARBITRO, Y SE PROCEGIO CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION DE MATERIAL TIPO I (MATERIA COMUN) PARA LO QUE ES LA INSTALACION DE TUBERIA PARA ABASTECER A LOS COMERINOS DE AGUA Y ASU VEZ DEL PROYECTO, NO SE ENCONTRO ATRASOS EN EL PROYECTO

ING. CRISTIAN MOLINA

09/02/2019

ESTE DIA SE PROCEGIO CON LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION DE MATERIAL COMUN PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA QUE SERVIRA PARA ABASTECER A LOS CAMERINOS Y A EL PROYECTO DE AGUA, TDMBIEN SE RECIBIERON LOS MATERIALES PARA LA FABRICACION DE LA MAMPOSTERIA

# BITÁCORA DE OBRA




FECHA / /

N° 03



Y SEGUNTO CON LA PRESENCIA DEL INGENIERO LUIS FERNANDO PORTILLO EL CUAL VERIFICO Y DIO VISTO BUENO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES			
NO SE ENCONTRO ATRASOS EN EL PROYECTO			
ING. LUIS FERNANDO AMADOR	ING. CRISTIAN MOLINA		
10/02/2019			
EN ESTE DIA SE CUMPLINO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL PROYECTO ASU VEZ SE INICIO Y SE CUMPLINO LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DE TUBERIA PVC. DE 1/2.			
ING. CRISTIAN MOLINA			
11/02/2019			
ESTE DIA SE COMENZO CON LA ACTIVIDAD DE CIMENTACION DE MAMPPOSTERIA PARA LO QUE ES LOS CAMERINOS TANTO DE LOS JUGADORES ASI COMO DE LOS ARBITROS EN TAL PUNTO ESTA ACTIVIDAD COMO LO QUE ES LA ACTIVIDAD DE TRAZADO Y MARCAPO EXCAVACION AUMENTARON POR LOS CAMBIOS REALIZADOS EL DIA CINCO DE FEBRERO CUANDO SE DEFINIO Y ACEPTO LA UBICACION DE LOS CAMERINOS, POR LO QUE SE PROBUJO CON LA ACTIVIDAD ENCONTRANDOSE EN EL SITIO			



# BITÁCORA DE OBRA




Nº 04

FECHA    /    /

UN CLIMA SIN LLUVIA EN EL PROYECTO	POR LO QUE NO HUBO ATRAZOS		
 _____ ING. CRISTIAN MOLINA			
12/02/2019			
ESTE DIA SE FINALIZO LA ACTIVIDAD DE CIMENTACION DE MAMPOSTERIA A SU VEZ SE COMENZO CON EL ENCOFRADO PARA LOS SOLERAS DE 20X20 CM Y SE			
COMINCO CON LA ACTIVIDAD DE FUNDICIÓN DE TAPAS DE CONCRETO LOS CUALES AUMENTARON POR LOS CAMBIOS REALIZADOS EL DIA CINCO			
DE FEBRERO EN EL CAMBIO DE DIMENSIONES DE LOS CAMERINOS, SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO UN CLIMA SIN LLUVIA Y POR LO TANTO SIN			
ATRAZOS EN EL PROYECTO			
 _____ ING. CRISTIAN MOLINA			
13/02/2019			
EN ESTE DIA SE TERMINO DE ENCOFRAR Y FUNDIR LAS SOLERAS DE 20X20 CM. Y A SU VEZ SE EMPESO A LEVANTAR LAS PAREDES DE BLOQUE, ESTA ACTIVIDAD TAMBIEN AUMENTA			
DEBIDO A LOS CAMBIOS REALIZADOS EL DIA CINCO DE FEBRERO, TAMBIEN SE COMENZO CON			
LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION DE LO QUE ES EN TANQUE SEPTICO Y EL POZO DE ABSORCIÓN, SE TUBO EN EL PROYECTO UN CLIMA SIN LLUVIAS			



POR LO QUE NO UFO ATRAZOS EN EL PROYECTO				
				
ING. CRISTIAN MOLINA 14/02/2019				
EN ESTE DIA SE PROSIGUIO CON LA ACTIVIDAD DE LEVANTAMIENTO DE PAREDES Y CON LA EXCAVACION DE EL DOZO DE ABSORCIÓN Y TANQUE SEPTICO ENCONTRANDOSE SOLO UNO CAPO DE 50 CM. LA MATERIA COMÚN LO DEMOS ES MATERIAL DURO ROCA A SU VEZ SE RECIBIO LA VISITA DEL INGENIERO LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO QUIEN CONSTATO DE EL PROBLEMA Y DE EL AUMENTO EN LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS				
EL SUELO DONDE SE HACE LA EXCAVACION PARA DOZO DE ABSORCION Y TANQUE SEPTICO SON MATERIAL DURO.				
				

# BITÁCORA DE OBRA



FECHA 16/02/2019



N° 06


	<p>EN ESTE DIA LA ACTIVIDAD DE PAREDES ESTA A AHORA DE SOLERA DE 15X15 POR LO QUE SE PROSIGUIO A EL ENCOFRADO PARA SOLERAS INTERMEDIAS, LUEGO</p>		
	<p>SE PROCEDE A EL FUNDIDO DE LOS MISMAS, EN EL PROYECTO SE CUENTA CON UN BUEN CLIMA POR LO QUE NO URBO ATRAZOS EN EL MISMAS</p>		
	 ING. CRISTIAN MOLINA		
	<p>18/02/2019</p>		
	<p>EN ESTE DIA SE PROCEDE A EL DESENCOFRADO DE SOLERAS X CARGADORES, TAMBIEN SE COMENZO CON LA ACTIVIDAD DE RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL SELETO ASI MISMO LAS ACTIVIDADES</p>		
	<p>INSTALACION DE TUBERIAS (P.V.C.) TANTO DE 4 PUL3. 2 PUL3. Y 1/2 PUL3. EN AMBOS CAMERINOS NO SE TUBO ATRAZOS EN EL PROYECTO.</p>		
	 ING. CRISTIAN MOLINA		
	<p>21/02/2019</p>		
	<p>EN ESTE DIA SE TIENE PREPARADAS LAS PAREDES PARA FORMAR LOS CULOTAS PARA FORMAR LAS PENDIENTES DE LAS 2 AGUAS QUE SE QUEDO</p>		
	<p>EN ACUERDO EL DIA CINCO DE FEBRERO QUE SE ARIAN, TAMBIEN SE CULMINO CON LA ACTIVIDAD DE INSTALACIONES DE TUBERIAS (P.V.C.) Y</p>		



# BITACORA DE OBRA

FECHA / /

07


REllENO Y COMPACTADO. 					
ING. Cristian Molina  26/02/2019					
EN ESTE DIA SE TIENEN FORMADAS LAS CUMBRESAS O CUBIERTAS, PARA EMPEZAR CON LA ACTIVIDAD DE SOLERAS DE CIERRE DE 20X20 PARA LA COLOCACION DE LAS CANALETAS Y ASI FORMAR EL TECHO TAMBIEN SE CONTINUA CON EL REPELLO Y PULIDO DE PAREDES, SE ENCUENTRA EN EL PROYECTO UN CLIMA SIN LLUVIA POR LO QUE NO HAY ATRAZO EN EL PROYECTO.					
					
ING. Cristian Molina  28/02/2019					
EN ESTE DIA YA SE TIENEN ENCOFRADAS LAS SOLERAS DE 20X20 EN EL CAMERINO DE JUGADORES Y SE PROCEDE A LA COLOCACION DEL ENCOFRADO DE LAS SOLERAS DE EL CAMERINO DE ARBITROS, TAMBIEN SE RECIBIO LA VISITA DEL ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO EN EL CUAL SE VIO LA NECESIDAD DE COLOCAR UNAS TIJERAS DEBIDO A LA DISTANCIA ENTRE PAREDES QUE ES MUCHA Y LA CANALETA PODRIA DEFIECTARSE EN EL MEDIO Y ORIGINAR PROBLEMAS ESTRUCTURALES A EL TECHO DEBIDO A EL PESO DE LA CUBIERTA, A SU VET					

NOS PERCLAMAMOS DE LA FUERZA DE EL VIENTO QUE ES CONSIDERABLE EN EL SITIO DE LA OBRA Y PODRIA LEVANTAR TODA LA ESTRUCTURA YASI						
OCORRER PERDIDAS NO SOLO MATERIALES SI NO TAMBIEN HUMANAS, POR LO TANTO SE DECIDIO CONSTRUIR 3 TIGERAS DE TUBO ESTRUCTURAL DE						
4X4 PULGADOS GALBANIZADO NO SOLO PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LA ESTRUCTURA SI NO TAMBIEN DE LAS PERSONAS QUE ABRAN USO DE LAS						
INSTALACIONES						
<p>RESGUARDANDO Y PREVIENDO LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS SE DECIDIO TOMAR A CONSIDERACION LA MEDIDA DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO</p> 						
01/03/2019						
EN ESTE DIA SE COMENZO CON LA FABRICACION DE LAS TIGERAS DE TUBO ESTRUCTURAL QUE SERVIRAN DE						
APOYO A LA ESTRUCTURA DEL TECHO ASU VEZ SE CONTINUA CON EL REPELLO Y PUNDO DE PAREDES, EN EL SITIO DEL PROYECTO SE CUENTA CON UN CLIMA SIN						
LUVIA POR LO QUE NO HAY ATRASOS EN EL PROYECTO						
ING. CRISTIAN MOLINO						

EN ESTE DIA SE ISO LA INSTALACION DE LAS TIJERAS DE TUBO ESTRUCTURAL, ASU VEZ LA COLOCACION Y SOLDADURA DE LAS CANALETAS, TAMBIEN SE COMENZO CON LA				
COLOCACION DE LOS ATIEZADORES EN LA PARTE DE LOS CAMERINDS DE LOS JUGADORES, LUEGO SE PROCEIO A LA FUNDICION DE SOLERAS DE CIERRE				
DE 20X20 EN EL CAMERINO DE JUGADORES				
				
TNC. Cristian Molina				
04/03/2019				
EN ESTE DIA SE COMENZO CON EL DESENCOFRADO DE SOLERAS DE CIERRE 20X20 A SU VEZ CON EL REPELLO Y PUUNDO DE EL ENTABICADO				
LUEGO SE PROSIGUIO A LA COLOCACION DE LA CUBIERTA DE TECHO EN EL CAMERINO DE JUGADORES				
				
TNC. Cristian Molina				
05/03/2019				
EN ESTE DIA SE COMENZO CON EL ENCOFRADO Y ARMADO DE LA SOLERA DE CIERRE EN EL CAMERINO DE ARBITROS, TAMBIEN CON EL ENCOFRADO Y POSTERIOR FUNDICION DEL BATIENTE CON BESTANA EN				
EL CAMERINO DE JUGADORES, A SU VEZ SE COMENZO CON LA COLOCACION DE LAS CANALETAS				



# BITÁCORA DE OBRA




FECHA / /

N° 10

			PARA LA POSTERIOR FUNDICIÓN DE LAS SOLETRAS DE CIERRE, SE CONTO CON LA PRESENCIA DEL ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO QUIEN ISO UNA VISITA A EL PROYECTO
SE VISITA EL AREA DE TRABAJO EN LA CUAL SE OBSERVO Y SE ANALIZO EL SISTEMA ELECTRIC PLANTEADO O CONTRATADO. SE DISCUTIO LOS LUGARES DONDE DEBEN IR A LA VES LA UBICACION DE LANAMANOS. EL PROYECTO LLEVA UN BUEN AVANCE FISICO. SE VISITO EL AREA DE BODEGA EN EL CUAL SE ENCONTRO MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, AL IGUAL PARA EL PISO DE CONCRETO. TOMANDO EN CUENTA QUE EL VEJANTAMIENTO DE PAREDES YA ESTA EN UN 100%. TANTO EN CAMERINOS DE ARBITROS COMO DE JUGADORES. SE ENCONTRO PERSONAL TRABAJANDO Y IDENTIFICADON, CON EQUIPO DE PROTECCION.			
(Empty space for additional notes or signatures)			

FECHA: 06/03/2019



EN ESTE DIA SE DESARROLÓ LOS SOLERAS DE CIERRE  
DE LOS CUBIERTOS DE ARBITROS Y SE PROSIGUIÓ  
A LA SUDURA DE ATIESADORES EN LAS CANALLETAS  
PARA POSTERIORMENTE INSTALAR LA CUBIERTA  
DE TECHO. EN EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON  
UN CLIMA SIN LLUVIA Y SIN ATRAZO A EL PROYECTO

ING. Cristian Moreno

07/03/2019

EN ESTE DIA SE RECIBIO LA VISITA DEL ING. LUIS  
FERNANDO AMADOR PORTILLO QUIEN NOS PROPORCIONA  
LAS NUEVAS ESPECIFICACIONES DEL MODULO SANITARIO  
W-96 EN EL CUAL SE DISEÑO PARA SOPORTAR LA CARGA  
DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL  
CUAL SE DIERON LAS ESPECIFICACIONES SIGUIENTES

#1) ZAPATA CORRIDA DE 15x30 CM. 4 NÚ3  
N3 @ 30 CMS.

#2) COLUMNAS DE 20x20 CM. 4 #3, #2 @ 15cm  
EN LAS ESQUINAS DE LOS SANITARIOS  
DISEÑADOS PARA HOMBRES

#3) UNA LOSA QUE SOPORTA EL PESO DEL TANQUE  
DE AGUA e = 15 CM #4 @ 15 CM @ 15  
EL ESPESOR DE LA LOSA SE DETORNO EN PROCESO  
DE REVISION PARA ANALISIS

ING. Cristian Moreno



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 10015

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 75150586

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 765,543.82

QUE SE A: Cristian Emmanuel Molina Urquiza  
LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Ciento Sesenta y Cinco mil quinientos Cuarenta y tres con 82/100  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 09	COD. 35

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social Cultural y Com.	C. 765,543.82	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transparencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adición y mejoras de Obras Urb.		
467	Const. adición y mejora lugares de recreo		
35	Construcción II Etapa Estadio Municipal, Casco Urbano Sta. Maria.		
	Pago de Tercera estimación de avance de obra de dicho Proyecto.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>C. 765,543.82</b>	

E.N.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08015999408325

Fecha 27-03-2019

Firma del Responsable del Subprograma \_\_\_\_\_

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto \_\_\_\_\_

Firma y Sello del Alcalde Municipal \_\_\_\_\_

Recibido por (f) \_\_\_\_\_

Identidad No. 1208-1722-0001

Solvencia No. \_\_\_\_\_

Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 27 de Marzo del 2019.

Recibo por: Lps. 765,543.82

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

Ciento Sesenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y tres con 82/100

(Lps. 765,543.82) correspondiente al pago de la Estimación,

# 03 de Avance de Obra del proyecto

Construcción II-Etapa Estadio Municipal

Con Numero 35 Ubicado en Casco Urbano Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

#### Desglose del pago

<b>MONTO ESTIMADO</b>	<u>L. 277,706.65</u>
-Menos deducción de anticipo	<u>L. 40,707.50</u>
-Menos deducción de ISR	
-Menos 5% Calidad de Obra	<u>L. 70,855.33</u>
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	<u>L. 765,543.82</u>

Firma del Contratista: 

Nombre del contratista: Purgio Torres Albornoz

Identidad #: 1208-1987-00001

**Cristian Enmanuel Molina Urquia**  
Cel. 9785-5990 / R.T.N. 12081987000010  
CAI:42183B-A6902E-B04295-653E6F-B2405B-05  
Marcala, La Paz  
E-mail:crisenmol1987@gmail.com

RECIBO POR HONORARIOS  
N° 000-001-04-00000086

Fecha, 27 de MARZO del 2019

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

R.T.N. 12179003434704

La cantidad de: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES <sup>8200</sup>

Por concepto de: PAGO TERCERA ESTIMACION DE PROYECTO  
SEGUNDA ETAPA ESTADIO MUNICIPAL

Total por Honorarios	L.	<u>165,543.82</u>
Total Neto Recibido	L.	<u>165,543.82</u>



Fecha Limite de Emisión:29/05/2019  
Rango otorgado:000-001-04-00000051 al 000-001-04-00000100  
Imp. La Independencia, Bo. Abajo, Frente a las Oficinas de la E.N.E.E., Comayagua. Tel. 2772-1175 / R.T.N. 14011981009990 Certificado N° 9231-15-10500-78

Firma

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 27 de Marzo del 2019.

**FRANCIS LOANY VÁSQUEZ URQUIA**  
**DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA**  
Su oficina.

Estimada:


Se remite la documentación de tercera estimación del proyecto **CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL, UBICACIÓN: CASCO URBANO SANTA MARÍA, LA PAZ**, de lo que se da fe que la documentación esta verificada tanto en campo como en oficina. Actuando como supervisor de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL**. Dicha documentación consta de:

- ESTIMACIÓN
- INFORME DE ESTIMACIÓN
- TABLA DE RETENCIONES
- PAGO A CUENTA CON FECHAS VIGENTES
- FOTOCOPIA DE IDENTIDAD
- FOTOCOPIA DE RTN
- FOTOCOPIA DE BITÁCORA CON LA ULTIMA ESTIMACIÓN BITÁCORA ORIGINAL
- BOLETA CAI VIGENTE.
- FOTOGRAFÍAS DETALLANDO EL AVANCE MÍNIMO 3 HOJAS, 8 FOTOGRAFÍAS.
- NOTA DE REMISIÓN A TESORERÍA POR LA SUPERVISIÓN.

ESTIMACIÓN	MONTO PAGADO	RETENCIÓN ISR 12.5%	RETENCIÓN CALIDAD DE OBRA	RETENCIÓN POR ANTICIPO	MONTO TOTAL	DE	AL
PRIMERA	L 154,601.17	L -	L 10,137.78	L 38,016.68	L 202,755.63	07/02/19	20/02/19
SEGUNDA	L 133,654.36	L -	L 8,764.22	L 32,865.83	L 175,284.40	21/02/19	07/03/19
TERCERA	L 165,543.82	L -	L 10,855.33	L 40,707.50	L 217,106.65	08/03/19	27/03/19
<b>TOTAL</b>	<b>L 453,799.35</b>	<b>L -</b>	<b>L 29,757.33</b>	<b>L 111,590.00</b>	<b>L 595,146.69</b>		

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



**ING. LUIS AMADOR**  
UNIDAD DE PROYECTOS  
ALCALDÍA SANTA MARÍA

## RETENCIONES DE ESTIMACIONES

CODIGO:	LPR-ALCALDIA DE SANTA MARIA-01-2019
NOMBRE DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO:	LA PAZ
MUNICIPIO:	SANTA MARIA
ALDEA:	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ
CONTRATISTA:	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA
FECHA DE INICIO:	07/02/19
PLAZO:	120
FECHA DE FINALIZACION:	07/06/19

FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	Tercera Estimacion del:	08/03/19	AL:	27/03/19
<b>CREDITO:</b>		<b>LPS</b>			
	Monto Inicial de Contrato	L 1129,020.86			
	Anticipo del 15% del Monto del Contrato	L 169,353.13			
	Monto Acumulado por O/C				
	Monto Acumulado por Adendum				
	Monto Final	L 1129,020.86			
	Monto de Tercera Estimacion	L 217,106.65			

VoBo


  
**SUPERVISOR MUNICIPALIDAD**

	% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
Retencion Sobre Anticipo	19.23%	1.25	24.04%	169,353.13	40,707.50
					L 1129,020.86

	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
Retencion de Calidad de obra	1.050	5.00%	217,106.65	10,855.33
				L 1129,020.86

### RESUMEN

Monto Estimado	L	<b>217,106.65</b>
Menos Deducion de Anticipo	L	<b>40,707.50</b>
Menos Deducion I.S.R 12.5%		
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%		
Deducciones 5% Calidad de Obra	L	<b>10,855.33</b>
<b>TOTAL A PAGAR TERCERA ESTIMACION</b>	L	<b>165,543.82</b>

MONTO DEL ANTICIPO	L169,353.13	100%
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	L38,016.68	22.45%
AMORTIZACION 2da. ESTIMACION	L32,865.83	19.41%
AMORTIZACION 3ra. ESTIMACION	L40,707.50	24.04%
<b>TOTAL AMORTIZADO</b>	<b>L111,590.00</b>	<b>65.89%</b>
<b>FALTA POR AMORTIZAR</b>	<b>L57,763.12</b>	<b>34.11%</b>

## MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL  
 UBICACIÓN: CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ  
 EJECUTOR: ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA  
 CODIGO: LPR121701-2019

ESTIMACION Nº 3

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
<b>CAMERINOS JUGADORES</b>												
1	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	66.8	L 21.35	L 1,426.18	66.8	L 1,426.18		L -	66.8	L 1,426.18	100%
2	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	13.78	L 81.75	L 1,126.52	13.78	L 1,126.52		L -	13.78	L 1,126.52	100%
3	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	17.91	L 85.37	L 1,170.78	17.91	L 1,170.78		L -	17.91	L 1,170.78	100%
4	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	13.77	L 1,825.34	L 25,134.93	13.77	L 25,134.93		L -	13.77	L 25,134.93	100%
5	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	12.99	L 1,825.34	L 23,711.17	12.99	L 23,711.17		L -	12.99	L 23,711.17	100%
6	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID	11	L 141.32	L 1,554.52	11	L 1,554.52		L -	11	L 1,554.52	100%
7	SOLERA 20X20, 4#3, #2@0.20, CONC 1:2:4	ML	27.76	L 310.15	L 8,609.76	27.76	L 8,609.76		L -	27.76	L 8,609.76	100%
8	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4	ML	4.69	L 110.47	L 518.10	4.69	L 518.10		L -	4.69	L 518.10	100%
9	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	19.27	L 527.34	L 10,161.84	19.27	L 10,161.84		L -	19.27	L 10,161.84	100%
10	CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4	ML	35.8	L 245.31	L 8,782.10	35.8	L 8,782.10		L -	35.8	L 8,782.10	100%
11	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	83.33	L 510.78	L 42,563.30	83.33	L 42,563.30		L -	83.33	L 42,563.30	100%
12	SOLERA 15X15 4 Nú3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	27.76	L 273.51	L 7,592.64	27.76	L 7,592.64		L -	27.76	L 7,592.64	100%
13	CARGADOR DE 10X15 2#3;#2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	4.4	L 201.25	L 885.50	4.4	L 885.50		L -	4.4	L 885.50	100%
14	BATIENTE C/PESTAÑA 10X15cm,2#3,#2@25, CONC 1:2:2	ML	12.08	L 230.74	L 2,787.34	12.08	L 2,787.34		L -	12.08	L 2,787.34	100%
15	JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2	ML	12.7	L 165.20	L 2,098.04	12.7	L 2,098.04		L -	12.7	L 2,098.04	100%
16	SOLERA 20X20, 4#3, #2@0.20, CONC 1:2:4	M.L.	24.13	L 325.21	L 7,847.32	24.13	L 7,847.32		L -	24.13	L 7,847.32	100%
17	PUERTA METALICA P-1 (1.00 X 2.10 M)	UND	2	L 4,525.61	L 9,051.22	0.4	L 1,810.24	0.6	L 2,715.37	1	L 4,525.61	50%
18	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID	2	L 4,255.02	L 8,510.04	0.4	L 1,702.01	0.6	L 2,553.01	1	L 4,255.02	50%
19	VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE)	M2	13.29	L 1,625.34	L 21,600.77	0	L -		L -	0	L -	0%
20	BALCONES (SUMINISTRO/INSTALACIONES)	M2	13.29	L 1,109.78	L 14,748.98	0	L -	8	L 8,878.24	8	L 8,878.24	60%
21	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	166.66	L 145.35	L 24,224.03	166.66	L 24,224.03		L -	166.66	L 24,224.03	100%
22	PINTURA DE ACEITE	M2	166.66	L 65.64	L 10,939.56	0	L -		L -	0	L -	0%
23	TECHO CANALETA 6 Y ALUZINC	M2	84.48	L 610.37	L 51,564.06	84.48	L 51,564.06		L -	84.48	L 51,564.06	100%
24	CANAL DE PVC (SUM / INST)	M.L.	16	L 210.34	L 3,365.44	0	L -		L -	0	L -	0%
25	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M.L.	2	L 230.85	L 461.70	0	L -		L -	0	L -	0%
26	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	56.6	L 370.48	L 20,969.17	15	L 5,557.20	41.6	L 15,411.97	56.6	L 20,969.17	100%
27	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	23.37	L 530.12	L 12,388.90	0	L -		L -	0	L -	0%
28	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	23.7	L 125.37	L 2,971.27	0	L -		L -	0	L -	0%
29	BANCA RECTANGULAR, CONCRETO(SUM/INST)	ML	15	L 1,225.04	L 18,375.60	0	L -	4	L 4,900.16	4	L 4,900.16	27%
30	ARMARIO METALICO	UNID	2	L 10,000.00	L 20,000.00	0	L -		L -	0	L -	0%
31	DUCHA TIPO	UNID	4	L 1,825.94	L 7,303.76	3.5	L 6,390.79		L -	3.5	L 6,390.79	88%
32	URINARIO COLECTIVO CERAMICA DE L=0.90MTS (INCLUYE ACCESORIOS)	UNID	2	L 5,525.64	L 11,051.28	0	L -	0.4	L 2,210.26	0.4	L 2,210.26	20%
33	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	2	L 3,525.19	L 7,050.38	0	L -	0.6	L 2,115.11	0.6	L 2,115.11	30%
34	TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96(SUM/INST)	UNID	3	L 380.74	L 1,142.22	3	L 1,142.22		L -	3	L 1,142.22	100%
35	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	50	L 21.32	L 1,066.00	50	L 1,066.00		L -	50	L 1,066.00	100%
36	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	50	L 85.46	L 4,273.00	50	L 4,273.00		L -	50	L 4,273.00	100%
37	LAVAMANOS DE CONCRETO L=1.65 MTS (INC. ACCESORIOS)	M.L.	2	L 2,920.37	L 5,840.74	0	L -	0.4	L 1,168.15	0.4	L 1,168.15	20%
38	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	50	L 18.21	L 910.50	50	L 910.50		L -	50	L 910.50	100%
39	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	50	L 35.72	L 1,786.00	50	L 1,786.00		L -	50	L 1,786.00	100%
40	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	32	L 81.75	L 2,616.00	32	L 2,616.00		L -	32	L 2,616.00	100%
41	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	400	L 12.15	L 4,860.00	300	L 3,645.00		L -	300	L 3,645.00	75%
42	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	400	L 25.13	L 10,052.00	300	L 7,539.00		L -	300	L 7,539.00	75%
43	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	3	L 1,598.32	L 4,794.96	1.5	L 2,397.48	0.5	L 799.16	2	L 3,196.64	67%



## MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

		PROYECTO:	CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL									
		UBICACIÓN:	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ									
		EJECUTOR:	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA									
		CODIGO:	LPR121701-2019									
		ESTIMACION Nº	3									
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
44	TANQUE SEPTICO 4M3 46-60 PERSONAS PARED DE LADRILL	UNID	1	L 25,512.37	L 25,512.37	0	L -	L -	L -	0	L -	0%
45	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1	L 28,564.30	L 28,564.30	0.25	L 7,141.08	0.6	L 17,138.58	0.85	L 24,279.66	85%
<b>SUB TOTAL</b>					L 481,964.28		L 269,734.64	L 57,890.00	L 327,624.64		68%	
<b>CAMERINOS ARBITRO</b>												
46	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	18.40	L 21.35	L 392.84	18.4	L 392.84	L -	L -	18.4	L 392.84	100%
47	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	4.79	L 81.75	L 391.58	4.79	L 391.58	L -	L -	4.79	L 391.58	100%
48	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	6.22	L 65.37	L 406.60	6.22	L 406.60	L -	L -	6.22	L 406.60	100%
49	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	4.79	L 1,825.34	L 8,743.38	4.79	L 8,743.38	L -	L -	4.79	L 8,743.38	100%
50	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	5.00	L 1,825.34	L 9,126.70	5	L 9,126.70	L -	L -	5	L 9,126.70	100%
51	DADO DE CONCRETO 40 X 30 X 30 (Concreto Simple)	UNID	5.00	L 141.32	L 706.60	5	L 706.60	L -	L -	5	L 706.60	100%
52	SOLERA 20X20, 4#3, #2@0.20, CONC 1:2:4	ML	7.20	L 325.21	L 2,341.51	7.2	L 2,341.51	L -	L -	7.2	L 2,341.51	100%
53	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4	ML	1.20	L 110.47	L 132.56	1.2	L 132.56	L -	L -	1.2	L 132.56	100%
54	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	3.18	L 527.34	L 1,676.94	3.18	L 1,676.94	L -	L -	3.18	L 1,676.94	100%
55	CASTILLO 15X15cm, 4#3, #2@20cm, CONC 1:2:4	ML	22.40	L 245.31	L 5,494.94	22.4	L 5,494.94	L -	L -	22.4	L 5,494.94	100%
56	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15cm	M2	23.46	L 510.78	L 11,982.90	23.46	L 11,982.90	L -	L -	23.46	L 11,982.90	100%
57	SOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.48	L 273.51	L 4,233.93	15.48	L 4,233.93	L -	L -	15.48	L 4,233.93	100%
58	CARGADOR DE 10X15 2#3, #2 @ 0.15 CONCRETO 1:2:2	M.L.	2.60	L 201.25	L 523.25	2.6	L 523.25	L -	L -	2.6	L 523.25	100%
59	BATIENTE C/PESTAÑA 10X15cm, 2#3, #2@25, CONC 1:2:2	ML	1.00	L 230.74	L 230.74	1	L 230.74	L -	L -	1	L 230.74	100%
60	JAMBA 10X15cm, 2#3, #2@15 cm, CONC 1:2:2	ML	8.40	L 165.20	L 1,387.68	8.4	L 1,387.68	L -	L -	8.4	L 1,387.68	100%
61	SOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	10.56	L 258.78	L 2,732.72	10.56	L 2,732.72	L -	L -	10.56	L 2,732.72	100%
62	PUERTA METALICA P-1 (1.00 X 2.10 M)	UND	1.00	L 4,525.61	L 4,525.61	0.3	L 1,357.68	0.3	L 1,357.68	0.6	L 2,715.37	60%
63	PUERTA METALICA P-3 (2.1 X 0.8 M)	UNID	2.00	L 4,255.02	L 8,510.04	0.6	L 2,553.01	0.6	L 2,553.01	1.2	L 5,106.02	60%
64	VENTANA ALUMINO Y CELOSIA TRANSP (INCLUYE RESANE)	M2	0.40	L 1,625.34	L 650.14	0	L -	L -	L -	0	L -	0%
65	BALCONES (SUMINISTRO/INSTALACIONES)	M2	0.40	L 1,109.78	L 443.91	0	L -	0.3	L 332.93	0.3	L 332.93	75%
66	REPELO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	56.31	L 145.35	L 8,184.66	56.31	L 8,184.66	L -	L -	56.31	L 8,184.66	100%
67	PINTURA DE ACEITE	M2	56.31	L 65.64	L 3,696.19	0	L -	L -	L -	0	L -	0%
68	TECHO CANALETA 4 Y ALUZINC	M2	21.12	L 485.32	L 10,249.96	21.12	L 10,249.96	L -	L -	21.12	L 10,249.96	100%
69	CANAL DE PVC ( SUM / INST )	M.L.	13.45	L 210.34	L 2,829.07	0	L -	L -	L -	0	L -	0%
70	BAJANTE P/AGUAS LLUVIAS P.V.C 3"	M.L.	2.00	L 230.85	L 461.70	0	L -	L -	L -	0	L -	0%
71	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO	M2	12.32	L 370.48	L 4,564.31	4	L 1,481.92	8.32	L 3,082.39	12.32	L 4,564.31	100%
72	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	4.80	L 530.12	L 2,544.58	0	L -	L -	L -	0	L -	0%
73	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	3.35	L 105.11	L 352.12	0	L -	L -	L -	0	L -	0%
74	BANCA RECTANGULAR, CONCRETO(SUM/INST)	ML	1.50	L 1,225.04	L 1,837.56	0	L -	0.4	L 490.02	0.4	L 490.02	27%
75	ARMARIO METALICO	UNID	1.00	L 10,000.00	L 10,000.00	0	L -	L -	L -	0	L -	0%
76	DUCHA TIPO	UNID	1.00	L 1,825.94	L 1,825.94	0	L -	L -	L -	0	L -	0%
77	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	1.00	L 3,525.19	L 3,525.19	0	L -	L -	L -	0	L -	0%
78	TUBERIA PVC 2" P/VENTILACION M.S. W-96(SUM/INST)	UNID	1.00	L 380.74	L 380.74	1	L 380.74	0.6	L 2,115.11	0.6	L 2,115.11	60%
79	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	12.00	L 21.32	L 255.84	12	L 255.84	L -	L -	12	L 255.84	100%
80	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	12.00	L 85.46	L 1,025.52	12	L 1,025.52	L -	L -	12	L 1,025.52	100%
81	LAVAMANOS DE CONCRETO L=1.00 MTS (INC. ACCESORIOS)	M.L.	1	L 2,920.37	L 2,920.37	0	L -	0.2	L 584.07	0.2	L 584.07	20%
82	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	12.00	L 18.21	L 218.52	12	L 218.52	L -	L -	12	L 218.52	100%
83	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	12.00	L 35.72	L 428.64	12	L 428.64	L -	L -	12	L 428.64	100%
84	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	1.80	L 81.75	L 147.15	1.8	L 147.15	L -	L -	1.8	L 147.15	100%
85	INSTALACION DE TUBERIA PVC ø"	M.L.	12.00	L 12.15	L 145.80	12	L 145.80	L -	L -	12	L 145.80	100%

## MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

		PROYECTO:	CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL										
		UBICACIÓN:	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ										
		EJECUTOR:	ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA										
		CODIGO:	LPR121701-2019										
		ESTIMACION Nº	3										
N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%	
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL		
86	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	12.00	L 25.13	L 301.56								
87	CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.	UNID	1.00	L 1,598.32	L 1,598.32	12	L 301.56		L -	12	L 301.56	100%	
88	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	1.00	L 14,285.64	L 14,285.64	0	L -	1	L 1,598.32	1	L 1,598.32	100%	
<b>SUB TOTAL</b>							0.3	L 4,285.69	0.5	L 7,142.82	0.8	L 11,428.51	80%
					L 136,413.96			L 81,521.58	L 19,256.37		L 100,777.94	74%	
<b>SISTEMA DE RIEGO</b>													
89	CISTERNA DE 10,000 LITROS/EQUIPO NEUMATICO	GLOBAL	1	L 33,237.34	L 33,237.34								
90	SISTEMA DE RIEGO PARA CAMPO DE FUTBOL	GLOBAL	1	L 104,256.51	L 104,256.51	0.1	L 3,323.73	0.8	L 26,589.87	0.9	L 29,913.61	90%	
<b>SUB TOTAL</b>							0	L -		L -	0	L -	0%
					L 137,493.85			L 3,323.73	L 26,589.87		L 29,913.61	22%	
<b>BANCA</b>													
91	CUBICULO PARA SUPLENTE	UND	2	L 29,281.85	L 58,563.70								
92	CUBICULO PARA SUPLENTE L 2.00 MTS	UND	1	L 20,208.91	L 20,208.91	0.5	L 14,640.93		L -	0.5	L 14,640.93	25%	
<b>SUB TOTAL</b>							0.4	L 8,083.56		L -	0.4	L 8,083.56	40%
					L 78,772.61			L 22,724.49	L -		L 22,724.49	29%	
<b>MODULO SANITARIO</b>													
93	TRAZADO Y MARCADO	M.L.	39.90	L 21.35	L 851.87								
94	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	9.22	L 81.75	L 753.74		L -	39.9	L 851.87	39.9	L 851.87	100%	
95	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	11.52	L 65.37	L 753.06		L -	9.22	L 753.74	9.22	L 753.74	100%	
96	REMOCION DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.)	M3	1.48	L 52.80	L 78.14		L -	11.52	L 753.06	11.52	L 753.06	100%	
97	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA	M3	8.34	L 1,825.34	L 15,223.34		L -	1.48	L 78.14	1.48	L 78.14	100%	
98	SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERIA	M3	6.95	L 1,825.34	L 12,686.11		L -	8.34	L 15,223.34	8.34	L 15,223.34	100%	
99	DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 NÚ3, NÚ2 @ 20 cm	UNID	6.00	L 579.10	L 3,474.60		L -	6.95	L 12,686.11	6.95	L 12,686.11	100%	
100	DADO DE CONCRETO 40 X40 X 30, 4 NÚ3, NÚ2 @ 20 cm	UNID	3.00	L 141.32	L 423.96		L -	6	L 3,474.60	6	L 3,474.60	100%	
101	SOLERA 15X15 4 NÚ3, NÚ2 A 20 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	20.50	L 273.51	L 5,606.96		L -	3	L 423.96	3	L 423.96	100%	
102	CASTILLO 20X20 4NÚ3 Y NÚ2 @ 15 CM. CONCRETO 1:2:2	M.L.	31.14	L 310.15	L 9,658.07		L -	20.5	L 5,606.96	20.5	L 5,606.96	100%	
103	CASTILLO 15X15, 4#3 Y #2 @ 15, CONCRETO 1:2:2	M.L.	15.50	L 245.31	L 3,802.31		L -		L -	0	L -	0%	
104	SOLERA SUPERIOR 15X15, 4#3, #2" 20 CM	ML	25.50	L 269.68	L 6,876.84		L -		L -	0	L -	0%	
105	SOLERA 20X25, 4#3 Y #2 @ 20 CONCRETO 1:2:2	M.L.	18.78	L 325.21	L 6,107.44		L -	25.5	L 6,876.84	25.5	L 6,876.84	100%	
106	CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2	ML	2.40	L 201.25	L 483.00		L -		L -	0	L -	0%	
107	BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2	ML	6.30	L 230.74	L 1,453.66		L -	2.4	L 483.00	2.4	L 483.00	100%	
108	ENTABICADO DE BLOQUE 15cm(INC.REPELLO/PULIDO)	ML	4.60	L 141.61	L 651.41		L -	6.3	L 1,453.66	6.3	L 1,453.66	100%	
109	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.(**)	M2	42.92	L 510.78	L 21,922.68		L -		L -	0	L -	0%	
110	REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	77.84	L 145.35	L 11,314.04		L -	42.92	L 21,922.68	42.92	L 21,922.68	100%	
111	TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.10m	ML	6.28	L 45.03	L 282.79		L -	60	L 8,721.00	60	L 8,721.00	77%	
112	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 m	ML	36.40	L 50.17	L 1,826.19		L -	6.28	L 282.79	6.28	L 282.79	100%	
113	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m	ML	83.78	L 53.74	L 4,502.34		L -	36.4	L 1,826.19	36.4	L 1,826.19	100%	
114	TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.25m	ML	37.56	L 58.20	L 2,185.99		L -	83.78	L 4,502.34	83.78	L 4,502.34	100%	
115	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO)	M3	4.62	L 629.56	L 2,908.57		L -		L -	0	L -	0%	
116	PISO GRANITO TERRAZO 30X30	M2	27.54	L 530.12	L 14,599.50		L -	4.62	L 2,908.57	4.62	L 2,908.57	100%	
117	MOLDURA PARA PISO TERRAZO 30X30 Cms.	M.L.	25.06	L 105.11	L 2,634.06		L -		L -	0	L -	0%	
118	BORDILLO DE CONCRETO DE 10X10cm, CONC 1:2:4	ML	9.00	L 110.47	L 994.23		L -		L -	0	L -	0%	
119	PINTURA DE ACEITE MATE	M2	130.07	L 65.64	L 8,537.79		L -		L -	0	L -	0%	
120	CERAMICA DE 20X30 cm (SUM/INST)	M2	20.90	L 325.47	L 6,802.32		L -		L -	0	L -	0%	
121	TECHO CANALETA 4", LAMINA ESM IND. MEDIO MOD SANIT	M2	41.29	L 485.32	L 20,038.86		L -		L -	0	L -	0%	
122	VENTANA ALUM. Y CELOSIA TRANSP.	M2	7.03	L 1,625.34	L 11,426.14		L -		L -	0	L -	0%	
123	BALCON PARA VENTANAS (PROMINE)	M2	7.03	L 1,109.78	L 7,801.75		L -		L -	0	L -	0%	
124	CANCEL METALICO PARA MODULO SANIT. PROMINE	UND	2.00	L 2,518.09	L 5,036.18		L -		L -	0	L -	0%	

## MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

**PROYECTO:** CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL  
**UBICACIÓN:** CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA, LA PAZ  
**EJECUTOR:** ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA  
**CODIGO:** LPR121701-2019

ESTIMACION Nº 3

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
125	CANCEL METALICO PARA DIVISION DE BAÑOS FRONTAL C/P	UND	3.00	L 1,625.38	L 4,876.14							
126	DIVISION METALICA PARA URINARIOS	UND	1.00	L 1,374.67	L 1,374.67							0%
127	LIMPIEZA FINAL DE AREAS INTERIORES	M2	15.94	L 5.50	L 87.67							0%
128	LIMPIEZA FINAL DE EXTERIORES (CORREDORES/ACERAS)	M2	11.60	L 5.50	L 63.80							0%
129	LOSA DE CONCRETO E= 7 cms.	M2	5.30	L 801.37	L 4,247.26							0%
130	CANAL DE AGUA LLUVIAS PVC	ML	6.20	L 287.64	L 1,783.37							0%
131	BAJANTE A. LL. PVC 3" EMBEBIDO EN COL. FRONTAL	UND	2.00	L 375.94	L 751.88							0%
132	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	2.23	L 88.44	L 197.22							0%
133	RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO	M3	1.90	L 65.37	L 124.20			2.23	L 197.22	2.23	L 197.22	100%
134	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 1/2" RD-13.5	M.L.	19.55	L 25.13	L 491.29			1.9	L 124.20	1.9	L 124.20	100%
135	INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø"	M.L.	19.55	L 12.15	L 237.53			19.55	L 491.29	19.55	L 491.29	100%
136	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 2" RD-41	M.L.	15.93	L 19.20	L 305.86			15.93	L 237.53	15.93	L 237.53	100%
137	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2"	M.L.	15.93	L 11.30	L 180.01			15.93	L 305.86	15.93	L 305.86	100%
138	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 4" RD-41	M.L.	12.15	L 71.81	L 872.49			12.15	L 180.01	12.15	L 180.01	100%
139	INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 4"	M.L.	12.15	L 14.91	L 181.16			12.15	L 872.49	12.15	L 872.49	100%
140	SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST)	UNID	4.00	L 3,525.19	L 14,100.76							100%
141	LAVAMANOS DE CONCRETO (C.E.B.)	ML	2.00	L 1,210.82	L 2,421.64			3	L 10,575.57	3	L 10,575.57	75%
142	URINARIO COLECTIVO CERAMICA DE L=0.90MTS (INCLUYE ACCESORIOS)	UNID	2.00	L 5,525.64	L 11,051.28							0%
143	PILETA DE ASEO 80X80X45 cm	und	1.00	L 987.34	L 987.34			1.2	L 6,630.77	1.2	L 6,630.77	60%
144	CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m	UND	2.00	L 2,100.87	L 4,201.74			1	L 987.34	1	L 987.34	100%
145	CAJA DE VALVULAS Y MEDIDOR	UND	1.00	L 2,214.97	L 2,214.97			1.4	L 2,941.22	1.4	L 2,941.22	70%
146	SIFON DE 3" HG EN PISO	UND	2.00	L 110.78	L 221.56							0%
147	CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELECTRICO Ø	M.L.	26.10	L 62.84	L 1,640.12							0%
148	INTERRUPTOR SENCILLO	UNID	3.00	L 210.32	L 630.96			13	L 816.92	13	L 816.92	50%
149	LAMPARA FLUORECENTE 1 X 40W (SUM/INST)	UND	6.00	L 549.14	L 3,294.84							0%
150	TANQUE SEPTICO 7M3 91-120 PERSONAS PARED DE BLOQUE	UNIDA	1.00	L 28,730.08	L 28,730.08							0%
151	POZO ABSO 4.5X1.9 MTS. NO INC. EXCAV. Y ACARREO	UNID	1.00	L 16,378.54	L 16,378.54							0%
152	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	7.00	L 81.75	L 572.25							0%
153	ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	7.00	L 65.37	L 457.59							0%
<b>SUB TOTAL</b>					L 294,376.16							
<b>MONTO A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION</b>					L 1129,020.86			L 735.60	L 113,370.41	L 114,106.01	L 595,146.69	39%
							L 378,040.04	L 217,106.65	L 595,146.69	L 595,146.69	52.71%	

 <b>EJECUTOR</b>	 <b>SUPERVISION ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA</b>
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA	NOMBRE: LUIS FERNANDO AMADOR PÓRTILLO	NOMBRE: GABINO ARGUETA GALVEZ
FECHA: 27 DE MARZO 2019		

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 28 de marzo del 2019.

GABINO ARGUETA GÁLVEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA MARÍA LA PAZ  
Su oficina.


Ref. Supervisión de infraestructura Del  
proyecto: **CONSTRUCCIÓN II ETAPA  
ESTADIO MUNICIPAL, CASCO URBANO,  
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ.**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, me permito entregar el INFORME N°3, del  
proyecto en mención; comprende el periodo del 08 de enero al 27 de marzo del 2019.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



**ING. LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO**  
UNIDAD DE PROYECTOS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



RESUMEN EJECUTIVO

<b>1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.</b>				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL</b>			
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b>			
<b>BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:</b>	El proyecto consiste en la construcción de camerinos para jugadores, camerinos para árbitros. Modulo sanitario para el público. Bancas de concreto, y sistema de riego.			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervisión está a cargo de la Unidad De Proyectos De La Alcaldía Municipal			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD</b>	<b>APORTE MUNICIPALIDAD</b>	<b>APORTE COMUNIDAD</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
<b>COSTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	L 1,129,020.86	L 1,129,020.86	L, 0.00	L 1,129,020.86
<b>COSTO DE SUPERVISIÓN (10% del monto del proyecto)</b>	L. 0.00			L. 0.00
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>				<b>L 1,129,020.86</b>

<b>1.2- INFORMACIÓN CONTRACTUAL.</b>	
<b>NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):</b>	<b>ING. CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUÍA</b>
<b>SUPERVISIÓN</b>	UNIDAD DE PROYECTOS DE LA alcaldía Municipal ING. LUIS AMADOR.
<b>CONTRATO ORIGINAL</b>	
<b>FECHA DE FIRMA DE CONTRATO</b>	07 DE FEBRERO 2019
<b>FECHA DE ORDEN DE INICIO</b>	07 DE FEBRERO 2019
<b>PLAZO CONTRACTUAL</b>	120 días
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	08 DE MAYO 2019

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



**1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.**

**OBRA EJECUTADA:** se prepara el informe que corresponde a la estimación número uno del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 17.96% de las actividades del proyecto las cuales comprenden:

**CAMERINOS JUGADORES:**

PUERTA METÁLICA P-1 (1.00 X 2.10 M), PUERTA METÁLICA P-3 (2.1 X 0.8 M), BALCONES (SUMINISTRO/INSTALACIONES), PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO, BANCA RECTANGULAR, CONCRETO(SUM/INST), URINARIO COLECTIVO CERÁMICA DE L=0.90MTS (INCLUYE ACCESORIOS), SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST), LAVAMANOS DE CONCRETO L=1.65 MTS (INC. ACCESORIOS), CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM., INSTALACIONES ELÉCTRICAS

**CAMERINOS ARBITRO**

PUERTA METÁLICA P-1 (1.00 X 2.10 M), PUERTA METÁLICA P-3 (2.1 X 0.8 M), BALCONES (SUMINISTRO/INSTALACIONES), PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM. CODALEADO FINO, BANCA RECTANGULAR, CONCRETO(SUM/INST), SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST), LAVAMANOS DE CONCRETO L=1.00 MTS (INC. ACCESORIOS), CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM., INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PRESENTANDO UN AVANCE FÍSICO DE UN 15.53%

**SISTEMA DE RIEGO**

CISTERNA DE 10,000 LITROS/EQUIPO NEUMÁTICO

**MODULO SANITARIO**

TRAZADO Y MARCADO, EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMÚN), ACARREO DE MATERIAL (DESPERDICIO), REMOCIÓN DE CAPA VEGETAL (INCL. ACARREO 20 MTS.), CIMENTACIÓN MAMPOSTERÍA CON 5 CM. DE CAMA ARENA, SOBRECIMIENTO DE MAMPOSTERÍA, DADO DE CONCRETO 50 X 50 X 50, 4 Nú3, Nú2 @ 20 cm, DADO DE CONCRETO 40 X40 X 30, 4 Nú3, Nú2 @ 20 cm., SOLERA 15X15 4 Nú3, Nú2 A 20 @ 20 CONCRETO 1.2.2, SOLERA SUPERIOR 15X15, 4#3, #2" 20 CM, CARGADOR DE 15X17cm, 3#3 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2, BATIENTE C/PESTAÑA 20x10cm,2#3,#2@20cm,CONC 1:2:2, PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM.(\*\*), REPELLO Y PULIDO DE PAREDES e=2 CM MORTERO DE 1:4, TALLADO DE ELEMENTOS L= 0.10m, TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.15 m, TALLADO DE ELEMENTOS DE L= 0.20 m, RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO), EXCAVACIÓN MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMÚN), RELLENO COMP. MATERIAL CERNIDO DEL SITIO, SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 1/2" RD-13.5, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ø", SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 2" RD-41, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2", SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC DE 4" RD-41, INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 4", SERVICIO SANITARIO (INC. ACCESORIOS)(SUM/INST), URINARIO COLECTIVO CERÁMICA DE L=0.90MTS (INCLUYE ACCESORIOS), PILETA DE ASEO 80X80X45 cm, CAJA DE REGISTRO 0.80X0.80X0.85m, CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP, PVC ELÉCTRICO ø

**SITUACIONES PRESENTADAS:**

No Hay

**SOLUCIONES PROPUESTAS:**

No Hay

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**

---



**PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:**

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

**1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**

---



## **FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO**




MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803



## PROYECTO CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO MUNICIPAL

CONSTRUCCION DE MODULO DE CAMERINOS PARA ARBITROS EL CUAL SE DESARROLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

BALCONES, PISO DE CONCRETO, BANCA RECTANGULAR, SERVICIO SANITARIO, LAVAMANOS DE CONCRETO, CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM.

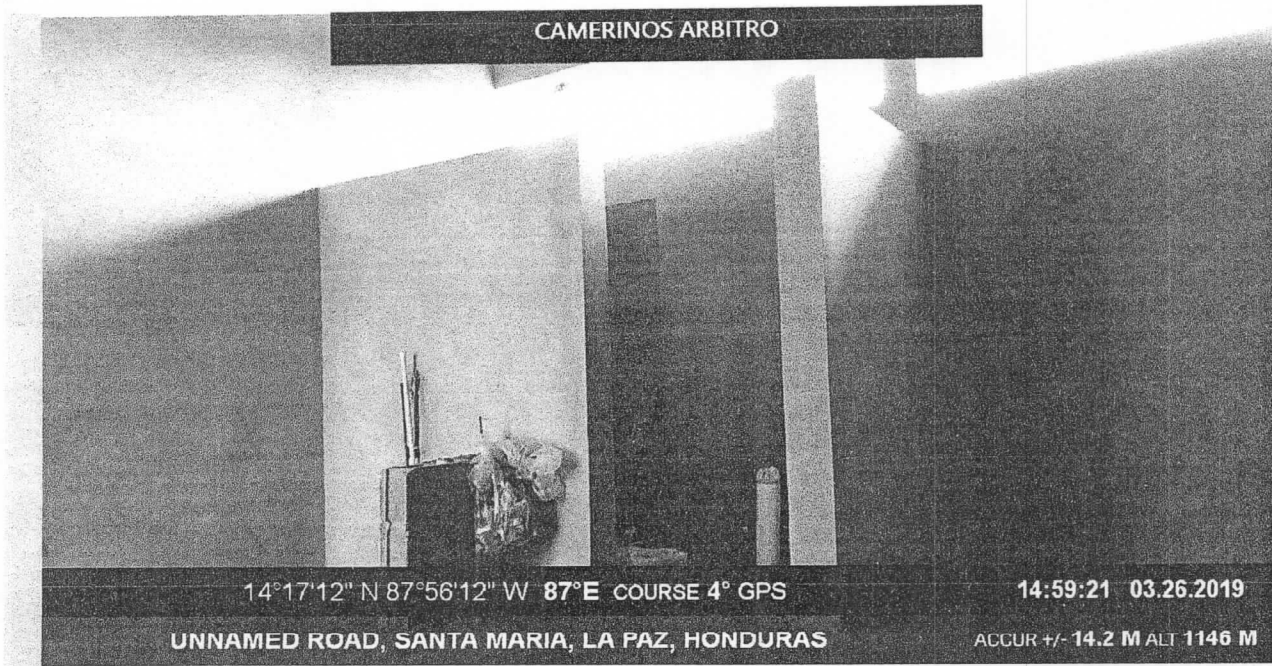

Caja de registro arbitros



14°17'11" N 87°56'11" W 185°S COURSE 87° GPS

14:31:51 03.26.2019


UNNAMED ROAD, SANTA MARIA, LA PAZ, HONDURAS

ACCUR +/- 6.6 M ALT 1161 M

**CONSTRUCCION DE MODULO DE CAMERINOS PARA JUGADORES EL CUAL SE DESARROLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:**

BALCONES (SUMINISTRO), PISO DE CONCRETO, BANCA RECTANGULAR, AREA DE URINARIO COLECTIVO, SERVICIO SANITARIO SUMINISTRO, LAVAMANOS DE CONCRETO, CAJA DE REGISTRO DE 40X40X60 CM., INSTALACIONES ELECTRICAS.

Jugadores,

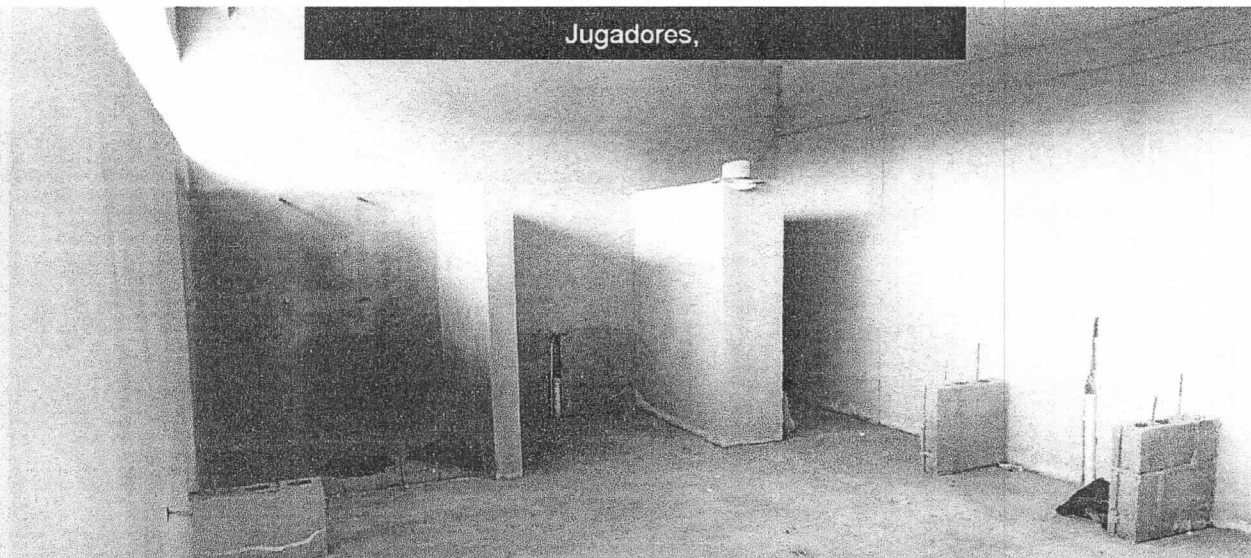

14°17'12" N 87°56'12" W 230°SW COURSE 232° GPS

14:50:17 03.26.2019


UNNAMED ROAD, SANTA MARIA, LA PAZ, HONDURAS

ACCUR +/- 18.8 M ALT 1166 M

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803



Cj juga

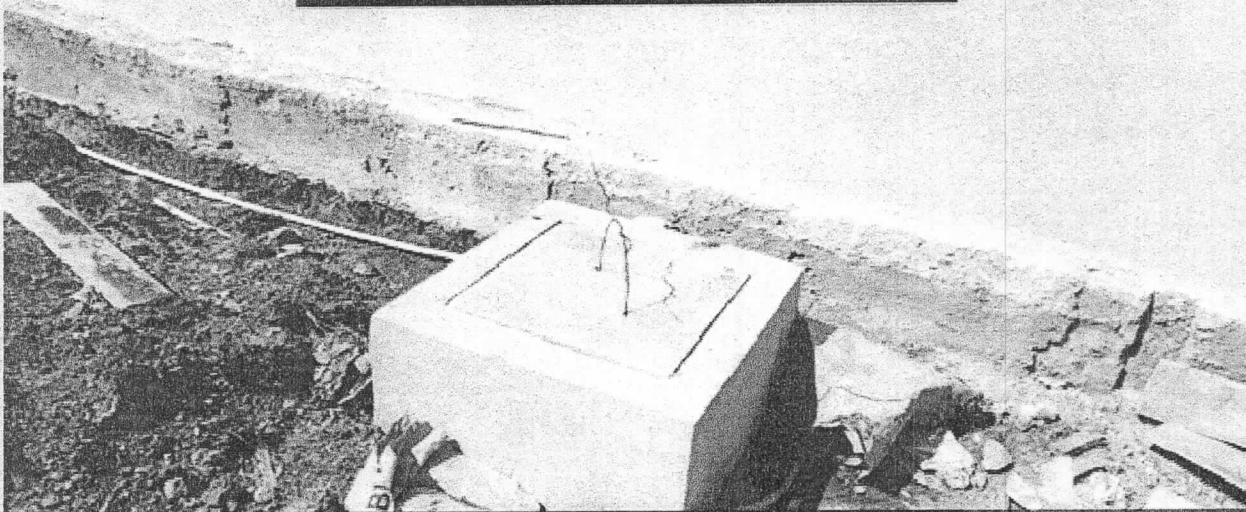

14°17'11" N 87°56'11" W 272°W COURSE 87° GPS

14:33:40 03.26.2019

UNNAMED ROAD, SANTA MARIA, LA PAZ, HONDURAS


ACCUR +/- 6.6 M ALT 1161 M



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**




**BALCONES**

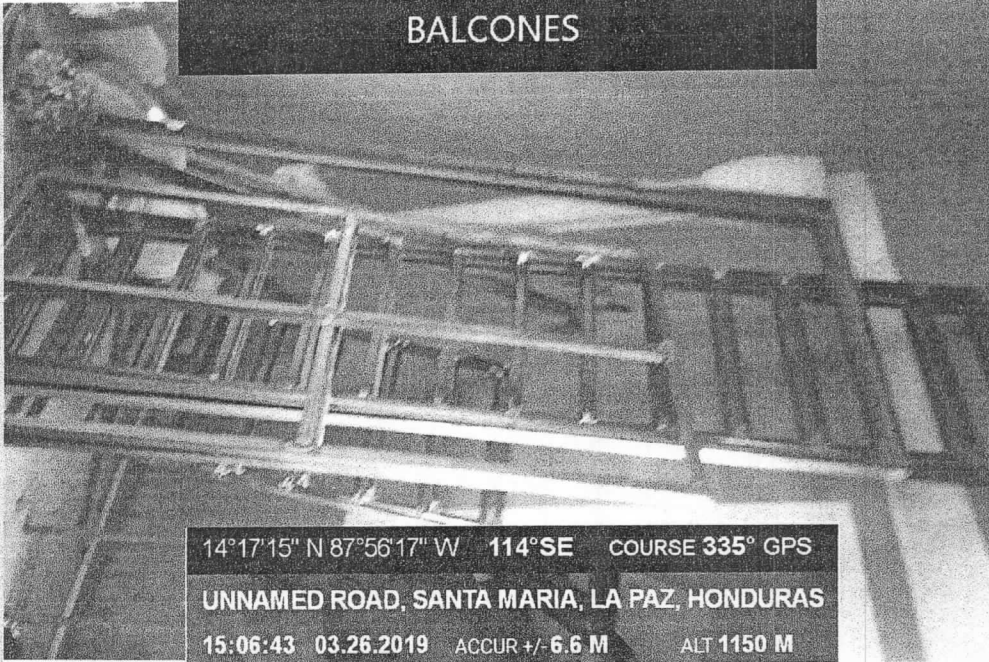

14°17'15" N 87°56'17" W 114°SE COURSE 335° GPS  
UNNAMED ROAD, SANTA MARIA, LA PAZ, HONDURAS  
15:06:43 03.26.2019 ACCUR +/- 6.6 M ALT 1150 M


**CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS PARA EL PUBLICO.**

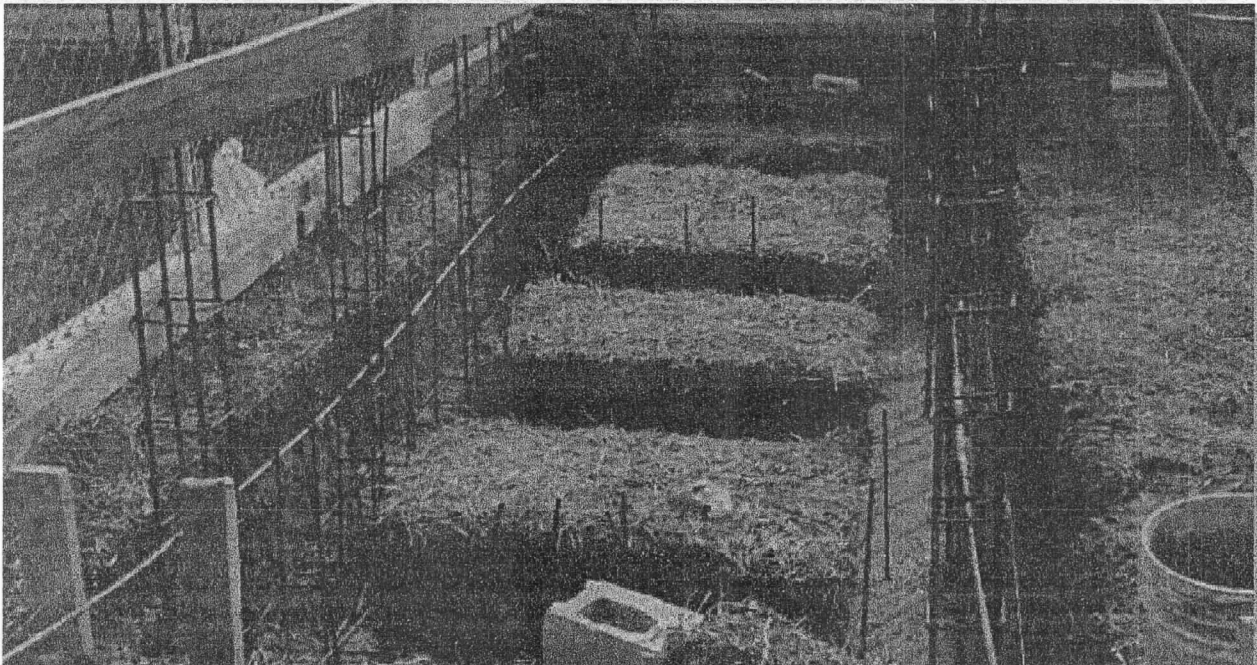

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



Sani

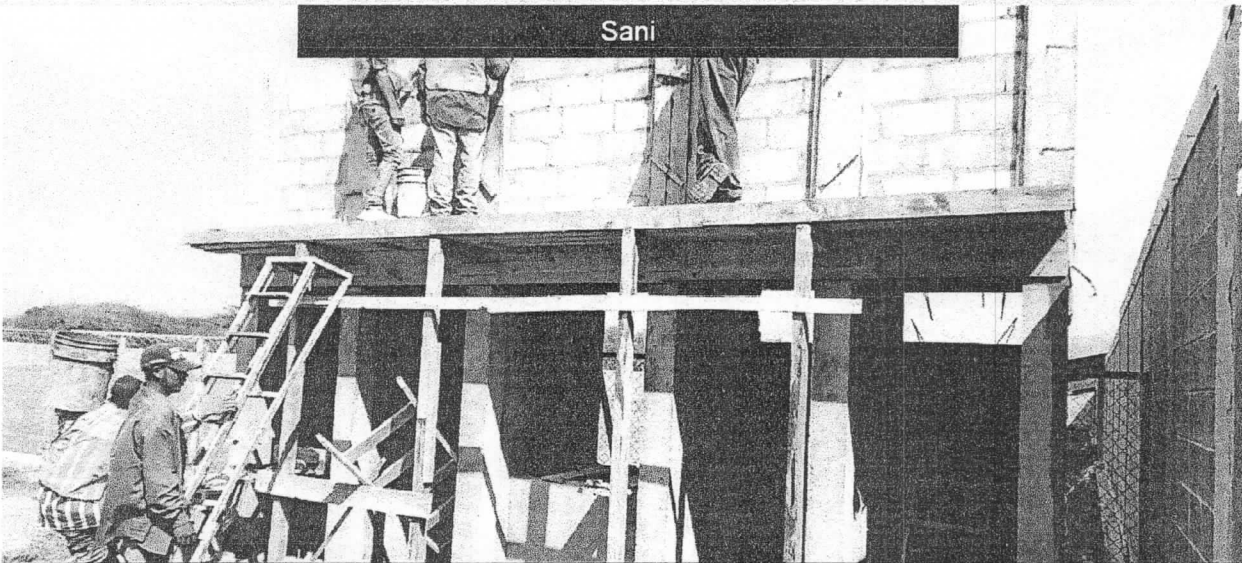


14°17'12" N 87°56'12" W 352°N COURSE 0° GPS

14:35:59 03.26.2019

UNNAMED ROAD, SANTA MARIA, LA PAZ, HONDURAS

ACCUR +/- 34.3 M ALT 1167 M

Sani

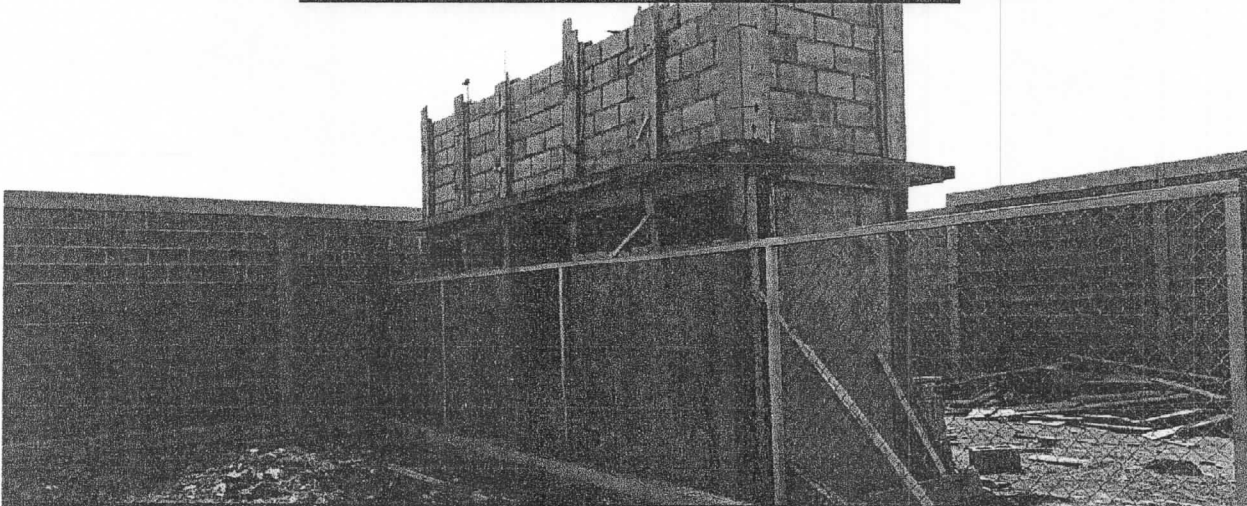

14°17'13" N 87°56'12" W 169°S COURSE 93° GPS

14:40:07 03.26.2019

UNNAMED ROAD, SANTA MARIA, LA PAZ, HONDURAS

ACCUR +/- 16.1 M ALT 1169 M

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



**Tuberia para aguas negras sanitarios**



**14°17'12" N 87°56'10" W 214°SW COURSE 247° GPS**

**14:43:57 03.26.2019**

**UNNAMED ROAD, SANTA MARIA, LA PAZ, HONDURAS**

**ACCUR +/- 62.2 M ALT 1126 M**

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

El suscrito, HACE CONSTAR: Que el contribuyente

Cristian Emmanuel Molina

ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 2019 por lo que se le extiende esta Constancia de Pago, para que pueda efectuar cualquiera de los actos enumerados en el Art. 2 del Dec. Leg. No. 15 del 2 de septiembre de 1965, sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 689987

Santa Maria la Paz  
Lugar y Fecha 07-03-19

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

CRISTIAN ENMANUEL MOLINA URQUIA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL 21 DICIEMBRE 1987  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 22 FEBRERO 2011

1208-1987-00001



12099180-01

VALIDO HASTA 31-12-2019



Roberto Rigorta Quiroz  
Firma y Sello Alcalde

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 1208  
CRISTIAN ENMANUEL / MOLINA URQUIA  
1208-1987-00001



Municipalidad de Santa María, La Paz

Email: [munisantamaria@yahoo.com](mailto:munisantamaria@yahoo.com)

Tel. 2717-7803

## PERMISO DE OPERACIÓN DE NEGOCIO

Nombre del Negocio: **“Constructora Molina Urquia”**

Otorgado a: **“Cristian Enmanuel Molina Urquia”**

Identidad: **1208198700001**

N°. De Permiso: **250**

Solvencia: **689987**

Ubicación: **Santa María, La Paz**

Clase De Negocio: **Constructora.**

Conforme reglamento para apertura de establecimientos comerciales en el municipio de Santa María Departamento de La Paz.

El director municipal de justicia de este término municipal concede el presente permiso de operación de negocio, que es **válido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019**, el cual deberá ser colocado en un lugar visible.


**Este permiso está sujeto a suspensión y cancelación, en caso de no cumplimiento con las reglas establecidas según Artículo N° 27 y 28 de la ley de policía y convivencia social.**

Dado en Santa María, Departamento De La Paz a los 07 días del mes de Marzo del año 2019.

  
  
**Director Municipal De Justicia**

  
  
**Jefe De Administración Tributaria**



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA****201-19-10500-9380**

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MOLINA URQUIA CRISTIAN ENMANUEL**  
Con Registro Tributario Nacional: **12081987000010**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-9380 en fecha 30/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417587553 de fecha 30/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.


Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX:     **SÍ** existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX:     **NO** existen Registros de Deudas.
- ETAX:     **NO** existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 201901, según declaración 27717657545, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-9380** o mediante el siguiente código QR:



11-904-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
SANTA MARIA LA PAZ  
9866-2258  
2754-8970

CHEQUE No. 75150586

PLANES, LA PAZ 27 Marzo 2019  
Lugar y Fecha

Cristian Emmanuel Molina Urquia L. 165,543.82  
Páguese a la orden de

= Ciento Sesenta y cinco mil Quinientos Cuarenta y tres <sup>82/100</sup>  
Cantidad en letras Lempiras



Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

013040790011304000061175150586

RFI Develley de Honduras, S.A. de C.V.
