


**MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA**

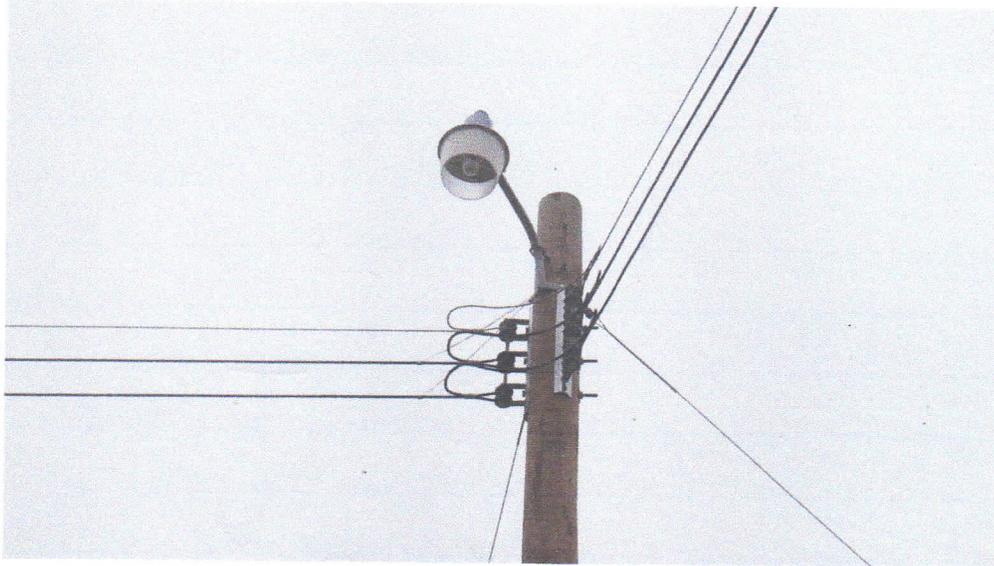

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**Construcción de Sistema de Electrificación Rural  
Santa Rita**

**BENEFICIARIOS.**

**Habitantes de Santa Rita**

**Solicitado A:**

---

**LEPAERA, LEMPIRA**

**HONDURAS C.A Julio de 2018**



*Manuela Rosendo Lara  
Jefe de la Unidad Técnica  
de Gestión Municipal.*

# Ficha de Proyecto

## 1. Identificación del Proyecto:

**NOMBRE DEL PROYECTO:** Construcción de Proyecto Electrificación en la comunidad de Santa Rita.

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

## 2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social

## 3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Electrificación en la comunidad de Santa Rita

## 4.- Ubicación del Proyecto.

La comunidad de la Santa Rita, se encuentra ubicada a 15 Kilómetros de la cabecera municipal.

## 5.- Propósito

Mejorar el nivel de vida de los habitantes de las comunidades de Santa Rita en el Municipio de Lepaera, mediante la construcción del Proyecto Electrificación, a través del apoyo de fuentes financieras externas.

## 6.- Descripción del Proyecto.

El Proyecto Consiste en la Instalación de Sistema de electrificación Rural de la comunidad de Santa Rita en el municipio de Lepaera, el cual ya cuenta con un estudio detallado en donde se describe claramente el tipo de Instalación a realizar y a la vez presenta un listado de materiales que serán necesarios para la construcción de este tipo de proyecto, el trabajo a realizar es el siguiente: se hará un replanteo, hincado y aplomado postes de madera de **30, 35 y 40** pies, montaje de **3** Kilómetros de Red Primaria y secundaria de distribución de energía, instalación de Lámparas y conexión de transformadores, para lo cual se requiere la participación de **1 ingeniero Electricista** el cual teniendo los conocimientos necesarios debe realizar un trabajo de calidad.

La Municipalidad se responsabiliza por el traslado de materiales de Lepaera a Santa Rita y al mismo tiempo por la Supervisión, ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto.

## **7. Elaboración del Proyecto**

### **- Alcance del Proyecto.**

Para realizar un proyecto de esta naturaleza es necesario contar con líderes con capacidad de gestión y un gobierno local comprometido con su pueblo. La ejecución del presente proyecto Inicialmente se realizaron varias reuniones en donde a su vez se elaboraron varias solicitudes, esto para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto , que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser Recolección de información (Diseño del proyecto)para la Ejecución del presente proyecto, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede a informar al comité de Desarrollo Comunal CODECO, la sociedad de padres de familia y miembros de la comunidad como beneficiarios directos para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras preliminares .

### **8. Impacto Ambiental.**

Con el presente proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección de los terrenos por donde pasara el proyecto, o donde se harán las mejoras para verificar que no sea destruida la vegetación esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la construcción no se haga en una zona de riesgo. En este caso no fue necesario tanto tramite porque solamente es colocación de postes y lo que hizo la comunidad beneficiaria fue solicitar permisos de servidumbre a las personas por donde serían colocados postes en caso de pasar por terrenos privados.

### **9. Impacto en terreno y asentamientos.**

Para la ejecución del presente no se causa ningún problema legal tanto en terrenos como en ninguna población determinada, este proyecto se construirá en un lugar que reúne las condiciones básicas necesarias para este tipo de proyecto.

### **10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros**

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. 98072593, 2655-50-90

Correo Electrónico: [lara.gestion2016@yahoo.com](mailto:lara.gestion2016@yahoo.com)

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: ENEE, FHIS, comunidad y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando ENEE, Gobierno Central y la municipalidad como principal financiador,

La Comunidad y la Municipalidad, apoyando con la mano de Obra Calificada y no calificada para la ejecución del Proyecto, esas actividades a realizar con Fondos propios y fondos provenientes de las transferencias. Es necesario dar a conocer que a la vez los padres de familia apoyan con la mano de obra local.

#### **11. Presupuesto del Proyecto.**

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal y para el cual a su vez se firmó un compromiso con los beneficiarios Directos también firman constancias de Aporte para la ejecución del proyecto.

#### **12. Estado del Proyecto actual.**

En este momento ya está casi Finalizado

#### **13. Costo de finalización Proyectado**

Costo Total: Lps.200,000.00

Aporte Municipal \_Transferencia positiva: Lps.200,000.00

Ejecutado: Lps. 200,000,00

**Pagado: Lps.180,000.00**

**Pendiente a Ejecutar: L.20,000.00**

Fecha de finalización proyectada

Agosto de 2018

#### **14. Ejecución Del Proyecto**

#### **15. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 3 meses por la cantidad de actividades a realizarse en el proyecto y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la fuente financiamiento como ser La ENEE , Municipalidad y la comunidad. No se pudo enviar una información anteriormente porque aunque ya se había concluido el proyecto de cuál sería el costo real del proyecto porque no se habían pagado algunas facturas de materiales eléctricos. Ya que lo que se planifico no se compara con lo que ya se Ejecutó.

Lo que se puede mencionar es que el proyecto lleva un buen avance físico y financiero, ya está en su parte final.

#### **16. Variación en el costo total del Proyecto.**

Si como en todo proyecto hay variaciones, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, pero en este no hubo esa diferencia porque se utilizó tal y como se tenía planificado, por esta razón no existe ninguna diferencia, para este proyecto se habían presupuestado en el aporte municipal **Lps.200,000.00** y lo cual ha sido ejecutado hasta la fecha **Lps.180,000.00** quedando pendiente de ejecutar **Lps.20,000.00** para completar el total del financiamiento.

##### **Monto Solicitado:**

Costo Total: Lps. 200,000.00

Costo Total: Lps.200,000.00

Aporte Municipal \_Transferencia positiva: **Lps.200,000.00**

Ejecutado: Lps. **200,000,00**

**Pagado: Lps. 180,000.00**

**Pendiente: Lps. 20,000.00**

Fecha de finalización proyectada

Agosto de 2018.

### **17. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.**


Si hubo variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto en vista que se tenía planificado para terminar en tres meses tiempo máximo, pero se tardó más mas de tres meses todas las actividades del proyecto, por las condiciones climáticas de la zona y por la parte de la municipalidad que se le dificulto el acarreo de materiales hasta su sitio de proyecto. Por ser este un terreno muy angosto se dificulto mucho la entrada de los postes.

El proyecto lleva un avance satisfactorio lo cual es bueno especialmente para la municipalidad, cumpliendo esta organización participante con lo que se le encomendó desde el inicio hasta la finalización.

### **18. Razones de los cambios antes mencionados.**

Como mencione anteriormente hubieron algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar, también por el acarreo de materiales esto porque las comunidad en donde se ubica el proyecto está en un terreno muy difícil en el municipio de Lepaera lo cual dificulta la entrada de vehículo en época de Invierno

Fotografias.

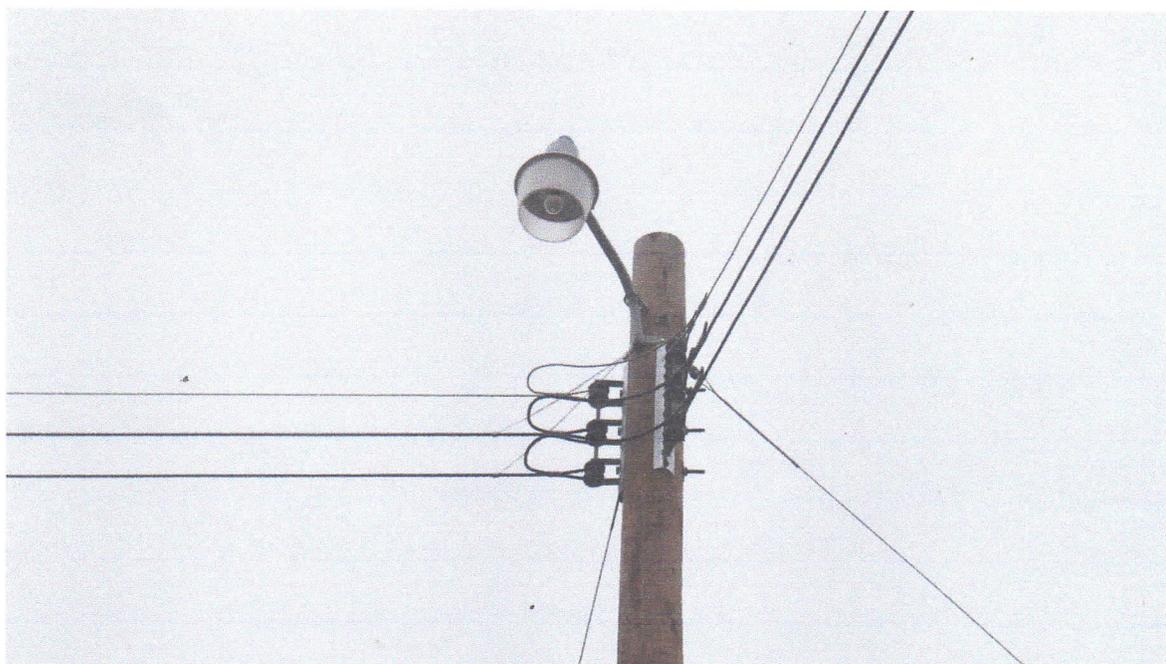





## MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



### NOMBRE DEL PROYECTO

**Construcción de Biblioteca Pública Virtual**

### BENEFICIARIOS.

**HABITANTES DE LEPAERA, LEMPIRA**

**Solicitado A:**

LEPAERA, LEMPIRA Julio de 2018

HONDURAS C.A



*Manuela Rosandora Lara*  
*Jefe de la Unidad Técnica*  
*Centro Municipal*

## **FICHA DE PROYECTO**

# **CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PÚBLICA VIRTUAL EN LEPAERA, LEMPIRA**

### **1. Identificación del Proyecto**

Encargado de la ejecución del proyecto  
Alcalde Municipal  
Edgar Antonio Murillo

### **2. Sector o Sub sector**

Sector: Infraestructura Social

### **3. Nombre del Proyecto**

Construcción de Proyecto de Construcción de Biblioteca Pública  
Virtual en Lepaera, Lempira

### **4. Ubicación del Proyecto.**

Barrió San Juan, Municipio de Lepaera

### **5. Propósito**

Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes aumenten los niveles de lectura dentro del municipio través de la adquisición de una Biblioteca Pública para la consulta de información

### **Descripción del Proyecto.**

El presente proyecto consiste en la construcción de una Biblioteca Publica Virtual en el Municipio de Lepaera Dpto. de Lempira, para los pobladores del

municipio de Lepaera es un avance en infraestructura y elevar el grado de cultura en los pobladores para que no pierdan el hábito a la lectura tanto para los visitantes como para los vecinos de Lepaera.

Es necesario mencionar que el proyecto se está ejecutando con fondos de Plan en Honduras y con fondos municipales mediante transferencia a la municipalidad, la misma aporta la mano de obra calificada y el terreno,.

El presente proyecto consta de sala principal, recepción, sala de cómputo, sala para biblioteca, jardines, área de recreación. Estos proyectos no son posibles sin el apoyo de la municipalidad, obteniendo los materiales y mano de obra del municipio. Dicho proyecto se desarrollara de la siguiente manera, construcción de:

General .. Módulo de biblioteca de 308.14 mtrs cuadrados x 4.85 metros de altura.

Realizando las siguientes actividades:

- 1.- Adecuación de terreno, trazar, marcar y nivelar.
- 2.-Excavacion, cimentación y dados de concreto.
- 3.-Construccion de columnas, castillos, soleras inferiores y superiores.
- 4.-Contruccion de paredes de bloque y vigas reforzado con tabiques
- 5.-Contruccion de contrafuerte de concreto armados de 0.15 x0.50 centímetros.
- 6.- Construcción de loza de loza de concreto y canal perimetral de 0.15x0.50 centímetros.
- 7.- Colocación de techo de alucín según plano.
- 8.-Contruccion de Redes hidrosanitarias, fluviales, griferías y accesorios.
- 9.- Instalación eléctrica, iluminación y estructurado
- 10.- acabado de elementos, soleras, vigas y columnas.
11. Acabado de Contrafuertes y Jardín según planos.
- 12.-Repellos, pulidos y pintado en general.
- 13.-Nivelacion y firmes de concreto
- 14.- Pegado de cerámica y molduras, según plano.
- 15.- acabadó interiores, divisiones y sanitarios.
- 16.-exteriores, fundición de aceras y cerámicas antiderrapantes.
17. limpieza general.

## **Elaboración del Proyecto**

### **Alcance del Proyecto.**

Para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, es necesario el involucramiento de toda la población del Casco Urbano, que son aproximadamente 1,200 hogares que son los beneficiarios directos del proyecto. Se realizaron varias reuniones para hacer conciencia a la población que el Municipio necesita promover la mejora educativa y cultural contando a la vez con áreas de recreación y para realizar labores meramente educativas para los visitantes y mismos habitantes de la ciudad.

El Gobierno mediante transferencia y la municipalidad de Lepaera ha sido la que brinda el terreno y otros fondos tanto municipales como transferencias del gob. Central..

### **8. Impacto Ambiental.**

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. Esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad. A la vez mantener la zona limpia contando con sus respectivos depósitos de basura, vigilancia permanente para que no se dañe la vegetación.

### **9. Impacto en terreno y asentamientos.**

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Dpto. Municipal de Catastro y La UMA de Lepaera Hizo verificación de terrenos, en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se daña Terrenos, Viviendas y bosque natural

En la parte legal ya se hizo los tramites respectivos los beneficiarios se les solicita su apoyo para visitar a los dueños de terrenos por donde pasara el proyecto, en este caso servicio de servidumbre.

## **10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros**

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara Castro, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión. Teléfono No. 9807-2593, 2655-50-90 Correo Electrónico: [lara.gestion2016@yahoo.com](mailto:lara.gestion2016@yahoo.com), Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira.

## **Fuentes de Financiamiento.**

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: Plan en Honduras, Gobierno de la Republica, Municipalidad.

## **11. Presupuesto del Proyecto.**

El Año 2017 se inició por medio de la Municipalidad.

## **12. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.**

Diciembre de 2017

## **13. Estado del Proyecto actual.**

El proyecto Construcción de Biblioteca Pública Municipal está en proceso.

## **14. Costo de finalización Proyectado**

### ***Costo Total Primera Etapa:***

#### **Aporte Municipal:**

Presupuestado: Lps. 200,000.00

Ampliación: 1,099.049.65

Transferencia Positiva: L. 110,550.00

Vigente: Lps. 1,409,599.70

#### **Con material Local:**

Arena, grava piedra

#### **Fecha de finalización proyectada:**

31 de Julio de 2018.

## **15.Ejecución Del Proyecto**

### **16.Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 6 meses por la dimensión del proyecto a ejecutar.

De lo planificado apenas se ha ejecutado en un **23.55%**

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps. 200,000.00** pero según transferencias asciende a la cantidad de **Lps.1,409,599.70**

#### **Variación en el costo total del Proyecto.**

No ha existido variación en cuanto al costo y la ejecución del proyecto, ya que se está realizando bien todo de acuerdo a lo planificado, el proyecto varia en cuanto a avance presupuestario menos que en cuanto al avance Físico de la obra Solamente que lo que refleja el porcentaje de ejecución es el movimiento financiero nada más, En la ejecución física lleva un **90 %** de avance

#### ***Costo Total Primera Etapa:***

##### Aporte Municipal:

Presupuestado: Lps. 200,000.00

Ampliación: 1,099.049.65

Transferencia Positiva: L.110,550.00

Vigente: Lps. 1,409,599.70

##### Con material Local:

Arena, grava piedra

Fecha de finalización programada

31 de Julio de 2018

### **17. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.**

Por el momento si ha existido cierta variación en cuanto al alcance y duración del proyecto ya que se tenía que culminar el proyecto en seis meses, tiempo máximo y por algunos imprevistos no se ha terminado; es necesario mencionar que todos los materiales y mano de obra estaban a disposición inmediata en el municipio. La etapa ya tiene un avance considerable de manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para la fuente financiera externa, ambos partes se han portado a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó hasta la etapa donde se encuentra el proyecto en este momento.

### **18. Razones de los cambios antes mencionados.**

No han existido cambios solamente en la fecha de culminación porque todo el proyecto se está ejecutando de acuerdo a lo planificado.

A continuación este es el avance del proyecto.

## **Anexos**





