



REPUBLICA DE HONDURAS

# ORDEN DE PAGO

Nº 10091

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

UNIDAD EJECUTORA TESORERIA

Orden de Pago No. \_\_\_\_\_

Cheque No. 75254517

Valor Efectivo: \_\_\_\_\_

Lps. 302,195.61

GUESE A: Juan Gabriel Argueta Montoya

LA CANTIDAD DE EN LETRAS: Trescientos dos mil Ciento Noventa y cinco con 67/100  
VALOR QUE SE ADEUDA POR LAS SIGUIENTES MERCADERIAS O SERVICIOS PUBLICOS.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
COD. 12	COD. 03	COD. 09	COD. 36

Gasto Corriente \_\_\_\_\_

Gasto de Inversión Social \_\_\_\_\_

Gasto por Deuda Pública \_\_\_\_\_

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	Valor en Lempiras	
		Total	
03	Desarrollo Social, Cultural y Com.	L. 302,195.61	
09	Seguridad Ciudadana		
12	Transferencia Gobierno Central		
400	Bienes Capitalizables		
460	Const. Adicion y Mejora de Edificios y O.U		
467	Const. Adiciones y Mejoras de Parques y L.B		
36	Mejoramiento II - Etapa Campo de Fútbol / Los Planes.		
	Pago de segunda Estimación de avance de obra de dicho Proyecto.		
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>L. 302,195.61</b>	

E.M.A.G. Tel.: 2230-6767, R.T.N. 08019999408325

Fecha 13-05-2019.

Firma del Responsable del Subprograma

Firma y Sello del Encargado del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde Municipal

Recibido por (f)

Identidad No.


Solvencia No.

Juan Gabriel Argueta Montoya

Juan Gabriel Argueta Montoya

1212-1977-00090

\_\_\_\_\_



**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA  
LA PAZ, HONDURAS, C.A.  
TEL. 2717-7803**



Santa María la Paz, 13 de mayo del 2019.

**FRANCIS LOANY VÁSQUEZ URQUIA**  
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA  
Su oficina.

Estimada:

Se remite la documentación de segunda estimación del proyecto **MEJORAMIENTO II ETAPA CAMPO DE FUTBOL, LOS PLANES, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ**, de lo que se da fe que la documentación esta verificada tanto en campo como en oficina. Actuando como supervisor de proyectos de la **ALCALDÍA MUNICIPAL**. Dicha documentación consta de:

- ✓ ESTIMACIÓN SOLICITADA
- ✓ INFORME DE ESTIMACIÓN
- ✓ TABLA DE RETENCIONES
- ✓ PAGO A CUENTA CON FECHAS VIGENTES
- ✓ FOTOCOPIA DE IDENTIDAD
- ✓ FOTOCOPIA DE RTN
- ✓ FOTOCOPIA DE BITÁCORA CON LA ULTIMA ESTIMACIÓN BITÁCORA ORIGINAL
- ✓ BOLETA CAI VIGENTE.
- ✓ FOTOGRAFÍAS DETALLANDO EL AVANCE MÍNIMO 3 HOJAS, 8 FOTOGRAFÍAS.
- ✓ NOTA DE REMISIÓN A TESORERÍA POR LA SUPERVISIÓN.

ESTIMACIÓN	MONTO PAGADO	RETENCIÓN ISR 12.5%	RETENCIÓN CALIDAD DE OBRA	RETENCIÓN POR ANTICIPO	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	MONTO TOTAL
PRIMERA	L 360,937.51	L -	L 23,668.03	L 88,755.13	L -	L 473,360.67
SEGUNDA	L 302,195.61	L -	L 19,816.11	L 74,310.40	L -	L 396,322.12
<b>TOTAL</b>	<b>L 663,133.12</b>	<b>L -</b>	<b>L 43,484.14</b>	<b>L 163,065.53</b>	<b>L -</b>	<b>L 869,682.79</b>

<b>Monto del Anticipo</b>		<b>195,764.58</b>	<b>100.00%</b>
AMORTIZACIÓN 1era. ESTIMACIÓN	L	88,755.13	45.34%
AMORTIZACIÓN 2era. ESTIMACIÓN	L	74,310.40	37.96%
<b>TOTAL AMORTIZADO</b>	<b>L</b>	<b>163,065.53</b>	<b>83.30%</b>
<b>FALTA POR AMORTIZAR</b>	<b>L</b>	<b>32,699.05</b>	<b>16.70%</b>

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.

**ING. LUIS AMADOR**  
UNIDAD DE PROYECTOS  
ALCALDÍA SANTA MARÍA



Lugar y Fecha: Santa María, La Paz 13 de Mayo del 2019.

Recibo por: Lps. 302, 195.61

Recibí de la **Municipalidad de Santa María, La Paz** la cantidad de

Trescientos dos mil Ciento Noventa y Cinco  
Lempiras con 61/100

(Lps. 302, 195.61 ) correspondiente al pago de la Estimación,

# 02 de Avance de obra del proyecto

Mejoramiento II - Etapa Campo de  
Fútbol.



Con Numero 36 Ubicado en Los Planos Municipio

De Santa María del Departamento de La Paz.

**Desglose del pago**

<b>MONTO ESTIMADO</b>	L. <u>396, 322.72</u>
-Menos deducción de anticipo	L. <u>74, 370.40</u>
-Menos deducción de ISR	
-Menos 5% Calidad de Obra	L. <u>19, 876.71</u>
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	L. <u>302, 195.61</u>

Firma del Contratista:

Nombre del cotrastista:

Juan G. Digueta

Identidad #:

1211-1977-00090


### RETENCIONES DE ESTIMACIONES

LPR-ALCALDIA DE SANTA MARIA-02-2019  
 MEJORAMIENTO II ETAPA CAMPO FUTBOL  
 LA PAZ  
 SANTA MARIA  
 LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ, HONDURAS

CODIGO:  
 NOMBRE DEL PROYECTO:  
 DEPARTAMENTO:  
 MUNICIPIO:  
 ALDEA:

FUENTE FINANCIAMIENTO:	MUNICIPALIDAD	SEGUNDA ESTIMACION DEL:	AL:	10/5/2019
<b>CREDITO:</b>				
	LPS			
	Monto Inicial de Contrato	L 1,305,097.19		
	Monto Acumulado por O/C			
	Monto Acumulado por Adendum			
	Monto Final	L 1,305,097.19		
	Monto de Segunda Estimacion	L 396,322.12		

VoBo



**SUPERVISOR MUNICIPALIDAD**

% DE AVANCE	FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ANTICIPO	RETENCION
30.37%	1.25	37.96%	L 195,764.58	L 74,310.40

Retencion Sobre Anticipo L 396,322.12  
 L 1,305,097.19

FACTOR de Ret	% RETENCION	MONTO ESTIMACION	RETENCION
1.050	5.00%	L 396,322.12	L 19,816.11

Retencion de Calidad de obra L 396,322.12  
 L 1,305,097.19

**RESUMEN**

Monto Estimado	L 396,322.12	
Menos Deducion de Anticipo	L 74,310.40	
Menos Deducion I.S.R 12.5%		
Retencion de Cumplimiento de Contrato 15%		
Deducciones 5% Calidad de Obra	L 19,816.11	
<b>TOTAL A PAGAR SEGUNDA ESTIMACION</b>	<b>L 302,195.61</b>	

<b>Monto del Anticipo</b>	<b>195,764.58</b>	<b>100.00%</b>
AMORTIZACION 1era. ESTIMACION	L 88,755.13	45.34%
AMORTIZACION 2era. ESTIMACION	L 74,310.40	37.96%
<b>TOTAL AMORTIZADO</b>	<b>L 163,065.53</b>	<b>83.30%</b>
<b>FALTA POR AMORTIZAR</b>	<b>L 32,699.05</b>	<b>16.70%</b>

# JUAN GABRIEL ARGUETA MONTOYA

San José, La Paz.

Cel. 9928-6442 Correo: juanargueta81@gmail.com

CAI: 702742-29D490-134086-73E07A-0E7F27-3C

RTN:12121977000908

RECIBO POR HONORARIOS

000-001-04-00000058

Recibí de: Municipalidad de Santa Maria La Paz RTN: 12179003434704

La suma neta de: trescientos dos mil Ciento noventa y cinco pes con 61/100

Por concepto de: Pago de II estimación Proyecto mejoramiento Segunda Etapa Campo de Futbol Los planes Sta Maria La Paz

Fecha: 13 de Mayo del 2019


Total por Honorarios	L.		
Total Neto Recibido	L.	302195	61

Rango Autorizado

000-001-04-00000051 / 000-001-04-00000100

Fecha Límite de Emisión: 15/01/2020

Original: Cliente Copia: Archivo

  
Firma

Publigram, 2da Ave. Bo. Torondón, Comayagua,  
Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142  
CERTIFICADO N° 9231-15-10500-2


11-304-000061-1  
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARTA  
SANTA MARTA LA PAZ  
3665-2258  
2754-8970


CHEQUE No. 75254517


PLANES, LA PAZ 13 de Mayo 2019  
Lugar y Fecha

Juan Gabriel Argueta Montoya L. 302,195.61  
Páguese a la orden de

Trescientos dos mil ciento Noventa y cinco con 61/100. Lempiras  
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.  
HONDURAS, C.A.

  
Firma(s)



⑆0⑆304079⑆00⑆1⑆30400006⑆1⑆⑆75254517

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**


JUAN GABRIEL / ARGUETA MONTOYA


 

HONOR RESERVA POR NACIMIENTO  
NACIDO EL 24 JUNIO 1977  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 08 AGOSTO 2013

1212-1977-00090   
02880231-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona natural o jurídica a los efectos de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR INIP



SOLICITADA EN 1501  
JUAN GABRIEL / ARGUETA MONTOYA  
1212-1977-00090

# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO II ETAPA CAMPO FUTBOL  
 UBICACION: LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ, HONDURAS  
 EJECUTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA M.  
 CODIGO: LPR121702-2019  
 ESTIMACION N° 2

N°	CONCEPTO	PRECIO			ACUMULADO ANTERIOR			EJECUTADO ACTUAL			ACUMULADO FINAL		
		UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	%
<b>GRADERIAS</b>													
1	EXCAVACION CON RETROEXCAVADORA SUELO TIPO I SEGUN SECCIONES TRANSVERSALES	M3	128.77	2,379.67	128.770	2,379.67	128.770	2,379.67	-	-	128.77	2,379.67	100.00%
2	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO SEGUN SECCIONES TRANSVERSALES	M3	14.56	1,427.90	14.560	1,427.90	14.560	1,427.90	-	-	14.56	1,427.90	100.00%
3	JARRERO DE MATERIAL (DESPERDICIO)	M3	114.21	12,651.04	114.210	12,651.04	114.210	12,651.04	-	-	114.21	12,651.04	100.00%
4	EXCAVACION ESTRUCTURAL CIMENTACION DE CONTRA HUELLA	M3	46.8	16,714.62	46.800	16,714.62	46.800	16,714.62	-	-	46.8	16,714.62	100.00%
5	EXCAVACION ESTRUCTURAL HUELLA DE GRADAS	M3	63	22,500.45	63.000	22,500.45	63.000	22,500.45	-	-	63	22,500.45	100.00%
6	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO EN CONTRA HUELLA	M3	54	5,295.78	54.000	5,295.78	54.000	5,295.78	-	-	54	5,295.78	100.00%
7	EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA APOYOS TRANSVERSALES GRADERIAS @2.50MITS	M3	7.5	735.38	7.500	735.38	7.500	735.38	-	-	7.5	735.38	100.00%
8	EXCAVACION ESTRUCTURAL PARA APOYOS TRANSVERSALES GRADERIAS @2.50MITS	M3	31.5	11,250.23	31.500	11,250.23	31.500	11,250.23	-	-	31.5	11,250.23	100.00%
9	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA CONTRA HUELLA	M3	21.6	38,400.48	21.600	38,400.48	21.600	38,400.48	-	-	21.6	38,400.48	100.00%
10	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA APOYO PERIMETRAL	M3	4.8	8,533.44	4.800	8,533.44	4.800	8,533.44	-	-	4.8	8,533.44	100.00%
11	CIMENTACION MAMPOSTERIA CON 5 CM. DE CAMA ARENA APOYO TRANSVERSALES EN GRADERIAS	M3	8.06	14,329.07	8.060	14,329.07	8.060	14,329.07	-	-	8.06	14,329.07	100.00%
12	SOLETA 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2 GRADERIAS	M.L	180	65,140.20	180.000	65,140.20	180.000	65,140.20	-	-	180	65,140.20	100.00%
13	SOLETA INF 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2 MURO DE PARED DE BLOQUE	M.L	30	10,856.70	30.000	10,856.70	30.000	10,856.70	-	-	30	10,856.70	100.00%
14	SOLETA SUP 20X20 4#3 Y #2 @ 20 CM. CONCRETO 1:2:2 MURO DE PARED DE BLOQUE	M.L	30	10,856.70	30.000	10,856.70	30.000	10,856.70	-	-	30	10,856.70	100.00%
15	SUBRECIMIENTO DE BLOQUE 15 CONCRETO V= 1#3 @ 20 CONTRA HUELLA	M2	72	870.80	72.000	870.80	72.000	870.80	-	-	72	870.80	100.00%
16	REFELLO Y PULIDO DE PAREDES #2 CM MORTERO DE 1-4	M2	72	154.01	72.000	154.01	72.000	154.01	-	-	72	154.01	100.00%
17	CASTILLO DE 0-15X0.15m. #43, #2@20cm. CONC 1:2:2	ML	26.4	6,744.41	26.400	6,744.41	26.400	6,744.41	-	-	26.4	6,744.41	100.00%
18	PARED BLOQUE 15cm. RELLENO, #43@20, #43@2 HILADAS	M2	53.7	48,856.26	53.700	48,856.26	53.700	48,856.26	-	-	53.7	48,856.26	100.00%
19	LGSA CONC #=10 CMS #4 alc 20 CMS Y #4 alc 30 CMS	M2	135	845.33	135.000	845.33	135.000	845.33	-	-	135	845.33	100.00%
20	SOLETA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2 ACERA	M.L	60	11,987.40	60.000	11,987.40	60.000	11,987.40	-	-	60	11,987.40	100.00%
21	RELLENO COMP. CON MATERIAL SELECTO (INC. ACARREO) #4cms	M3	3.9	2,749.83	3.900	2,749.83	3.900	2,749.83	-	-	3.9	2,749.83	100.00%
22	PISO CONCRETO 1:2:4 SIMPLE #5 10	M2	45	16,596.90	45.000	16,596.90	45.000	16,596.90	-	-	45	16,596.90	100.00%
23	PASAMANOS HG 1 1/2" PARALELOS @1.20m. ARRIOSTRE @0.50m	UNID	24	22,918.32	24.000	22,918.32	24.000	22,918.32	-	-	24	22,918.32	100.00%
24	PORTON METALICO P-12, 2.10x3.0m	M.L	1	10,000.00	1.000	10,000.00	1.000	10,000.00	-	-	1	10,000.00	100.00%
25	COLUJMA 20 X 20, AN#4, N#3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	M.L	4.2	551.23	4.200	551.23	4.200	551.23	-	-	4.2	551.23	100.00%
26	CARGADOR DE 15X17cm, #43 Y #2@20 cm. CONC 1:2:2	ML	3.5	280.17	3.500	280.17	3.500	280.17	-	-	3.5	280.17	100.00%
<b>SUB TOTAL</b>													
		M3	1.69	3,986.58	1.690	3,986.58	1.690	3,986.58	-	-	1.69	3,986.58	100.00%
<b>GRADAS DE ACCESO</b>													
		M3	1.69	6,737.32	1.690	6,737.32	1.690	6,737.32	-	-	1.69	6,737.32	100.00%
<b>TECHOS Y ESTRUCTURAS METALICAS</b>													
28	EXCAVACION MATERIAL TIPO I (MATERIAL COMUN)	M3	5	490.25	5.000	490.25	5.000	490.25	-	-	5	490.25	100%
29	ZAPATA ANSLA 1.00 X 1.00, #=0.30, 7 NU5, a.s.	UNDI	5	11,238.60	5.000	11,238.60	5.000	11,238.60	-	-	5	11,238.60	100%
30	COLUJMA 30 X 30, 6#6, N#3 @ 20, CONCRETO 1:2:2	ML	17.5	20,405.18	17.500	20,405.18	17.500	20,405.18	-	-	17.5	20,405.18	100%
31	TECHO CANALETA 4", LAMINA ALUMINIZADA (EEBIM)	M2	204	98,705.40	204.000	98,705.40	204.000	98,705.40	-	-	204	98,705.40	100%
32	PLACA METALICA PREFABRICADA DE 10"X12"X3/8	UND	10	14,560.00	10.000	14,560.00	10.000	14,560.00	-	-	10	14,560.00	100%
33	VIGA JONST H=50CM, L=5.5M, CUERDA SUP. 2X2 CH 14	ML	27.5	23,100.00	27.500	23,100.00	27.500	23,100.00	-	-	27.5	23,100.00	100%
<b>SUB TOTAL</b>													
		M3	1.69	168,489.43	1.690	168,489.43	1.690	168,489.43	-	-	1.69	168,489.43	82.07%
<b>CUNETA EN U</b>													
34	TRAZADO Y MARCADO	ML	100	3,920.00	100.000	3,920.00	100.000	3,920.00	-	-	100	3,920.00	100%
35	EXCAVACION ESTRUCTURAL	M3	28	10,000.20	28.000	10,000.20	28.000	10,000.20	-	-	28	10,000.20	100%
36	RELLENO COMPACTO CON MATERIAL DEL SITIO	M3	30	2,819.51	30.000	2,819.51	30.000	2,819.51	-	-	30	2,819.51	100%
37	LGSA CONC. #=10 CMS #4 alc 20 CMS Y #4 alc 30 CMS	M2	80	67,626.40	80.000	67,626.40	80.000	67,626.40	-	-	80	67,626.40	100%
38	SOLETA 10X15 2#3, #2@15 CONCRETO 1:2:2	M.L	200	19,979.00	200.000	19,979.00	200.000	19,979.00	-	-	200	19,979.00	100%
39	PARED DE BLOQUE SIMPLE DE 15 CM (*)	M2	70	37,226.70	70.000	37,226.70	70.000	37,226.70	-	-	70	37,226.70	100%
<b>SUB TOTAL</b>													
		M3	1.69	3,986.58	1.690	3,986.58	1.690	3,986.58	-	-	1.69	3,986.58	100%
<b>GRADAS DE ACCESO</b>													
		M3	1.69	6,737.32	1.690	6,737.32	1.690	6,737.32	-	-	1.69	6,737.32	100.00%








# MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO II ETAPA CAMPO FUTBOL  
 UBICACION: LOS PLANES, SANTA MARIA, LA PAZ, HONDURAS  
 EJECUTOR: ING. JUAN GABRIEL ARGUETA M.  
 CODIGO: LPR121702-2019

ESTIMACION N° 2

N°	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
						CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
40	REJILLA METALICA A=0.50m,VAR 1/2" ANGULO 1"	ML	100	524.61	L 52,461.00	0	L -	L -	L -	0	L -	0%
41	REPELLO Y FULIDO DE PAREDES ø=2 CM MORTERO DE 1:4	M2	70	154.01	L 10,780.70	0	L -	L 70	L 10,780.70	70	L 10,780.70	100%
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>L 234,915.10</b>		<b>L 126,694.00</b>		<b>L 45,760.10</b>		<b>L 172,454.10</b>	<b>76.68%</b>
<b>CUNETAS EN V</b>												
42	TRAZADO Y MARCADO	ML	180	39.20	L 7,056.00	180	L 7,056.00		L -	180	L 7,056.00	100%
43	EXCAVACION ESTRUCTURAL	M3	54	357.15	L 19,286.10	54	L 19,286.10		L -	54	L 19,286.10	100%
44	MATERIAL SELECTO	M3	18	98.07	L 1,765.26	0	L -	5	L 490.35	5	L 490.35	28%
45	CUNETAS DE CONCRETO DE 3000LBS/PULG. #2@20CM AMBOS SENTIDOS	ML	19.8	801.43	L 11,908.31	0	L -	19.8	L 11,908.31	19.8	L 11,908.31	100%
46	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO	M3	360	98.07	L 35,305.20	0	L -	5.2	L 509.96	5.2	L 509.96	1%
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>L 75,320.87</b>		<b>L 26,342.10</b>		<b>L 12,908.63</b>		<b>L 39,250.73</b>	<b>52.11%</b>
<b>BANCA ARBITROS Y SUPLENTE</b>												
47	CUBICULO PARA SUPLENTE L. 4.20 MTS	UND	2	26,145.85	L 52,291.30	0	L -	0.5	L 13,072.83	0.5	L 13,072.83	25%
48	CUBICULO PARA SUPLENTE L. 2.00 MTS	UND	1	14,858.46	L 14,858.46	0	L -	0.25	L 3,714.62	0.25	L 3,714.62	25%
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>L 67,149.76</b>		<b>L -</b>		<b>L 13,072.83</b>		<b>L 16,787.44</b>	<b>25.00%</b>
<b>SISTEMA DE RIEGO</b>												
49	SISTEMA DE RIEGO PARA CAMPO DE FUTBOL	GLOBAL	1	127,000.00	L 127,000.00	0	L -		L -	0	L -	0%
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>L 127,000.00</b>		<b>L -</b>		<b>L -</b>		<b>L -</b>	<b>0.00%</b>
<b>PISTA ATLETICA</b>												
50	PISTA DE MATERIAL SELECTO ø=0.10cms, A=6mts, L=273.42 ml.	M3	154.05	629.98	L 100,348.22	50	L 31,499.00	114.05	L 71,849.22	164.05	L 103,348.22	100%
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>L 103,348.22</b>		<b>L 31,499.00</b>		<b>L 71,849.22</b>		<b>L 103,348.22</b>	<b>100.00%</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>L 1,305,097.19</b>		<b>L 473,360.67</b>		<b>L 396,322.12</b>		<b>L 873,397.41</b>	<b>66.92%</b>

FIRMA:  ING. JUAN GABRIEL ARGUETA M. 	FIRMA:  NOMBRE: LUIS FERNANDO AMADOR PORTILLO	FIRMA:  NOMBRE: GASINO ARGUETA GALVEZ 
ALCALDE MUNICIPAL SANTA MARIA		
FECHA: 11 DE MAYO 2019		



Santa María la Paz, 11 de abril del 2019.

GABINO ARGUETA GÁLVEZ  
ALCALDE MUNICIPAL  
SANTA MARÍA LA PAZ  
Su oficina.


Ref. Supervisión de infraestructura Del  
proyecto: **MEJORAMIENTO II ETAPA  
CAMPO DE FUTBOL LOS PLANES  
MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA  
PAZ.**

Estimado Señor:

En cumplimiento de los términos contractuales, actuando como supervisor de proyectos de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA, me permito entregar el INFORME N°2, del proyecto en mención; comprende el periodo del 29 abril al 10 mayo del 2019.

Sin otro particular le saluda.

Atentamente.



ING. LUÍS FERNANDO AMADOR PORTILLO  
UNIDAD DE PROYECTOS  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA



**RESUMEN EJECUTIVO**

<b>1.1-IDENTIFICACION DEL PROYECTO.</b>				
<b>NOMBRE DEL PROYECTO:</b>	<b>MEJORAMIENTO II ETAPA CAMPO DE FUTBOL</b>			
<b>UBICACIÓN:</b>	<b>LOS PLANES MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, LA PAZ</b>			
<b>BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:</b>	El proyecto consiste en la construcción de graderías para el público las cuales contarán con un techo, se construirán cunetas las cuales servirán para mejorar el desagüe del campo. A la vez se construirán bancas para suplentes y árbitros, una pista atlética conformada con material selecto.			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b>	Los fondos de este proyecto proceden de la de LA MUNICIPALIDAD. La Supervisión está a cargo de la Unidad De Proyectos De La Alcaldía Municipal			
<b>CONCEPTO</b>	<b>FINANCIAMIENTO MUNICIPALIDAD</b>	<b>APORTE MUNICIPALIDAD</b>	<b>APORTE COMUNIDAD</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
<b>COSTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	L 1,305,097.19	L 1,305,097.19	L, 0.00	L 1,305,097.19
<b>COSTO DE SUPERVISIÓN (10% del monto del proyecto)</b>	L. 0.00			L. 0.00
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>				<b>L 1,305,097.19</b>

<b>1.2- INFORMACIÓN CONTRACTUAL.</b>	
<b>NOMBRE DEL EJECUTOR (contratista):</b>	<b>ING. JUAN GABRIEL ARGUETA M.</b>
<b>SUPERVISIÓN</b>	UNIDAD DE PROYECTOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL ING. LUIS AMADOR.
<b>CONTRATO ORIGINAL</b>	
<b>FECHA DE FIRMA DE CONTRATO</b>	26 DE ENERO 2019
<b>FECHA DE ORDEN DE INICIO</b>	26 DE ENERO 2019
<b>PLAZO CONTRACTUAL</b>	120 días
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	26 DE MAYO 2019

### 1.3 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO.

**OBRA EJECUTADA:** se prepara el informe que corresponde a la estimación número dos del proyecto el cual presenta un avance a la fecha del 66.92% de las actividades del proyecto las cuales comprenden:

#### **GRADERÍAS:**

Se realizaron actividades de limpieza, excavación, relleno, formación de la gradería, columnas.

#### **TECHOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS**

Construcción de Columnas y Joist, gradería.

#### **CUNETAS**

Excavación de cunetas las cuales se van formando y construyendo con una losa de concreto de 12cm de espesor mejorándose por parte del contratista lo contratado que es 10cm de espesor.

PRESENTANDO UN AVANCE FÍSICO DE UN 66.92%

#### **SITUACIONES PRESENTADAS:**

No se presentaron.

#### **SOLUCIONES PROPUESTAS:**

No se presentaron

#### **PERSONAL TRABAJANDO EN SITIO:**

1. Maestro de Obra
2. Ayudantes.
3. Ingeniero Ejecutor

### 1.4-DETALLE DE TAREAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

La supervisión desarrolla las siguientes actividades en campo.

1. Revisión de medidas.
2. Supervisión de personal presente en el proyecto.
3. Verificación de Actividades en sitio ejecutadas conforme a lo presupuestado.

## **FOTOGRAFÍAS DEL PROYECTO**

**PROYECTO MEJORAMIENTO II ETAPA CAMPO DE FUTBOL**

**PISTA ATLÉTICO**

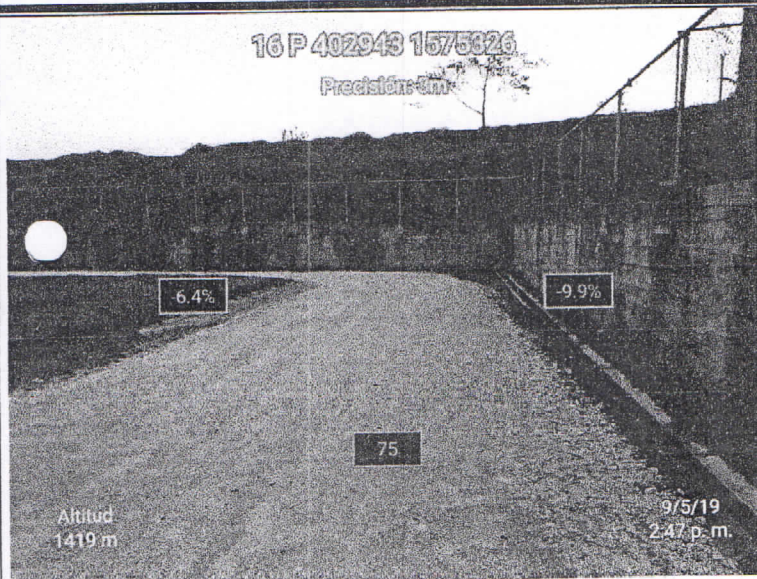


Figure 1 En la imagen se puede observar que se trabajó en el relleno y compactado de la pista, con un espesor de 10cm.

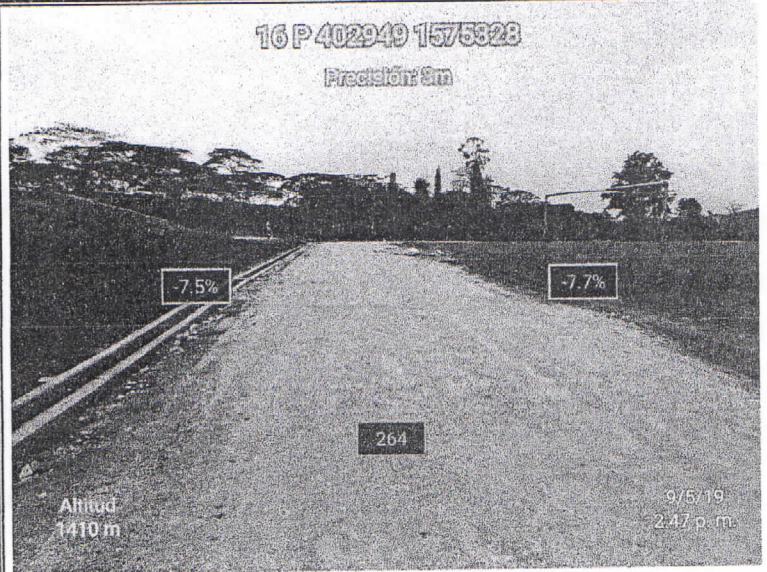


Figure 2 Construcción de cunetas y relleno compactado de la pista

**GRADERÍA**

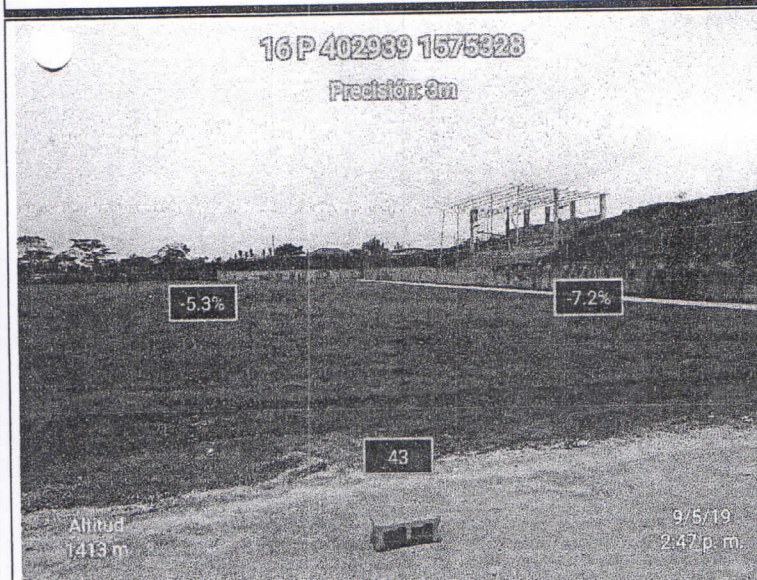


Figure 3 Gradería, la cual está siendo construida con joist y columnas que soportan la estructura.

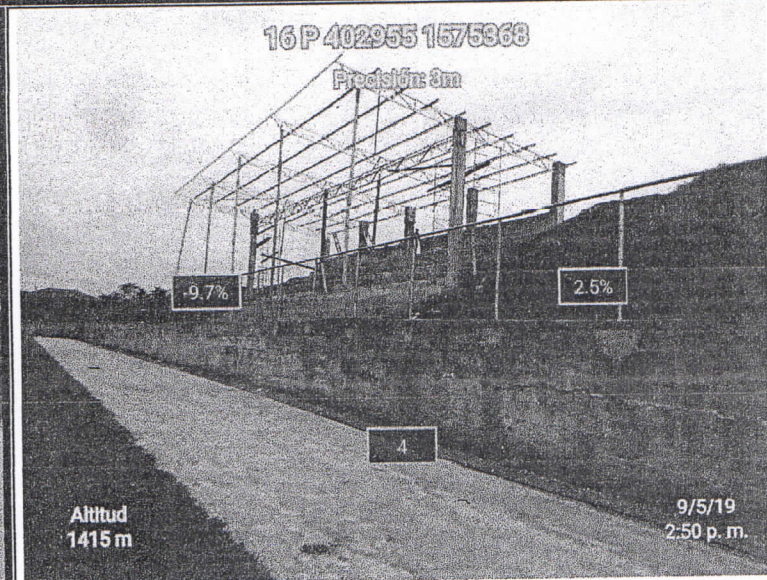


Figure 4 Gradería, la cual está siendo construida con joist y columnas que soportan la estructura.

**GRADERÍA**

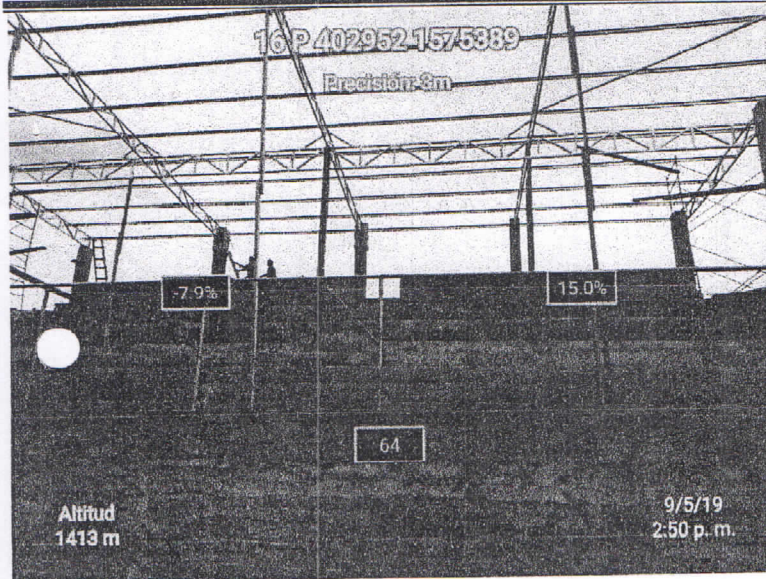


Figure 5 Gradería, con Joist columnas

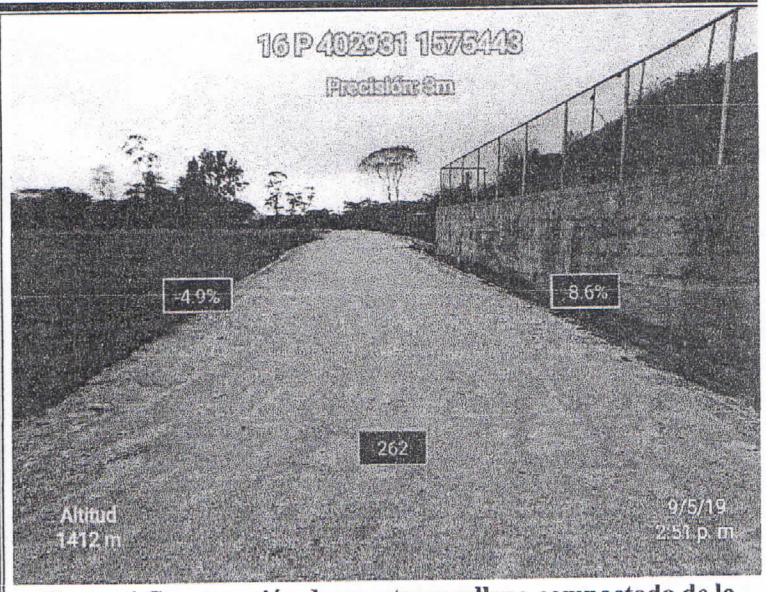


Figure 6 Construcción de cunetas y relleno compactado de la pista

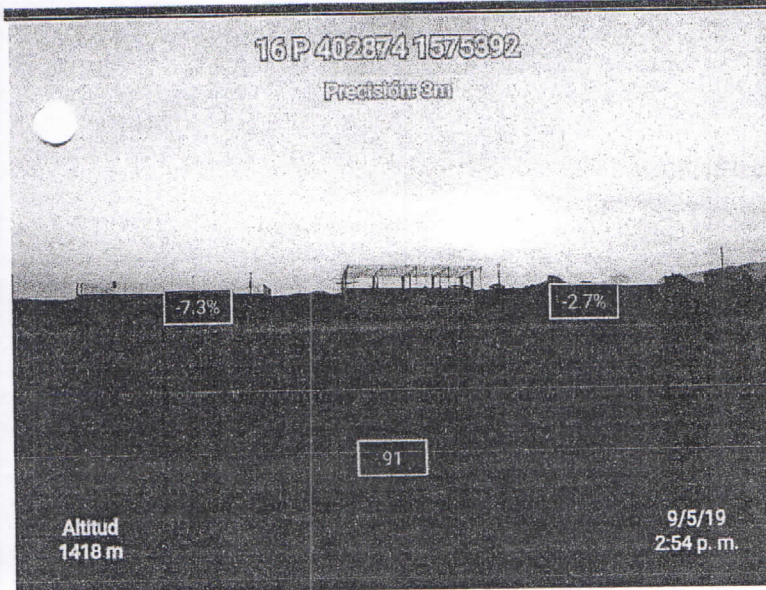


Figure 7 Cancha de futbol

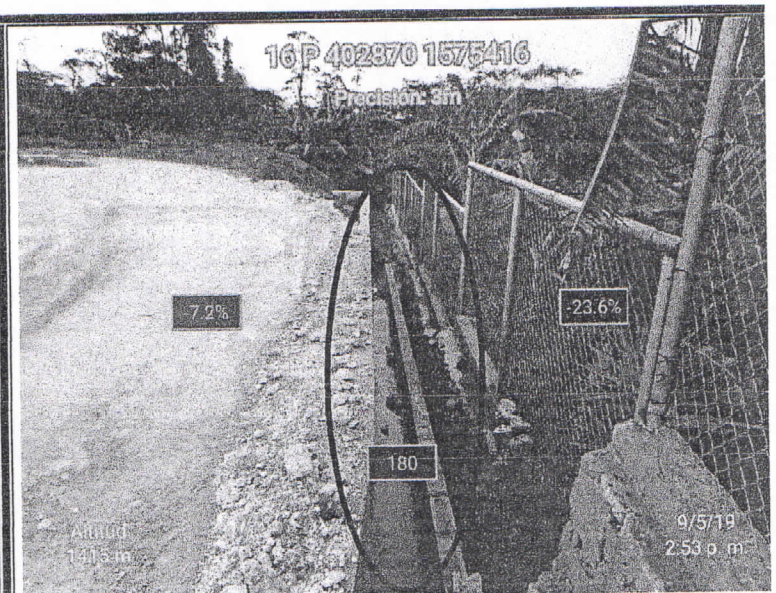


Figure 8 Cunetas de desagüe

**PISTA DE ATLETISMO**

16 P 402875 1575375

Precisión: 3m

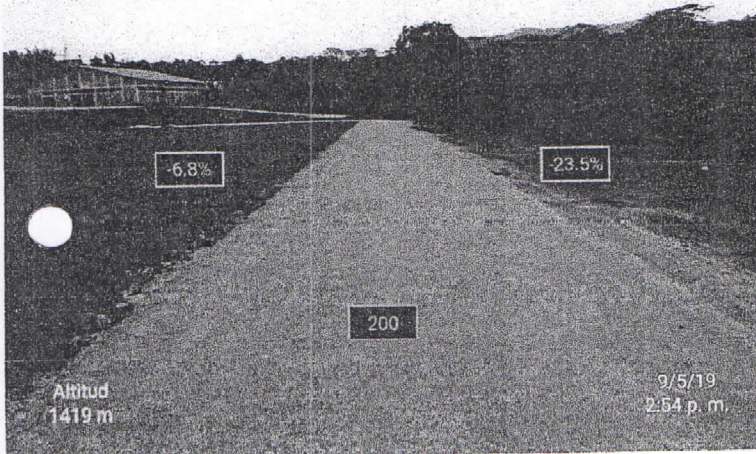


Figure 9 Pista de atletismo

16 P 402898 1575312

Precisión: 4m

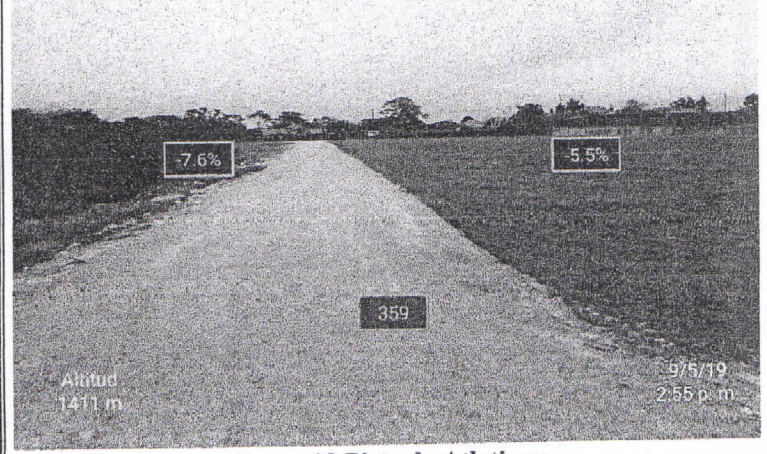


Figure 10 Pista de Atletismo

16 P 402968 1575382

Precisión: 3m

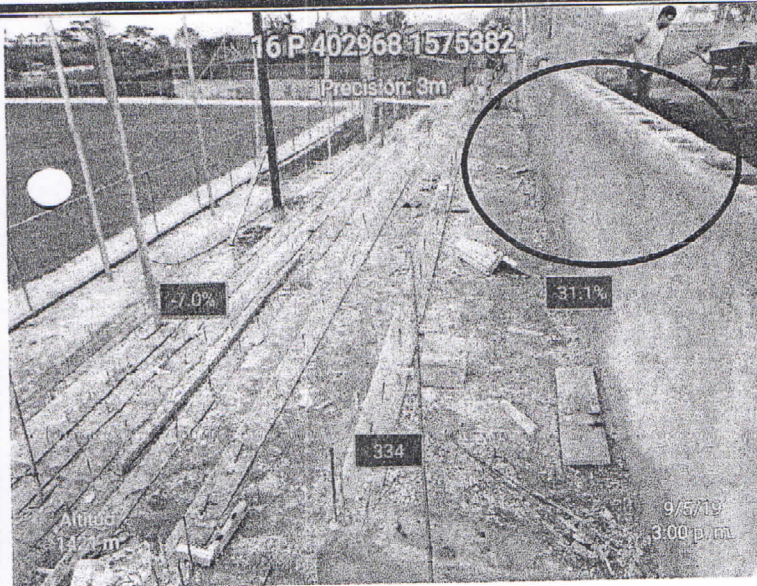


Figure 11 Graderías Pared de Bloque

16 P 402969 1575379

Precisión: 3m

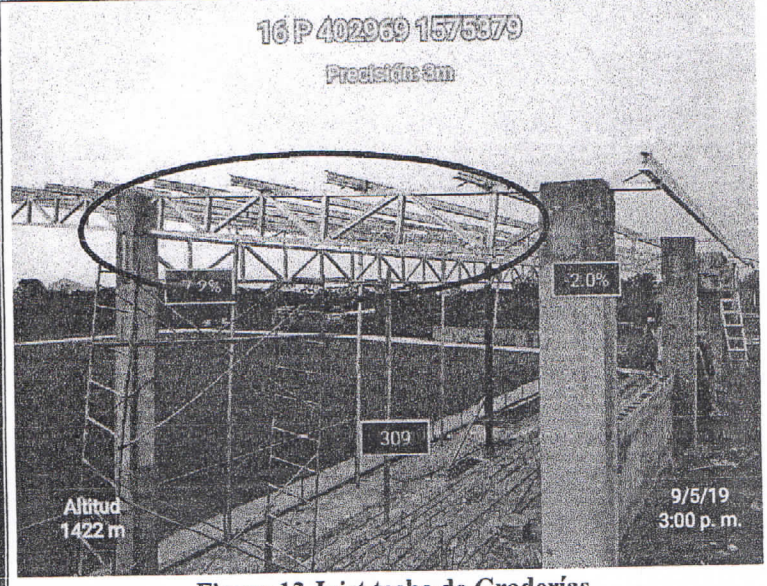


Figure 12 Joist techo de Graderías





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-20127

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARGUETA MONTOYA JUAN GABRIEL**  
Con Registro Tributario Nacional: **12121977000908**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-20127 en fecha 03/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418252255 de fecha 26/04/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 27715008650, presentada el 26/04/2019, la presente Constancia vence el 01/07/2019.


Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-20127** o mediante el siguiente código QR:






FECHA 08/14/19

Se continúan trabajos en días de quincenas / se  
está replanteando arbolado en las mismas, igual  
se rellena para el resto de columnas, se comienzan  
cuerpos de evacuación hasta la esquina del muro  
muro norte.


Se solicita al Supervisor lo siguiente:

- 1) Confirmación de si se construyen como permitidas
- 2) Detalle del muro en area de lindes fondo sur
- 3) Detalle de techo solicitado
- 4) Continuación de la actividad de riesgo (sistema de riesgo)
- 5) Si no se ejecuta el sistema de riesgo confirmar que  
esta actividad se ejecuta con los mismos procedimientos  
de tiempo de ejecución.

  
Ayuntamiento

13 Abril 2019

Se visitó el terreno en la zona de San Antonio  
La Presidencia de la Junta Municipal de San Mateo  
Formación en la zona de San Antonio de la zona  
de San Mateo, La Paz, Baja California Sur.  
El terreno se encuentra en un terreno  
de San Mateo.





FECHA No 109 / 19

se continúan los trabajos en Canchales y mano de  
 manifestación de Canchales todos sus. se trabaja en  
 apoyo de Canchales en U y se trabajan actividades  
 en Canchales.

se viene el día sábado de las clases II en el  
 día de los juegos y se trabaja en Sist por semana  
 un grupo de trabajo de los jugadores

se trabaja en la ejecución de las obras en Canchales para  
 mejorar las actividades y el monto ejecutado es de  
 la semana por ser a mano suelta se trabaja hasta  
 los Muebles. 11/04/19

*[Handwritten signature]*

22 / 04 / 19


se continúan trabajos en mano de manifestación y trabajos  
 a todo de juegos

se trabaja de parte de aduanas para jugadores aptos

se trabaja ejecución para trabajos de todo sus  
 a todo Canchales.

se viene el día sábado se viene planificando el bitácora

*[Handwritten signature]*



FECHA 30/04/19

N° 10

Se continúan los trabajos de muro en lado sur del campo, se está reellanado bien de piedra de canchales y se trabaja en techo de fundición se están fabricando los jorist por sermón de apoyo para la instalación de canchales de techo se está solicitando el detalle de los espacios para replantes y resolución sobre sistema de riego al campo de Fútbol.

03/05/2019

Se continúan trabajos en techo de canchales, se están fabricando los jorist de tubo 2x2 (19) longitudinales para estructurar el techo. Los dimensiones de estos elementos son L-26.5ml de mas largo y alto 60cm. Incluye jorist de L-10.65ml y 50cm de alto. Se pide la aprobación y detalle de el plan de replantes y aberturas.

También se solicita resolución sobre adecuación de sistema de riego.



FECHA 15 PCM

Se continuo trabajando en la estructura de techo en area de gradillas, se esta fortaleciendo el poste en columnas de esta area, a esta fecha se tiene instalada la lamina galvanizada en un tubo de 6x6 altura 10 y se instaló tambien el post de L-20mm. Se comenzo a instalar los post de 1065 mil para luego colocar la siguiente estructura. El clima a continuado un poco por la lluvia en la tarde poco viento.

09/05/2011

Se trabaja en el techo del area de gradillas, a esta fecha se tiene instalada la estructura principal como post y completa, la colocacion de lamina galvanizada con un tubo ya en sitio se cubre el material extra (batistado) en todo los postes del campo, y por orden de el Sr. alcalde y supervisor se Ejecuto mejoras en el acceso del proyecto como se temperatura de techo, batistado de techo, aferrado de techo, tambien se realiza cambio de posición de postes y acceso a campo.

*[Handwritten signature]*
