

Municipalidad de Santa Ana de Yusguare

Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Tel. 2788-0111, 2788-0107

Email: munisay88@yahoo.com



INFORME DE AVANCES DE PROYECTOS EN EJECUCION MES DE ABRIL AÑO 2019.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL PROYECTO	FECHA DE CONTRATO	MONTO CONTRACTUAL	ORDEN DE CAMBIO O ADENDUM	TOTAL DE CONTRATO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
001	SECTOR EDUCACION 11-001 (Subsidios para financiar servicios de: Maestros , niñeras, vigilante, técnicos en computación, material didáctico y reparaciones menores en edificaciones educativos Tablones Arriba, Tajeada, La Permuta, El Zapotillo, Casco Urbano, El Cerro, Filipinas)	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Aldea de Tablones Arriba, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construcción Muro de Contención y Muro Perimetral Escuela José Trinidad Reyes.	03/12/2018	38,075.85	11,600.67	49,676.52	100%	
002	SECTOR SALUD 11-002 (Subsidios para financiar servicios de: Enfermeras, Técnicos de laboratorio, Médicos en servicio social,	Carlos Roberto Erazo Mejía	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Rampa de Acceso y Portón Corredizo en Centro de Capacidades Especiales.	28/12/2018	29,952.00	-	29,952.00	100%	


	compra de medicamentos y campañas de salud para los centros de Tablones arriba, Tajeada, La Permuta, El Zapotillo, Casco Urbano)									
003	PRESERVACION DEL PATRIMONIO 12-001 (Mejoramiento de Edificio Municipal de Oficinas Administrativa de Barrio El Centro)	Marcio Enrique Chavarría Aguirre	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento del Edificio Municipal.	04/02/2019	20,700.00	-	20,700.00	100%	
004	SECTOR EDUCACION 11-001 (Subsidios para financiar servicios de: Maestros , niñeras, vigilante, técnicos en computación, material didáctico y reparaciones menores en edificaciones educativos Tablones Arriba, Tajeada, La Permuta, El Zapotillo, Casco Urbano, El Cerro, Filipinas)	Ronald Alfredo Moreno	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento de la Bodega del Jardín de Niños Ángela Bustillo Valle.	05/02/2019	650.00	-	650.00	100%	
005	SEGURIDAD CIUDADANA 11-001 (Mejoramiento de Alumbrado	Wilmer Alexander Guillen Betanco	Aldea El Puente, Tablones Abajo, Tablones	Contrato de Mano de Obra de Iluminación de Vías Públicas.	11/02/2019	38,985.00	-	38,985.00	100%	

	Público De: Área Rural de Tablones Arriba, Tablones Abajo, La Tajeada La Permuta, Pueblo Nuevo, El Zapotillo, y del Casco Urbano)		Arriba, Colonia Manuel Fernández, Barrio El Centro, San Francisco y Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.							
006	CULTURA 12-001 (Subsidio a organizaciones de la sociedad civil(Iglesias, Comités de ferias, patronatos)	Ronald Alfredo Moreno	Barrio El Centro Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento en Iglesia Católica del Municipio.	11/02/2019	1,250.00	-	1,250.00	100%	
007	EDUCACION 11-001 (Subsidios para financiar servicios de: Maestros , niñeras, vigilante, técnicos en computación, material didáctico y reparaciones menores en Edificaciones educativos Tablones Arriba, Tajeada, La Permuta, El Zapotillo, Casco Urbano, El Cerro, Filipinas)	Teófilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrió San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Rehabilitación Módulos de Baños Centro de Educación Básica Álvaro Contreras.	04/03/2019	55,686.11	-	55,686.11	100%	
008	EDUCACION 11-001 (Construcción de pisos y vestidores del edificio del Centro de educación básica Álvaro Contreras)	Carlos Alberto Erazo Mejía	Barrió San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento Centro de Educación Básica Álvaro Contreras.	05/03/2019	222,887.00	-	222,887.00	26.69%	

009	PARTICIPACION CIUDADANA 12-005 (Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil)	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Barrió Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable.	21/03/2019	4,600.00	-	4,600.00	100%	
010	EDUCACION 11-001 (Subsidios para financiar servicios de: Maestros , niñeras, vigilante, técnicos en computación, material didáctico y reparaciones menores en Edificaciones educativos Tablones Arriba, Tajeada, La Permuta, El Zapotillo, Casco Urbano, El Cerro, Filipinas)	Isael Antonio Sánchez López	Barrió San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Cafetería Centro de Educación Básica Álvaro Contreras.	22/03/2019	20,000.00	-6,426.86 +65,943.29	79,816.43	64.51%	
011	EDUCACION 11-001 (Construcción de pisos y vestidores del edificio del Centro de educación básica Álvaro Contreras)	Elvin Joczon Valladares Guillen	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 14.70 horas de retro-excavadora y 16 viajes de desperdicio en el Mejoramiento de Centro de Educación Álvaro Contreras (Vestidores, Escenario y Piso de Concreto)	22/03/2019	20,038.75	-	20,038.75	100%	
012	PARTICIPACION CIUDADANA 12-005 (Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil)	Teófilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrió Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Reductores de Velocidad (Bordas) en Pavimento.	27/03/2019	14,012.73	-	14,012.73	100%	

013	PARTICIPACION CIUDADANA 12-005 (Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil)	Teófilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrió San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construcción de Alcantarilla con caja de captación de agua.	29/03/2019	21,012.77	5,615.23	26,628.00	100%	
014	PARTICIPACION CIUDADANA 12-005 Subsidios a organizaciones de la sociedad civil.	Elvin Joczon Valladares Guillen	Barrió San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 6.80 horas de Retro-excavadora y Tres viajes de desperdicio en la Construcción de Alcantarilla con caja de captación de agua.	29/03/2019	7,245.00	-	7,245.00	100%	
015	DEPORTES 12-003 Subsidios a Organizaciones deportivas del Municipio	Ramón Enrique Vallejo Reyes	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable. (Campo de Futbol)	09/04/2019	33,616.00	-	33,616.00	100%	
016	DEPORTES 12-003 Subsidios a Organizaciones deportivas del Municipio	Ronald Alfredo Moreno	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Reparacion de portones en Campo de Futbol.	12/04/2019	2,300.00	-	2,300.00	100%	
017	DEPORTES 12-003 Subsidios a Organizaciones deportivas del Municipio	Elvin Joczon Valladares Guillen	Barrio Los Mangos, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Servicios de 23.40 Horas de Retro-Excavadora para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Campo de Futbol.	16/04/2019	20,182.50	-	20,182.50	100%	
018	PARTICIPACION CIUDADANA 12-005 Subsidios a organizaciones de la sociedad civil.	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio Tierras Morenas, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de construccion de Tapadera para pozo de Alcantarillado Sanitario en el Pavimento.	25/04/2019	3,000.00	-	3,000.00	100%	

019	PRO - HONDURAS 13- 001 Mejoramiento y Apertura de carretera que conduce de casco urbano a Aldea El Cerro.	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio San Francisco, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de Dos Reductores de Velocidad (Bordas) en Pavimento.	26/04/2019	2,827.58	-	2,827.58	100%	
020	SEGURIDAD CIUDADANA 12- 001 (Mejoramiento de parque de El Casco Urbano)	Teofilo Antonio Maldonado Beltrand	Barrio El Centro, Santa Ana de Yusguare.	Contrato de Mano de Obra de Construccion de Cisterna en Parque Municipal	29/04/2019	44,551.46	-	44,551.46	0.00%	






ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Construcción de Alcantarilla con caja de captación
 Ejecutor: Taito Antonio Matosado Beltrán
 Monto de Contrato: L. 21,012.77

Aides: N/A
 Fecha Contrato: 29 de Marzo del 2019
 Su Color: Negro San Francisco

Departamento: Choluteca
 Municipio: Santa Ana de Yusguare
 Período del: 06 de Abril al 26 de Abril del 2019

ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA (FINAL)

ACTIVIDAD
DESCRIPCION

UNIDAD

CANT.

PRESUPUESTADO
P.U.

TOTAL L.

EJECUTADO ANTERIOR
CANT.

TOTAL L.

EJECUTADO ESTE PERIODO
CANT.

TOTAL L.

ACUMULADO ACTUAL
Cantidad

TOTAL L.

%

ALCANTARILLA CON CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA												
PROLIMINARES												
1.00	Trazado y marcado	m	12.40	L. 20.00	L. 248.00	12.40	L. 248.00			12.40	L. 248.00	100.00%
TOTAL					L. 248.00		L. 248.00				L. 248.00	100.00%
CIMENTACION												
2.00	Excavación de material no calificado	m³	25.80	L. 274.00	L. 7,069.20	25.80	L. 7,069.20			25.80	L. 7,069.20	100.00%
3.00	Cimentación de mampostería	m³	8.11	L. 235.00	L. 1,435.65	1.53	L. 359.96	4.58	L. 1,076.30	6.11	L. 1,435.65	100.00%
TOTAL					L. 8,605.04		L. 7,428.16		L. 1,676.30		L. 8,505.05	100.00%
PAREDES												
4.00	Pared de bloque 8" fundido	m²	4.07	L. 250.00	L. 1,017.50			4.07	L. 1,017.50	4.07	L. 1,017.50	100.00%
5.00	Repele y alisados e= 3.00 cm, mortero 1:4	m²	3.00	L. 110.00	L. 330.00			3.00	L. 330.00	3.00	L. 330.00	100.00%
TOTAL					L. 1,347.50				L. 1,347.50		L. 1,347.50	100.00%
LOSA												
6.00	Losa concreto e= 10 cm #4 a/c 20 cm y #4 a/c 30 cm	m²	20.52	L. 270.00	L. 5,540.40	20.52	5,540.40			20.52	L. 5,540.40	100.00%
7.00	Losa de concreto e= 7.0 cm	m²	12.40	L. 113.00	L. 1,401.20			12.40	L. 1,401.20	12.40	L. 1,401.20	100.00%
8.00	Encofrado de losa superior	m²	20.52	L. 136.00	L. 2,790.72	12.21	1,674.43	8.21	L. 1,116.56	20.52	L. 2,790.72	100.00%
TOTAL					L. 9,732.32		L. 7,214.83		L. 2,517.78		L. 9,732.32	100.00%
RELLENO Y COMPACTADO												
9.00	Relleño y compactado con material selecto	m³	10.28	L. 115.00	L. 1,179.90			10.28	L. 1,179.90	10.28	L. 1,179.90	100.00%
TOTAL					L. 1,179.90				L. 1,179.90		L. 1,179.90	100.00%
TOTAL FOSEA SEPTICA					L. 21,012.77		L. 14,890.99		L. 6,121.78		L. 21,012.77	100.00%
GRAN TOTAL					L. 21,012.77		L. 14,890.99		L. 6,121.78		L. 21,012.77	100.00%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor por lo cual firmo y sello.

CONTRATISTA

Nombre: Taito Antonio Matosado Beltrán

FECHA: 26-04-2019

INGENIERO SUPERVISOR

Nombre: Ing. Elyse Rivera Anzueto

FECHA: 26/04/2019

CONTRATADOR MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE

Nombre: Elyse Rivera Anzueto

FECHA: 26/04/2019

ALCALDE MUNICIPAL

Nombre: Elyse Rivera Anzueto

FECHA: 26/04/2019









Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



Caja rectora de agua, 26/04/2019

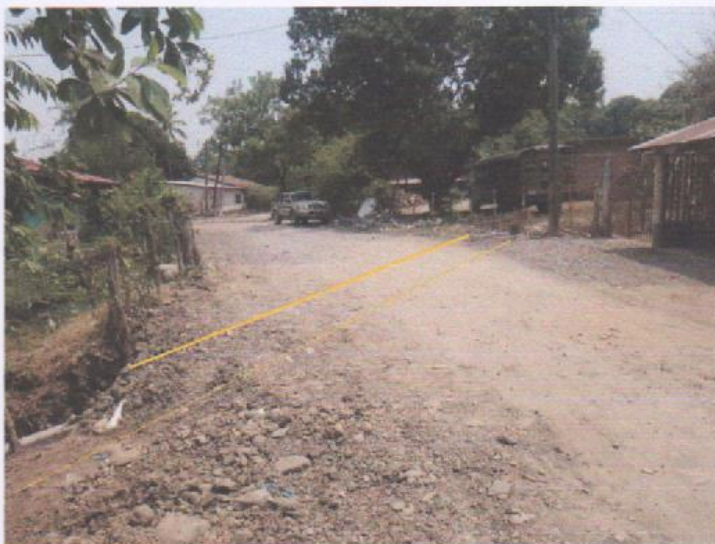

Ubicación Alcantarilla 26/04/2019


Ing. Eynar Rivera Araujo





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



"MAMBOCAURE"



Aguas arriba, acceso. 26/04/2019



Aguas abajo, salida. 26/04/2019


Ing. Eynar Rivera Araujo





ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Construcción de Alcantarilla con caja de captación

Ejecutor: Teofilio Antonio Maldonado Beltrand

Monto de Contrato: L. 5,615.23

Aldes: N/A

Fecha Contrato: 29 de Marzo del 2019

Bo. Colonia: Barrio San Francisco

Departamento: Choluteca

Municipio: Santa Ana de Yusguare


Periodo del: 15 de Abril al 26 de Abril del 2019

ADENDUM # 01 POR MANO DE OBRA
ESTIMACIÓN # 01(FINAL)

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	Cantidad	TOTAL L.	
DESCARGA DE AGUA												
1.0	Conformación a mano	m²	1.40	350.00	L. 490.00			1.40	L. 490.00	1.40	L. 490.00	100.00%
2.0	Enchapado de piedra	m²	9.31	165.00	L. 1,536.15			9.31	L. 1,536.15	9.31	L. 1,536.15	100.00%
3.0	Losa de concreto simple e= 10 cm	m²	9.31	L. 168.00	L. 1,564.08			9.31	L. 1,564.08	9.31	L. 1,564.08	100.00%
4.0	Bordillos de 20x25 cm	ml	8.10	L. 250.00	L. 2,025.00			8.10	L. 2,025.00	8.10	L. 2,025.00	100.00%
TOTAL					L. 5,615.23				L. 5,615.23		L. 5,615.23	100.00%
GRAN TOTAL					L. 5,615.23				5,615.23		5,615.23	100.00%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagos al ejecutor para lo cual firmo y sello.

CONTRATISTA

Firma: 

Nombre: Teofilio Antonio Maldonado Beltrand

FECHA: 26-04-2019

INGENIERO SUPERVISOR

Firma: 

Nombre: Ing. Eymar Rivera Arzujo

FECHA: 26/04/2019

COORDINADOR MANCOMUNIDAD

Firma: 

Nombre: Edas Muro

FECHA: 26/04/2019

ALCALDE MUNICIPAL

Firma: 

Nombre: Edas Muro

FECHA: 26/04/2019







Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



Descarga, 26/04/2019



Descarga. 26/04/2019


Ing. Rynar Rivera Araujo




ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE

Descripción: Construcción de Alcantarilla con caja de captación

Ejecutor: Teofilo Antonio Maldonado Salazar

Monte de Contrato: L. 21,812.77

Aldea: N/A

Fecha Contrato: 26 de Marzo del 2019

Subcontrato: Santa Ana Francisco

Departamento: Choluteca

Municipio: Santa Ana de Yusguare

Periodo del: 01 de Abril al 05 de Abril del 2019

ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRA

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	Cantidad	TOTAL L.	
ALCANTARILLA CON CAJA DE CAPTACIÓN DE AGUA												
PRELIMINARES												
1.00	Trazado y marcado	m	12.40	L. 20.00	L. 248.00			12.40	L. 248.00	12.40	L. 248.00	100.00%
	TOTAL				L. 248.00				L. 248.00	12.40	L. 248.00	100.00%
CIMENTACIÓN												
2.00	Excavación de material no calificado	m³	25.80	L. 274.00	L. 7,069.20			25.80	L. 7,069.20	25.80	L. 7,069.20	100.00%
3.00	Cimentación de mampostería	m²	6.11	L. 235.00	L. 1,435.85			1.53	L. 358.96	1.53	L. 358.96	25.00%
	TOTAL				L. 8,505.05				L. 7,428.16	27.33	L. 7,428.16	87.34%
PAREDES												
4.00	Pared de bloque 8" fundido	m²	4.97	L. 250.00	L. 1,247.50							
5.00	Replazo y afilados en 2.00 cm, mortero 1:4	m²	3.00	L. 110.00	L. 330.00							
	TOTAL				L. 1,577.50							0.00%
LOSA												
6.00	Losa concreto en 10 cm #4 a lo 20 cm y #4 a lo 30 cm	m²	20.52	L. 270.00	L. 5,540.40			20.52	L. 5,540.40	20.52	L. 5,540.40	100.00%
7.00	Losa de concreto en 7.0 cm	m²	12.40	L. 113.00	L. 1,401.20							
8.00	Encofrado de losa superior	m²	20.52	L. 136.00	L. 2,790.72			12.31	L. 1,674.43	12.31	L. 1,674.43	59.99%
	TOTAL				L. 9,732.32				L. 7,214.83	12.31	L. 7,214.83	74.13%
RELLENO Y COMPACTADO												
9.00	Releño y compactado con material selecto	m³	10.26	L. 115.00	L. 1,179.90							
	TOTAL				L. 1,179.90							
TOTAL - FOSA SEPTICA					L21,812.77							
GRAN TOTAL					L. 21,812.77				14,995.39		14,995.39	70.87%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a la cantidad de forma exacta y con buena calidad, y en cumplimiento a las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor para lo cual firmo y sello:

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTOS ESTIMADOS	-	14,995.39	14,995.39
Retención por Anticipo	-	2,233.85	2,233.85
Retención por I.S.R. (12.5%)	-	-	-
Retención por Cédula de Obra	-	-	-
Retención por Impuesto	-	-	-
Saldo a Pagar	-	12,057.35	

CONTRATISTA

(Firma)

Nombre: Teofilo Antonio Maldonado Salazar

FECHA: 05-04-2019

INGENIERO SUPERVISOR

(Firma)

Nombre: Ing. Eymar Rivera Arango

FECHA: 05/04/2019

ALCALDE MUNICIPAL

(Firma)

Nombre: Elio Manuel Torres

FECHA: 05/04/2019







Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



"MAMBOCAURE"



05/04/2019



05/04/2019

Ing. Eynar Rivera Araujo



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Construcción Reductores de Velocidad (Bordas) en Pavimento

Ejecutor: Teofilo Antonio Maldonado Beltrand

Monto de Contrato: L. 14,012.73

Aídea: N/A

Fecha Contrato: 27 de Marzo del 2019

Bo/Colonia: Barrio Tierras Moradas

Departamento: Choluteca

Municipio: Santa Ana de Yusguare

Periodo del: 01 de Abril al 06 de Abril del 2019

ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRA

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	Cantidad	TOTAL L.	
REDUCTORES DE VELOCIDAD												
1.0	Trazado y marcado	ml	39.00	20.00	L. 780.00			19.50	L. 390.00	19.50	L. 390.00	50.00%
2.0	Demolición de pavimento asfáltico	m²	39.00	39.00	L. 1,521.00			19.50	L. 760.50	19.50	L. 760.50	50.00%
3.0	Acarreo de material con carretilla	m³	5.07	65.00	L. 329.55			2.54	L. 164.78	2.54	L. 164.78	50.00%
4.0	Encofrado	unidad	3.00	18.00	L. 54.00			1.50	L. 27.00	1.50	L. 27.00	50.00%
5.0	Loses de concreto reforzado, 7 # 3 y # 3 @ 35 cm	m²	39.00	179.00	L. 6,981.00			19.50	L. 3,490.50	19.50	L. 3,490.50	50.00%
6.0	Concreto 280 kg/cm² incluye curado y afinado (ver planos)	m³	1.95	1,222.00	L. 2,382.90			0.98	L. 1,197.56	0.98	L. 1,197.56	50.28%
7.0	Junta con tapa-gotera	ml	39.00	7.00	L. 273.00							
8.0	Pintura de tráfico	ml	125.28	13.50	L. 1,691.28							
TOTAL-REDUCTORES DE VELOCIDAD					L.14,012.73				L.8,030.34		L. 8,030.34	43.03%
GRAN TOTAL					L. 14,012.73				8,030.34		8,030.34	43.03%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagos al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	-	8,030.34	8,030.34
Retención por Anticipo	-	904.55	904.55
Retención por I.R.B. (12.5%)	-	-	-
Retención por Calidad de Obra	-	-	-
Retención por Multa	-	-	-
Neto a Pagar	-	5,125.78	5,125.78

CONTRATISTA




Firma: Teofilo Antonio Maldonado Beltrand

Nombre: Teofilo Antonio Maldonado Beltrand

FECHA: 05-04-2019

INGENIERO SUPERVISOR



Firma: Ing. Einar Rivera Azupar

Nombre: Ing. Einar Rivera Azupar

FECHA: 05/04/2019

ALCALDE MUNICIPAL



Firma: Edgardo Muñoz Turcios

Nombre: Edgardo Muñoz Turcios

FECHA: 05/04/2019







Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



"MAMBOCAURE"



05/04/2019



05/04/2019


Ing. Eynar Rivera Araujo





ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Construcción Reductores de Velocidad (Bordas) en Pavimento
 Ejecutar: Teofilo Antonio Maldonado Beltrán
 Monto de Contrato: L. 14,012.73

Aldea: N/A
 Fecha Contrato: 27 de Marzo del 2019
 Bo/Colonia: Barrio Tierras Morenas

Departamento: Choluteca
 Municipio: Santa Ana de Yusguare
 Periodo del: 06 de Abril al 26 de Abril del 2019


ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA (FINAL)

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	Cantidad	TOTAL L.	
REDUCTORES DE VELOCIDAD												
1.0	Trazado y marcado	ml	39.00	20.00	L. 780.00	19.50	390.00	19.50	L. 390.00	39.00	L. 780.00	100.00%
2.0	Demolición de pavimento asfáltico	m²	39.00	39.00	L. 1,521.00	19.50	760.50	19.50	L. 760.50	39.00	L. 1,521.00	100.00%
3.0	Acarreo de material con carretilla	m²	5.07	65.00	L. 329.55	2.54	164.78	2.53	L. 164.45	5.07	L. 329.55	100.00%
4.0	Encofrado	unidad	3.00	18.00	L. 54.00	1.50	27.00	1.50	L. 27.00	3.00	L. 54.00	100.00%
5.0	Losa de concreto reforzado, 7 # 3 y # 3 @ 35 cm	m²	39.00	178.00	L. 6,951.00	19.50	3,400.50	19.50	L. 3,400.50	39.00	L. 6,951.00	100.00%
6.0	Concreto 280 kg/cm² incluye curado y afinado (ver planos)	m³	1.95	1,222.00	L. 2,382.90	0.98	1,197.56	0.97	L. 1,185.34	1.95	L. 2,382.90	100.00%
7.0	Junta con tapa-gotera	ml	39.00	7.00	L. 273.00			39.00	L. 273.00	39.00	L. 273.00	100.00%
8.0	Pintura de tráfico	ml	125.28	13.50	L. 1,691.28			125.28	L. 1,691.28	125.28	L. 1,691.28	100.00%
TOTAL-REDUCTORES DE VELOCIDAD					L.14,012.73		L. 6,030.34		L.7,982.39		L. 14,012.73	100.00%
GRAN TOTAL					L. 14,012.73		L. 6,030.34		L. 7,982.39		L. 14,012.73	100.00%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
Monto Estimado	8,030.34	7,982.39	14,012.73
Retención por Anticipo	904.65	1,197.36	2,101.91
Retención por I.S.R. (13.2%)			-
Retención por Calidad de Obra			-
Retención por Multa			-
Neto a Pagar	5,125.79	5,785.03	11,910.82


CONTRATISTA



Firma: Teofilo Antonio Maldonado Beltrán

FECHA: 26-04-2019

INGENIERO SUPERVISOR



Firma: Eyné Rivera Araujo

FECHA: 26/04/2019

ALCALDE MUNICIPAL



Firma: Mauricio Torcios S

FECHA: 26/04/2019







Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



26/04/2019



26/04/2019


Ing. Eynar Rivera Arce





ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Construcción Cafetería Centro Basico Alvaro Cantares
Ejecutor: Isael Antonio Sanchez Lopez
Monto de Contrato: L. 79,516.43

Aldia: NIA
Fecha Contrato: 22 de Marzo del 2019
Ba/Colonia: Santo San Francisco

Departamento: Choluteca
Municipio: Santa Ana de Yusguare
Periodo del: 26 de Marzo al 08 de Abril del 2019


ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRA

ESTIMACIÓN PVP POR MANS DE OBRAS												
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
CAFETERIA												
PRELIMINARES												
1.0	Demolicion de Jaminera	Global	1.00	800.00	L 800.00			1.00	L 800.00	1.00	L 800.00	100.00%
2.0	Acarreo de material con carretilla	m³	35.00	60.00	L 2,100.00			7.00	L 420.00	7.00	L 420.00	20.00%
3.0	Trazado y marcado	m	84.20	23.00	L 1,936.60			84.20	L 1,936.60	84.20	L 1,936.60	100.00%
	TOTAL				L 4,636.60				L 1,936.60		L 1,936.60	41.77%
EXCAVACIÓN												
4.0	Excavación de material no calificado	m³	9.78	270.00	L 2,370.60			9.78	L 2,370.60	9.78	L 2,370.60	100.00%
	TOTAL				L 2,370.60				L 2,370.60		L 2,370.60	100.00%
CIMENTACIÓN												
5.00	Cimentación de mamposteria	m³	7.17	L 287.00	L 2,057.79			7.17	L 2,057.79	7.17	L 2,057.79	100.00%
6.00	Dado de concreto de 40 x 40 x 50 cm, 4#3 y #2 @ 20 cm	unidad	13.00	L 125.00	L 1,625.00			13.00	L 1,625.00	13.00	L 1,625.00	100.00%
7.00	Dado de concreto de 40 x 40 x 50 cm, 4#3 y #2 @ 20 cm con tubo HG de 2-1/2"	unidad	5.00	L 140.00	L 700.00			5.00	L 700.00	5.00	L 700.00	100.00%
	TOTAL				L 4,382.79				L 4,382.79		L 4,382.79	100.00%
ESTRUCTURA												
8.00	Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ML	41.85	L 125.00	L 5,236.25			4.20	L 525.00	4.20	L 525.00	10.08%
9.00	Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (inferior)	ML	84.20	L 109.00	L 9,177.80			84.20	L 9,177.80	84.20	L 9,177.80	100.00%
10.00	Solera 15X15 cm, 4#3 Y #2 @ 15 cm Concreto 1:2:2, (cargador o intermedia)	ML	33.90	L 113.00	L 3,819.40							
11.00	Batiente de 0.35x0.05 4#3 y #2 @ 25 cm	ML	7.26	L 170.00	L 1,234.20							
12.00	Tallados de elementos estructurales de 0.20 cm	ML	205.55	L 60.00	L 12,513.00							
	TOTAL				L 31,952.45				L 9,702.80		L 9,702.80	30.37%
PARED												
13.00	Pared de bloque sisada #6" 1#3 @ 5 hiladas	m²	86.03	L 200.00	L 17,206.00			19.74	L 3,948.00	19.74	L 3,948.00	22.95%
	TOTAL				L 17,206.00				L 3,948.00		L 3,948.00	22.95%
TECHO DE CANALETA Y LAMINA DE ALUZINC												
14.00	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc calibre 26 legitima	m²	94.00	L 120.00	L 11,280.00							
	TOTAL				L 11,280.00							
PISOS												
15.00	Relleno con material del sitio	m³	15.02	L 60.00	L 901.20							
16.00	Piso de concreto simple 5 cm de espesor	m²	77.36	L 87.73	L 6,786.79							
	TOTAL				L 7,687.99							
SUB-TOTAL CAFETERIA					L79,516.43				L 22,340.79		L 22,340.79	28.10%



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE




ALCALDE MUNICIPAL

Descripción: Construcción Cafeteria Centro Basico Alvarez Contreras
 Ejecutor: Isael Antonio Sanchez Lopez
 Monto de Contrato: L. 79,516.43

Aldea: N/A
 Fecha Contrato: 22 de Marzo del 2019
 Bo/Colección: Barrio San Francisco

Departamento: Choluteca
 Municipio: Santa Ana de Yusguare
 Periodo del: 25 de Marzo al 08 de Abril del 2019

ESTIMACIÓN # 01 POR MANO DE OBRA

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	Cantidad	TOTAL L.	
GRAN TOTAL					L. 79,516.43				22,340.79		22,340.79	28.10%

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a la ejecución de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar si ejecutar para lo cual firmo y sello.

CONTRATISTA

 Firma: Isael Antonio Sanchez Lopez
 Nombre: Isael Antonio Sanchez Lopez

 Fecha: 08/04/19

INGENIERO SUPERVISOR

 Firma: [Signature]
 Nombre: Ing. Eymar Arany Rivera Arce
 Fecha: 08/04/2019

COORDINADOR MANCOMUNIDAD

 Firma: [Signature]
 Nombre: [Signature]
 Fecha: 08/04/2019

ALCALDE MUNICIPAL

 Firma: [Signature]
 Nombre: Edson Turcios S.
 Fecha: 08/04/2019







Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



"MAMBOCAURE"



05/04/2019



05/04/2019


Ing. Eynar Rivera Araujo





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



08/04/2019



08/04/2019


Ing. Eyhar Rivera Araujo





ORDEN DE CAMBIO 01

"CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACIDADES ESPECIALES, SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTÉCA".

Tipo de Contrato	Proyecto	Avance Físico = 0	Departamento:	CHOLUTÉCA
Monto Aprobado	Fecha de Inicio	Avance Financiero = 0	Municipio:	SANTA ANA DE YUSGUARE
Monto Contratado = 20,000.00 - L. 6,426.85 = L. 13,573.14 + 65,943.29 = L. 79,516.43	Fecha de Finalización	Multa Diaria	Barrio:	San Francisco
Duración del Contrato		Monto Ampliación =		

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO CONTRATADO		ORDEN DE CAMBIO ANTERIOR (ACUMULADA)		NUEVA ORDEN DE CAMBIO		CONTRATADO - ORDENES DE CAMBIO ACUMULADAS	
				Cantidad	Total (LPS.)	Cantidad (LPS.)	Total (LPS.)	Cantidad	Total (LPS.)	Cantidad	Total (LPS.)
PRELIMINARES											
1	Trazado y Marcado	ML	23.00	27.50	633.50			27.50	1,304.10	27.50	1,304.10
	SUB-TOTAL PRELIMINARES				633.50				1,304.10		1,304.10
EXCAVACIÓN											
2	Excavación de material no calificado	M3	270.00	0.63	170.10			0.63	2,200.50	0.63	2,370.60
	SUB-TOTAL DE EXCAVACIÓN				170.10				2,200.50		2,370.60
CONCRETO											
3	Dado de concreto de 40 x 40 x 45 cm, 4#3 y #2 @20 cm	UNIDAD	125.00	6.00	750.00			6.00	750.00	6.00	750.00
4	Dado de concreto de 30 x 30 x 45 cm, con tubo 2-1/2" HG-CH 16	UNIDAD	140.00	3.00	420.00			3.00	420.00	3.00	420.00
5	Dado de concreto de 30 x 30 x 45 cm, 4#3 y #2 @20 cm	UNIDAD	94.99	2.00	189.98			2.00	189.98	2.00	189.98
	SUB-TOTAL DE CONCRETO				1,359.98				1,359.98		1,359.98
ESTRUCTURA											
6	Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ML	125.00	20.78	2,597.50			20.78	2,608.75	20.78	2,608.75
7	Solera 15x20 cm, 4#3 y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (interior)	ML	109.00	27.50	2,997.50			27.50	6,180.30	27.50	6,177.80
8	Solera 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm Concreto 1:2:2, (cargador o intermedia)	ML	113.00	7.50	847.50			7.50	2,971.90	7.50	3,819.40
	SUB-TOTAL DE ESTRUCTURA				4,442.50				11,760.95		18,203.45
PAREDES											
9	Pared de bloque simple # 4	M2	150.00	33.78	5,067.00			33.78	5,067.00	33.78	5,067.00
	SUB-TOTAL DE PAREDES				5,067.00				5,067.00		5,067.00
TECHO DE CANALETA Y LAMINA DE ALUMINIO											
10	Techo de canaleta de 2"x6" y lamina de aluminio calibre 26 legítima	M2	120.00	35.02	4,200.40			35.02	7,077.60	35.02	11,280.00
	SUB-TOTAL DE TECHO DE CANALETA Y LAMINA DE ALUMINIO				4,200.40				7,077.60		11,280.00
PISOS											
11	Piso de concreto simple 5 cm de espesor	M2	87.73	24.22	2,124.83			24.22	4,661.97	24.22	6,786.79
	SUB-TOTAL DE PISOS				2,124.83				4,661.97		6,786.79
NUEVAS ACTIVIDADES											
12	Demolición Jardinería de Ladrillo	Unid	600.00	1.00	600.00			1.00	600.00	1.00	600.00
13	Acero de material con carretilla	M3	60.00	35.00	2,100.00			35.00	2,100.00	35.00	2,100.00
14	Relleno y compactación con material del sitio	M3	60.00	15.02	900.20			15.02	900.20	15.02	900.20
15	Orimeración de Mampostería	M3	287.00	7.17	2,057.79			7.17	2,057.79	7.17	2,057.79
16	Dado de concreto de 40 x 40 x 50 cm, 4#3 y #2 @20 cm	UNIDAD	125.00	13.00	1,625.00			13.00	1,625.00	13.00	1,625.00
17	Dado de concreto de 40 x 40 x 50 cm, 4#3 y #2 @20 cm con tubo HG de 2-1/2"	UNIDAD	140.00	5.00	700.00			5.00	700.00	5.00	700.00
18	Pared de bloque esada # 6	M2	200.00	86.03	17,206.00			86.03	17,206.00	86.03	17,206.00
19	Tallados de elementos estructurales de 0.20 cm	ML	60.00	208.56	12,514.80			208.56	12,514.80	208.56	12,514.80
20	Balante de 0.35x0.05 4#3 y #2 @ 25 cm	ML	170.00	7.26	1,234.20			7.26	1,234.20	7.26	1,234.20
	SUB-TOTAL ACTIVIDADES NUEVAS				38,938.99				38,938.99		38,938.99
GRAN TOTAL CONTRATO ANTERIOR					20,000.00				65,943.29		15,573.34
GRAN TOTAL CONTRATO ANTERIOR + ACTUAL									65,943.29		29,516.63

CONTRATISTA:

INGENIERO SUPERVISOR

COORDINADOR MAMBOCAURE

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA: *Fael Antonio Sanchez Lopez*

NOMBRE: FAEL ANTONIO SANCHEZ LOPEZ

FECHA: 08/04/19

FIRMA: *[Firma]*

NOMBRE: ING. EYAN BARRERA

FECHA: 08/04/19

FIRMA: *[Firma]*

NOMBRE: ING. EYAN BARRERA

FECHA: 08/04/2019

FIRMA: *[Firma]*

NOMBRE: EDAS MAMBOCAURE

FECHA: 08/04/2019



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Construcción Cafetería Centro Basilio Alvarez Contreras
Ejecutor: Isael Antonio Sanchez Lopez
Monto de Contrato: L. 79,516.43

Aldea: N/A
Fecha Contrato: 22 de Marzo del 2019
Bo. Colonia: Barrio San Francisco

Departamento: Choluteca
Municipio: Santa Ana de Yusguare
Periodo del: 09 de Abril al 25 de Abril del 2019

ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA

ESTIMACIÓN #2 POR MANO DE OBRA													
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%	
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L		
CAFETERIA													
PRELIMINARES													
1.00	Demolición de Jaminera	Global	1.00	600.00	L. 600.00			-	1.00	L. 600.00	1.00	L. 600.00	100.00%
2.00	Acarreo de material con carretilla	m²	35.00	60.00	L. 2,100.00			-	20.00	L. 1,200.00	20.00	L. 1,200.00	57.14%
3.00	Trazado y marcado	ml	84.20	23.00	L. 1,936.60	84.20	1,936.60			84.20	L. 1,936.60	100.00%	
TOTAL					L. 4,636.60		1,936.60		L. 1,936.60		3,736.60	80.58%	
EXCAVACIÓN													
4.00	Excavación de material no calificado	m³	8.78	270.00	L. 2,370.00	8.78	2,370.00			8.78	L. 2,370.00	100.00%	
TOTAL					L. 2,370.00		L. 2,370.00		L. 6.00		L. 2,370.00	100.00%	
CIMENTACIÓN													
5.00	Cimentación de mamposteria	m³	7.17	L. 267.00	L. 2,057.79	7.17	2,057.79			7.17	L. 2,057.79	100.00%	
6.00	Dado de concreto de 40 x 40 x 50 cm, 4#3 y #2 @20 cm	unidad	13.00	L. 125.00	L. 1,625.00	13.00	1,625.00			13.00	L. 1,625.00	100.00%	
7.00	Dado de concreto de 40 x 40 x 50 cm, 4#3 y #2 @20 cm con tubo HG de 2-1/2"	unidad	5.00	L. 140.00	L. 700.00	5.00	700.00			5.00	L. 700.00	100.00%	
TOTAL					L. 4,382.79		L. 4,382.79		L. 6.00		L. 4,382.79	100.00%	
ESTRUCTURA													
8.00	Castillo de 15x15 cm, 4#3 y #2 @ 15 cm, concreto 1:2:2	ML	41.65	L.125.00	L. 5,206.25	4.29	L. 525.00	37.45	L. 4,681.25	41.65	L. 5,206.25	100.00%	
9.00	Solera 15X20 cm, 4#3 Y #2 @ 20 cm Concreto 1:2:2, (inferior)	ML	84.20	L.109.00	L. 9,177.80	84.20	L. 9,177.80			84.20	L. 9,177.80	100.00%	
10.00	Solera 15X15 cm, 4#3 Y #2 @ 15 cm Concreto 1:2:2, (cargador o intermedia)	ML	33.80	L. 113.00	L. 3,819.40			-	33.80	L. 3,819.40	33.80	L. 3,819.40	100.00%
11.00	Batiente de 0.35x0.05 4#3 y #2 @ 25 cm	ML	7.26	L. 170.00	L. 1,234.20			-					
12.00	Tallados de elementos estructurales de 0.20 cm	ML	208.58	L. 80.00	L. 12,514.80			-					
TOTAL					L. 31,952.45		L. 6,702.80		L. 8,500.65		L. 19,203.45	56.97%	
PARED													
13.00	Pared de bloque sisada #6" 1#3 @ 5 hiladas	m²	86.03	L. 200.00	L. 17,206.00	19.74	3,948.00	66.29	L. 13,258.00	86.03	L. 17,206.00	100.00%	
TOTAL					L. 17,206.00		L. 3,948.00		L. 13,258.00		L. 17,206.00	100.00%	
TECHO DE CANALETA Y LAMINA DE ALUZINO													
14.00	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzino calibre 26 legitima	m²	94.00	L. 120.00	L. 11,280.00			38.00	L. 4,560.00	38.00	L. 4,560.00	40.43%	
TOTAL					L. 11,280.00				L. 4,560.00		L. 4,560.00	40.43%	
PISOS													
15.00	Releño con material del sitio	m²	15.02	L. 60.00	L. 901.20			14.00	L. 840.00	14.00	L. 840.00	93.21%	
16.00	Piso de concreto simple 5 cm de espesor	m²	77.36	L. 87.73	L. 6,786.79								
TOTAL					L. 7,687.99				L. 840.00		L. 840.00	10.93%	
SUB-TOTAL CAFETERIA					L.79,516.43		L. 22,346.79		L. 29,998.65		L. 51,299.44	64.51%	



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Vista: _____
MUNICIPIO SUPLENTE

Descripción: Construcción Cafetería Centro Basico Alvarez Contreras
Ejecutor: Isael Antonio Sanchez Lopez
Monto de Contrato: L. 79.516.43

Aldea: NIA
Fecha Contrato: 22 de Marzo del 2019
Ba.Colonia: Barrio San Francisco

Departamento: Choluteca
Municipio: Santa Ana de Yuguare
Periodo del: 09 de Abril al 26 de Abril del 2019

ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA

ESTADÍSTICA DE FORTALEZAS DE CURSA												
No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	Cantidad	TOTAL L.	
		GRAN TOTAL		L. 79,516.43		22,340.79		28,958.85		51,299.44	84.51%	

En virtud que doy fe que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad, y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagas al ejecutor para lo cual firmo y sello:

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	22,340.79	28,958.85	51,299.44
Retención por Anticipo	1,000.00	1,000.00	2,000.00
Retención por I.S.R. (12.5%)			-
Retención por Calidad de Obra			-
Retención por Multa			-
Neto a Pagar	21,340.79	27,958.85	48,299.44

CONTRATISTA

Firma: Isael Antonio Sanchez Lopez
Nombre: Isael Antonio Sanchez Lopez

FECHA: 26/04/2019

INGENIERO SUPERVISOR

Firma: [Firma]
Nombre: Ing. Eymar Rivera Araujo

FECHA: 26/04/2019



ALCALDE MUNICIPAL

Firma: [Firma]
Nombre: Eymar Rivera Araujo

FECHA: 26/04/2019





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



26/04/2019



26/04/2019


Ing. Eynar Rivera Araujo





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



"MAMBOCAURE"



INTERIOR, 26/04/2019



ESTRUCTURA DE TECHO, 26/04/2019


Ing. Eynar Rivera Araujo





ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Rehabilitación Módulo de Baños Centro de Educación Básica Alvaro Contreras
Ejecutor: Teófilo Antonio Maldonado Beltrán
Monto de Contrato: L. 50,886.11

Aldea: N/A
Fecha Contrato: 04 de Marzo del 2019
Bo. Cobanía: Barrio San Francisco

Departamento: Choluteca
Municipio: Santa Ana de Yuguare
Periodo del: 23 de Marzo al 05 de Abril del 2019

ESTIMACIÓN # 03 POR MANO DE OBRA (FINAL)



No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%	
				P.U.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	Cantidad	TOTAL L.		
MODULO DE BAÑOS													
DESMONTAJES													
1.0	Desmontaje de puerta incluye contornamcos	unidad	6.00	117.00	L. 702.00	6.00	702.00			6.00	L. 702.00	100.00%	
2.0	Desmontaje de techo y estructura existente	m²	8.58	24.50	L. 210.21	8.58	210.21			8.58	L. 210.21	100.00%	
3.0	Desmontaje de inodoros	unidad	6.00	177.00	L. 1,062.00	6.00	1,062.00			6.00	L. 1,062.00	100.00%	
4.0	Desmontaje de balcones	m²	1.80	78.00	L. 140.40	1.80	140.40			1.80	L. 140.40	100.00%	
	TOTAL				L. 2,114.61		L. 2,114.61				2,114.61	100.00%	
PAREDES													
5.0	Pintura en paredes	m²	100.55	34.00	L. 3,418.70	100.55	L. 3,418.70			100.55	L. 3,418.70	100.00%	
	TOTAL				L. 3,418.70		L. 3,418.70				L. 3,418.70	100.00%	
TECHO													
6.0	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc legitimo	m²	20.40	L. 148.00	L. 3,019.20	20.40	L. 3,019.20			20.40	L. 3,019.20	100.00%	
7.0	Entablicado	ml	25.60	L. 54.00	L. 1,382.40	25.60	L. 1,382.40			25.60	L. 1,382.40	100.00%	
	TOTAL				L. 4,401.60		L. 4,401.60				L. 4,401.60	100.00%	
PUERTAS Y VENTANAS													
8.00	Puerta de lamina troquelada	unidad	7.00	L.1,350.00	L. 9,450.00			7.00	L. 9,450.00	7.00	L. 9,450.00	100.00%	
9.00	Balcones de tubo industrial de 1-1/2"x1-1/2"x1/8"	m²	1.96	L. 272.00	L. 538.56			1.96	L. 538.56	1.96	L. 538.56	100.00%	
	TOTAL				L. 9,988.56				L. 9,988.56		L. 9,988.56	100.00%	
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS													
10.00	Excavación de material no calificado	m³	2.28	L. 274.00	L. 624.72	2.28	L. 624.72			2.28	L. 624.72	100.00%	
11.00	instalación de inodoros	unidad	6.00	L. 742.00	L. 4,452.00	6.01	L. 6.00	5.99	L. 4,446.00	6.00	L. 4,452.00	100.00%	
12.00	instalación tubería PVC de 1/2"	ml	12.00	L. 6.00	L. 72.00	12.00	L. 72.00			12.00	L. 72.00	100.00%	
13.00	instalación tubería de drenaje PVC de 4"	ml	30.00	L. 18.00	L. 570.00	30.00	L. 570.00			30.00	L. 570.00	100.00%	
14.00	Cajas de registro	unidad	2.00	L.1,020.00	L. 2,040.00	2.00	L. 2,040.00			2.00	L. 2,040.00	100.00%	
	TOTAL				L. 7,758.72		L. 7,758.72		L. 4,446.00		L. 7,758.72	100.00%	
TOTAL-MODULO DE BAÑOS						L37,892.19		L. 13,247.83		L. 14,434.56		L. 14,274.93	81.87%



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Rehabilitación Módulo de Baños Centro de Educación Básica Alvaro Contreras

Ejecutor: Teófilo Antonio Maldonado Beltrand

Monto de Contrato: L. 55,808.11

Aídea: N/A

Fecha Contrato: 04 de Marzo del 2019

Su/Colección: Santa Ana de Yusguare

ESTIMACIÓN # 03 POR MANO DE OBRA (FINAL)

Departamento: Choluteca

Municipio: Santa Ana de Yusguare


Período del: 23 de Marzo al 05 de Abril del 2019



No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	Cantidad	TOTAL L.	
FOSA SEPTICA												
PRELIMINARES-CIMENTACION												
15.00	Trazado y marcado	m	12.80	L. 20.00	L. 256.00	12.80	256.00			12.80	L. 256.00	100.00%
18.00	Excavación de material no calificado	m³	33.70	L. 274.00	L. 9,233.80	33.70	9,233.80			33.70	L. 9,233.80	100.00%
17.00	Cimentación de mampostería	m³	2.56	L. 287.00	L. 734.72	2.56	734.72			2.56	L. 734.72	100.00%
18.00	Vaciado de material granular	m³	4.57	L. 130.00	L. 594.10	4.57	594.10			4.57	L. 594.10	100.00%
TOTAL					L. 10,818.62		10,818.62				L. 10,818.62	100.00%
ESTRUCTURAS												
19.00	Solera inferior de 20x20, 4#3, #2@15 concreto 1:2:2	m	12.80	L. 130.00	L. 1,664.00	12.80	1,664.00			12.80	L. 1,664.00	100.00%
2.00	Solera superior de 15x20, 4#3, #2@20 concreto 1:2:2	m	12.80	L. 109.00	L. 1,395.20	12.80	1,395.20			12.80	L. 1,395.20	100.00%
21.00	Columna 20x20, 4#3 y #2 @ 15 concreto 1:2:2 C-1	m	24.18	L. 190.00	L. 4,594.20	24.18	4,594.20			24.18	L. 4,594.20	100.00%
22.00	Encofrado de losa superior	m²	9.00	L. 136.00	L. 1,224.00	9.00	1,224.00			9.00	L. 1,224.00	100.00%
23.00	Losa de concreto reforzado #4 @ 20 cm y #4 @ 30 cm	m²	11.07	L. 230.00	L. 2,546.10	11.07	2,546.10			11.07	L. 2,546.10	100.00%
24.00	Tapadera 0.60x0.60 m. #3 a.s.	unidad	1.00	L. 0.00	L. 0.00							
TOTAL					L. 11,423.50		11,423.50				L. 11,423.50	100.00%
PARED												
25.00	Pared de bloque 6" relleno, 1#3 @ 20 cm	m²	19.80	L. 191.00	L. 3,781.80	19.80	3,781.80			19.80	L. 3,781.80	100.00%
26.00	Repele y pulido	m²	19.80	L. 100.00	L. 1,980.00	19.80	1,980.00			19.80	L. 1,980.00	100.00%
TOTAL					L. 5,761.80		5,761.80				L. 5,761.80	100.00%
TOTAL- FOSA SEPTICA					L.26,003.82		L. 26,003.82		L. 14,434.56		L. 26,003.82	100.00%
GRAN TOTAL					L. 55,808.11		41,251.55		14,434.56		55,808.11	100.00%

En virtud que hoy se le que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma sujeta y con buena calidad, y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor por lo cual firmo y sello.

CONTRATISTA



Nombre: Teófilo Antonio Maldonado Beltrand

FECHA: 05-04-2019

INGENIERO SUPERVISOR



Nombre: Ing. Eusebio Rivera Arango

FECHA: 05/04/2019

ALCALDE MUNICIPAL



Nombre: Eusebio Rivera Arango

FECHA: 05/04/2019







Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



"MAMBOCAURE"



05/04/2019



05/04/2019

Ing. Eynar Rivera Araujo



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Rehabilitación Módulo de Baños Centro de Educación Básica Alvaro Contreras
Ejecutor: Teófilo Antonio Maldonado Beltrán
Monto de Contrato: L. 95,886.11

Aídea: N/A
Fecha Contrato: 04 de Marzo del 2019
Bo. Poblado: Barrio San Francisco

Departamento: Choluteca
Municipio: Santa Ana de Yuguare
Periodo del: 23 de Marzo al 05 de Abril del 2019

ESTIMACIÓN # 63 POR MANO DE OBRA (FINAL)

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
MODULO DE BAÑOS												
DESMONTAJES												
1.0	Desmontaje de puerta incluye contramarcos	unidad	6.00	117.00	L. 702.00	6.00	702.00			6.00	L. 702.00	100.00%
2.0	Desmontaje de techo y estructura existente	m²	8.58	24.50	L. 210.21	8.58	210.21			8.58	L. 210.21	100.00%
3.0	Desmontaje de inodoros	unidad	6.00	177.00	L. 1,062.00	6.00	1,062.00			6.00	L. 1,062.00	100.00%
4.0	Desmontaje de balcones	m²	1.80	78.00	L. 140.40	1.80	140.40			1.80	L. 140.40	100.00%
TOTAL						L. 2,114.61		L. 2,114.61			2,114.61	100.00%
PAREDES												
5.0	Pintura en paredes	m²	100.55	34.00	L. 3,418.70	100.55	L. 3,418.70			100.55	L. 3,418.70	100.00%
TOTAL						L. 3,418.70		L. 3,418.70			L. 3,418.70	100.00%
TECHO												
6.0	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc legitimo	m²	20.40	L. 148.00	L. 3,019.20	20.40	L. 3,019.20			20.40	L. 3,019.20	100.00%
7.0	Entablicado	ml	25.60	L. 54.00	L. 1,382.40	25.60	L. 1,382.40			25.60	L. 1,382.40	100.00%
TOTAL						L. 4,401.60		L. 4,401.60			L. 4,401.60	100.00%
PUERTAS Y VENTANAS												
8.00	Puerta de lamina troquelada	unidad	7.00	L.1,360.00	L. 9,450.00			7.00	L. 9,450.00	7.00	L. 9,450.00	100.00%
9.00	Balcones de tubo industrial de 1-1/2"x1-1/2"x1/8"	m²	1.98	L. 272.00	L. 538.56			1.98	L. 538.56	1.98	L. 538.56	100.00%
TOTAL						L. 9,988.56				L. 9,988.56	L. 9,988.56	100.00%
INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS												
10.00	Excavación de material no calificado	m²	2.28	L. 274.00	L. 624.72	2.28	L. 624.72			2.28	L. 624.72	100.00%
11.00	Instalación de inodoros	unidad	6.00	L. 742.00	L. 4,452.00	6.01	L. 6.00	5.99	L. 4,446.00	6.00	L. 4,452.00	100.00%
12.00	Instalación tubería PVC de 1/2"	ml	12.00	L. 6.00	L. 72.00	12.00	L. 72.00			12.00	L. 72.00	100.00%
13.00	Instalación tubería de drenaje PVC de 4"	ml	30.00	L. 18.00	L. 570.00	30.00	L. 570.00			30.00	L. 570.00	100.00%
14.00	Cajas de registro	unidad	2.00	L.1,020.00	L. 2,040.00	2.00	L. 2,040.00			2.00	L. 2,040.00	100.00%
TOTAL						L. 7,758.72		L. 3,312.72		L. 4,446.00	L. 7,758.72	100.00%
TOTAL-MODULO DE BAÑOS						L27,892.19		L. 13,347.83		L.14,434.56	L. 14,274.93	81.87%



Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure



"MAMBOCAURE"



Urinarios y cerámica



Cerámica

Ing. Eynar Rivera Araujo



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Mejoramiento Centro de Educación Básica Alvaro Contreras
Ejecutor: Carlos Roberto Erazo Mejía
Monto de Contrato: L. 222,887.00

Aldea: N/A
Fecha Contrato: 05 de Marzo del 2019
Bo. Colonia: Barrio San Francisco

Departamento: Choluteca
Municipio: Santa Ana de Yusguare
Periodo del: 23 de Marzo al 05 de Abril de 2019

ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%	
				P.U	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L		
ESCENARIO													
DEMOLICIONES													
1.00	Demolición de gradas existentes	m²	25.00	400.00	L. 10,000.00	25.00	L. 10,000.00			25.00	L. 10,000.00	100.00%	
2.00	Demolición para construcción de gradas de acceso a escenario	m²	3.29	400.00	L. 1,316.00			3.29	L. 1,316.00	3.29	L. 1,316.00	100.00%	
3.00	Acarreo de material con carretilla	m³	28.29	50.00	L. 1,414.50								
4.00	Acarreo de material de desperdicio con volqueta	m³	28.29	160.00	L. 4,526.40								
	TOTAL				L. 17,256.90		L. 10,000.00		L. 1,316.00		L. 10,000.00	57.95%	
PRELIMINARES-CIMENTACIÓN													
5.00	Trazado y marcado	ml	16.71	20.00	L. 334.20	16.71	334.20			16.71	L. 334.20	100.00%	
6.00	Excavación de material no calificado	m³	3.37	200.00	L. 674.00	3.37	674.00			3.37	L. 674.00	100.00%	
7.00	Zapata corrida 0.40 m, e= 20 cm, 3#3 y #3 @ 30 cm	ml	16.71	100.00	L. 1,671.00	16.71	1,671.00			16.71	L. 1,671.00	100.00%	
	TOTAL				L. 2,679.20		L. 2,679.20				L. 2,679.20	100.00%	
ESTRUCTURAS													
8.00	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15, concreto 1:2:2 C-1	ml	10.80	130.00	L. 1,404.00	10.80	L. 1,404.00			10.80	L. 1,404.00	100.00%	
9.00	Solera inferior de 15x15, 4#3, #2 @ 20 concreto 1:2:2	ml	16.00	100.00	L. 1,600.00	16.00	L. 1,600.00			16.00	L. 1,600.00	100.00%	
	TOTAL				L. 3,004.00		L. 3,004.00				L. 3,004.00	100.00%	
PAREDES ARMADAS													
10.00	Pared de bloque 8", 1#3 @ 3 hiladas horizontal #3 @ agujero, mortero 1:4	m²	20.00	190.00	L. 3,800.00	20.00	L. 3,800.00			20.00	L. 3,800.00	100.00%	
11.00	Pared de bloque 6" simple, pared posterior	m²	13.50	150.00	L. 2,025.00			13.50	L. 2,025.00	13.50	L. 2,025.00	100.00%	
12.00	Repello y pulido	m²	36.54	100.00	L. 3,654.00								
13.00	Resane de paredes en general	m²	56.68	50.00	L. 2,834.00			40.00	L. 2,000.00	40.00	L. 2,000.00	70.57%	
14.00	Aplicación de sellador	m²	36.54	10.00	L. 365.40								
15.00	Pintura en paredes	m²	154.30	33.00	L. 5,091.90								
	TOTAL				L. 17,770.30		L. 3,800.00		L. 4,025.00		L. 7,825.00	44.03%	
PISOS-GRADAS													
16.00	Relleno con material del sitio, anexo de escenario y gradas	m³	69.01	120.00	L. 8,281.20			69.01	L. 8,281.20	69.01	L. 8,281.20	100.00%	
17.00	Acarreo de material con carretilla	m³	69.01	50.00	L. 3,450.50								
18.00	Firme de concreto 1:2:2, e=7.00 cm, refuerzo #2 @ 30 cm A.S.	m²	34.16	150.00	L. 5,124.00			34.16	L. 5,124.00	34.16	L. 5,124.00	100.00%	
19.00	Gradas de acceso frontal al escenario	ml	15.75	600.00	L. 9,450.00								
20.00	Gradas de acceso lateral al escenario	ml	3.50	600.00	L. 2,100.00			3.50	L. 2,100.00	3.50	L. 2,100.00	100.00%	
	TOTAL				L. 26,406.70				L. 15,505.20		L. 15,505.20	64.08%	
SUB-TOTAL DE ESCENARIO						L. 85,116.10		19,483.20		L. 20,846.20		L. 39,013.40	68.46%



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



Descripción: Mejoramiento Centro de Educación Básica Alvaro Contreras
Ejecutor: Carlos Roberto Erazo Mejía
Monto de Contrato: L. 222,887.00

Aldea: N/A
Fecha Contrato: 05 de Marzo del 2019
Bo/Colonia: Barrio San Francisco

Departamento: Choluteca
Municipio: Santa Ana de Yusguare
Periodo del: 23 de Marzo al 05 de Abril de 2019

ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	Cantidad	TOTAL L.	
VESTIDORES												
PRELIMINARES-CIMENTACION												
21.00	Trazado y marcado	ml	16.71	20.00	L. 374.20	16.71	374.20			16.71	L. 374.20	100.00%
22.00	Excavación de material no calificado	m³	3.89	200.00	L. 738.00	3.89	738.00			3.89	L. 738.00	100.00%
23.00	Dados de concreto 40x40x40 cm 4#3 y #2@20 cm	unidad	6.00	100.00	L. 600.00	6.00	600.00			6.00	L. 600.00	100.00%
	TOTAL				L. 1,712.20		L. 1,712.20				L. 1,712.20	100.00%
ESTRUCTURAS												
24.00	Solera inferior de 15x15, 4#3, #2@20 concreto 1:2:2	ml	17.60	100.00	L. 1,760.00	17.60	1,760.00			17.60	L. 1,760.00	100.00%
25.00	Solera superior de 15x15, 4#3, #2@20 concreto 1:2:2	ml	20.02	100.00	L. 2,002.00			20.02	L. 2,002.00	20.02	L. 2,002.00	100.00%
26.00	Jamba 10x15, 2#3 Y #2 @ 20 cm, Concreto 1:2:2	ml	4.20	90.00	L. 378.00			4.20	L. 378.00	4.20	L. 378.00	100.00%
27.00	Cargador 15x17, 3#3 Y #2 @ 20 cm, Concreto 1:2:2	ml	2.00	100.00	L. 200.00			2.00	L. 200.00	2.00	L. 200.00	100.00%
28.00	Castillo 15x15, 4#3 y #2 @ 15,concreto 1:2:2 C-1	ml	24.18	130.00	L. 3,143.40	7.25	942.50	16.93	L. 2,200.90	24.16	L. 3,143.40	100.00%
	TOTAL				L. 7,483.40		L. 2,702.80		L. 4,780.60		L. 7,483.40	100.00%
PAREDES SIMPLE												
29.00	Pared de bloque 6" simple	m²	33.30	150.00	L. 4,995.00	9.99	1,498.50	23.31	L. 3,496.50	33.30	L. 4,995.00	100.00%
30.00	Repello y pulido	m²	66.60	100.00	L. 6,660.00			26.64	L. 2,664.00	26.64	L. 2,664.00	40.00%
31.00	Aplicación de sellador	m²	66.60	10.00	L. 666.00							
32.00	Pintura en paredes	m²	66.60	33.00	L. 2,197.80							
	TOTAL				L. 14,518.80		L. 1,498.50		L. 6,160.50		L. 7,669.00	52.76%
PISOS												
33.00	Relleno con material del sitio	m²	1.45	33.00	L. 47.85							
34.00	Piso de concreto 1:2:2, a=5.00 cm	m²	14.50	80.00	L. 1,160.00							
35.00	Piso de cerámica	m²	15.50	120.00	L. 1,860.00							
36.00	Molduras	m³	24.27	110.00	L. 2,669.70							
	TOTAL				L. 6,737.55							
TECHO CANALETA Y LAMINA DE ALUZINC												
37.00	Techo de canaleta de 2"x4" y lamina de aluzinc legitimo	m²	22.77	130.00	L. 2,960.10			22.77	L. 2,960.10	22.77	L. 2,960.10	100.00%
38.00	Entabicado	m²	14.54	45.55	L. 662.30			14.54	L. 662.30	14.54	L. 662.30	100.00%
	TOTAL				L. 3,622.40				L. 3,622.40		L. 3,622.40	100.00%
PUERTAS Y VENTAS												
39.00	Puerta de lamina troquelada	unidad	2.00	1,875.00	L. 3,750.00							
	TOTAL				L. 3,750.00							
SUB-TOTAL VESTIDORES					L. 36,824.36		5,913.20		L. 14,563.80		L. 20,477.00	55.61%



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA DE YUSGUARE
MANCOMUNIDAD DE MAMBOCAURE



[Signature]
Vicepresidente Municipal

Descripción: Mejoramiento Centro de Educación Básica Alvaro Contreras
Ejecutor: Carlos Roberto Erazo Mejía
Monto de Contrato: L. 222,887.00

Aldea: N/A
Fecha Contrato: 05 de Marzo del 2019
Bo. Colonia: Barrio San Francisco

Departamento: Chokuleca
Municipio: Santa Ana de Yusguare
Periodo del: 23 de Marzo al 05 de Abril de 2019

ESTIMACIÓN # 02 POR MANO DE OBRA

No.	ACTIVIDAD DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRESUPUESTADO		EJECUTADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO ACTUAL		%
				P.U.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	CANT.	TOTAL L	Cantidad	TOTAL L	
PISO DE CONCRETO REFORZADO												
PRELIMINARES-CIMENTACION												
40.00	Trazado y marcado	ml	106.63	20.00	L. 2,132.60							
41.00	Excavación de material no calificado	m³	5.77	200.00	L. 1,154.00							
42.00	Dientes de mampostería 0.25x0.30 m	m³	6.77	300.00	L. 2,031.00							
	TOTAL				L. 5,317.60							-
PISO												
43.00	Relleno compactado con material selecto	m³	40.33	120.00	L. 4,839.60							
44.00	Acarreo de material con carretilla	m³	40.33	50.00	L. 2,016.50							
45.00	Firme de concreto 1:2:2, e=8.00 cm, refuerzo #2 @30 cm A.S.	m³	854.83	180.00	L. 104,772.80							
	TOTAL				L. 111,628.90							
	SUB-TOTAL PISO				L. 116,946.50							
	GRAN TOTAL				L. 222,887.80		25,396.92		36,410.80		59,498.40	26.69%

En virtud de lo que las cantidades en la presente estimación corresponden a lo ejecutado de forma exacta y con buena calidad. Y en cumplimiento de las condiciones generales de mi contrato, solicito se proceda a pagar al ejecutor para lo cual firmo y sello.

DESCRIPCION	RETENCION ANTERIOR	RETENCION ACTUAL	RETENCION ACUMULADA
MONTO ESTIMADO	25,396.92	36,410.00	61,806.92
Retención por Anticipo	3,609.54	5,311.50	9,121.04
Retención por I.S.R. (12.5%)			-
Retención por Calidad de Obra			-
Retención por Multa			-
Neto a Pagar	21,787.38	30,098.50	51,885.88

CONTRATISTA

Firma: *[Signature]*
Nombre: Carlos Roberto Erazo Mejía

FECHA: 05/04/2019

INGENIERO SUPERVISOR

Firma: *[Signature]*
Nombre: Einar Rivera Araujo

FECHA: 05/04/2019



COORDINADOR MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
Nombre: Ing. Erazo Mejía

FECHA: 05/04/2019



ALCALDE MUNICIPAL

Firma: *[Signature]*
Nombre: Erazo Mejía

FECHA: 05/04/2019






Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure


"MAMBOCAURE"



Vestidores

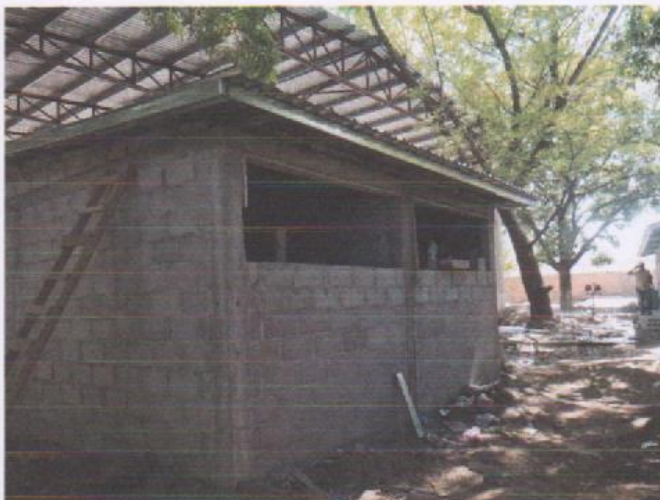

Vestidores, fachada posterior


Ing. Eyrar Rivera Araujo





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



ESCENARIO



Gradas laterales


Ing. Eymar Rivera Araujo





Mancomunidad de Municipios de La Botija y El Guanacaure




"MAMBOCAURE"



Repello interior, vestidores



Repello interior, vestidores




Ing. Eynar Rivera Araujo




**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAMPO DE FUTBOL
DEL BARRIO LOS MANGOS.**



**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAMPO DE FUTBOL
DEL BARRIO LOS MANGOS.**

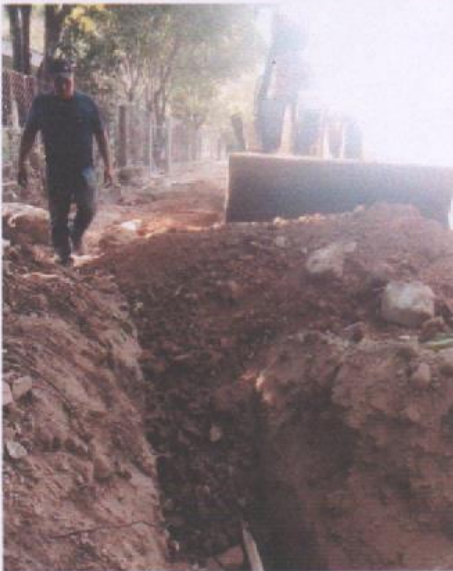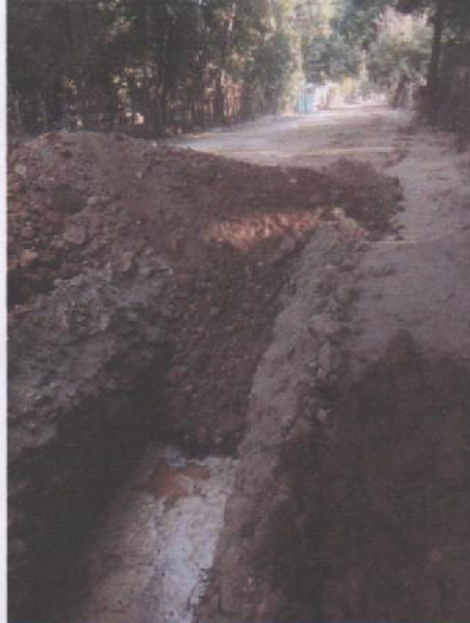

23.40 horas de Retro-excavadora para el Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en el Campo de Fútbol del Barrio Los Mangos.

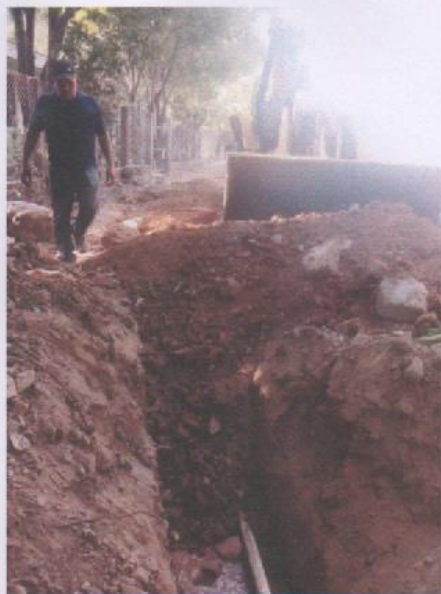

**CONSTRUCCION DE TAPADERA DE POZO DE ALCCANTARILLADO
SANITARIO EN EL PAVIMENTO DEL BARRIO TIERRAS MORENAS.**



**CONSTRUCCION DE DOS REDUCTORES DE VELOCIDAD (BORDAS) EN EL
BARRIO SAN FRANCISCO.**



**14.70 HORAS MAQUINAS DE RETRO-EXCAVADORA Y 16 VIAJES DE
DESPERDICIO EN EL MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACION
BASICA ALVARO CONTRERAS (VESTIDORES, ESCENARIO Y PISO DE
CONCRETO).**

