


Municipio de Lepaera Departamento de Lempira

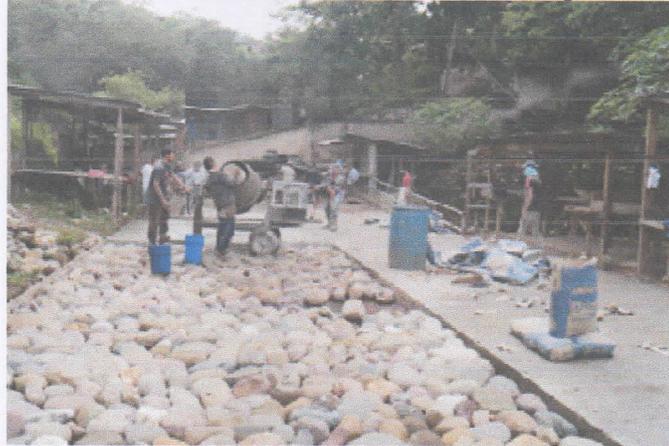

NOMBRE DEL PROYECTO:

Pavimentación de Calles de inician en Gradas Antiguas frente a propiedad de Ítalo Castañeda a-Salida a Tejeras , Lepaera en el Dpto. de Lempira

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Barrio San Juan de Lepaera, Lempira.

ORGANIZACIÓN PROPONENTE Y RESPONSABLE:

La Municipalidad de Lepaera, Lempira

Email: lepaera2006@yahoo.com



Maria Rosandra Lara
Jefe de la Unidad Técnica
de Gestión Municipal

Lepaera Lempira

Octubre de 2019.

Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Pavimentación de Calles que inician en gradas antiguas frente a propiedad de Italo Castañeda a salida de Tejeras, Lepaera dpto. de Lempira.

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social (componente Vial)

3.- Nombre del Proyecto

Pavimentación de Calles que inician en gradas antiguas frente a propiedad de Italo Castañeda a salida de Tejeras, Lepaera dpto. de Lempira.

4.- Ubicación del Proyecto.

El municipio de Lepaera se encuentra ubicado al norte del departamento de Lempira en el occidente de Honduras C. A. El proyecto se pretende realizar en el Barrio San Juan específicamente de calle que inicia en gradas antiguas frente a Italo Castañeda y culmina a salida a Tejeras.

5.- Propósito

Mejorar las condiciones del municipio a través de la pavimentación de **112** metros lineales de calle y **1500** mtrs cuadrados de calle que inicia en gradas antiguas frente a Ítalo Castañeda y culmina a salida a Tejeras.

en el Barrio San Juan del municipio Lepaera, dpto. De Lempira.

6.- Descripción del Proyecto.

Este proyecto consiste en la construcción de **112** Mtrs Lineales de Calle, **1500** mtrs cuadrados de pavimento desarrollado de la siguiente manera : construcción de **0.60** centímetros de ancho ,construcción de banca de media luna de cemento ,fornada de cemento, el piso y el

asiento de 0.50 metros de Largo , siguientes : 1.60 x 1.60 metros cuadrados., calle que inicia en gradas antiguas frente a Ítalo Castañeda y culmina a salida a Tejeras. en barrio San Juan, Barrio este proyecto se necesita porque en invierno se dificulta el tránsito para los pobladores ya que podrán tener una mejor comunicación y acceso en el municipio es necesario mencionar que ya cuenta con un buen porcentaje de calles pavimentadas en este año 2019. Y ya se tiene BV de la Corporación Municipal para darle seguimiento en el 2020 a este tipo de proyecto.

En la actualidad urge la pavimentación de estas carreteras para poder restablecer la comunicación - con la ejecución de este proyecto se estarán beneficiando unos 40 **familias directamente y 1,000 habitantes** que indirectamente usan diariamente estas vías de comunicación para el traslado de sus bienes de consumo , La modalidad para Construcción de este tramo será con mano de obra comunitaria y así beneficiar a **25 Familias** por un espacio de 2.5 meses o según sea la duración del proyecto en mención., ya que cada ruta tiene su duración respectiva eso depende la cantidad de metros a ejecutar y así mismo se realizan los pagos

7. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto.

La mayoría de municipios de lempira enfrentan problemas de infraestructura de las calles municipales debido a las fuertes tormentas, y los barrios y colonias son los que sufren las consecuencias debido a que no puede haber comunicación, el invierno copioso causo severo daños a red vial de la zona urbana el cual destruye dicha calles.

Con esta modalidad **Pavimentación de calles** buscamos mejorar la comunicación del Barrio el centro, Barrio delicias ,San Juan y a los diferentes barrio que tiene el municipio de Lepaera lempira el cual incorporaremos a la población a las actividades de mejora y rehabilitación de sus vías de acceso además generar empleo temporal para aquellas familias que se encuentran en rango de pobreza.

Para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto, que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser Recolección de información para llevar a cabo el presente proyecto, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede a informar a la población de Lepaera como ser: beneficiarios directos

para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras preliminares. Pero el ejecutor directo es la Municipalidad que es quien contrata el personal especializado para este tipo de proyecto.

8. Impacto Ambiental.

El presente proyecto por ser un proyecto de infraestructura por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección de la zona donde se ejecutará el proyecto de pavimentación para verificar que no sean destruida las áreas verdes esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la pavimentación no se haga en una zona de riesgo sea donde haya viviendas que puedan quedar a la deriva o donde ya está el proyecto de alcantarillado. Ya que si no existe un alcantarillado Sanitario no es posible ejecutar el proyecto.

Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente ya se cuenta con la supervisión directa del Ing. de la Mancomunidad Puca en donde se define claramente que no hay problemas con alguna propiedad ya que la ruta a pavimentar son calles establecidas y bien definidas por el dpto. De catastro. Y a la vez ya se cuenta con los permisos respectivos, en caso de que fuese necesario.

9. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo,

Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara,
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Francisco Lara.

Gerente de la Mancomunidad Puca

Cel. 9451-4754

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: FHIS, SOPTRAVI Municipalidad, Fondo Vial y FONDO CAFETERO NACIONAL.

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo el principal financiador es FHIS y la Municipalidad, ya sea con fondos propios o fondos provenientes de las transferencias ya que cuenta con su propia maquinaria, a la vez brinda su aporte El Fondo Cafetero, el comité de desarrollo Comunal **CODECO** y beneficiarios apoyan con el cuneteo y con la alimentación de las personas que operan la maquinaria a utilizar.

10. Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal, se realizaron las respectivas cotizaciones., y luego de su análisis se procedió a la elección de la cotización mas baja.

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal con la presencia de representantes de la comisión Ciudadana de Transparencia, que siempre están presentes en cualquier reunión que se realiza en la municipalidad.

Estado del Proyecto actual.

En este momento el proyecto ya está en proceso de ejecución en un **52.66%** en su aporte financiero en lo que va del mes de octubre, un **60%** ejecución física. Es necesario mencionar que falta pavimentar varias calles, pero por falta del sistema de Alcantarillado por el momento no se realizó conforme a lo aprobado.

Costo de finalización Proyecto

Costo Total: **Lps. 104,451.00**

Vigente: Lps. 104,451.00

Devengado; Lps. 55,000.00

Ejecutado: L. **55,000.00**

Pendiente a ejecutar: Lps. 49,451.00

Fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2019

11. Ejecución Del Proyecto

12. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 3 meses, por ser un proyecto que no es muy complicado realizarse en el proyecto y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la **Municipalidad**. Podemos mencionar que hasta donde en la ruta ejecutada ha sido muy buen avance, es decir que el proyecto está acorde a lo planteado en el contrato mpal , lógicamente existen variaciones, pero no de mucha relevancia, el proyecto en mención se planifico a ser concluido en el segundo semestre del 2019. Y se está logrando y Lógicamente el presupuesto ya estaba aprobado. al inicio del proyecto no se pudo entregar el informe a la fecha porque los materiales se pagan en las ferreterías al crédito y hasta que es pagado el último fondo se puede dar un reporte claro de lo invertido.

Variación en el costo total del Proyecto.

Las variaciones han existido como en todo proyecto, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia no es muy grande ya que se tenía que ejecutar **Lps.104,451.00** según lo asignado y se ejecutó **:Lps.55,000.00** quedando pendiente de ejecutar **Lps: 49,451.00** Este es de acuerdo al avance el cuales muy significativo. Pero los pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal. Ya que es un proyecto que continúa. Y el costo es muy elevado.

Monto Solicitado:

Total del proyecto Pavimentación de calle que inicia en gradas antiguas frente a Ítalo Castañeda y culmina a salida a Tejeras.

: Costo Total: **Lps. 104,451.00**

Vigente: **Lps. 104,451.00**

Devengado; Lps. 55,000.00
Ejecutado: L. **55,000.00**
Pendiente a ejecutar: Lps. 49,451.00

Fecha de finalización proyectada
Diciembre de 2019

13. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Existieron algunas variaciones en cuanto a la parte técnica, como ser en el ancho de los bordes pero fueron resueltas de manera satisfactoria entre el maestro de obra e ing. a cargo del proyecto, en cuanto a la duración hubo variaciones ya que la exigencia era que se debía terminar unos tramos en un periodo 4 meses , pero si se cumplió en 1 tramo por ser de menor magnitud, podemos decir que si se cumplió en periodo todas las actividades relacionadas con el proyecto, algo que afecto un poco fueron las condiciones climáticas de la zona.

El proyecto lleva un avance que es de mucha satisfacción para la municipalidad como para los habitantes del casco urbano, y es necesario mencionar que la municipalidad ha cumplido con los pagos hasta la etapa en que el proyecto se encuentra actualmente. , porque aunque bien es cierto de la lentitud en los pagos estos no se retrasan mucho porque de ello depende la continuidad del proyecto.


Razones de los cambios antes mencionados.




Como mencione anteriormente hubo algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar que afecto en el sentido que al haber lluvia se detienen los proyectos., pero fue en un tiempo corto. Ya que no se puede posponer mucho tiempo. Hubo variación también en cuanto al pago de la obra física ya que esta se paga conforme ingresan las transferencias a la municipalidad.



ANEXOS

-- Fotografías Proyecto Pavimentación de Calles en Barrio desde calle en gradas antiguas, frente a propiedad de Ítalo Castañeda en Barrio San Juan.

Informe Fotográfico

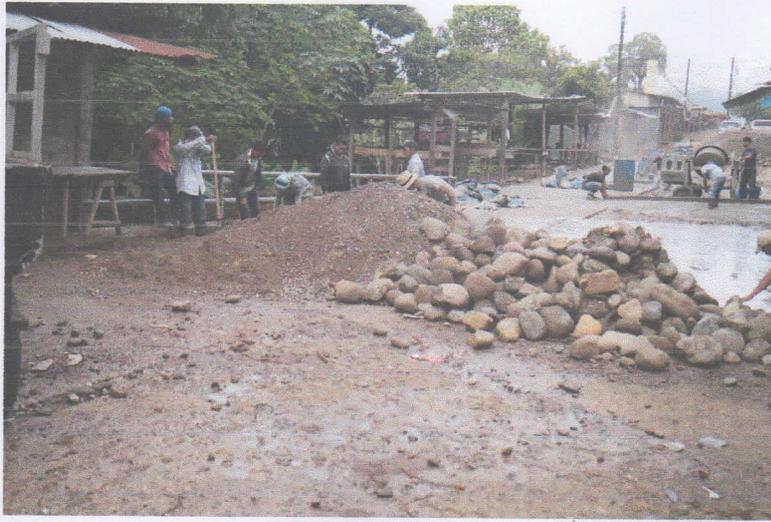

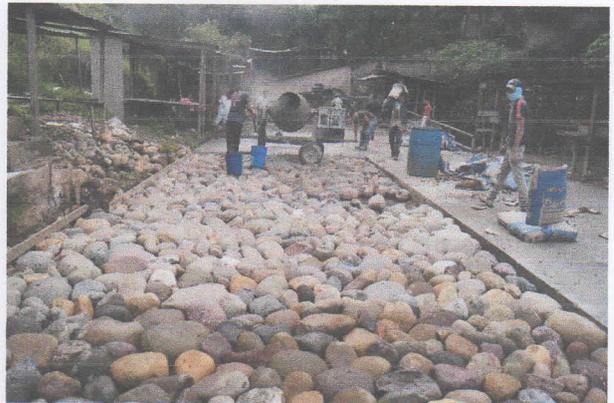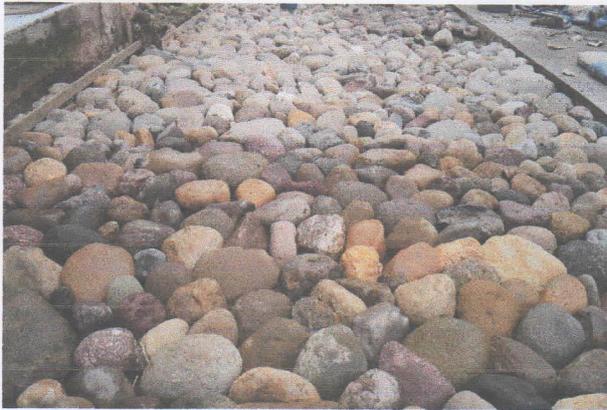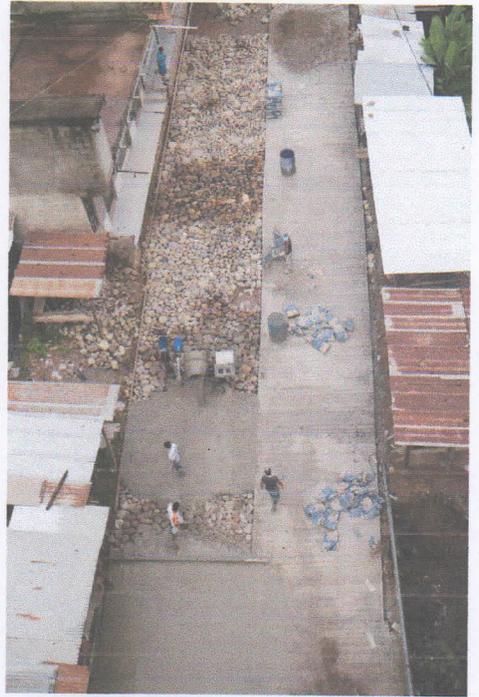

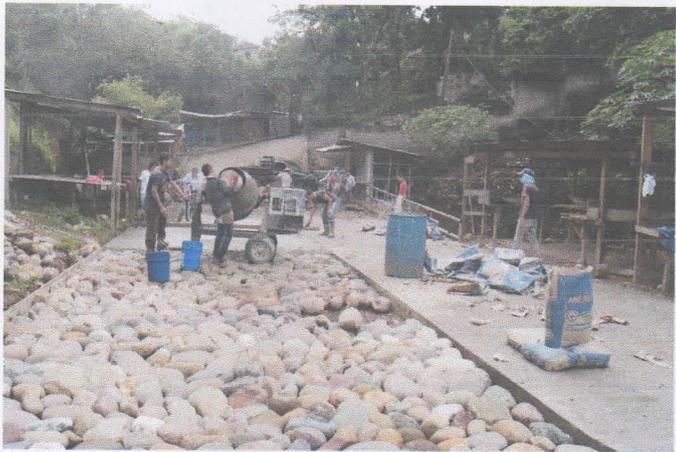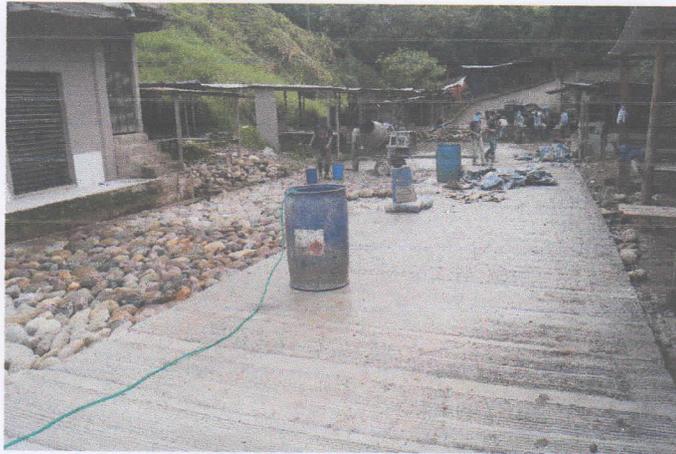

Ficha de Proyecto



Construcción de Policlínico en el Casco Urbano

LEPAERA, LEMPIRA OCTUBRE DE 2019.

Honduras Centro América


Maria Rosendo
Jefe de la Unidad Técnica
de Gestión Municipal.

1. Ejecución del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Policlínico en Casco Urbano de Lepaera

.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social (SALUD)

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Policlínico en Casco Urbano de Lepaera

4.- Ubicación del Proyecto.

El Proyecto se encuentra localizado en el Barrio Las Delicias del Municipio de Lepaera en el Dpto. de Lempira, específicamente donde hoy se ubica la Clínica Materno Infantil el Hogar Materno tiene las colindancias siguientes: **Al Norte** con los municipios de Atima y Naranjito en el Dpto. de Santa Bárbara, **al Sur:** colinda con los municipios de las Flores y Gracias en el Dpto. de Lempira ,**al Este** con el Municipio de la Iguala ,Lempira y Atima ,Santa Bárbara, **al Oeste :** Con los Municipios de Santa Rosa ,San José y San Juan de Opoa departamento de Copan.

5.- Propósito

Contar con un lugar adecuado en el casco Urbano de Lepaera en donde exista la prioridad y buena atención a pacientes de todo tipo brindando una eficiente asistencia médica hospitalaria inmediata en caso de requerirlo y con un ambiente de seguridad para los futuros pacientes.

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la Construcción de una Policlínica en el Casco Urbano de Lepaera, específicamente en Barrio Las Delicias, que se ubica en un terreno que tiene las siguientes medidas: **16 x 25.96 MTRS** cuadrados y dicho proyecto tiene un área de **400 metros Mtrs.** Cuadrados. Realizándose las siguientes actividades:

Construcción de 45 metros lineales de cerca perimetral, con cimentación de piedra y bloque, zapata corrida, vigas de cimentación y losa de cimentación instalación hidráulicas, armado de paredes de Concreto Forzado, anclajes en castillos y jambas ,anclajes de las paredes de bloque, columnas del pacillo y columnas del edificio ,zapata corridas del pacillo y vigas de cimentación del pacillo ,vigas aéreas, estructura de techo, paredes de bloque de 6 reforzado con refuerzo de cada 0.40 cada dos líneas.

En la construcción se hizo un área de laboratorio, quirófano, pediatría, odontología, área de ultrasonidos. dormitorios, farmacia, sala de espera, comedor, corredor, área de lavandería, baños y corredor) y otros espacios, a la vez con sus respectivas jardineras la cual presta un ambiente agradable y de mucha comodidad para los pacientes.

Este un proyecto con características técnicas de calidad ya que es una infraestructura con una resistencia(anti-sismos) que cumple las expectativas tanto del cooperante, beneficiarios y gobierno Local.

7. Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto.**
- **1. Se cuenta ya con un 100 % de avance físico**
- **2. Se cuenta con personal con capacidad ejecutando la obra**
- **3.- Contar con un Diseño adecuado para el Policlínico**

8. Impacto Ambiental.

Para la ejecución proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la Unidad de Medio Ambiente se hicieron las inspecciones correspondientes del terreno donde se está construyendo la obra, verificando que la construcción se ejecutara en una zona segura y en donde no se causa ningún daño. Lo que se puede mencionar que la zona es segura, ya que allí está construida la Clínica Materno Infantil

Impacto en terreno y asentamientos.

La Construcción de la Policlínica, cuenta con el terreno legalmente escriturado, el cual es propiedad Municipal y está ubicado en un lugar que reúne las condiciones básicas como ser: Agua Potable, electrificación y de fácil acceso.

9. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara,
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se contó con un banco de Fuente de Financiamiento para la ejecución del proyecto describiéndolas a continuación: Secretaria de Salud, Plan en Honduras, FHIS, CEPROD, embajada de Japón y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada el financiador directo es la embajada de Japón como principal financiador, con la contraparte de la municipalidad, (materiales locales como ser: piedra, grava y arena). Realizándose estas actividades con fondos propios y fondos provenientes de las transferencias.

Presupuesto del Proyecto.

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal y para el cual a su vez se firmó una carta acuerdo con embajada de Japón de Salud y la municipalidad.

Estado Actual del Proyecto.

En este momento la obra está ya por finalizar, y por el momento no se le está dándose el uso correspondiente donde se beneficia la población del municipio de Lepaera (embarazadas, heridos, fracturas, etc)

10. Costo de finalización Financiera.

Costo Total: Lps.**200,000.00**

Transferencia Positiva: Lps. **100,000.00**

Total : Lps.200,000.00

Devengado: Lps. **43,362.50**

Ejecutado: Lps. **43,362.50**

Pendiente a Ejecutar: Lps.156,637.50 Parte financiera

Fecha de finalización proyectada

Febrero de 2019

11. Ejecución Del Proyecto

12. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el presente proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 1 un año en vista que las actividades a realizarse en el proyecto y para poder cumplir con los requisitos solicitados por la fuente financiamiento como ser: **La embajada de Japón y la Municipalidad**. Por estar en un **100%** de ejecución la parte física y por estar siendo dirigida por los japones quienes son los principales financiadores y quienes manejan información de los costos más altos del proyecto, ya se está esperando la conclusión del proyecto, aunque en estos momentos está en un **21.68% acumulado en este mes de Octubre, la parte financiera que es el Aporte Municipal**

Por parte de la secretaria de Salud y la municipalidad se está supervisando el proyecto permanentemente, en vista que, aunque ya se sabe la calidad de obra que ejecuta la embajada de Japón, es necesario también mencionar que por medio de la Unidad Técnica de Gestión se está supervisando la obra, dando fe que es una obra que reúne los requisitos de una obra de calidad como lo es el

policlínico. ya el proyecto está finalizado, e instalado todo el equipo que se necesita para su funcionalidad.

13. Variación en el costo total del Proyecto.

En este momento no ha habido variaciones, ya que el proyecto está finalizado y colocado todo el equipo técnico para su funcionalidad y seguirá invirtiendo hasta concluir el proyecto para llegar al aporte acordado.

Monto Solicitado:

Costo Total: Lps.**100,000.00**

Transferencia Positiva: Lps. **100,000.00**

Total: Lps.200,000.00

Devengado: Lps. **43,362.50**

Ejecutado: Lps. **43,362.50**

Pendiente a Ejecutar: Lps. 156,637.50 parte financiera

Fecha de finalización proyectada

Febrero de 2019

14. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

La variación más grande que existe en este momento es la fecha de culminación del proyecto ya que tenía que culminar en febrero y hasta este momento ya está finalizado

Existen otras variaciones como en todo proyecto porque a la par de este proyecto hay otros ejecutándose en el municipio lo cual afecta

a veces para poder cumplir a cabalidad con los requerimientos del proyecto. Lo que si es necesario mencionar la calidad de obra que está ejecutando la embajada de Japón y no se duda que se culmine con todas las especificaciones técnicas de calidad conforme a lo establecido por la empresa ejecutora.

Se tenía planificado para terminar en el mes de febrero, pero se concluyo en el mes de septiembre y ya está en funciones.

Observación: En si la obra física está finalizada, pero por ser una obra con características muy estrictas y es necesario mencionar que su infraestructura física ya está finalizada. Y lo mejor que el Centro de asistencia se entregara ya con equipo de calidad e instalado en su respectiva área.

Razones de los cambios antes mencionados.


1. Lentitud en que llegan las transferencias a la Municipalidad que es uno de los cooperantes del proyecto.
- 2.- El Clima, que es un factor inevitable, afecta grandemente, pero más la parte técnica del proyecto.
- 3.- Existen otros proyectos ejecutándose al mismo tiempo, lo que dificulta terminar en el tiempo previsto.

ANEXOS: FOTOS.

Estos son los avances de la obra física del proyecto.

YA FINALIZANDO LA OBRA FISICA



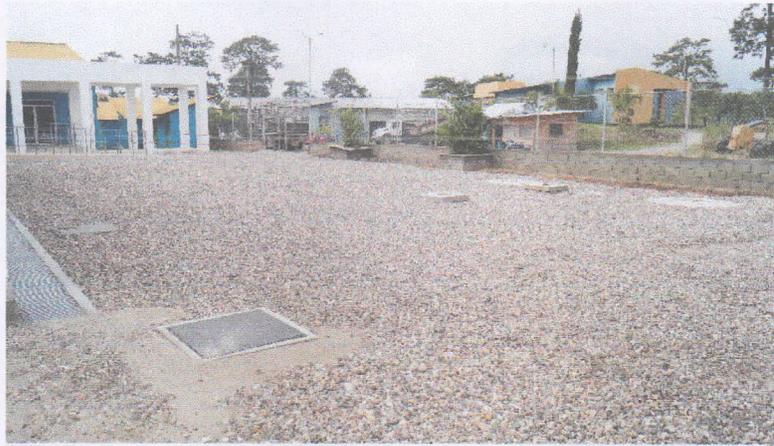







Municipalidad de Lepaera, Lempira



Nombre del Proyecto

**Compra de Terreno para la Construcción de
Campo de Futbol en la comunidad de Plan del
Socorro, Lepaera**

BENEFICIARIOS.

HABITANTES DE PLAN DEL SOCORRO

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.A Octubre de 2019



Maria Rosandra Parra Castro
Jefe de la Unidad Tecnica de
Gestión Municipal

Ficha de Proyecto

Compra de Terreno para la Construcción de Campo de Futbol en la aldea Plan del Socorro.

1. Identificación del Proyecto

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal
Edgar Antonio Murillo

2.- Sector o Sub sector

Sector: Deporte (Infraestructura Social)

3.- Nombre del Proyecto

Compra de Terreno para la Construcción de Campo de Futbol en la aldea de Plan del Socorro , Lepaera.

4.- Ubicación del Proyecto.

La Comunidad de Plan del Socorro se encuentra ubicada a 8 Kmtrs del Casco Urbano, municipio de Lepaera, Dpto. de Lempira

5.- Propósito

Mejorar las condiciones de recreación y para la realización de diferentes actividades ya se sociales, deportivas, religiosas y educativas a través de la adquisición de Terreno para la construcción de Campo de Futbol en la comunidad de Plan de Socorro la cual será de beneficio para toda la comunidad.

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la adquisición de Terreno para la construcción de un Campo de Fútbol en la comunidad de plan del Socorro de **32X17 mtrs** (área total de 544 Mtrs dicho terreno se pretende cercar

para lo cual se utilizaran los siguientes materiales: Cerca Perimetral de Alambre de Púas, bases de cemento para mayor seguridad, y se protege especialmente el área.

Tomando en cuenta lo anterior, es que la municipalidad de Lepaera ha tomado la iniciativa de la ejecución de un proyecto tan importante, contando con todo el apoyo necesario para desarrollar este trabajo.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

- El Municipio de Lepaera ya cuenta con varias áreas para campo de futbol, pero al mismo tiempo existen zonas que no cuentan con estos sitios de recreación que son tan indispensables para los niños, jóvenes y adultos.
- Por el momento existen muchas deficiencias, en vista de que apenas se ha iniciado con la preparación del terreno para la buena funcionalidad del campo.

El presente proyecto es necesario por las siguientes razones:

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
- Se crean fuentes de empleo ,lo que redundará en la economía de las familias del municipio
- Mejora las condiciones de recreación y convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad.
- Aleja del vicio a la juventud del municipio de Lepaera.
- Mejora la autoestima de los habitantes del municipio.
- Por lo anteriormente expuesto la alcaldía tiene planificado la ejecución del proyecto y para llevar a cabo esta obra pendiente de ejecutar, es necesario llevar a cabo una serie de actividades como ser:
 - Levantamiento de Estudio de Proyecto.
 - Cotización de materiales en las ferreterías locales.
 - Cotización de mano de Obra calificada.
 - Inicio de la obra.

- Supervisión, monitoreo y seguimiento de la obra.
- Entrega de la obra ya culminada.
- Inauguración del Proyecto.

Para llevar a cabo dichas actividades es necesaria la participación de los vecinos de la comunidad de Plan del Socorro en el municipio de Lepaera, y de muchos aficionados que están interesados en que la obra se realice.

Lógicamente que la municipalidad es la principal responsable de la buena ejecución de la obra en mención.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, distribución del cuerpo de agua, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Catastro y La Unidad Municipal de medio Ambiente de Lepaera hizo verificación de la zona en donde se harán las respectivas construcciones Construcción de Campo de Futbol de Plan del Socorro en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se dañan Terrenos, u otras áreas que se consideren de mucha importancia.

Por ser directamente la municipalidad la que ejecuta ella se encarga directamente de contratar las personas que llevaran a cabo el proyecto.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión.

Teléfono No. 98072593, 2655-50-90

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Mauricio Avalos

Mancomunidad Puca

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: **FHIS, Gobierno Central, Beneficiarios directos y Municipalidad**

De las Fuentes financieras mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando Municipalidad, Gobierno Central,

Manejados por la Municipalidad

Presupuesto del Proyecto.

Este año se inició por medio de la Municipalidad, manejando el siguiente presupuesto:

Aporte Municipal: Lps.100,000.00

Vigente: Lps.100,000.00

Devengado: Lps.20,000.00

Pagado: Lps.20,000.00

Pendiente a pagar: Lps.80,000.00

Y a la vez Con material Local = Si se necesitan.

Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre de 2018

11. Estado del Proyecto actual.

En este momento esta en su etapa de inicio.

Y se pretende el proyecto se ejecutara en una sola etapa

Costo de finalización Proyectado

Aporte Municipal: Lps.100,000.00

Vigente: Lps.100,000.00

Devengado: Lps.20,000.00

Pagado: Lps.20,000.00

Pendiente a pagar: Lps.80,000.00

Y a la vez Con material Local = Si se necesitan.

Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre de 2018.

Además, la municipalidad apoya Con material Local =en caso de ser necesario.

Fecha de finalización proyectada

Se tiene programado el pago completo del terreno del Campo de Futbol para Diciembre de 2019.

12. Ejecución Del Proyecto

13. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 3 meses por ser un proyecto que no requiere de mucho trámite legal , ya que la compra de

terrenos ,es un trámite rápido, que si no hay otros beneficiarios involucrados no existe mucho tramite.

De lo planificado ya se tiene un avance de un **20%** lo que es muy poco, pero ya se explicó que dicho terreno se pagara en la medida que ingresen las trasferencias y lo importante es que la compra se realizó conforme a lo planificado porque siempre existen algunos contratiempos, pero no de mucha relevancia como ser por parte de los colindantes, pero nada que no se pueda resolver, El proyecto se pretende se estará concluido en su totalidad en el mes de diciembre del presente año.

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps.100,000.00** como transferencia positiva, devengado tiene la cantidad de **Lps.20,000.00** y pagado la cantidad de **Lps. 20,000.00** Quedando por ejecutar la cantidad de **Lps.80,000.00**

14. Variación en el costo total del Proyecto.

Siempre existen variaciones en los proyectos y esté presento algunos cambios en la parte presupuestaria ya que el proyecto se ejecutó en un **20 %** es decir que el proyecto lleva muy poco avance, faltando un poco del **80%** de la Obra física y financiera como ser : Pago del terreno ,y plantel del campo. El último reporte de avance financiero es manejado en estos momentos por la Oficina de contabilidad, la cual da fe que los fondos son entregados de acuerdo a lo planificado

Monto Solicitado:

Costo de finalización Proyectado

Aporte Municipal: Lps.100,000.00

Vigente: Lps.100,000.00

Devengado: Lps.20,000.00

Pagado: Lps.20,000.00

Pendiente a pagar: Lps.80,000.00

Y a la vez Con material Local = Si se necesitan

Fecha de finalización Proyectada:

Diciembre de 2019

15. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Siempre existen variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto en vista que se tiene planificado para terminar en tres meses tiempo máximo, pero se tarda mas en el sentido que se paga el proyecto en la medida que ingresan las transferencias a la Municipalidad

El proyecto avanza de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para los beneficiarios, ambas se han portado a la altura cumpliendo con lo que se les solicito de una manera responsable y eficiente.

16. Razones de los cambios antes mencionados.

Como mencione anteriormente hubo algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: Colindantes del Terreno, que es un factor que se puede llegar a un acuerdo, otro es en el pago del terreno que es básicamente por la tardanza de las transferencias, lo cual dificulta para darle continuidad a los proyectos.

Anexos

Fotografías del área comprada para el campo de Futbol.



