



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

En respuesta a la solicitud No OIP-005-06-01-2020 enviada el día 06 de Enero del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de construcción de un muro perimetral en CEPB Francisco Bustillo.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	M.O Fernando Suazo Gonzales
Sector	Sur Este del municipio.
Nombre del proyecto	Construcción de un muro perimetral en cementerio municipal.
Ubicación del proyecto	Barrio el san francisco
Descripción del proyecto	El proyecto está comprendido por 122 metros lineales, excavación de ancho de 40 centímetros por 60 centímetros, de profundo, columnas y 15x15 centímetros, solera superior de 15x15 cm e inferior de 20x20cm y una construcción de paredes con bloques de 6 pulgadas.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal proyecto)	Beneficiar a 5190 personas del municipio des ilícitas que hacen Lorin Anel Orellana Secretaria Municipal Julado en el plan de
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Fernando Suazo Gonzales
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 135,616.57
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2018




LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Estado actual del proyecto	Ejecutado aproximadamente en un 48.91%
Costo de finalización del proyecto	NO APLICA
Fecha de finalización	19 marzo 2020
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 10 días del mes de Enero del año 2020




Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/12/2019
Hora : 02:15 p.m.
USUARIO: CARMEN.NOLASCO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11789

L: 42,356.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8061

Fecha de Emisión: 20/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERNANDO SUAZO GONSALEZ

Id/RTN: 1204195800002

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Pago a la Segunda Estimación del Proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO SAN FRANCISCO casco urbano del Municipio de Cane.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 002 000 001 47210 11-001-01	Construcción del muro Perimetral del Cementerio Municipal	42,356.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,356.10
Monto Total:		42,356.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	42,356.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	42,356.10

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Fernando Suazo González
 Identidad No.: 1304-195800002

0s+js/f9Jmcy/LQzMdGUq2WiggyzA99QNh3+EWZbt1yPBDJ5TJTNihLqtX/e7rg6v7BoxqUNU8S2eDDhvOPUrk6vqNLrodWCw4tEveuoIjB47DPKiq61LBZdaeAtHXo
 00pZliagocxi0QbVafcf7M5R34Z+pWW



MUNICIPALIDAD DE CANE LA PAZ

Lic. Francisco Bustillo G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org
R.T.N. 12049995434017

RECIBO

Nº 08626

Por Lps. 42956.10

Recibí de la Tesorería Municipal:

La Cantidad de: Cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y seis con 10/100

Por Concepto de: pago segundo Estimación de proyecto construcción Muro
perimetral ubicado en el Cementerio municipal barrio San Francisco

Dirección de Domicilio: barrio EL porvenir

Teléfono / Celular: 97712360

Imprenta Rios: Tel.: 2771-8063 / 9952-2937 R.T.N. 03011964011686 20 tal del 7,801 en adelante 14/06/2019

Fecha de Pago: 20 de diciembre del 2019

Fernando Suazo C.

Nombre

Firma

1204-1958 00002

Identidad

ESTIMACION No 2
MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ
PROYECTO: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO
EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.
UBICACIÓN: BARRIO EL PORVENIR, CEMENTERIO MUNICIPAL
EJECUTOR: M.O. FERNANDO SUAZO GONZALES
PERIODO DEL: 05 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE				EJECUCION ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	ANTIDA	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	Demolición de pared de bloque	M2	240	45	10800	240.00	10800.00			240.00	10,800.00	100
2	Trazado y marcado	ML	122	28	3416	122.00	3416.00			122.00	3,416.00	100
3	Excavación	M3	29.28	126	3689.28	29.28	3689.28			29.28	3,689.28	100
4	Cimentación de mampostería	M3	27.44	825	22638	3.56	2937.00	23.88	19,701.00	27.44	22,638.00	100
5	fundición de solera inferior de 20x20cm	ml	122	157	19154			122.00	19,154.00	122.00	19,154.00	100
6	Fundición de castillos 15x15 cm	MI	158.1	138.29	21863.84							0
7	fundición de solera superior 15 x 15 cm	ml	122	167	20374							0
8	Pared de bloque de 6 pulgadas	M2	245.85	137	33681.45			48.38	6,628.06	48.38	6,628.06	19.68
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO					135,616.57		20,842.28		45,483.06		66,325.34	48.91

ESTIMACION 1	45,483.06
RETECION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA	2,274.15
RETECION DEL 12.5%	852.81
TOTAL A PAGAR	42,356.10



[Signature]
CONTRATANTE

[Signature]
CONTRATISTA



[Signature]
UPERVISOR

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2019
-----------------------	--	-----------

INFORME DE SUPERVION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.

Nombre del contratista: MO. FERNANDO SUAZO GONZALES

Nombre del supervisor: Luis Fernando Martínez Ávila

Fecha de presentación del informe: 05DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación
Estimación:
A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio
2. Días no trabajados por fuerza mayor:
Todos los días se trabajaron.
3. Contratista/ MO. FERNANDO SUAZO GONZALES
Responsable de obra: MO. FERNANDO SUAZO GONZALES

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo33.54%

Porcentaje acumulado ejecutado.....48.91%

Estos porcentajesdeberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ, Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....	33.54%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....	33.54%
Porcentaje acumulado ejecutado.....	48.91%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados por el maestro de obra se ejecutan siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión ha este proyecto se hace constante durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por la por el maestro de obra antes mencionadas, que provoquen daños a las personas que visiten el cementerio.

En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

- Cimentación de mampostería
- Fundición de solera inferior de 20x20cm
- Pared de bloque de 6 pulg.
-

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace de lunes a viernes periódicamente.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:

No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor:

Lugar (municipio de cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación, 20 de Diciembre del año 2019



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ, Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

AVANCE FINANCIERO

INFORME DE SUPERVICION

Proyecto: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 19/11/2019 - 05/12/2019 en base a la primera estimación.

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	135,616.57	100.00%
Deducción del 5% de calidad	2,274.15	33.54%
Estimación 2	45,483.06	33.54%
Deducción del 12.5%	852.81	33.54%
AVANCE FINANCIERA		33.54%

RESUMEN

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	3,316.26	48.91
Deducción del 12.5%	1,243.60	48.91
ESTIMACION 1	66,325.34	48.91

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

RETENCIONES

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	LPS. 3,316.26
DEDUCCION DEL 12.5%	LPS. 1,243.60

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto *"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ,* Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ

UBICACIÓN MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Construcción de pared de bloque de 6"






Fundición de solera inferior



Armado de hierro



Cimentación de mampostería

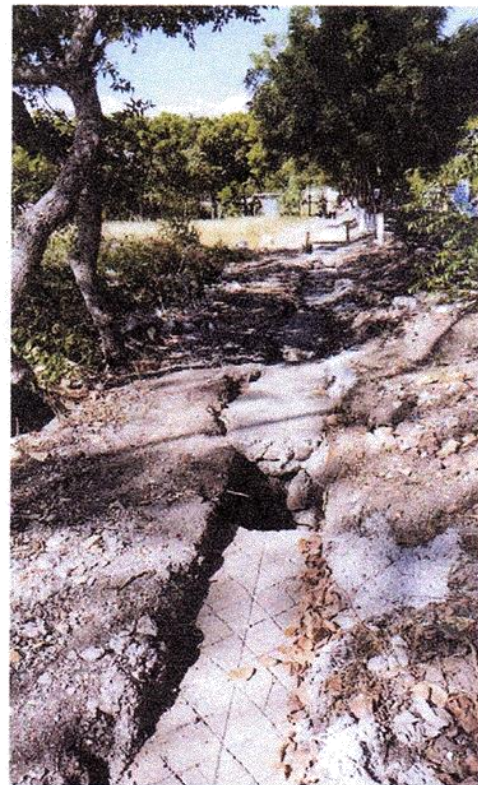

007614000218
ALCALDIA MUNICIPAL CANE, LA PAZ
AL NORTE DE PLAZA SAN FRANCISCO
TEL 27744067

CHEQUE No. 00005995


Cane, 20/12/2019
Lugar y Fecha

Fernando Suazo Gayale
Páguese a la orden de

L 42,356.10

Cuarenta y Dos mil trescientos cincuenta y seis con 10/100
Cantidad en letras Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.



Firma(s)

⑆01001142⑆00007614000218⑆00005995

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FERNANDO / SUAZO GONZALEZ




HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 24 ENERO 1958
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 14 ABRIL 1997

1204-1958-00002




00756400-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTO R.N.P.



SOLICITADA EN 1204

FERNANDO / SUAZO GONZALEZ
1204-1958-00002
