



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

En respuesta a la solicitud No OIP-005-03-02-2020 enviada el día 03 de Febrero del presente año sobre la ejecución de proyectos y las diferentes licitaciones le doy a conocer por medio de esta tabla el avance del proyecto de construcción de un muro perimetral en CEPB Francisco Bustillo.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	M.O Fernando Suazo Gonzales
Sector	Sur Este del municipio.
Nombre del proyecto	Construcción de un muro perimetral en cementerio municipal.
Ubicación del proyecto	Barrio el san francisco
Descripción del proyecto	El proyecto está comprendido por 122 metros lineales, excavación de ancho de 40 centímetros por 60 centímetros, de profundo, columnas y 15x15 centímetros, solera superior de 15x15 cm e inferior de 20x20cm y una construcción de paredes con bloques de 6 pulgadas.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Beneficiar a 5190 personas del municipio Reducir las actividades ilícitas que hacen jóvenes y adultos. Vistosidad del lugar Cumplir con lo estipulado en el plan de inversión municipal
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Fernando Suazo Gonzales
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal.
Presupuesto del proyecto	Lps. 135,616.57
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2018
Estado actual del proyecto	Ejecutado en un 100%



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Costo de finalización del proyecto	Lps. 135,616.57
Fecha de finalización	09 Enero 2020
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	NO APLICA

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 11 días del mes de febrero del año 2020



Luis Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos

ESTIMACION No 4
MUNICIPALIDAD DE CANE, LA PAZ
PROYECTO: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL
UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.
UBICACIÓN: BARRIO EL PORVENIR, CEMENTERIO MUNICIPAL
EJECUTOR: M.O. FERNANDO SUAZO GONZALES
PERIODO DEL: 27 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2020

N°	DESCRIPCION	PRESUPUESTO BASE				EJECUCION ANTERIOR		EJECUTADO ACTUAL		ACUMULADO FINAL		%
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	
1	Demolición de pared de bloque	M2	240	45	10800	240.00	10800.00			240.00	10,800.00	100
2	Trazado y marcado	ML	122	28	3416	122.00	3416.00			122.00	3,416.00	100
3	Excavación	M3	29.28	126	3689.28	29.28	3689.28			29.28	3,689.28	100
4	Cimentación de mampostería	M3	27.44	825	22638	27.44	22638.00			27.44	22,638.00	100
5	fundición de solera inferior de 20x20cm	ml	122	157	19154	122	19154.00	0.00	0.00	122.00	19,154.00	100
6	Fundición de castillos 15x15 cm	MI	158.1	138.29	21863.84	79.05	10931.92	79.05	10,931.92	158.10	21,863.84	100
7	fundición de solera superior 15 x 15 cm	ml	122	167	20374			122.00	20,374.00	122.00	20,374.00	100
8	Pared de bloque de 6 pulgadas	M2	245.85	137	33681.45	188.38	25,808.06	57.47	7,873.39	245.85	33,681.45	100.00
TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO					135,616.57		85,505.34		39,179.31		135,616.57	100.00

ESTIMACION 3	39,179.31
RETECION DEL 5% DE CALIDAD DE OBRA	1,958.97
RETECION DEL 12.5%	734.61
TOTAL A PAGAR	36,485.73



CONTRATANTE

CONTRATISTA



SUPERVISOR

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Municipalidad de CANE	Informe de estimación avalando estimación	Muni-2019
-----------------------	--	-----------

INFORME DE SUPERVION DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.

Nombre del contratista: MO. FERNANDO SUAZO GONZALES

Nombre del supervisor: Luis Fernando Martínez Ávila

Fecha de presentación del informe: 27 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2020

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación
Estimación:
A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio
2. Días no trabajados por fuerza mayor:
Todos los días se trabajaron.
3. Contratista/ MO. FERNANDO SUAZO GONZALES
Responsable de obra: MO. FERNANDO SUAZO GONZALES

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

4. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo28.89%

Porcentaje acumulado ejecutado.....100.00%

Estos porcentajesdeberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....28.89%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....28.89%
Porcentaje acumulado ejecutado.....100.00%

5. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados por el maestro de obra se ejecutan siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante el supervisor.

6. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión ha este proyecto se hace constante durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por la por el maestro de obra antes mencionadas, que provoquen daños a las personas que visiten el cementerio.

En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

- Solera superior pulg.
- Fundición de castillos

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace de lunes a viernes periódicamente.

7. Conclusiones y recomendaciones generales:

No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor

Lugar (municipio de cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación 09 de Enero del año 2020



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

AVANCE FINANCIERO

INFORME DE SUPERVICION

Proyecto: "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ.

Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias del gobierno central, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 27/12/2019 - 09/01/2020 en base a la cuarta estimación.

	Monto en Lps	porcentajes
Monto del contrato	135,616.57	100.00%
Deducción del 5% de calidad	1958.97	28.89%
Estimación 4	39,179.31	28.89%
Deducción del 12.5%	734.61	28.89%
AVANCE FINANCIERA		28.89%

RESUMEN

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	6780.83	100.00
Deducción del 12.5%	2542.81	100.00
ESTIMACION 1,2,3,4	135,616.57	100.00

Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

RETENCIONES

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	LPS. 6780.83
DEDUCCION DEL 12.5%	LPS. 2542.81



Informe de supervisión para soporte de la de la primera estimación del proyecto "PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ., Ubicación del proyecto: CANE, LA PAZ

FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO

"PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN MURO PERIMETRAL UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PORVENIR CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ

UBICACIÓN MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Fundición de castillos

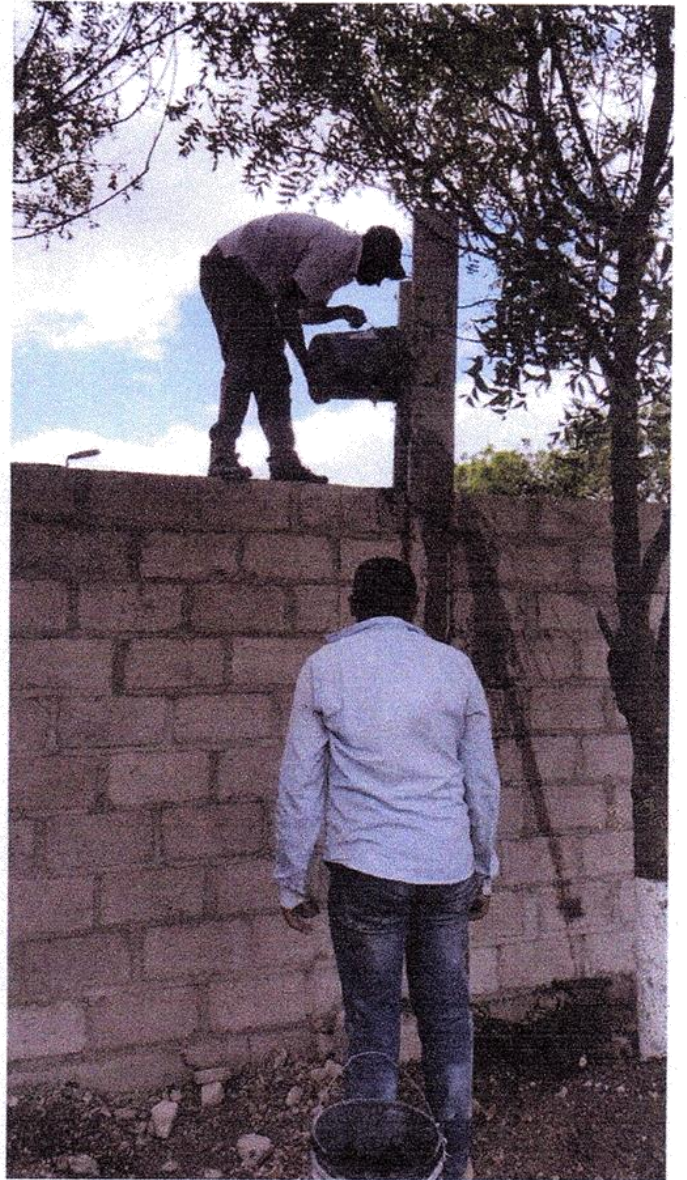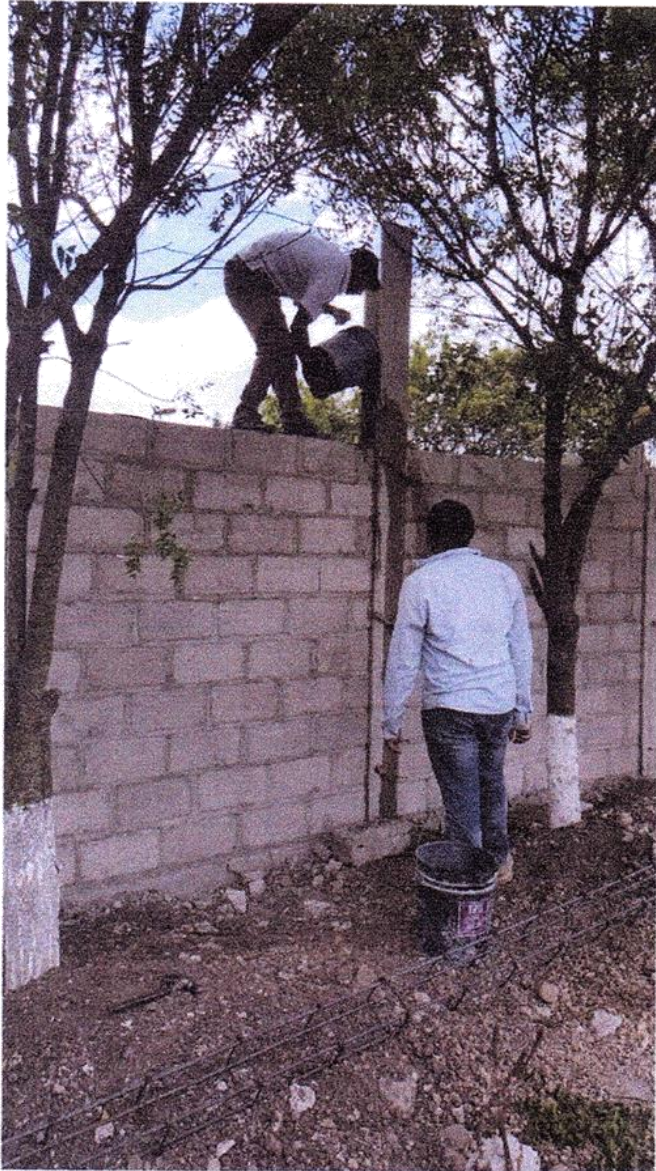

Fundición de solera superior

