

Municipalidad de Lepaera, Lempira

Nombre del Proyecto



CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS EN ESTADIO JUAN ORLANDO HERNANDEZ EN
LEPAERA.

BENEFICIARIOS.

HABITANTES DE LEPAERA

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.A Octubre de 2020



Municipio de Lepaera Departamento de Lempira



NOMBRE DEL PROYECTO:

Pavimentación de Calles de iniciando frente a casa del Sr. Humberto Muñoz doblando por casa del Sr. Neryn Ubence Reyes Concluyendo frente a casa del Sr. Vicente Lara, en Lepaera en el Dpto. de Lempira

UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Barrio San Juan de Lepaera, Lempira.

ORGANIZACIÓN PROPONENTE Y RESPONSABLE:

La Municipalidad de Lepaera, Lempira
Email: lepaera2006@yahoo.com



Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Pavimentación de Calles de iniciando frente a casa del Sr. Humberto Muñoz doblando por casa del Sr. Neryn Ubence Reyes Concluyendo frente a casa del Sr. Vicente Lara, en Lepaera en el Dpto. de Lempira

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social (componente Vial)

3.- Nombre del Proyecto

Pavimentación de Calles de iniciando frente a casa del Sr. Humberto Muñoz doblando por casa del Sr. Neryn Ubence Reyes Concluyendo frente a casa del Sr. Vicente Lara, en Lepaera en el Dpto. de Lempira.

4.- Ubicación del Proyecto.

El municipio de Lepaera se encuentra ubicado al norte del departamento de Lempira en el occidente de Honduras C. A. El proyecto se pretende realizar en el Barrio San Juan específicamente de calle que inicia desde casa del Sr. Humberto Muñoz doblando a casa del Sr. Neryn Ubence reyes Concluye en de Vicente Lara

5.- Propósito

Mejorar las Condiciones del Municipio a través de la pavimentación de 167.28 metros lineales de calle y **1201.73** mtrs cuadrados de calle que inicia desde casa del Sr. Humberto Muñoz doblando a casa del Sr. Neryn Ubence reyes Concluye en casa de Vicente Lara del mpio de Lepaera.

6.- Descripción del Proyecto.

Este proyecto consiste en la construcción de **167.28** Metros Lineales de Calle, **1201.73 mtrs** cuadrados de pavimento desarrollado de la siguiente manera: construcción de **6x6** centímetros de ancho, bordillo de cemento, , de calle que inicia desde casa del Sr. Humberto Muñoz

doblando a casa del Sr. Neryn Ubence Reyes Concluye en casa de Vicente Lara del mpio. de Lepaera.

Este proyecto se necesita porque en invierno se dificulta el tránsito para los pobladores ya que podrán tener una mejor comunicación y acceso en el municipio es necesario mencionar que ya cuenta con un buen porcentaje de calles pavimentadas durante años anteriores. Y ya se tiene B.V de la Corporación Municipal para darle seguimiento en el presente año 2020 y 2021 a este tipo de proyecto.

En la actualidad urge la pavimentación de estas carreteras para poder restablecer la comunicación - con la ejecución de este proyecto se estarán beneficiando unos **30 familias directamente y 1,200 habitantes** que indirectamente usan diariamente estas vías de comunicación para el traslado de sus bienes de consumo , La modalidad para Construcción de este tramo será con mano de obra comunitaria y así beneficiar a **25 Familias** por un espacio de 2.0 meses o según sea la duración del proyecto en mención., ya que cada ruta tiene su duración respectiva eso depende la cantidad de metros a ejecutar y así mismo se realizan los pagos

7. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto.

La mayoría de municipios de lempira enfrentan problemas de infraestructura de las calles municipales debido a las fuertes tormentas, y los barrios y colonias son los que sufren las consecuencias debido a que no puede haber comunicación, el invierno copioso causo severos daños a red vial de la zona urbana el cual destruye dichas calles.

Con esta modalidad **Pavimentación de calles** buscamos mejorar la comunicación del Barrio el centro, Barrio delicias, San Juan y a los diferentes barrios que tiene el municipio de Lepaera lempira el cual incorporaremos a la población a las actividades de mejora y rehabilitación de sus vías de acceso además generar empleo temporal para aquellas familias que se encuentran en rango de pobreza.

Para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto, que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser Recolección de información para llevar a cabo el presente proyecto, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede

a informar a la población de Lepaera como ser: beneficiarios directos para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras preliminares. Pero el ejecutor directo es la Municipalidad que es quien contrata el personal especializado para este tipo de proyecto.

8. Impacto Ambiental.

El presente proyecto por ser un proyecto de infraestructura por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección de la zona donde se ejecutará el proyecto de pavimentación para verificar que no sean destruida las áreas verdes esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la pavimentación no se haga en una zona de riesgo sea donde haya viviendas que puedan quedar a la deriva o donde ya está el proyecto de alcantarillado. Ya que si no existe un alcantarillado Sanitario no es posible ejecutar el proyecto.

Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente ya se cuenta con la supervisión directa del Ing. de la Mancomunidad Puca en donde se define claramente que no hay problemas con alguna propiedad ya que la ruta a pavimentar son calles establecidas y bien definidas por el dpto. De catastro. Y a la vez ya se cuenta con los permisos respectivos, en caso de que fuese necesario.

9. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Francisco Lara.

Gerente de la Mancomunidad Puca

Cel. **9451-4754**

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: FHIS, SOPTRAVI Municipalidad, Fondo Vial y FONDO CAFETERO NACIONAL.

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo el principal financiador es FHIS y la Municipalidad, ya sea con fondos propios o fondos provenientes de las transferencias ya que cuenta con su propia maquinaria, a la vez cuando son reparación y mantenimiento de carreteras brinda su aporte El Fondo Cafetero, el comité de desarrollo Comunal **CODECO** y beneficiarios apoyan con el cuneteo y con la alimentación de las personas que operan la maquinaria a utilizar.

10. Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal, se realizaron las respectivas cotizaciones., y luego de su análisis se procedió a la elección de la cotización mas baja.

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal con la presencia de representantes de la comisión Ciudadana de Transparencia, que siempre están presentes en cualquier reunión que se realiza en la municipalidad.

Estado del Proyecto actual.

En este momento el proyecto ya está en proceso de ejecución en un **58.78%** en su aporte financiero en lo que va del mes de junio, un **80%** ejecución física. Es necesario mencionar que falta pavimentar varias calles del casco urbano, pero una vez concluido el sistema de Alcantarillado en algunas zonas por el momento no se realizó conforme a lo aprobado.

Costo de finalización Proyectado

Aporte Municipal: **Lps. 100,000.00**

Transferencia Positiva: **Lps.436,520.00**

Transferencia Negativa: **Lps.50,000.00**

Vigente: **Lps. 486,520.00**

Devengado: **Lps. 286,000.00**

Ejecutado: **L.286,000.00**
Pendiente a ejecutar: **Lps.200,520.00**

Fecha de finalización proyectada

Noviembre de 2020

11. Ejecución Del Proyecto

12. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 2 meses, por ser un proyecto que no es muy complicado realizarse en el proyecto y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la **Municipalidad**. Podemos mencionar que hasta donde esta según ruta ejecutada ha sido muy buen avance, es decir que el proyecto está acorde a lo planteado en el contrato mpal , lógicamente existen variaciones, pero no de mucha relevancia, el proyecto en mención se planifico a ser concluido en el mes de Marzo de 2020. Y no se pudo concluir especialmente la parte financiera porque debido a la pandemia COVID-19 se paró el proyecto por un lapso de 3 meses, pero ya está logrando su conclusión y Lógicamente el presupuesto ya estaba aprobado. al inicio del proyecto no se pudo entregar el informe a la fecha porque no se ha concluido la obra en su totalidad y los materiales se pagan en las ferreterías al crédito y hasta que es pagado el último fondo se puede dar un reporte claro de lo invertido.es necesario mencionar que el proyecto ya está en un 80% la obra física, se seguirá dando el aporte financiero hasta concluir el proyecto

Variación en el costo total del Proyecto.

Las variaciones han existido como en todo proyecto, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia en este periodo es muy grande ya que se tenía que ejecutar **Lps.486,520.00** según lo asignado y se devengo: **Lps. 286,000.00** quedando pendiente de ejecutar **Lps: 200,520.00** Este es de acuerdo al avance el cual es muy significativo. Pero los pagos se seguirán dando

hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal. Ya que es un proyecto que continúa. Y el costo es muy elevado.

Monto Solicitado:

Total, del proyecto Pavimentación de Calles iniciando frente a casa del Sr. Humberto Muñoz doblando por casa del Sr. Neryn Ubence Reyes Concluyendo frente a casa del Sr. Vicente Lara, en Lepaera en el Dpto. de Lempira

Aporte Municipal: **Lps. 100,000.00**

Transferencia Positiva: **Lps.436,520.00**

Transferencia Negativa: **Lps.50,000.00**

Vigente: **Lps. 486,520.00**

Devengado: **Lps. 286,000.00**

Ejecutado: **L.286,000.00**

Pendiente a ejecutar: **Lps.200,520.00**

Fecha de finalización proyectada

Noviembre de 2020

13. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Existieron algunas variaciones en cuanto a la fecha de finalización y la parte técnica, como ser en el ancho de las calles, por ser una zona donde nace mucha agua lo cual dificulta, pero fueron resueltas de manera satisfactoria entre el maestro de obra e ing. a cargo del proyecto, en cuanto a la duración hubo variaciones ya que la exigencia era que se debía terminar este tramo en un periodo 2 meses , pero si se ha cumplido con el avance de la obra mencionada y se está avanzado en la reparación de otros tramos y ya se lleva avance el parte del tramo #2, podemos decir que si se cumplió en periodo todas las actividades relacionadas con el proyecto, algo que afecto un poco fueron las condiciones climáticas de la zona y por el ingreso de la Pandemia COVID-19 al país ya que afecto para el depósito de las transferencias a la municipalidad.

El proyecto lleva un avance que es de mucha satisfacción para la municipalidad como para los habitantes del casco urbano, y es necesario mencionar que la municipalidad ha cumplido con los pagos hasta la etapa en que el proyecto se encuentra actualmente, porque,

aunque bien es cierto de la lentitud en los pagos estos no se retrasan mucho, porque de ello depende la continuidad del proyecto.

Razones de los cambios antes mencionados.

Como mencione anteriormente hubo algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar que afecto en el sentido que al haber lluvia se detienen los proyectos., pero fue en un tiempo corto. Ya que no se puede posponer mucho tiempo. Hubo variación también en cuanto al pago de la obra física ya que esta se paga conforme ingresan las transferencias a la municipalidad.

ANEXOS.

-- Fotografías Proyecto Pavimentación de Calles

Informe Fotográfico















MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

Proyecto de Electrificación en Policlínico Barrio Las Delicias

BENEFICIARIOS.

Habitantes de Lepaera, Lempira

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.A Octubre de 2020

A handwritten signature in black ink, followed by a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA' and a central emblem. Below the stamp, the text 'Municipalidad de Lepaera, Lempira' is written in cursive.

Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Proyecto Electrificación en Policlínica de Barrio Las delicias.

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social

3.- Nombre del Proyecto

Proyecto de electrificación en Policlínico de Barrio Las Delicias

4.- Ubicación del Proyecto.

El Policlínico se encuentra ubicado en el Barrio Las Delicias de Lepaera, específicamente a 1 kmtr específicamente del casco urbano.

5.- Propósito

Mejorar el nivel de vida de los habitantes del municipio de Lepaera y de los municipios de la mancomunidad Puca , mediante la construcción del Proyecto Electrificación en el Policlínico para brindar una mejor atención en los servicios de salud a través del apoyo de fuentes financieras externas y de la municipalidad.

6.- Descripción del Proyecto.

El Proyecto Consiste en la Instalación de Sistema de electrificación en el Policlínico ubicado en barrio Las Delicias en el municipio de Lepaera, el cual ya cuenta con un estudio detallado en donde se describe claramente el tipo de Instalación a realizar y a la vez presenta un listado de materiales que serán

necesarios para la construcción de este tipo de proyecto, el trabajo a realizar es el siguiente: se hará la distribución de energía ,instalación de Lámparas y conexión de transformadores, para lo cual se requiere la participación de **1 ingeniero Electricista** el cual teniendo los conocimientos necesarios debe realizar un trabajo de calidad.

La Municipalidad se encarga del traslado de materiales al sitio del proyecto en este caso al Policlínico y al mismo tiempo por la Supervisión, ejecución, monitoreo y evaluación del Proyecto. Lo cual en estos momentos se está haciendo con apoyo del personal de Salud asignado en el sitio del proyecto antes mencionado.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

Para realizar un proyecto de esta naturaleza es necesario contar con líderes con capacidad de gestión y un gobierno local comprometido con su pueblo. La ejecución del presente proyecto Inicialmente se realizaron varias reuniones en donde a su vez se tomó la decisión de llevar a cabo un proyecto tan necesario , esto para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto , que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser Recolección de información (Diseño del proyecto) el cual fue hecho por el Ing., que se contrató para tal fin ,para la Ejecución del presente proyecto, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede a informar al comité de Salud. descentralizada, para iniciar en la realización de las obras preliminares.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección del lugar del proyecto, se revisa toda la zona del Policlínico verificando que no existan arboles grandes alrededor y por toda la zona donde pasara el proyecto, para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la construcción no se haga en una zona de riesgo. En este caso no fue necesario tanto tramite porque solamente es colocación de 2 postes y cableado de todo el Policlínico y no fue necesario realizar permisos de servidumbre.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente no se causa ningún problema legal tanto en terrenos como en ninguna población determinada, este proyecto se construirá en un lugar que reúne las condiciones básicas necesarias para este tipo de proyecto.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: ENEE, FHIS, comunidad y Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando ENEE, Gobierno Central y la municipalidad como principal financiador,

La Municipalidad, apoyando con la mano de Obra Calificada y no calificada para la ejecución del Proyecto, esas actividades a realizar con Fondos propios y fondos provenientes de las transferencias. Es necesario dar a conocer que siempre existe el apoyo por parte de Salud.

Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal y para el cual a su vez se estableció la forma de ejecución de proyecto lo cual queda establecido para su respectiva liquidación.

11. Estado del Proyecto actual.

En este momento ya el proyecto está finalizado solamente quedando pendiente pago de mano de obra y materiales

12. Costo de finalización Proyectado

Aporte Municipal: **Lps.531,944.94**

Transferencia Negativa: **Lps.100,000.00**

Vigente: **Lps.431,944.94**

Ejecutado: Lps. **75,000.00**

Pagado: Lps. 75,000.00

Pendiente a Ejecutar: L.356,944.94

Fecha de finalización proyectada

Agosto de 2020 obra física y financiera

13. Ejecución Del Proyecto

14. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 3 meses por la cantidad de actividades a realizarse en el proyecto y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la fuente financiamiento como ser La ENEE y la Municipalidad. Es necesario mencionar que el proyecto en si la parte física se terminó en el tiempo establecido, pero lo financiero se esta ejecutando ya que por el costo del proyecto es necesario pagarlo por etapas

Es necesario mencionar que el proyecto ya está finalizando en su estructura física faltando la parte financiera, se están realizando conforme a lo planificado y conforme ingresan las trasferencias a la Municipalidad.

15. Variación en el costo total del Proyecto.

Si como en todo proyecto hay variaciones, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, pero en este no hubo esa diferencia porque se utilizó tal y como se tenía planificado, por esta razón no existe ninguna diferencia, para este proyecto se habían presupuestado en el aporte. **L.431,944.94**

Monto Solicitado:

13. Costo de finalización Proyectado

Aporte Municipal: **Lps.531,944.94**

Transferencia Negativa: **Lps.100,000.00**

Vigente: **Lps.431,944.94**

Ejecutado: **Lps. 75,000.00**

Pagado: Lps. 75,000.00

Pendiente a Ejecutar: L.356,944.94

Fecha de finalización proyectada

Agosto de 2020

16. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Si hubo variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto en vista que se tenía planificado para terminar en tres meses tiempo máximo, pero se ha tardado más de tres meses todas las actividades del proyecto, por las condiciones climáticas de la zona y por la parte del ing. que es el ejecutor directo del proyecto que se le ha hecho imposible avanzar con el proyecto. A la vez algunos materiales a utilizarse se hicieron imposible en algún momento su traslado hasta el sitio del proyecto.

El proyecto lleva un avance satisfactorio lo cual es bueno especialmente para la municipalidad, cumpliendo esta organización participante con lo que se le encomendó desde el inicio hasta la finalización.

17. Razones de los cambios antes mencionados.

Como mencione anteriormente hubo algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar, también por el acarreo de materiales esto porque el sitio donde se ubica el proyecto está en un terreno muy difícil más que todo para su ingreso, pero el tramo es corto y esa es una ventaja para el proyecto electrificación de Policlinico Lepaera.

En este tramo se dificulta la entrada en época de invierno.

Fotografías. A continuación se presenta un informe fotografico del estado del proyecto.



MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

Mantenimiento de Aguas negras en el Casco Urbano

BENEFICIARIOS.

Habitantes del Casco Urbano de Lepaera

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.A Octubre de 2020

Ficha de Proyecto

Mantenimiento de Aguas Negras en el Casco Urbano

1. Identificación del Proyecto

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal
Edgar Antonio Murillo

2.- Sector o Sub sector

Sector: AGUA Y SANEAMIENTO

3.- Nombre del Proyecto

Mantenimiento de Aguas Negras en el Casco Urbano: Barrio El Centro, Barrio San Juan y Barrio el Calvario de Lepaera, Lempira

4.- Ubicación del Proyecto.

Casco Urbano Lepaera, Lempira, la cual se ubica al Norte del Dpto. de Lempira

5.- Propósito

Mejorar el saneamiento Básico, disminuyendo las enfermedades causadas por la contaminación del medio ambiente a través de la ejecución del proyecto: Mantenimiento de Aguas Negras en el Casco Urbano de Lepaera.

6.- Descripción del Proyecto.

El presente proyecto consiste en Darle mantenimiento al Sistema de Aguas Negras en los diferentes barrios de El Casco Urbano de Lepaera, dicho proyecto que para los pobladores surge como una de las prioridades más urgentes en estos momentos como ser la limpieza del alcantarillado o sistema

de aguas negras ,en donde lo mas prioritario en estos momentos es sacar sedimentos que impiden que las agua negras circulen libremente ocasionando el derrame de suciedad proveniente de estas tuberías dañando el medio ambiente, lo que al final produce enfermedades gastrointestinales, de la piel etc.

Es necesario dar a conocer que el presente proyecto cuenta con un estudio detallado de materiales ya se encuentran en bodega algunos materiales que son comprados con fondos aprobados por la Corporación Mpal. En la actualidad se hizo la Sanjeadura y colocación de tubería, a la vez se están limpiando pozos o lagunas de absorción.

Se ha considerado como parte integral del proyecto desarrollar capacidades en las organizaciones locales para una administración eficiente y brindar sostenibilidad y mantenimiento al proyecto.

El Trabajo a realizar es específicamente el mantenimiento de Aguas Negras/alcantarillado de Sanitario en los diferentes barrio del Casco Urbano.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

Se está dando ejecución al proyecto en estos momentos tanto financiera como en su parte física y para poder ejecutarlo de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a los avances que se han obtenido en esta última etapa, es necesario el involucramiento de toda la población del Casco Urbano, que son aproximadamente **1,200** hogares que son los beneficiarios directos del proyecto y también se involucran las personas que están construyendo viviendas nuevas.

Se realizaron varias reuniones para hacer conciencia a la población de la problemática existente por la falta de un buen mantenimiento al sistema de aguas negras existente en la actualidad y sobre la contaminación la cual es latente, lo que afecta a los habitantes del municipio de Lepaera ocasionando muchas enfermedades producto de la contaminación ambiental.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, distribución del cuerpo de agua, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. esto para asegurar que el proyecto se esta ejecutando en una zona que reúna las características ambientales de calidad.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad atravez de la Oficina de Unidad Técnica de Gestión Municipal como encargada del proyecto, Dirección de municipal de Justicia, Junta de Agua , dpto de Servicios Publicos y La UMA de Lepaera Hizo verificación de terrenos, en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar atravez de las visitas si no se daña Terrenos, Viviendas y bosque natural

A los beneficiarios se les solicita su apoyo para visitar a los dueños de propiedades por donde se estará ejecutando el proyecto, en este caso no es servicio de servidumbre si no más que todo un análisis de posibles molestias a la población.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Mauricio Avalos

Mancomunidad Puca.

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: **FHIS, Congreso Nacional, Beneficiarios directos y Municipalidad**

De las Fuentes financieras mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando Municipalidad,

Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto en estos momentos ya está en un **24.23%** según lo planificado, están pendientes la ejecución de algunas actividades, pero viene la otra etapa para darle la continuidad en caso que no se concluya el proyecto.

11.Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre del 2019.

12.Estado del Proyecto actual.

En este momento ya está en ejecución el proyecto de mantenimiento, Ya que es un proyecto que se pretende se ejecutara en varias etapas por ser un proyecto continuo ya que constantemente se daña el sistema de Aguas Negras, en estos momentos faltando solamente la cimentación de los tramos en donde se colocó la tubería y se reparó los pozos .

13.Costo de finalización Proyectado

Costo Total Lps: **Lps.122,580.52**

Vigente: **Lps.122,580.52**

Devengado: Lps.29,700.00

Pagado: Lps.29,700.00

Pendiente a Ejecutar: Lps.92,880.52

Además, la municipalidad brinda su aporte Con material Local =**arena, grava piedra**

Fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2020 para de esta primer etapa

Ejecución Del Proyecto

14.Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 12 meses por la dimensión del proyecto a ejecutar y a realizarse por etapas ya que es un proyecto continuo y por la localización en vista que es en zona Urbana por lo cual se hace muy difícil dar el avance recomendado por la fuente de financiamiento al proyecto, ya que existieron algunos contratiempos que se consideran de menor importancia.

De lo planificado ya se tiene un avance de un **24.23% en lo que va el mes de Octubre** del presente año ya que se ha ejecutado el proyecto desde el lugar que señala el diseño, se han hecho trámites como ser: visita a los diferentes sitios en donde se hará el mantenimiento ya que hay varios lugares reportados como problema. Al momento de realizar los trabajos solicitar permiso de Servidumbre, visitas por parte de la UMA y todo tipo de estudio necesarios para la ejecución de un proyecto de esta naturaleza.

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps.122,580.52 en este periodo y se ha pagado la**

cantidad de Lps. 29.700.00 quedando por ejecutar la Cantidad de Lps. 92,880.52

15.Variación en el costo total del Proyecto.

Como en todo proyecto existen variaciones, en este caso, como es un proyecto que se pretende ejecutar en diferentes etapas, el presupuesto está en ejecución, y la parte física a la vez lleva un buen avance por el momento, por lo cual no hay muchas variaciones en el aporte municipal se iban a invertir **Lps. 122,580.52** y se han pagado **Lps.29,700.00 solamente, faltando una ejecución de Lps.92,880.52**

Costo Total Lps: **Lps.122,580.52**

Vigente: **Lps.122,580.52**

Devengado: Lps.29,700.00

Pagado: Lps.29,700.00

Pendiente a Ejecutar: Lps.92,880.52

Además, la municipalidad brinda su aporte Con material Local =arena, grava piedra

Fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2020 primer etapa

18.-Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Por el momento no ha habido variaciones en cuanto a la ejecución en este proyecto.

Esta etapa ha tenido una ejecución de un **24.23% lo que falta siempre se le está dando la continuidad,** pero hasta donde está el proyecto en estos

momentos se ha ejecutado de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para los beneficiarios, ambas se portaron a la altura cumpliendo cada organización participante con lo que se le encomendó desde que se le dio inicio al proyecto.

16. Razones de los cambios antes mencionados.

Por el momento no ha habido cambios que se consideren de mucha relevancia como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar, también por los materiales esto porque las ferreterías existentes en el municipio de Lepaera no cuentan con todos los materiales que se necesitan para darle seguimiento al proyecto. también el hecho que la ejecución financiera no se llevo a cabo en el tiempo deseado, dándosele continuidad el presente año 2020.

Anexos

_ Área en donde se está ejecutando el proyecto de mantenimiento de sistema de Aguas Negras.

-Ya se hizo colocación de tubería.

- Preparación de material

- Construcción de agujeros

- Fotografías de las Diferentes actividades desarrolladas en el proyecto Construcción de Mantenimiento de Aguas Negras del Casco Urbano









Ficha de Proyecto



Mantenimiento de Materno y Policlínico en el
Barrio Las Delicias Casco Urbano
Lepaera, Lempira Octubre de 2020.



Honduras Centro América

1. Ejecución del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Mantenimiento de Materno y Policlinico en Barrio Las Delicias.

.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social (SALUD)

3.- Nombre del Proyecto

Mantenimiento de Materno y Policlinico en Barrio Las Delicias.

4.- Ubicación del Proyecto.

El Proyecto se encuentra localizado en el Barrio Las Delicias del Municipio de Lepaera en el Dpto. de Lempira, específicamente donde hoy se ubica la Clínica Materno Infantil y Policlinico del Municipio de Lepaera tiene el cual tiene las siguientes colindancias : **Al Norte** con los municipios de Atima y Naranjito en el Dpto. de Santa Bárbara, **al Sur:** colinda con los municipios de las Flores y Gracias en el Dpto. de Lempira ,**al Este** con el Municipio de la Iguala ,Lempira y Atima ,Santa Bárbara, **al Oeste** : Con los Municipios de Santa Rosa ,San José y San Juan de Opoa departamento de Copan.

5.- Propósito

Contribuir a brindar las mejores condiciones de Salud ofreciendo un lugar adecuado en el casco Urbano de Lepaera en donde exista la prioridad y buena atención a pacientes de todo tipo brindando una eficiente asistencia

médica hospitalaria inmediata en caso de requerirlo y con un ambiente higiénico o de seguridad para los futuros pacientes.

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en brindar mantenimiento al materno y Policlínico ubicados ambos en el Casco Urbano, específicamente el proyecto se enfoca en pago de personal de aseo y para brindar mantenimiento a las áreas como ser: laboratorio, Sala de Espera, áreas de partos, clínicas, salón principal, área verde, área de lavandería, baños y otras secciones que se requiere mantenimiento permanente. además en estos momentos se le brinda mantenimiento al área de Triage.

Además de las actividades antes descritas este personal ha participado en otras actividades como ser, apoyo al personal de salud en las diferentes actividades que ellos realizan como ser: Brigadas Médicas, Campañas de Limpieza.

Este es un proyecto con muy buenas características ya que cumple las expectativas tanto de los beneficiarios como del gobierno Local.

7. Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto.**
- **1. Se cuenta ya con un 29.66% de avance financiero**
- **2. Se cuenta con personal con mucha responsabilidad realizando los trabajos encomendados.**
- **3.- Contar con la logística necesaria para realizar un trabajo de calidad.**

8. Impacto Ambiental.

Para la ejecución del proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la Unidad de Medio Ambiente se hicieron las inspecciones correspondientes del terreno donde se está ejecutando las actividades, verificando que estas se ejecuten de la mejor manera y en una zona segura y en donde no se causa ningún daño en vista a que el lugar lo amerita.

Impacto en terreno y asentamientos.

Para el mantenimiento del materno y Policlínico no se ha causado ningún tipo de impacto ya sea con el personal/ del equipo técnico contratado y se verificó su buena ubicación y que el lugar reúna las condiciones básicas como ser: Agua Potable, electrificación y de fácil acceso.

9. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara,
Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se contó con un banco de Fuente de Financiamiento para la ejecución del proyecto describiéndolas a continuación: municipalidad y gobierno Central por medio de las Transferencias.

De las Fuentes financieras antes mencionada el financiador directo es la municipalidad como principal financiador, realizándose estas actividades con fondos propios y fondos provenientes de las transferencias.

Presupuesto del Proyecto.

Se asigna un presupuesto para el personal a contratar dicho presupuesto es avalado por la corporación municipal, además el encargado del dpto. de Recursos humanos hace la evaluación del personal a contratar

Estado Actual del Proyecto.

En este momento la obra está en proceso, como ser: el mantenimiento del materno y Policlinico porque dichas actividades son de gran importancia ya que se le está dando el uso correspondiente donde se beneficia la población del municipio de Lepaera (Embarazadas y todo tipo de personas que requiera de los servicios del Policlinico)

10. Costo de finalización Financiera.

Costo Total: **Lps.100,000.00**

Ampliacion: **Lps.100,000.00**

Transferencia Negativa: **Lps.100,000.00**

Vigente: **Lps.100,000.00**

Devengado: Lps.29,655.00

Ejecutado: Lps. 29,655.00

Pendiente a Ejecutar: **Lps.70,345.00**

Fecha de finalización proyectada

Noviembre de 2020

11. Ejecución Del Proyecto

12. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el presente proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 3 meses en vista que las actividades a realizarse en el proyecto y para poder cumplir con los requisitos solicitados por la fuente de financiamiento como ser: **La Municipalidad**. Por estar en un **29.66%** de ejecución financiera, correspondiente al presente año **2020** ya se está esperando la conclusión del proyecto, aunque en estos momentos falta un **70.34%% acumulado en este mes de Octubre de acuerdo a lo presupuestado el año 2019, la parte financiera que es el Aporte Municipal**

Por parte de la secretaria de Salud y la municipalidad se está supervisando el proyecto permanentemente, en vista que, aunque ya se sabe la capacidad de las personas contratadas, es necesario también mencionar que por medio de la oficina de Recursos Humanos se está supervisando todos y cada uno de los proyectos dando fe que el proyecto se ejecuta tal y como se plantea.

13. Variación en el costo total del Proyecto.

En este momento no ha habido variaciones, ya que el proyecto todavía está en proceso de ejecución y se seguirá invirtiendo hasta concluir el proyecto y llegar al aporte acordado.

Monto Solicitado:

Costo Total: **Lps.100,000.00**

Ampliacion: **Lps.100,000.00**

Transferencia Negativa: **Lps.100,000.00**

Vigente: **Lps.100,000.00**

Devengado: Lps.29,655.00

Ejecutado: Lps. 29,655.00

Pendiente a Ejecutar: **Lps.70,345.00**

Fecha de finalización proyectada

Noviembre de 2020

14. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

No existen variaciones que afecten en este momento.

Existen otras variaciones como en todo proyecto porque a la par de este proyecto hay otros ejecutándose en el municipio lo cual a fecha a veces para poder cumplir a cabalidad con los requerimientos del proyecto. Lo que, si es necesario mencionar la calidad de personal contratado, y no se duda que se culmine en tiempo y forma.

Siempre se le dará seguimiento conforme lo planificado

Observación: En si la obra lleva muy buen avance financiero y físico.

Razones de los cambios antes mencionados.

1. Lentitud en que llegan las transferencias a la Municipalidad que es uno de los cooperantes del proyecto.
- 2.- El Clima, que es un factor inevitable, afecta grandemente, porque el personal no puede realizar trabajos de campo.
- 3.- Existen otros proyectos ejecutándose al mismo tiempo, lo que dificulta en muchos aspectos.

ANEXOS: FOTOS. Se envían fotografías de actividades realizadas, básicamente es seguimiento a la parte financiera, la ejecución física es la misma.

Limpieza de zona interna de Policlínico. como parte del mantenimiento.





Limpieza de alrededores de Policlínico y Materno Infantil

Siembra de árboles.







Ficha de Proyecto



Operación Fuerza Honduras (Triage Lepaera)

BENEFICIARIOS.

HABITANTES DEL MUNICIPIO DE LEPAERA DPTO. DE LEMPIRA

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA Octubre de 2020

HONDURAS C.A

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Operación Fuerza Honduras (Triage Lepaera)

.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: VIDA MEJOR, SALUD, Emergencia COVID-19

3.- Nombre del Proyecto

Operación Fuerza Honduras (Triage Lepaera)

4.- Ubicación del Proyecto.

El Municipio de Lepaera, está ubicado en la Región Norte del Departamento de Lempira y forma parte de la mancomunidad Puca por estar establecida al pié del Refugio de Vida Silvestre Montaña de Puca, parte importante del corredor biológico en el occidente del país, integrado principalmente por varias áreas protegidas como ser el Parque Nacional Celaque, el Refugio de Vida Silvestre Montaña Verde y la Reserva Biológica de Opalaca. El municipio tiene una extensión territorial de **318.7** kilómetros cuadrados, las elevaciones principales del municipio están entre **550 y 2234** metros sobre el nivel del mar. Con una variedad de micro climas que da la oportunidad de desarrollo de una agricultura muy variada.

El municipio limita por la parte oeste completamente con el Río Jicatuyo, con la limitante que son mínimas las áreas con facilidades de riego y estas áreas están en poder de pocos terratenientes, el resto del área, debido a las

pendientes y condiciones orográficas de los terrenos las condiciones de producción son más limitadas. La Región sur del municipio drena a la parte baja del Río Mejocote a la altura del municipio de Las Flores, por medio de la micro cuenca del Río Yargual, las otras dos micro cuencas importantes son la del Río Jagua y Río Matay que drenan a la Sub Cuenca del Río Jicatuyo por la parte norte del municipio.

Atención a 6100 hogares del municipio de Lepaera

5.- Propósito

Contribuir a mejorar la calidad de salud de las personas del municipio de Lepaera a través de la ejecución del proyecto Operación Fuerza Honduras mediante la creación un Centro de triaje para el control de las personas infectadas por el **COVID-19** en el municipio.

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en el pago de personal médico y de aseo además la compra de mobiliario, equipo de bioseguridad, tanques de Oxígeno, Camas y equipo de Oficina para ser utilizado en la atención a personas con síntomas de COVID-19 en el municipio, el presente proyecto contempla los siguientes componentes:

-) Cotización y compra de mobiliario y equipo
-) Preparación de local e instalación de equipo comprado
-) Supervisión del Centro (Triaje)
-) Levantamiento de ficha con su respectiva firma para rendición de cuentas ante el tribunal Superior de Cuentas.
-) Supervisión de personal de aseo y médicos asignados al centro de triaje.
-) Brindar recomendaciones en cuanto a higiene por parte del Personal de Salud, para evitar en incremento de contagios en el municipio de Lepaera.

7. Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto.**
- **1. Contar con un local completamente equipado para la atención a pacientes infectados con el COVID-19 que cumpla con los requerimientos establecidos por la municipalidad y se ejecute en el tiempo establecido.**

- **2. Contar con capacidades técnicas instaladas** para la atención adecuada de los pacientes.
- **3.- Que el personal asignado les brinde las recomendaciones necesarias a las personas para que se disminuyan los riesgos de contagio.**

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto por parte del Gobierno Central, con un manejo adecuado de fondos de parte de la municipalidad, a través de los diferentes departamentos guiados por el Dpto. de Recursos humanos, Salud Publica, Comisión Ciudadana de Transparencia y de las demás dependencias se hace una inspección de la calidad de los materiales y equipo instalados y de las diferentes actividades realizadas antes, durante y en la finalización del proyecto Operación fuerza Honduras

La verificación que se hace es en base a calidad y cantidad ya que el proyecto va dirigido a las personas con padecimiento o con síntomas del COVID-19 del municipio de Lepaera.

A la vez los técnicos de Salud dan una capacitación a las familias sobre los cuidados que hay que tener antes, durante y después de la Epidemia COVID-19.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente ya se tiene un área de intervención previamente concertada con las fuerzas vivas de las comunidades, involucrando a las iglesias, Juntas de Agua y CODECOS y que ellos conocen mejor la comunidad y las personas que pueden adolecer de algún problema de salud y necesiten el apoyo pronto y oportuno

en el municipio de Lepaera., además es necesario mencionar que en caso que se presenten personas infectadas por el virus se hacen cercos epidemiológicos a través del personal de salud previamente capacitado.

La atención es especial para todas las personas del municipio, pero tomando en cuenta los hogares donde hay personas con discapacidad, Hipertensos, Diabéticos y de la tercera edad de las diferentes comunidades de nuestro municipio

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre

Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: Secretaria de Salud, CEDIS, PMA, gobierno central (programa Mundial de Alimentos) y la Municipalidad

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento el financiador directo es Gobierno Central, CEDIS ,La Municipalidad, su apoyo directo es con la parte administrativa, local, supervisión y monitoreo del proyecto.

Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue Donado por el Gobierno Central y ejecutado por la corporación municipal por la cantidad según transferencia positiva y Ampliacion por la cantidad de **Lps.1,537,226.60** y para el cual a su vez se buscó el apoyo de la Secretaria de Salud para la supervisión, capacitación y entrega de equipo y mobiliario juntamente con la municipalidad. siempre la Comisión ciudadana de Transparencia verificando el proyecto para una mejor utilización de los fondos y el manejo adecuado de los mismos

Estado Actual del Proyecto.

Este es un proyecto continuo, se le está dando el seguimiento apoyando todo el municipio de Lepaera atendiendo la mayor parte de la población del municipio ya que nadie esta exento de padecer del Virus COVID_19 .

En estos momentos el proyecto Fuerza Honduras lleva una ejecución de un **17.53%**

Con el proyecto de emergencia COVID_19 se puede agregar que el logro en la compra e instalación de equipo es muy significativo ya que influye grandemente en la atención de las personas, específicamente de la tercera edad, hipertensos, diabéticos, asmáticos y otras tomando también como base las familias de escasos recursos del municipio de Lepaera.

Costo de finalización Proyectado

Costo Total: Lps.1,537,226.60

Vigente: Lps. 1,537,226.60

Pagado: L. 269,409.26

Pendiente a Ejecutar: Lps.1,267,817.40

Fecha de finalización

Diciembre de 2020 segunda Etapa

11.Ejecución Del Proyecto

12.Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En estos momentos ya se pagó el personal de aseo y médicos y a la vez se realizaron las compras de mobiliario, Oxígeno, Pruebas Rápidas, Camas etc. Y otros enseres que son necesarios para el funcionamiento del centro de atención a pacientes con el Coronavirus denominado (TRIAJE) los cuales en estos momentos ya están en su respectivo lugar y por la gracia de Dios no ha sido necesario darle en lo que se refiere al oxígeno y las camas ya que las personas que han salido infectadas, se les administra el tratamiento y se manda a aislarse a sus casas, y se capacita para seguir los lineamientos en cuanto a las condiciones de vida seguridad recomendadas por SINAGER y la secretaria de Salud.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planificó para ejecutarse en un lapso de tiempo que se desconoce su tiempo de culminación en vista que la enfermedad anda en el ambiente y entre más las personas acatan las recomendaciones,

menos será la propagación y así de esa manera no se tendrán inconvenientes a nivel del municipio.

Por parte de la comisión de Transparencia, la cual verifica el estado de los productos y equipo de oficina y sobre la atención a los pacientes, estos con el objetivo de realizar transparentemente el proceso de manejo de los fondos utilizados.

La Municipalidad a la vez está supervisando el proyecto permanentemente, en vista que, aunque ya se han manejado fondos para la Pandemia, no significa que no pudiesen surgir problemas que afecten el buen uso del equipo y demás insumos entregados y la idea esa que se le este dando una buena atención a los pacientes y a la vez que el equipo adquirido sea el correcto. ya que no se debe jugar con la salud de los habitantes del municipio de Lepaera.

Es necesario dar a conocer que ya se estan brindando informes a la Oficina de acceso a la información Publica OIP para una mejor transparencia.

13. Variación en el costo total del Proyecto.

Si como en todo proyecto hay variaciones, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia no es muy grande, en vista que se habían presupuestado en el aporte municipal según Ampliacion y transferencia positiva existe la cantidad Vigente de **Lps. 1,537,226.60** y existe un monto ejecutado de **Lps.269,409.26**

Monto Solicitado:

Costo de finalización Proyectado

Costo Total: Lps.1,537,226.60

Vigente: Lps. 1,537,226.60

Pagado: L. 269,409.26

Pendiente a Ejecutar: Lps.1,267,817.40

Fecha de finalización

Diciembre de 2020 segunda Etapa

14. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Existe variación en cuanto a la fecha de finalización del proyecto en si ,la parte financiera si se le puede colocar fecha de culminacion de presupuesto ,pero la parte física en lo que se refiere a la utilización del equipo comprado no se puede mencionar fecha fija porque a diario aparecen nuevos casos de COVID-19 ,lo mejor en todo esto es que estos casos no son graves es decir como para tener que dejarlos internos , además en cuanto a cómo se está llevando a cabo la parte financiera, el equipo comprado ya fue ubicado en el lugar asignado por la Municipalidad

En todo proyecto siempre existen variaciones e inconvenientes y en este caso es en cuanto al abastecimiento de equipo, ya que no trajeron todo de un solo


Podemos decir que se está ejecutando el proyecto de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para la fuente financiera que está apoyando, cumpliendo cada organización participante con lo que se le encomendó desde el inicio hasta la etapa en que se encuentra el proyecto actualmente.

15. Razones de los cambios antes mencionados. En los proyectos siempre hay inconvenientes por los cuales se puede interrumpir un proyecto en el tiempo previsto. Entre estas limitantes encontramos las siguientes:


1.- Lentitud en cuanto a la compra de los equipos seleccionados

2.- Los proveedores no cuentan con todo el equipo en tiempo y forma.

Área de Intervención.

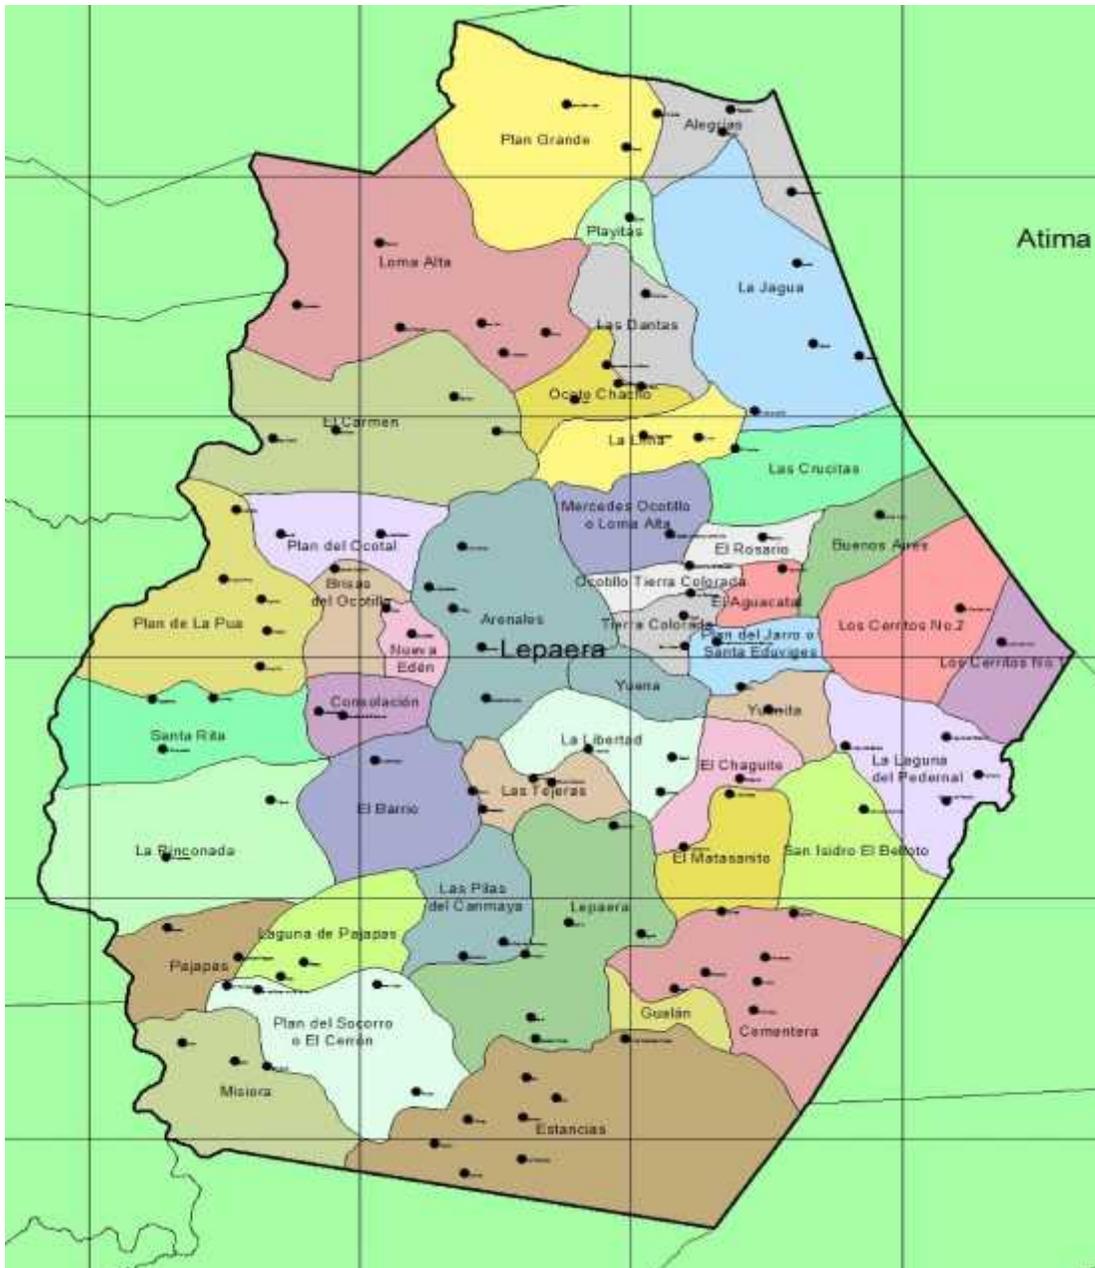

Fotografias del Avance del Proyecto









MUNICIPALIDAD DE LEPAERA, LEMPIRA



NOMBRE DEL PROYECTO

Construcción de Biblioteca en Escuela 14 de Julio de la comunidad de Lagunas del Pedernal

BENEFICIARIOS.

HABITANTES DE LA ESTANCIA, LEPAERA, LEMPIRA

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA octubre de 2020

HONDURAS C.A

FICHA DE PROYECTO

CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA 14 DE JULIO DE LAGUNAS DEL PEDERNAL

Identificación del Proyecto

Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo

1. Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social

2. Nombre del Proyecto

Proyecto de Construcción de Biblioteca en escuela 14 de Julio de la comunidad de Lagunas del Pedernal

3. Ubicación del Proyecto.

Lagunas del Pedernal , Municipio de Lepaera a 12 Kmtrs del Casco Urbano

4. Propósito

Mejorar las condiciones para que los niños, niñas y jóvenes aumenten los niveles de lectura en la escuela 14 de Julio de la comunidad de Lagunas del Pedernal , través de la adquisición de una Biblioteca Pública para la consulta de información

Descripción del Proyecto.

El presente proyecto consiste en la construcción de una Biblioteca Publica Virtual en la Escuela de la comunidad de Lagunas del Pedernal, municipio de Lepaera Dpto. de Lempira, para los pobladores de esta comunidad es un avance en infraestructura y elevar el grado de cultura en los pobladores para que no pierdan el habito a la lectura tanto para los visitantes como para los vecinos de la comunidad

Es necesario mencionar que el proyecto se ejecutara con fondos de Plan en Honduras, y con fondos municipales mediante transferencia a la municipalidad, la comunidad aporta la mano de obra calificada y el terreno,

El presente proyecto consta de sala principal, recepción, sala de cómputo, sala para biblioteca,. Estos proyectos no son posibles sin el apoyo de la municipalidad, obteniendo los materiales y mano de obra del municipio. Dicho proyecto se desarrollara de la siguiente manera, construcción de:

General. Módulo de biblioteca de 200 mtrs cuadrados x 4.85 metros de altura. Realizando las siguientes actividades:

- 1.- Adecuación de terreno, trazar, marcar y nivelar.
- 2.-Excavacion, cimentación y dados de concreto.
- 3.-Construccion de columnas, castillos, soleras inferiores y superiores.
- 4.-Contruccion de paredes de bloque y vigas reforzado con tabiques
- 5.-Contruccion de contrafuerte de concreto armados de 0.15 x0.50 centímetros.
- 6.- Construcción de loza de loza de concreto
- 7.- Colocación de techo de alucín según plano.
- 8.-Contruccion de Redes hidrosanitarias, fluviales, griferías y accesorios.
- 9.- Instalación eléctrica, iluminación y estructurado
- 10.- acabado de elementos, soleras, vigas y columnas.
11. Acabado de Contrafuertes y Jardín según planos.
- 12.-Repellos, pulidos y pintado en general.
- 13.-Nivelacion y firmes de concreto
- 14.- Pegado de cerámica y molduras, según plano.
- 15.- acabado interiores, divisiones y sanitarios.
- 16.-exteriores, fundición de aceras y cerámicas antiderrapantes.
17. limpieza general.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto.

Para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, es necesario el involucramiento de toda la población de la comunidad de Lagunas del Pedernal, que son aproximadamente **1076 habitantes y 184 viviendas** que son los beneficiarios directos del proyecto. Se realizaron varias reuniones para hacer conciencia a la población que el Municipio necesita promover la mejora educativa y cultural contando a la vez con áreas de recreación y para realizar

labores meramente educativas para los visitantes y mismos habitantes de la comunidad

La comunidad y la municipalidad de Lepaera ha sido la que brinda el terreno y otros fondos tanto municipales como transferencias del Gob. Central.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. Esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad. A la vez mantener la zona limpia contando con sus respectivos depósitos de basura, vigilancia permanente para que no se dañe la vegetación.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Dpto. Municipal de Catastro y La UMA de Lepaera Hizo verificación de terrenos, en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se daña Terrenos, Viviendas y bosque natural

En la parte legal ya se hizo los tramites respectivos los beneficiarios se les solicita su apoyo para visitar a los dueños de terrenos por donde pasara el proyecto, en este caso servicio de servidumbre.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara Castro, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión. Teléfono No. 9807-2593, 2655-50-90 Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com, Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira.

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: Plan en Honduras, Gobierno de la Republica, Municipalidad.

11.Presupuesto del Proyecto.

El Año 2018 se presupuestó por medio de la Municipalidad para la ejecución.

12.Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre de 2019

13. Estado del Proyecto actual.

El proyecto Construcción de Biblioteca está en su etapa de inicio, solamente se cuenta con el terreno y con evidencias de la puesta de la primera piedra, la Municipalidad en estos momentos solo ha depositado el 50% de la cantidad acordada.

14.Costo de finalización Proyectado

Costo Total Primera Etapa:

Aporte Municipal:

Costo Total: Lps. 200,000.00

Ampliación: **Lps.0.00**

Transferencia Positiva: **Lps.200,000.00**

Transferencia Negativa: **Lps. 0.00**

Vigente: Lps. **200,000.00**

Pagado: Lps.100,000.00

Pendiente a Pagar: 100,000.00

Con material Local:

Arena, grava piedra

Fecha de finalización proyectada:

Diciembre de 2020

15.Ejecución Del Proyecto

16.Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 7 meses por la dimensión del proyecto a ejecutar.

De lo planificado apenas se ha ejecutado en un **50% hasta este mes de octubre**

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad Transferencia Positiva por la cantidad de **Lps.200,000.00 ,Vigente Lps.200,000.00**

Variación en el costo total del Proyecto.

No Hay variación en cuanto a la fecha de culminación de la obra física, ya que apenas el proyecto está en su etapa inicial.

No ha existido variación en cuanto al costo y la ejecución del proyecto, ya que en estos momento ya esta finalizado y todo se ejecutó de acuerdo a lo planificado, el proyecto varia en cuanto a avance presupuestario pero en la obra Físico de la obra Solamente que lo que refleja el porcentaje de ejecución es el movimiento financiero nada más, En la ejecución física lleva a un **100 %** ya culminado y equipado el proyecto.

Aporte Municipal:

Costo Total: Lps. 200,000.00

Transferencia Positiva: **Lps.200,000.00**

Transferencia Negativa: **Lps. 0.00**

Vigente: Lps. **200,000.00**

Pagado : Lps 100,000.00

Pendiente a Pagar: Lps.100,000.00

Con material Local:

Arena, grava piedra

Fecha de finalización proyectada:

Diciembre de 2020

17.Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Por el momento no ha existido variación en cuanto al alcance y duración del proyecto ya que no se ha iniciado el proyecto, la Municipalidad solo ha brindado una parte del aporte acordado ,se espera en el mes de Diciembre la obra física ya esté terminada , equipado y en funciones; es necesario mencionar que todos los materiales y mano de obra estaban a disposición inmediata en el municipio. El proyecto ya tiene un avance considerable de manera satisfactoria para la municipalidad porque se dio un aporte, pero para la fuente financiera externa no porque esta parada la obra en mención, en lo que respecta al proyecto, ambas partes se han portado a la altura cumpliendo cada organización participante con lo que se le encomendó hasta la etapa donde se encuentra el proyecto en este momento ya finalizado.(solo puesta de la primera piedra y firmado el convenio)

18.Razones de los cambios antes mencionados.

No han existido cambios solamente por el momento ya que la obra solo se ha puesto la primera piedra y firmado el convenio de apoyo económico.

A continuación, este es el avance del proyecto. Solamente foto de la puesta de la primera piedra.

ANEXOS FOTOGRAFICOS:

Puesta de la primera piedra.





Ficha de Proyecto



Construcción de Jardín de Niños Zenobia Rodas La Estancia, Lepaera, Lempira

Lepaera, Lempira Octubre de 2020

Honduras Centro América



Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Jardín de Niños
Zenobia Rodas, La Estancia, Lepaera.

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal
Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Jardín de niños Zenobia Rodas de la Estancia

4.- Ubicación del Proyecto.

La Comunidad de La Estancia se encuentra ubicada a 6 Km de la cabecera municipal.

5.- Propósito

Mejorar las condiciones Educativas de los niños y niñas que asisten al Centro educativo Zenobia Rodas de la comunidad de La Estancia Centro, Lepaera.

6.- Descripción del Proyecto.

El proyecto consiste en la Construcción de un Jardín de Niños la cual mide 8 M X 6 m cada una, la estructura es de mampostería de bloque R.P.P, con columnas y vigas de concreto 3000 psi, con acero de refuerzo #3 longitudinalmente y #2 en estribos, cimentación de mampostería con concreto ciclópeo 70% piedra y 30% concreto, estructura de techo con canaleta y Aluzinc.

A través de la Sociedad de Padres de Familia, alumnos y maestros, han gestionado el Proyecto ante diferentes organizaciones Gubernamentales y no gubernamentales como ser: CEDIS, Gob. Central,SGJD y UCSEL y CEPROD y hasta la fecha ya se obtuvo respuesta tanto del aporte municipal como se SGSJD, quien en 2018 se le presentó la solicitud, la cual a su vez fue presentada a la corporación Municipal, quedando aprobado para ser ejecutada entre el 2019-2020.

Es necesario dar a conocer que la Municipalidad por no contar con fondos suficientes para cubrir el costo Total del Proyecto en este momento, mencionaron que el proyecto se ejecutará más rápidamente en vista que se obtuvieron fondos.

En la medida sean depositadas las transferencias se construirá y al mismo tiempo la Municipalidad menciona que está dispuesta a apoyar con la otra contraparte la cual puede ser en Mano de Obra Calificada (**50%**) Proporcionar los materiales Locales como ser: Piedra, Arena y Grava, el acarreo de los mismos. Hasta el momento la obra está en proceso de ejecución no se ha terminado la obra física y no se ha terminado de cancelar en su totalidad el proyecto. hasta el momento ya el proyecto tiene avance físico de un 45% y se le seguirá dando el avance para poder utilizar el centro educativo en un tiempo corto.

Es necesario mencionar que debido a la pandemia COVID 19 el proyecto se discontinuó por un periodo de 3 meses, pero hasta hace poco se le ha dado el seguimiento a dicho proyecto.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

Para la ejecución del presente proyecto Inicialmente se realizaron varias reuniones en donde a su vez se elaboraron varias solicitudes, esto para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto , que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser Recolección de información para la Ejecución del presente proyecto, construcción de Plantel, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede a informar a la sociedad de padres de familia ,maestros y alumnos como beneficiarios directos para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras preliminares .

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección del terreno donde se está construyendo la obra, o se harán las mejoras para verificar que no sean destruida la vegetación esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la construcción no se haga en una zona de riesgo. En este caso ya se hicieron los tramites de legalización porque este fue un terreno que la municipalidad adquirió y ya se legalizo.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente ya la comunidad cuenta con un terreno en trámites de legalización, este terreno se encuentra ubicado en un lugar que reúne las condiciones básicas como ser: Agua Potable, electrificación.

10.- Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros.

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: SGJD, Plan en Honduras, FHIS, CEPROD y Municipalidad,

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando SGJD y Municipalidad, apoyando con la mano de Obra Calificada y materiales locales como ser: Piedra, Grava y Arena. Para la ejecución del Proyecto, esas actividades a realizar con Fondos propios y fondos provenientes de las transferencias. Es necesario dar a conocer que a la vez los padres de familia apoyan con la mano de obra local.

10. Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal y para el cual a su vez se inició con la ejecución y a la vez los beneficiarios Directos también firman constancias de Aporte para la ejecución del proyecto.

11. Estado del Proyecto actual.

En este momento está en proceso de Construcción, ya las paredes estan a nivel con su respectivo techo, faltan puertas ,ventanales ,se debe mejorar el apagaviento y el piso ,a la vez los modulos sanitarios, este proyecto se descontinuo desde Marzo dichas actividades se esperaba estuvieran listas ya en el mes de septiembre. pero no fue posible, en estos momento se retomó el proyecto.

12. Costo de finalización Proyectado

Costo Total: Lps.434,987.75

Ampliacion Lps.284,987.75

Transferencia Positiva Lps.150,000.00

Vigente: Lps.434,987.75

Devengado: Lps.74,900.00

Ejecutado: Lps. **74,900.00**

Pendiente a Ejecutar: **Lps.360,087.75**

Fecha de finalización proyectada

Abril 2020, pero se amplió a septiembre debido a la pandemia COVID-19

13. Ejecución Del Proyecto

14. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 4 meses por la SGJD y la Municipalidad por la dimensión del proyecto a realizarse y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la fuente financiamiento como ser: SGJD, **la Municipalidad y la comunidad.**

Observaciones: el proyecto se detuvo por un periodo de tres meses y medio, pero es necesario mencionar que el proyecto lleva un avance un poco lento siempre debido a la pandemia COVID-19 y al fenómeno tropical ETA que afecto grandemente a nuestro municipio.

Variación en el costo total del Proyecto.

Si como en todo proyecto hay variaciones, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia es un poquito amplio por el momento, en vista que se habían presupuestado en el aporte municipal **Lps. 434,987.75** y devengado la cantidad de **Lps.74,900.00** solo se ha ejecutado hasta la fecha **L.74,900.00** pero los pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal.

Monto Solicitado:

Costo Total: Costo Total: **Lps.434,987.75**

Ampliacion **Lps.284,987.75**

Transferencia Positiva **Lps.150,000.00**

Vigente: **Lps.434,987.75**

Devengado: **Lps.74,900.00**

Ejecutado: Lps. **74,900.00**

Pendiente a Ejecutar: **Lps.360,087.75**

Fecha de finalización proyectada

Abril 2020,pero se amplió para Septiembre debido a la pandemia COVID-19

Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Por el momento si existen variaciones en lo que va del proyecto hasta donde se ha ejecutado ya que se detuvo el proyecto en el mes de Marzo por la Pandemia, pero está a nivel de techo, quedando pendiente las ventanas, puertas, piso , apaga viento y modulos sanitarios.

Por lo demás en la parte financiera el proyecto se está ejecutando de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para los beneficiarios directos es decir la comunidad ambas se estan portando a la altura cumpliendo cada organización participante con los que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización.

15. Razones de los cambios antes mencionados.

Por el momento no han existido cambios que se consideran muy relevantes , pero si se hicieron observaciones al momento de la supervisión ya que falta el apaga viento, puertas, ventanales y modulo sanitario y a la vez también podemos decir que el clima

afecto ya que es un factor externo que no se puede evitar, también por el acarreo de materiales se tuvo un poquito de problema ya que la comunidad en donde se ubica el proyecto el terreno es un poco difícil, en el municipio de Lepaera lo cual dificulta la entrada de vehículo en época de lluvia.

ANEXOS

Fotografías. Ya casi a nivel de solera.







**Municipio de Lepaera
Departamento de Lempira**

**NOMBRE DEL PROYECTO:
Mantenimiento y reparación de carreteras del Municipio de Lepaera en el
Dpto. de Lempira**

**UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Varias Comunidades del Municipio de **Lepaera, Lempira.****



**ORGANIZACIÓN PROPONENTE Y RESPONSABLE:
La Municipalidad de Lepaera, Lempira
Email: lepaera2006@yahoo.com**



Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Mantenimiento y reparación de carreteras del Municipio de Lepaera en el Dpto. de Lempira

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Vial

3.- Nombre del Proyecto

Reparación de tramo Carretero Comunidades del Municipio de Lepaera

4.- Ubicación del Proyecto.

Las Comunidades en donde se realizarán las reparaciones se encuentran ubicadas en comunidades del municipio de Lepaera específicamente de **12 a 25 Km** del Casco Urbano (se adjunta mapa del Municipio)

5.- Propósito

Garantizar la seguridad de las personas que transitan las carreteras ubicados en las comunidades del Municipio de Lepaera, a través del acceso de fondos que puedan garantizar la Construcción y Rehabilitación de carreteras dañados principalmente en época de invierno.

6.- Descripción del Proyecto.

Este proyecto consiste en la reparación de vías de acceso de comunidades del Municipio de Lepaera abarcando **200** Kilómetros de carretera que sirven de acceso a la carretera que conduce a las comunidades de las siguientes Rutas: **Ruta No.1** Tierra Colorada De Ocotillo Hacia Mercedes Pecaneras. **Ruta 3: D Tierra Colorada Hacia el Aguacatal** **Ruta No.4** Plan de los Robles, Consolación, Santa Rita, Plan de la Púa, Brisas del Ocotillo y Plan del Ocotil de Lepaera **Ruta No.5.** de Tejeras, El Carmen, Las Dantas, Los Chiles, Playitas, plan Grande, Alegrías, Regadillos , Coros a Unirse a Jagua. **Ruta No.6** de Lepaera, Tejeras, Plan de los Robles Hasta Rinconada. **Ruta No.7** de las Pilas, Plan del

Socorro Concluyendo en Misiora., Ruta No.8 de Lepaera, hacia Gualan Concluyendo en Cementera. Ruta No.9 De las Pilas Hacia Laguna de Pajapas. Ruta No.10 De chagüite hacia Yuenita, Ruta No.11;De Loma Alta ,El Corcho terminando en corrales.

Ruta N.12 Del Cañal hasta la Colonia San José. Ruta No.13 de San Matías hasta Yuena, Ruta No.14.del Rosario hacia Buenos Aires, Ruta No.15.de las Crucitas, hacia la Lima Ruta No.16 de Tejeras, El Barrio, Salida a Arenales.

La ruta que se está mejorando en este momento es la ruta N. 2, la cual lleva muy buen avance.

A estos mismos tramos carreteros se les da mantenimiento siempre por estar en condiciones deterioradas ya sea por los fuertes inviernos que azotan la zona o porque son muy transitadas y que además de eso no se les ha dado el mantenimiento adecuado por la falta de recursos por lo cual en la actualidad está completamente deteriorada dificultando así el tránsito de personas y los productos de esa zona. En la actualidad urge la reparación de estas carreteras para poder restablecer la comunicación - con la ejecución de este proyecto se estarán beneficiando unos **21,000** habitantes aproximadamente (Directamente) y **6,000** que indirectamente usan diariamente estas vías de comunicación para el traslado de sus bienes de consumo, personas que transitan caminando y los productos que ellos producen. La modalidad para la reparación de este proyecto será con mano de obra comunitaria y así beneficiar a **60** Familias por un espacio de dos meses aproximadamente.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

Iniciando el proyecto la corporación municipal se reúne y discuten sobre las rutas que se repararan, seguidamente se socializa el proyecto con los beneficiarios de los proyectos dándoles a conocer sus responsabilidades. Donde a su vez se elaboraron notas de solicitud, esto para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto , que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser: Preparación de maquinaria , Recolección de información para llevar a cabo el presente proyecto, además se solicita la copia de la cedula de cada una de las personas que realizan el trabajo para elaboración de Planillas, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede a informar a los líderes comunitarios y habitantes de las comunidades como ser

beneficiarios directos para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras preliminares como ser: chapia de calles, Bacheo y cuneteo.

8. Impacto Ambiental.

El presente proyecto por ser un proyecto de infraestructura por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección de la zona donde se realizarán las reparaciones, o se harán las mejoras para verificar que no sean destruida la vegetación esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la reparación no se haga en una zona de riesgo sea donde haya viviendas que puedan quedar a la deriva. En este caso no fue necesario porque ya existe una brecha y ya se conoce perfectamente la zona y no existe ningún problema.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Se toma como base para verificación de las zonas a reparar el mapa del municipio en donde aparecen todas las comunidades a intervenir para un mejor control, para la ejecución del presente ya se cuenta con una guía proporcionada por los directivos de cada una de las comunidades a beneficiar. Y a la vez ya se cuenta con los permisos respectivos, en caso de que fuese necesario. No se afecta ningún terreno en todo el trayecto del proyecto.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre

Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros
La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Mauricio Avalos

Mancomunidad Puca

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: SOPTRAVI Municipalidad, Fondo Vial y FONDO CAFETERO NACIONAL.

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo el principal financiador es la Municipalidad, ya sea con fondos propios o fondos provenientes de las transferencias ya que cuenta con su propia maquinaria, a la vez brinda su aporte El Fondo Cafetero las comunidades beneficiarias apoyan con la Chapia, Bacheo, cuneteo y con la alimentación de las personas que operan la maquinaria a utilizar.

11. Presupuesto del Proyecto.

Antes de iniciar el proyecto es presentado a la corporación municipal, en donde se define el presupuesto.

El presupuesto para el presente Proyecto que asciende a la cantidad de **Lps. 2,150,000.00** que es la cantidad aprobada por la Corporación Municipal. A los beneficiarios Directos que también se les socializa el Proyecto dándoles a conocer las actividades que tiene que realizar como comunidad.

Estado del Proyecto actual.

En este momento el proyecto ya se está ejecutando en un **17.42 %** correspondiente al mes de octubre.

Se espera su continuidad., ya que es fundamental darle seguimiento para que las carreteras primarias y algunas brechas no se deterioren y se alcance el nivel deseado.

12. Costo de finalización Projectado

Costo Asignado: **Lps. 2,150,000.00**

Costo Total: **L. 2,150,000.00**

Ejecutado: **L. 374,544.00**

Falta por ejecutar: L.1,775,456.00

fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2020

13. Ejecución Del Proyecto

14. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo de un año por ser un proyecto que hay ocasiones se vuelve complicado su realización especialmente en época de Lluvia y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la **Municipalidad**. Esta información se estará enviando más periódicamente según el proyecto lleve un avance muy significativo como es el caso de la ejecución de este tipo de proyecto que al **100%** no están concluidas las carreteras reparadas pero que si el siguiente año se le da continuidad por lo cual en ese momento ya se tiene idea clara del costo real del proyecto, ya que lo que se solicitó no se compara con lo que ya se Ejecutó aunque no es muy significativa la diferencia

Es necesario dar a conocer que proyecto está siendo auditado permanentemente por el tribunal superior de cuentas, De parte del dpto. De Contabilidad también presenta un informe económico cada fin de mes para llevar un mejor control de los proyectos ya sea sociales, productivos y otros a ejecutarse en el Municipio de Lepaera.

15. Variación en el costo total del Proyecto.

Las variaciones han existido como en todo proyecto, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia no es muy grande, en vista que se habían presupuestado en el aporte municipal según asignación municipal la cantidad de **Lps. 2,150,000.00** y se ha ejecutado hasta la fecha **L. 374,544.00** pero los pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal.

12. Costo de finalización Proyectado

Costo Asignado: **Lps. 2,150,000.00**

Costo Total: **L. 2,150,000.00**

Ejecutado: **L. 374,544.00**

Falta por ejecutar: L.1,775,456.00

Fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2020

16. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

En este momento no hay variaciones, pero en este tipo de proyecto siempre hay variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto en vista que se tiene planificado para terminar de 12 meses tiempo máximo todas las actividades del proyecto, pero casi siempre por las condiciones climáticas de la zona y por la parte de la municipalidad que se le dificulta mover la maquinaria a la zona

Lo que se verifica en estos momentos es que al proyecto se le ha dado continuidad de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para la comunidad, ambas se han portado a la altura cumpliendo cada una con lo que se le ha encomendado en tiempo y forma.


17. Razones de los cambios antes mencionados.

En estos momentos no han existido cambios por el momento, pero como mencione anteriormente hubo algunos cambios pero que se consideran muy relevantes para este tipo de proyecto como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar, también por actividades como ser chapia de calles, bacheo y cuneteo si hay lluvia se dificulta, lo cual retrasa grandemente el proyecto lo cual dificulta la entrada de vehículo en época de lluvia. A la vez la labor de los que operan la maquinaria también se detiene.

ANEXOS

-- Fotografía (mapa y fotos de calles reparadas)

-Reparación de Tramo Carretero en Comunidades del Municipio de Lepaera

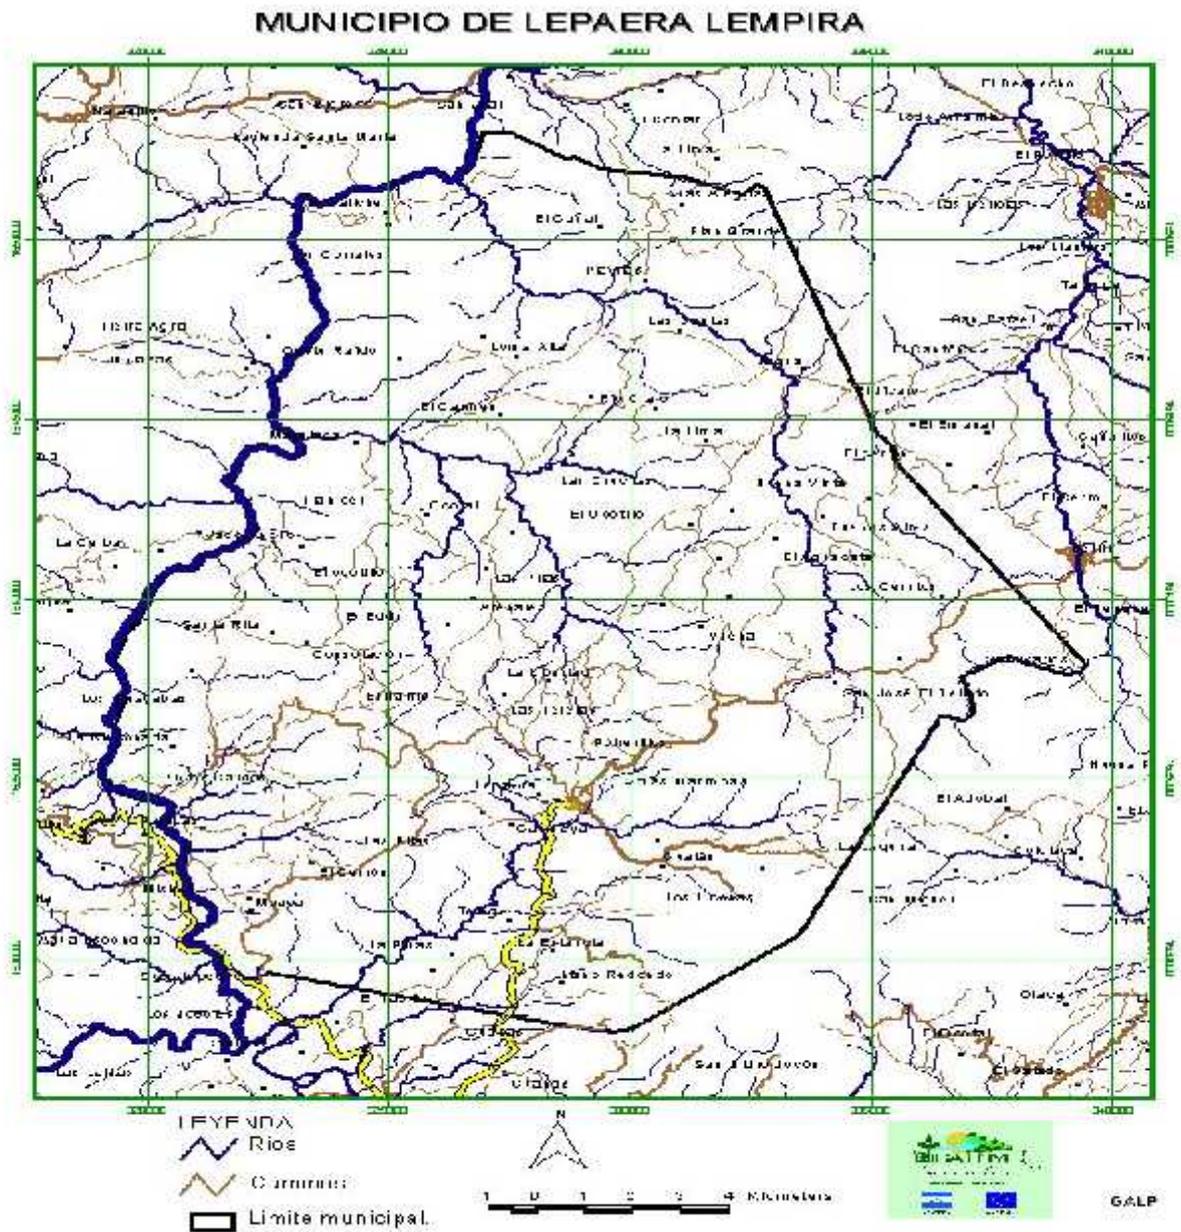

INFORME FOTOGRAFICO























Municipalidad de Lepaera, Lempira



Nombre del Proyecto

Iluminación de Campo de Fútbol en la comunidad de Tejeras

BENEFICIARIOS.

HABITANTES DE TEJERAS

Solicitado A:

LEPAERA, LEMPIRA

HONDURAS C.

octubre de 2020

Ficha de Proyecto

Iluminación de Campo de Futbol en la comunidad de Tejeras.

1. Identificación del Proyecto

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal
Edgar Antonio Murillo

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social

3.- Nombre del Proyecto

iluminación en Campo de Futbol en la comunidad de Tejeras

4.- Ubicación del Proyecto.

Tejeras, municipio de Lepaera, Dpto. de Lempira a 6 Km del casco Urbano

5.- Propósito

Mejorar la iluminación del Campo de Futbol en la comunidad de Tejeras, Lepaera y así crear condiciones más seguras para la práctica del Deporte sanos en sus diferentes áreas para alejar a los jóvenes de los vicios que dañen su salud física y mental.

6.- Descripción del Proyecto.

El Proyecto Consiste en la iluminación de un Campo de Futbol en Tejeras, Lepaera en donde se realizaran las siguientes actividades: acarreo de postes y otros materiales hacia la comunidad, hincado de postes por parte de los beneficiarios y el ing. electricista que marco los lugares en donde se colocarían ,colocación de transformadores, cableado, colocación de transformadores, ya anteriormente se habían realizado otras actividades

propias de la construcción del campo como ser: es la Nivelación del Terreno para la Construcción de este proyecto, para esto se empleó maquinaria municipal posteriormente se preparara el material necesario y equipo para la Construcción de la cancha.

Tomando en cuenta lo anterior, es que la municipalidad de Lepaera ha tomado la iniciativa de la ejecución de un proyecto tan importante como ser : La iluminación del campo de futbol , contando con todo el apoyo necesario para desarrollar este trabajo.

7. Elaboración del Proyecto

- Alcance del Proyecto.

- El Municipio de Lepaera ya cuenta con varios campos de futbol pero no todos están iluminados y al mismo tiempo existen zonas que no cuentan con estos sitios de recreación que son tan indispensables para los niños, jóvenes y adultos y los que existen ya están deteriorado y merece realizar una buena reparación

El presente proyecto es necesario por las siguientes razones:

- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
- Se crean fuentes de empleo ,lo que redundo en la economía de las familias del municipio
- Mejora las condiciones de recreación y convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad.
- Aleja del vicio a la juventud del municipio de Lepaera.
- Mejora la autoestima de los habitantes del municipio.
- Por lo anteriormente expuesto la alcaldía tiene planificado la ejecución del proyecto y para llevar a cabo esta obra pendiente de ejecutar, es necesario llevar a cabo una serie de actividades como ser:
- Levantamiento de Estudio de Proyecto.
- Cotización de mano de Obra calificada.
- Recolección y acarreo de material Local como ser: Piedra, Arena y grava.
- Inicio de la obra.
- Supervisión, monitoreo y seguimiento de la obra.
- Entrega de la obra ya culminada.

Para llevar a cabo dichas actividades es necesaria la participación de los vecinos de la comunidad de Tejeras que se beneficia directamente , y de muchos aficionados que están interesados en que la obra se

concluya. Lógicamente que la municipalidad es la principal responsable de la buena ejecución de la obra en mención.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, distribución del cuerpo de agua, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad a través de la Oficina de Catastro y La Unidad Municipal de medio Ambiente de Lepaera Hizo verificación de la zona en donde se harán las respectivas construcciones (Iluminación de Campo de Fútbol en Tejeras Lepaera), en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar a través de las visitas si no se dañan Terrenos, u otras áreas que se consideren de mucha importancia.

Por ser directamente la municipalidad la que ejecuta ella se encarga directamente de contratar las personas que llevaran a cabo el proyecto.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, Jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: **FHIS, Gobierno Central, Beneficiarios directos y Municipalidad**

De las Fuentes financieras mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando Municipalidad, Gobierno Central,

manejados por la Municipalidad

Presupuesto del Proyecto.

El Año **2018** se inició por medio de la Municipalidad, manejando el siguiente presupuesto:

Aporte Municipal: Presupuestado Lps.475,000.00

Con material Local = si es necesario.

Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Noviembre de 2020 pago financiero de la obra (Junio de 2019 estructura Fisica)

11. Estado del Proyecto actual.

En este momento ya está finalizada su obra física

Ya que estaba listo todo el material, la parte financiera no está pagada todavía.

12. Costo de finalización Proyectado

Aporte Municipal: Presupuestado. **Lps. 475,000.00**

Devengado: **Lps.225,000.00**

Pendiente a pagar **Lps. 250,000.00**

Fecha de finalización proyectada

Ya esta finalizada la obra física del proyecto se continuara posteriormente con el campo de futbol. Como ser: Reconstrucción de Campo de Futbol en un periodo no mayor de tres meses calendario, por lo que se estima que este mes de Noviembre tendría avanzados los trabajos.

13. Ejecución Del Proyecto

14. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 3 meses por ser un proyecto que no requiere de mucho trámite legal, ni de la compra de terrenos o materiales tan sofisticados en vista que los materiales a utilizar los provee el ing. electricista que es el encargado de la obra lo cual facilita la ejecución de la obra (dicho ing. cotiza y compra los materiales eléctricos)

De lo planificado ya se tiene un avance de un **47.37 % en esta etapa**, lo que es muy significativo y lo importante es que se está realizando conforme a lo planificado porque siempre existen algunos contratiempos, pero no de mucha relevancia como ser el Clima, que ha estado bastante lluvioso, lo que hacía bastante difícil el avance de la obra física. Pero al final se concluyó dicha obra quedando pendiente la parte financiera.

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps. 475,000.00** devengado tiene la cantidad de **Lps.225,000.00** y pagado la cantidad de **Lps. 225,000.00**. Quedando por ejecutar la cantidad de **Lps.250,000.00**

15. Variación en el costo total del Proyecto.

Siempre existen variaciones en los proyecto y esté presento algunos cambios en la parte presupuestaria ya que el proyecto se ejecutó en un **47.37%** quedando pendiente un **52.63%** y en este caso no influye, porque ya se ejecutó la parte física como es un proyecto que se está ejecutando sin parar, el presupuesto está en ejecución, se presentara una especie de informe por parte de la Oficina de Contabilidad porque es un porcentaje mínimo y lo que existen son facturas sin liquidar.

Monto Solicitado:

Aporte Municipal: Presupuestado. **Lps. 475,000.00**

Devengado: **Lps.225,000.00**

Pendiente a pagar **Lps. 250,000.00**

Fecha de finalización proyectada

Ya está finalizada la obra física del proyecto se continuará posteriormente con el campo de futbol. Como ser: Reconstrucción de Campo de Futbol en un periodo no mayor de tres meses calendario, por lo que se estima que este mes de noviembre tendría avanzados los trabajos

En el mes de junio 2019 se terminaron la mayor parte de los trabajos en lo que corresponde a la estructura física de la obra.

16. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Siempre hay variaciones en cuanto al alcance y duración del proyecto en vista que se tenía planificado para terminar en tres meses tiempo máximo, pero se tardó más de esta fecha en lo que corresponde a esta primer etapa, esto siempre por factores que dificultan darle continuidad a los proyectos y concluirlos en el tiempo previsto y además siempre por las condiciones climáticas de la zona

Está concluida la mayor parte de la obra electrica, de una manera satisfactoria tanto para la municipalidad como para los beneficiarios, ambas se portaron a la altura cumpliendo con lo que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización.

17. Razones de los cambios antes mencionados.

Como mencione anteriormente hubieron algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se

puede evitar y en época de lluvia se torna difícil darle continuidad a los proyectos. Pero aun así se logró el propósito. De iluminación del campo de futbol.

Fotos Adjuntas: Solo iluminación

Anexos:







**Municipio de Lepaera
Departamento de Lempira**



NOMBRE DEL PROYECTO:
Pavimentación y Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano de Lepaera en el Dpto. de Lempira

UBICACIÓN DEL PROYECTO:
Barrio Centro y barrio San Juan de Lepaera, Lempira.

ORGANIZACIÓN PROPONENTE Y RESPONSABLE:
La Municipalidad de Lepaera, Lempira
Email: lepaera2006@yahoo.com

Ficha de Proyecto

1. Identificación del Proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO: Pavimentación y Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano.

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal

Edgar Antonio Murillo Cruz

2.- Sector o Sub sector

Sector: Infraestructura Social (componente Vial)

3.- Nombre del Proyecto

Pavimentación y Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano

4.- Ubicación del Proyecto.

El municipio de Lepaera se encuentra ubicado al norte del departamento de Lempira en el occidente de Honduras C. A. El proyecto se pretende realizar en los diferentes barrios que se ubican en el Casco Urbano.

5.- Propósito

Mejorar las Condiciones viales del Municipio a través de la pavimentación y Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano de Lepaera para brindarle mayor seguridad a los transeúntes que a diario circulan por la ciudad.

6.- Descripción del Proyecto.

Este proyecto consiste en la construcción de **150** Metros Lineales de Calle, **1400 mtrs** cuadrados de pavimento desarrollado de la siguiente manera: construcción de **0.60** centímetros de ancho, reconstrucción de bordillo de cemento, reconstrucción de adoquinado , siguientes: 1.60 x 1.60 metros cuadrados., calle que inicia en frente a farmacia de Dr. José Neftalí Pérez y culmina Banco Atlántida de Barrio Centro , este proyecto se necesita porque ya paso la vida útil del mismo y hay

mucho bache y en invierno se dificulta el tránsito para los pobladores ya que podrán tener una mejor comunicación y fácil tránsito para los pobladores que a diario circulan esta zona, es necesario mencionar que ya cuenta con un buen porcentaje de calles pavimentadas durante años anteriores. Y ya se tiene B.V de la Corporación Municipal para darle seguimiento en el presente año 2020 -2021 a este tipo de proyecto.

En la actualidad urge la pavimentación de estas carreteras para poder restablecer la comunicación - con la ejecución de este proyecto se estarán beneficiando unos **60 familias directamente y 1500 habitantes** que indirectamente usan diariamente estas vías de comunicación para el traslado de sus bienes de consumo , La modalidad para Construcción de este tramo será con mano de obra comunitaria y así beneficiar a **20 Familias** por un espacio de **3 meses** o según sea la duración del proyecto en mención., ya que cada ruta tiene su duración respectiva eso depende de la cantidad de metros a ejecutar y así mismo se realizan los pagos.

7. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto.

La mayoría de municipios de lempira enfrentan problemas de infraestructura de las calles municipales debido a las fuertes tormentas, los barrios y colonias son los que sufren las consecuencias debido a que no puede haber comunicación, el invierno copioso causo severos daños a red vial de la zona urbana el cual destruye dichas calles.

Con esta modalidad **Pavimentación y Reconstrucción de calles en el Casco Urbano** buscamos mejorar la comunicación del Barrio el Centro, Barrio Delicias, San Juan y a los diferentes barrios que tiene el municipio de Lepaera lempira el cual incorporaremos a la población a las actividades de mejora y rehabilitación de sus vías de acceso además generar empleo temporal para aquellas familias que se encuentran en rango de pobreza.

Para iniciar el proceso de llenado de perfil de Proyecto, que conlleva seguidamente a la ejecución de una serie de acciones como ser Recolección de información para llevar a cabo el presente proyecto, una vez recibida la notificación de aprobación del proyecto se procede a informar a la población de Lepaera como ser: beneficiarios directos para que comiencen a organizarse y a la vez realizar las obras

preliminares. Pero el ejecutor directo es la Municipalidad que es quien contrata el personal especializado para este tipo de proyecto.

8. Impacto Ambiental.

El presente proyecto por ser un proyecto de infraestructura por parte de la municipalidad, a través del dpto. De catastro y de la unidad de Medio ambiente se hace una inspección de la zona donde se ejecutará el proyecto de pavimentación para verificar que no sean destruida las áreas verdes esto para que no sea dañado el medio ambiente y a la vez para verificar que la pavimentación no se haga en una zona de riesgo sea donde haya viviendas que puedan quedar a la deriva o donde ya está el proyecto de alcantarillado. Ya que si no existe un alcantarillado Sanitario no es posible ejecutar el proyecto.

Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente ya se cuenta con la supervisión directa del Ing. de la Mancomunidad Puca en donde se define claramente que no hay problemas con alguna propiedad ya que la ruta a pavimentar son calles establecidas y bien definidas por el dpto. De catastro. Y a la vez ya se cuenta con los permisos respectivos, en caso de que fuese necesario.

9. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: Municipalidad de Lepaera, Lempira

Ing. Francisco Lara.

Gerente de la Mancomunidad Puca

Cel. 9451-4754

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: FHIS, SOPTRAVI Municipalidad, Fondo Vial y FONDO CAFETERO NACIONAL.

De las Fuentes financieras antes mencionada hasta el momento solo el principal financiador es FHIS y la Municipalidad, ya sea con fondos propios o fondos provenientes de las transferencias ya que cuenta con su propia maquinaria, a la vez cuando son reparación y mantenimiento de carreteras brinda su aporte El Fondo Cafetero, el comité de desarrollo Comunal **CODECO** y beneficiarios apoyan con el cuneteo y con la alimentación de las personas que operan la maquinaria a utilizar.

10. Presupuesto del Proyecto.

El presente proyecto fue presentado a la corporación municipal, se realizaron las respectivas cotizaciones., y luego de su análisis se procedió a la elección de la cotización mas baja.

El proyecto fue aprobado en reunión de Corporación Municipal con la presencia de representantes de la comisión Ciudadana de Transparencia, que siempre están presentes en cualquier reunión que se realiza en la municipalidad.

Estado del Proyecto actual.

En este momento el proyecto ya está en proceso de ejecución en un **19.06%** en su aporte financiero en lo que va del mes de octubre un **95%** ejecución física. Es necesario mencionar que falta pavimentar varias calles del casco urbano, pero por falta del sistema de Alcantarillado en algunas zonas por el momento no se realizó conforme a lo aprobado.

Costo de finalización Proyectado

Costo Total Municipal: **Lps.0.00**

Transferencia Positiva: **Lps.148,260.00**

Vigente: **Lps. 439,494.99**

Devengado: **Lps. 83,780.00**

Ejecutado: **L.83,780.00**

Pendiente a ejecutar: **Lps.355,714.99**

Fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2020

11. Ejecución Del Proyecto

12. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse en un periodo no mayor de 3 meses (físico), por ser un proyecto que no es muy complicado realizarse y por los trabajos previos a ejecutarse y a la vez para cumplir con los requisitos solicitador por la **Municipalidad**. Podemos mencionar que hasta donde esta según ruta ejecutada ha sido muy buen avance, es decir que el proyecto está acorde a lo planteado en el contrato mpal , lógicamente existen variaciones, pero no de mucha relevancia, el proyecto en mención se planifico a ser concluido en el mes de Diciembre de 2020 más que todo la parte financiera. no se pudo concluir especialmente la parte financiera porque debido a la pandemia COVID-19 se paró el proyecto por un lapso de 3 meses, pero ya está logrando su conclusión y Lógicamente el presupuesto ya estaba aprobado. al inicio del proyecto no se pudo entregar el informe a la fecha porque no se ha concluido la obra en su totalidad y los materiales se pagan en las ferreterías al crédito y hasta que es pagado el último fondo se puede dar un reporte claro de lo invertido.es necesario mencionar que el proyecto este mes se culminó la obra física, pero falta el aporte financiero.

Variación en el costo total del Proyecto.

Las variaciones han existido como en todo proyecto, en cuanto a lo solicitado con lo ejecutado, en este tipo de proyecto la diferencia en este periodo es muy grande ya que se tenía que ejecutar **Lps.439,494.99** según transferencia positiva y ampliación y se devengo: **Lps. 83,780.00** y se ejecutó **Lps.83,780.00**

quedando pendiente de ejecutar **Lps: 355,714.99** Este es de acuerdo al avance el cuales muy significativo. Pero los pagos se seguirán dando hasta llegar al aporte acordado en reunión de Corporación Municipal. Ya que es un proyecto que continúa. Y el costo es muy elevado.

Monto Solicitado:

Total, del proyecto Pavimentación y Reconstrucción de calles en el casco Urbano que inicia en frente a farmacia del dr. José Neftalí Pérez y culmina en la esquina de Banco Atlántida, otro tramo que inicia esquina opuesta al kínder José Trinidad Cabañas y culmina frente al Costado opuesto a la casa Cural

Costo Total Municipal: **Lps.0.00**

Transferencia Positiva: **Lps.148,260.00**

Vigente: **Lps. 439,494.99**

Devengado: **Lps. 83,780.00**

Ejecutado: **L.83,780.00**

Pendiente a ejecutar: **Lps.355,714.99**

Fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2020

13. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Existieron algunas variaciones en cuanto a la fecha de finalización y la parte técnica, como son calles que son muy transitadas , lo cual dificulta grandemente, debido al tráfico constante porque es zona comercial pero fueron resueltas de manera satisfactoria entre el maestro de obra e ing. a cargo del proyecto, habilitando una calle primero y luego se trabajaría en la otra via. en cuanto a la duración hubo variaciones ya que la exigencia era que se debía terminar unos tramos en un periodo 4 meses , pero si se ha cumplido en la construcción de un tramo y ya se lleva avance el parte del tramo #1, podemos decir que si se cumplió en periodo todas las actividades relacionadas con el proyecto, algo que afecto un poco fueron las condiciones climáticas de la zona y por el ingreso de la Pandemia COVID-19 al país ya que afecto para el depósito de las trasferencias a la municipalidad.

El proyecto lleva un avance que es de mucha satisfacción para la municipalidad como para los habitantes del casco urbano, y es necesario mencionar que la municipalidad ha cumplido con los pagos hasta la etapa en que el proyecto se encuentra actualmente, porque, aunque bien es cierto de la lentitud en los pagos estos no se retrasan mucho, porque de ello depende la continuidad del proyecto.

Razones de los cambios antes mencionados.

Como mencione anteriormente hubo algunos cambios pero que no se consideran muy relevante como ser: El Clima que es un factor que no se puede evitar que afecto en el sentido que al haber lluvia se detienen los proyectos., pero fue en un tiempo corto. Ya que no se puede posponer mucho tiempo. Hubo variación también en cuanto al pago de la obra física ya que esta se paga conforme ingresan las transferencias a la municipalidad.

ANEXOS.

-- Fotografías Proyecto Pavimentación y Reconstrucción de Calles en Casco Urbano.

Informe Fotográfico.



















Ficha de Proyecto

CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DEL ESTADIO JUAN ORLANDO HERNANDEZ EN LEPAERA.

1. Identificación del Proyecto

1.- Encargado de la ejecución del proyecto

Alcalde Municipal
Edgar Antonio Murillo

2.- Sector o Sub sector

Sector: DEPORTES (Infraestructura Social)

3.- Nombre del Proyecto

Construcción de Adiciones y Mejoras del Estadio Juan Orlando Hernández

4.- Ubicación del Proyecto.

Tocoro, municipio de Lepaera, Dpto. de Lempira

5.- Propósito

Contribuir al mejoramiento de Las Instalaciones deportivas del Estadio municipal de Lepaera, a través de ampliación y reformas a la infraestructura física y así crear condiciones para la práctica del Deporte en sus diferentes áreas.

6.- Descripción del Proyecto.

En la ejecución de esta etapa del proyecto consiste en la realización de las siguientes actividades:

Realización de diferentes actividades en el estadio entre ellas el darle mantenimiento a la Grama, pagando un personal permanente para eso también se está realizando el acondicionamiento y reparación de pintura de graderías y techado de la misma

Todas estas actividades antes descritas se han realizado en las instalaciones del Estadio Municipal

Tomando en cuenta lo anterior, es que la municipalidad de Lepaera ha decidido darle continuidad a este proyecto tan importante, contando con todo el apoyo necesario para desarrollar este trabajo. todas estas actividades se realizan dependiendo la necesidad.

7. Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto.**
- En este momento estamos reportando continuidad del proyecto adiciones y mejoras del Estadio Juan Orlando Hernández en el Municipio de Lepaera, es necesario mencionar que en el mes de Julio quedaron pendientes muchas deficiencias, por lo cual se le dará continuidad para que estas instalaciones den una funcionalidad de calidad.
- El presente proyecto es necesario por las siguientes razones:
- Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.
- Se crean fuentes de empleo, lo que redundará en la economía de las familias del municipio
- Mejora las condiciones de recreación y convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad.
- Aleja del vicio a la juventud del municipio de Lepaera.
- Mejora la autoestima de los habitantes del municipio.
- A través de los fondos que se generan por cobros de entrada a los espectáculos deportivos se pueden ayudar a financiar el deporte. Ya que el municipio cuenta con un equipo de fútbol de segunda división. Aunque en estos momentos debido a la pandemia COVID-19 el equipo se desintegra.
- Por lo anteriormente expuesto la alcaldía tiene planificado la ejecución de esta segunda Etapa del Proyecto y para llevar a cabo esta obra, es necesario llevar a cabo una serie de actividades como ser:
 - Levantamiento de deficiencias del proyecto
 - Cotización de materiales en las ferreterías locales.

- Cotización de mano de Obra calificada.
- Recolección y acarreo de material Local como ser: Piedra, Arena y grava. en caso de ser necesario
- Inicio de la obra.
- Construcción de varias estructuras incompletas en este caso graderías, módulos sanitarios, camerinos etc.
- Supervisión, monitoreo y seguimiento de la obra.
- Entrega de la obra ya culminada.

Para llevar a cabo dichas actividades es necesaria la participación de los socios del equipo de futbol denominado Lepaera FC , y de muchos aficionados que están interesados en que la obra se concluya. Lógicamente que la municipalidad es la principal responsable de la buena ejecución de la obra en mención.

8. Impacto Ambiental.

Con el presente proyecto se ha levantado una ficha de Registro Biofísica y Socioeconómica de la localidad, en donde se describen características del medio como ser: Tipo de suelo, Pendientes del Terreno, distribución del cuerpo de agua, Vulnerabilidad del terreno, cantidad de árboles etc. esto para asegurar que el proyecto se construirá en una zona que reúna las características ambientales de calidad.

9. Impacto en terreno y asentamientos.

Para la ejecución del presente Proyecto la Municipalidad atravez de la Oficina de Catastro y La Unidad Municipal de medio Ambiente de Lepaera Hizo verificación de la zona en donde se harán las respectivas construcciones, en vista que para llevar a cabo el proyecto se tiene que comprobar atravez de las visitas si no se daña Terrenos, u otras áreas que se consideren de mucha importancia.

Por ser directamente la municipalidad la que ejecuta ella se encarga directamente de contratar las personas que llevaran a cabo el proyecto.

10. Detalles del Encargado del Proyecto /Nombre Completo, Números Telefónicos, Correo electrónico, entre otros

La encargada del proyecto en mención es: María Rosandra Lara, jefe de la Unidad Técnica de Gestión

Teléfono No. **98072593, 2655-50-90**

Correo Electrónico: lara.gestion2016@yahoo.com

Sede: **Municipalidad de Lepaera**, Lempira

Fuentes de Financiamiento.

Se cuenta con un banco de Fuentes de Financiamiento para este tipo de proyecto que damos a conocer a continuación: **FHIS, Gobierno Central, Beneficiarios directos y Municipalidad**

De las Fuentes financieras mencionada hasta el momento solo ha estado funcionando Municipalidad, Gobierno Central manejados por la Municipalidad.

11. Presupuesto del Proyecto.

Según la municipalidad de Lepaera se maneja el siguiente presupuesto:

Transferencia Positiva; Lps.150,000.00

Vigente: Lps.150,000.00

Devengado: Lps. 13,385.00

Pagado Lps. 13,385.00

Pendiente a ejecutar: Lps.136,615.00

Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.

Diciembre de 2019

12. Estado del Proyecto actual.

En este momento ya está en proceso de Construcción (mantenimiento de Grama, ya que en estos momentos se le ha dado un avance significativo, específicamente en la parte financiera siempre habrá otras áreas del estadio pendientes, pero son de menor importancia, más que todo detalles. pero si es necesario mencionar que el informe que se presenta en este perfil la parte financiera y física.

13. Costo de finalización Proyectado

Transferencia Positiva; Lps.**150,000.00**

Vigente: Lps.150,000.00

Devengado: Lps. 13,385.00

Pagado Lps. 13,385.00

Pendiente a ejecutar: **Lps.136,615.00** Con material Local =arena, grava piedra en caso de ser necesario

Fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2020

Se tiene programado concluir con el presente trabajo específicamente en el Estadio en un periodo de 12 meses calendario, por lo que se estima que el mes de **diciembre de 2020** se tendría concluidos los trabajos en un **100%**.

14. Ejecución Del Proyecto

15. Relación de lo Planificado con los productos entregados de manera trimestral.

En relación con lo planificado debo mencionar que el proyecto se planifico para ejecutarse de manera continua porque es un proyecto municipal y además por ser un proyecto que no requiere de mucho trámite legal, ni de la compra de materiales tan sofisticados ya que los materiales a utilizar se encuentran en la zona.

De lo planificado ya se tiene un avance de un **19.82 % en lo que va del mes octubre (estructura Fisica)** del aporte General, pero del aporte

devengado se ha ejecutado en un **19.82% del mes de Octubre (presupuestaria)** ya que en cuanto a proyecto es el avance que tiene, ya que no se ha pagado en la ferretería los materiales a medida que se vaya ejecutando este presupuesto se ira reportando, pero solo la parte financiera, pero no en si la obra física. Siempre existen otro tipo de contratiempos, en este caso fue el Clima, que estuvo bastante lluvioso, lo que hacía bastante difícil el avance de la obra física. El proyecto se pretende se concluirá esta etapa el segundo semestre del 2020.

En cuanto a la inversión financiera la Municipalidad en su presupuesto tenía la cantidad de **Lps.150,000.00** Devengado la cantidad de **Lps. 13,385.00** de esta cantidad solamente se ha pagado la cantidad de **Lps. 13,385.00** quedando por ejecutar la cantidad de Lps.136,315.00 pero en obra física es poco el avance, este fondo restante por pagar será desembolsado en la medida que vengán las transferencias.

Variación en el costo total del Proyecto.

Siempre existen variaciones en los proyecto y esté presento algunos cambios en la parte presupuestaria ya que el proyecto se ejecutó en un **23.36% del mes de Julio y un 19.82% en el mes de Octubre** quedando pendiente un **56.82%** y en este caso no influye, como es un proyecto que se está ejecutando conforme llegan las transferencias, el presupuesto está en ejecución, siempre conforme los pagos de la obra se presentara otro perfil, cuando ya se conozcan la cantidad de fondos invertidos.

Monto Solicitado:

Transferencia Positiva; Lps.50,000.00

Vigente: Lps. 150,000.00

Devengado: Lps. 13,385.00

Pagado Lps. 13,385.00

Pendiente a ejecutar: Lps.136,615.00

Con material Local =arena, grava piedra en caso de necesitarse.

Fecha de finalización proyectada

Diciembre de 2020

16. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto.

Por el momento no hay ninguna variación porque este proyecto está todavía en ejecución, en caso de concluirse antes del tiempo programado se dará a conocer, aunque siempre hay algo nuevo que construir o reconstruir es este tipo de proyecto.

Esta etapa ya se está avanzando, de una manera satisfactoria en la parte financiera y física, quedando pendiente una buena cantidad de la parte financiera. La municipalidad y los beneficiarios, ambas se han portado a la altura cumpliendo con lo que se les encomendó desde el inicio hasta la finalización.

17. Razones de los cambios antes mencionados.

En la parte financiera queda pendiente el pago de fondos por parte de la municipalidad, pero no se han realizado ningún tipo de cambio.

Anexos: el informe fotográfico: Se presentan fotografías de la parte del estadio que ha sido mejorado el engramillado, chapia y recorte de maleza. y también se muestra parte de la infraestructura del

lugar





