



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

NOTIFICACION DEL PROYECTO

A solicitud de la oficina de la información pública OIP, sobre las ejecuciones y contrataciones de diversos proyectos por medio de los diferentes medios de contratación, se detalla en la tabla siguiente el avance del proyecto construcción de dos Aula y un Módulo Sanitarios, en el instituto Técnico Rafael Pineda Ponce

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	Constructora INGENIUM
Sector	Norte del municipio de Cane.
Nombre del proyecto	"Proyecto construcción de dos Aula y un Módulo Sanitarios, en el instituto Técnico Rafael Pineda Ponce
Ubicación del proyecto	Casco urbano del municipio "ITRPP"
Descripción del proyecto	El proyecto comprende actividades como, excavación, Zapata corrida, instalación de bloque de 8", 4", repello, pulido de paredes columnas 20x20 cm, solera superior de 20x20cm entabicado, instalación de techo con canaleta de 2x4" instalación de servicios sanitarios.
ELABORACIÓN DEL PROYECTO	
Alcance del proyecto(principal de proyecto)	Este proyecto beneficiara a 429 alumnos de esta institución educativa, ya que se hace insuficientes para determinadas carreras recibir clases en las aulas existentes.
Impacto ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y asentamiento	No aplica
Detalle del encargado del proyecto	Constructora INGENIUM
Fuente de financiamiento	Alcaldía municipal, AMHOM, GOBERNACION.
Presupuesto del proyecto	Lps. 1064,723.48
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Junio 2019
Estado actual del proyecto	Ejecutado en un 100%
Costo de finalización del proyecto	Lps. 1064,723.48
Fecha de finalización	30 Diciembre 2020
EJECUCIÓN DEL PROYECTO	




LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
E-mail: municane@yahoo.com
www.municane.org

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	NO APLICA
Variación en el costo total del proyecto	NO APLICA
Variación en el alcance de duración del proyecto.	Se dio una ampliación de tiempo a causa de la pandemia covi-19

Para los fines que el interesado estime conveniente se firma la presente notificación a los 04 días del mes de FEBRERO del año 2021




Fernando Martínez Ávila
Desarrollo comunitario/proyectos



Honduras, C.A.

CANE, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2021

Hora : 09:10 a.m.

USUARIO: CARMEN.NOLASCO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12920

L.: 96,793.40

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9216

Fecha de Emisión: 21/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YESSICA DEL SOCORRO MEDINA CLAROS

Id/RTN: 1201198500481

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de la tercera estimación del Proyecto construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Rafael Pineda Ponce. este pago es contraparte municipal y devolución de la garantía.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 007 000 001 47110 11-001-01	Transferencias por medio de la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización y AMHON para el Proyectos de construcción de 2 aulas y módulos sanitarios en el Instituto Rafael Pineda Ponce.	96,793.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	96,793.40
Monto Total:		96,793.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	96,793.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	96,793.40



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No:

0s+jsf9Jmcy/LQ2MdGUp2WogY2A990m3-EWZbt1yPBDJSTJTNHtX/e7rg6v7BoxqUNU8S96hAcBCKsp5CO63wTpCiZyRTUbrXi8yWLRWUXY0zf+FGqF3I/+c
NvzqinGPjIK54N1ApmAggKCBNxcEhTA2Qj

CONSTRUCTORA
INGENIUM
S de RL

E-mail.: constructoraingenium@hotmail.com

R.T.N.: 12049995434017 Constancia. de Registro. de Exonerados. _____

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03911965011686 Tels.: 9952-2967/2771-8063, Cel.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comay.

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

TOTAL A PAGAR L

No. 000-001-01-00



ESTIMACIÓN

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANE, LA PAZ

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS DE AULAS DE 7X8 Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE
 UBICACIÓN: CASCO URBANO DE AULAS DE 7X8 Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE
 EJECUTOR: CONSTRUCTORA INGENIUM S. DE R.L.
 ESTIMACIÓN: NUMERO TRES
 PERIODO DEL: 02/11/2020 HASTA 05/12/2020 33.00 DÍAS



No	PRESUPUESTO DE OFERTA		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO EN ESTE PERIODO		TOTAL ACUMULADO	
	CONCEPTO						CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO
A.- ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1	Limpieza de terreno		M2	480.00	L 20.00	L 9,600.00	480.00	L 9,600.00	0.00	L -	480.00	L 9,600.00
2	Trazado y marcado		ML	162.64	L 19.40	L 3,155.22	162.64	L 3,155.22	0.00	L -	162.64	L 3,155.22
	SUB.- TOTAL (LPS)					L 12,755.22		L 12,755.22		L -		L 12,755.22
B.-EXCAVACIÓN Y RELLENOS												
3	Excavación para cimientos en suelo semiduro		M3	50.72	L 195.93	L 9,988.29	50.72	L 9,988.29	0.00	L -	50.72	L 9,988.29
4	Relleno con material selecto		M3	47.17	L 573.00	L 27,028.41	47.17	L 27,028.41	0.00	L -	47.17	L 27,028.41
	SUB.- TOTAL (LPS)					L 37,016.70		L 37,016.70		L -		L 37,016.70
C.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS												
5	Cimientos de mampostería (0.70x0.50)m, (0.30x0.50)m, en corredor (0.30x0.20)m en acera		M3	7.56	L 1,670.90	L 12,632.00	7.56	L 12,632.00	0.00	L -	7.56	L 12,632.00
6	Zapata corrida de 0.60x0.20m de concreto 1:2:2.5 #3. #3@0.20m		ML	60.00	L 473.32	L 28,399.20	60.00	L 28,399.20	0.00	L -	60.00	L 28,399.20
7	Sobre-elevación de bloque 8" #3@orificio. #3@3 hiladas		M2	48.00	L 1,139.46	L 54,694.08	48.00	L 54,694.08	0.00	L -	48.00	L 54,694.08
8	Solera inferior (5-1) de15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con #4#3 y anillos #2 @ 20 cms.		ML	60.00	L 269.70	L 16,182.00	60.00	L 16,182.00	0.00	L -	60.00	L 16,182.00
9	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con #4#3 y anillos #2 @ 20 cms		ML	41.40	L 331.90	L 13,740.66	41.40	L 13,740.66	0.00	L -	41.40	L 13,740.66
10	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con #4#3 y anillos #2 @ 20 cms		ML	24.70	L 371.32	L 9,171.60	24.70	L 9,171.60	0.00	L -	24.70	L 9,171.60
11	Bordillo de concreto 1:2:4 e=10 cms		ML	27.90	L 136.26	L 3,801.65	27.90	L 3,801.65	0.00	L -	27.90	L 3,801.65
12	Solera superior (5-2)15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con #4#3 y anillos #2 @ 20 cms.		ML	28.00	L 271.27	L 7,595.56	28.00	L 7,595.56	0.00	L -	28.00	L 7,595.56
13	Solera superior (5-3)20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con #4#3 y anillos #2 @ 20 cms.		ML	40.96	L 357.30	L 14,635.01	40.96	L 14,635.01	0.00	L -	40.96	L 14,635.01
14	Solera voladizo (5-6)20x25 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con #2#5, #4#3, anillos #2@20cms.		ML	4.56	L 498.33	L 2,272.38	4.56	L 2,272.38	0.00	L -	4.56	L 2,272.38
15	Batiente liso bajo ventanas (B-1) (10x15) cms con #2#3 con alacranes #2 @ 20 cms		ML	10.50	L 184.01	L 1,932.11	10.50	L 1,932.11	0.00	L -	10.50	L 1,932.11
16	Batiente con pestaña bajo ventanas (B-2) (10x15) cms con #2#3 con alacranes #2 @ 20 cms		ML	13.20	L 184.01	L 2,428.93	13.20	L 2,428.93	0.00	L -	13.20	L 2,428.93
17	Cargador (17x15) de concreto 1:2:2 reforzado con 3 #3 y anillos #2@0.20m		ML	2.40	L 239.64	L 575.14	2.40	L 575.14	0.00	L -	2.40	L 575.14
18	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones		M2	143.30	L 347.81	L 49,841.17	143.30	L 49,841.17	0.00	L -	143.30	L 49,841.17
19	Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera		M2	50.62	L 215.55	L 10,911.14	0.00	L -	50.62	L 10,911.14	50.62	L 10,911.14
	SUB.- TOTAL (LPS)					L 228,812.63		L 217,901.49		L 10,911.14		L 228,812.63
20	Pared reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:5		M2	162.84	L 964.72	L 157,095.00	162.84	L 157,095.00	0.00	L -	162.84	L 157,095.00
21	Entablado de bloque 6" h=22cms, mortero 1:5, incluye repello y pulido		ML	28.00	L 230.19	L 6,445.32	28.00	L 6,445.32	0.00	L -	28.00	L 6,445.32
	SUB.- TOTAL (LPS)					L 163,540.32		L 163,540.32		L -		L 163,540.32
D.- REPELLOS Y REVOQUES												
22	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms,		M2	325.68	L 275.88	L 89,848.60	325.68	L 89,848.60	0.00	L -	325.68	L 89,848.60
23	Repello de elementos de L=0.25m mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 1:1 e=0.25cms,		ML	86.00	L 87.91	L 7,560.26	86.00	L 7,560.26	0.00	L -	86.00	L 7,560.26
24	Repello de elementos de L=0.20m, mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 1:1 e=0.25 cms,		ML	82.80	L 64.97	L 5,379.52	82.80	L 5,379.52	0.00	L -	82.80	L 5,379.52
25	Repello de elementos de L=0.15m , mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms,		ML	175.38	L 64.24	L 11,266.41	175.38	L 11,266.41	0.00	L -	175.38	L 11,266.41

26	Repello de elementos de H=0.17m, mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	4.80	L	64.23	L	308.30	4.80	L	308.30	0.00	L	308.30	4.80	L	308.30	100%
27	Repello de elementos de L=0.10m, mortero 1:4 e=2.00 cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	48.40	L	78.24	L	3,786.82	48.40	L	3,786.82	0.00	L	3,786.82	48.40	L	3,786.82	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	118,149.91		L	118,149.91		L	118,149.91		L	118,149.91	100%
	F. CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS																
28	Viga aérea metálica de tubo estructural de 4"x4" L=11.50m con antiorroscivo a dos manos	UNIDAD	2.00	L	864.40	L	1,728.80	2.00	L	1,728.80	0.00	L	1,728.80	2.00	L	1,728.80	100%
29	Techo de cancheta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, antiorroscivo a dos manos	M2	192.95	L	483.91	L	93,370.43	192.95	L	93,370.43	0.00	L	93,370.43	192.95	L	93,370.43	100%
30	Capote para aluzinc color rojo	ML	16.40	L	75.46	L	1,237.54	16.40	L	1,237.54	0.00	L	1,237.54	16.40	L	1,237.54	100%
31	Albante térmico de espuma de polietileno, e=3mm	M2	113.12	L	98.38	L	11,128.75	113.12	L	11,128.75	0.00	L	11,128.75	113.12	L	11,128.75	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	107,465.52		L	107,465.52		L	107,465.52		L	107,465.52	100%
	G. PISOS Y CERÁMICAS																
32	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color gris perla en interiores, incluye fraguado.	M2	107.55	L	512.04	L	55,069.90	107.55	L	55,069.90	0.00	L	55,069.90	107.55	L	55,069.90	100%
33	Moldura de piso terrazo original en interior color gris perla de (30x7) cms. incluye fraguado	ML	55.90	L	153.70	L	8,591.83	55.90	L	8,591.83	0.00	L	8,591.83	55.90	L	8,591.83	100%
34	Piso de ladrillo terrazo original de (30x30) cms. color rojo en exteriores, incluye fraguado.	M2	33.86	L	512.04	L	17,337.67	33.86	L	17,337.67	0.00	L	17,337.67	33.86	L	17,337.67	100%
35	Moldura de piso terrazo original en exterior color rojo de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	10.80	L	153.70	L	1,659.96	10.80	L	1,659.96	0.00	L	1,659.96	10.80	L	1,659.96	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	82,659.36		L	82,659.36		L	82,659.36		L	82,659.36	100%
	H. INSTALACIONES ELÉCTRICAS																
37	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40).	ML	87.02	L	95.89	L	8,344.35	87.02	L	8,344.35	87.02	L	8,344.35	87.02	L	8,344.35	100%
39	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).	ML	41.76	L	58.98	L	2,463.00	41.76	L	2,463.00	41.76	L	2,463.00	41.76	L	2,463.00	100%
39	Suministro e instalación de interruptor sencillo bajo repello	UND	4.00	L	205.86	L	827.44	4.00	L	827.44	4.00	L	827.44	4.00	L	827.44	100%
40	Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello	UND	6.00	L	230.08	L	1,380.48	6.00	L	1,380.48	6.00	L	1,380.48	6.00	L	1,380.48	100%
41	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2 x 40 watts	UND	12.00	L	920.04	L	11,040.48	12.00	L	11,040.48	12.00	L	11,040.48	12.00	L	11,040.48	100%
42	Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1 x 40 watts	UND	2.00	L	425.68	L	851.36	2.00	L	851.36	2.00	L	851.36	2.00	L	851.36	100%
43	Centro de carga de 6 espacios	UND	2.00	L	2,135.50	L	4,271.00	2.00	L	4,271.00	2.00	L	4,271.00	2.00	L	4,271.00	100%
44	Mufa de 2"	UND	2.00	L	162.75	L	325.50	2.00	L	325.50	2.00	L	325.50	2.00	L	325.50	100%
45	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	UND	2.00	L	190.14	L	380.28	2.00	L	380.28	2.00	L	380.28	2.00	L	380.28	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	29,883.89		L	29,883.89		L	29,883.89		L	29,883.89	100%
	J. PUERTAS Y VENTANAS																
46	Puerta metálica troquelada de 1.20 x 2.10m	UND	2.00	L	5,323.95	L	10,647.90	2.00	L	10,647.90	2.00	L	10,647.90	2.00	L	10,647.90	100%
47	Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica	M2	36.84	L	1,762.76	L	64,940.08	36.84	L	64,940.08	36.84	L	64,940.08	36.84	L	64,940.08	100%
48	Balcones metálicos de ángulo y varilla lisa de 1/2"	M2	36.84	L	872.12	L	32,128.90	36.84	L	32,128.90	36.84	L	32,128.90	36.84	L	32,128.90	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	107,716.88		L	107,716.88		L	107,716.88		L	107,716.88	100%
	K. PINTURA																
49	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	396.80	L	72.13	L	28,621.18	396.80	L	28,621.18	396.80	L	28,621.18	396.80	L	28,621.18	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	28,621.18		L	28,621.18		L	28,621.18		L	28,621.18	100%
	L. OBRAS FINALES																
50	Limpeza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3	M3	30.00	L	127.32	L	3,819.60	30.00	L	3,819.60	30.00	L	3,819.60	30.00	L	3,819.60	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	3,819.60		L	3,819.60		L	3,819.60		L	3,819.60	100%
	TOTAL MODULOS DE AULAS					L	920,441.21		L	920,441.21		L	920,441.21		L	920,441.21	
	A. ACTIVIDADES PRELIMINARES																
51	Limpeza de terreno	M2	36.90	L	8.90	L	328.41	36.90	L	328.41	0.00	L	328.41	36.90	L	328.41	100%
52	Trazado y marcado	ML	46.35	L	19.40	L	899.19	46.35	L	899.19	0.00	L	899.19	46.35	L	899.19	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	1,227.60		L	1,227.60		L	1,227.60		L	1,227.60	100%
	B. EXCAVACIÓN Y RELLENOS																
53	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	3.61	L	170.52	L	615.58	3.61	L	615.58	0.00	L	615.58	3.61	L	615.58	100%
54	Relleno con material selecto	M3	2.71	L	573.00	L	1,552.83	2.71	L	1,552.83	0.00	L	1,552.83	2.71	L	1,552.83	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					L	2,168.41		L	2,168.41		L	2,168.41		L	2,168.41	100%

C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS																
55	Cimientos de mampostería (0.30x0.50)m. en corredor,(0.30x0.20)m en acera	M3	0.93	L	1,670.90	1,553.94	0.93	L	1,553.94	0.00	L	-	0.93	L	1,553.94	100%
56	Zapata corrida de 0.40x0.20m de concreto 1:2-2, 3 #3, #3@0.20m	ML	10.30	L	388.08	3,997.22	10.30	L	3,997.22	0.00	L	-	10.30	L	3,997.22	100%
57	Sobre-elevación de bloque 6", #3@0.40m, #3@3 hiladas	M2	4.64	L	825.94	3,832.36	4.64	L	3,832.36	0.00	L	-	4.64	L	3,832.36	100%
58	Solera inferior (S-1) de 15x15 cms, de concreto 1:2:2, reforzado con #43 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	14.95	L	358.26	5,355.99	14.95	L	5,355.99	0.00	L	-	14.95	L	5,355.99	100%
59	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con #43 y anillos #2 @ 20 cms	ML	10.80	L	331.90	3,584.52	10.80	L	3,584.52	0.00	L	-	10.80	L	3,584.52	100%
60	Castillo (C-2) de (15x15) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con #43 y anillos #2 @ 20 cms	ML	12.60	L	371.32	4,678.63	12.60	L	4,678.63	0.00	L	-	12.60	L	4,678.63	100%
61	Solera superior (S-2) 15x15 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con #43 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	9.08	L	358.26	3,253.00	9.08	L	3,253.00	0.00	L	-	9.08	L	3,253.00	100%
62	Solera de remate (15x10)m, de concreto 1:2:2 reforzado con 2 #3 y anillos #2@0.20m	ML	9.25	L	177.30	1,640.03	9.25	L	1,640.03	0.00	L	-	9.25	L	1,640.03	100%
63	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@20 cms en ambas direcciones	M2	3.37	L	347.81	1,172.12	3.37	L	1,172.12	0.00	L	-	3.37	L	1,172.12	100%
64	Piso de concreto 1:2:4 reforzada e=10cm #2@ 20 cm para acera	M2	8.70	L	598.82	5,209.73	8.70	L	5,209.73	8.70	L	5,209.73	8.70	L	5,209.73	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					34,277.54	0.00	L	29,067.81		L	5,209.73		L	34,277.54	100%
D- MAMPOSTERÍA																
65	Pared reforzada de bloque de 6"x8"x16" 1 #3@0.60m horizontalmente, mortero 1:3	M2	13.59	L	558.66	7,592.19	13.59	L	7,592.19	0.00	L	-	13.59	L	7,592.19	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					7,592.19		L	7,592.19		L	-		L	7,592.19	100%
E- REPellos Y REVOQUES																
66	Repello de paredes e=2.00 cms, mortero 1:4, pulido 1:1 e=0.25cms.	M2	27.17	L	275.88	7,496.76	27.17	L	7,496.76	0.00	L	-	27.17	L	7,496.76	100%
	Tallado de elementos de L=0.20m	ML	21.60	L	64.97	1,403.35	18.15	L	1,179.28	3.45	L	224.08	21.60	L	1,403.35	100%
	Tallado de elementos de L=0.15m	ML	57.31	L	64.24	3,681.59	0.00	L	-	57.31	L	3,681.59	57.31	L	3,681.59	100%
69	Tallado de elementos de L=0.10m	ML	18.50	L	78.24	1,447.44	0.00	L	-	18.50	L	1,447.44	18.50	L	1,447.44	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					14,029.15		L	8,676.04		L	5,353.11		L	14,029.15	100%
F- CUBIERTAS Y CIELOS FALSOS																
70	Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	10.44	L	483.91	5,052.02	10.44	L	5,052.02	0.00	L	-	10.44	L	5,052.02	100%
	Capote para aluzinc color rojo	ML	3.00	L	75.46	226.38	3.00	L	226.38	0.00	L	-	3.00	L	226.38	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					5,278.40		L	5,278.40		L	-		L	5,278.40	100%
G. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS																
72	Trazado y marcado	ML	13.65	L	19.40	264.81	13.65	L	264.81	0.00	L	-	13.65	L	264.81	100%
73	Excavación para instalaciones hidrosanitarias en suelo semiduro	M3	2.82	L	170.52	480.87	2.82	L	480.87	0.00	L	-	2.82	L	480.87	100%
	Relleno con material selecto	M3	0.80	L	573.00	458.40	0.80	L	458.40	0.00	L	-	0.80	L	458.40	100%
75	Suministro e instalación de tubería de 4" RD-41	ML	10.86	L	99.89	1,084.81	10.86	L	1,084.81	0.00	L	-	10.86	L	1,084.81	100%
76	Suministro e instalación de tubería de 1/2" RD-26	ML	5.84	L	16.23	94.78	5.84	L	94.78	0.00	L	-	5.84	L	94.78	100%
77	Suministro e instalación de tubería de 3/4" RD-26	ML	9.71	L	15.87	154.10	9.71	L	154.10	0.00	L	-	9.71	L	154.10	100%
78	Caja de registro de 65 x 65 x 90 cms.	UND	1.00	L	2,843.81	2,843.81	1.00	L	2,843.81	0.00	L	-	1.00	L	2,843.81	100%
79	Caja de válvula y medidor de 40 x 30 x 40 cms.	UND	1.00	L	1,207.89	1,207.89	1.00	L	1,207.89	0.00	L	-	1.00	L	1,207.89	100%
80	Suministro e instalación de inodoro, incluye accesorios	UND	3.00	L	1,772.75	5,318.25	3.00	L	5,318.25	0.00	L	-	3.00	L	5,318.25	100%
81	Mueble de concreto de 1.20 mts de largo y 0.60 mts de ancho (incluye lavamanos)	UND	1.00	L	7,339.20	7,339.20	1.00	L	7,339.20	0.00	L	-	1.00	L	7,339.20	100%
82	Losa de concreto 1:2:2 de 1.55m x 1.65m para colocar el tanque elevado de e= 10 cms, #3@0.20 m ambas direcciones	M2	2.56	L	919.16	2,353.05	2.56	L	2,353.05	0.00	L	-	2.56	L	2,353.05	100%
83	Suministro e instalación de tanque de polietileno de 750 litros	UND	1.00	L	3,238.50	3,238.50	0.00	L	-	1.00	L	3,238.50	1.00	L	3,238.50	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					24,838.46		L	21,599.96		L	3,238.50		L	24,838.46	100%
H. PUERTAS Y VENTANAS																
84	Puerta de lámina metálica de 0.85 x 1.70mts	UND	1.00	L	3,256.81	3,256.81	0.00	L	-	1.00	L	3,256.81	1.00	L	3,256.81	100%
85	Puerta de lámina metálica de 0.90 x 1.70mts	UND	2.00	L	3,256.81	6,513.62	0.00	L	-	2.00	L	6,513.62	2.00	L	6,513.62	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					9,770.43		L	-		L	9,770.43		L	9,770.43	100%
I. PINTURA																
86	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	12.09	L	72.13	872.05	0.00	L	-	12.09	L	872.05	12.09	L	872.05	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)					872.05		L	-		L	872.05		L	872.05	100%
I. OBRAS ADICIONALES																

87	Suministro e instalación de biodigestor de 1300 lts, incluye accesorios.	UND	1.00	17,844.46	17,844.46	0.00	L	-	1.00	L	17,844.46	1.00	L	17,844.46	100%
88	Tapadera de protección para biodigestor de 1300 lts de 1.50 x 1.50 x 0.45 mts	UND	1.00	4,257.50	4,257.50	0.00	L	-	1.00	L	4,257.50	1.00	L	4,257.50	100%
89	Caja de lodos de 0.80x1.05x0.90 mts	UND	1.00	4,223.19	4,223.19	0.00	L	-	1.00	L	4,223.19	1.00	L	4,223.19	100%
90	Pozo de absorción 4.00 x 1.90 m	UND	1.00	12,460.69	12,460.69	0.00	L	-	1.00	L	12,460.69	1.00	L	12,460.69	100%
91	Limpieza final de áreas exteriores	M2	8.70	8.90	77.43	0.00	L	-	8.70	L	77.43	8.70	L	77.43	100%
92	Excavación de material tipo II	M3	22.59	170.52	3,852.05	0.00	L	-	22.59	L	3,852.05	22.59	L	3,852.05	100%
93	Relleno y compactado suelo cemento	M2	1.84	573.00	1,054.32	0.00	L	-	1.84	L	1,054.32	1.84	L	1,054.32	100%
94	Relleno y compacto de material selecto en tuberías	M3	0.80	573.00	458.40	0.00	L	-	0.80	L	458.40	0.80	L	458.40	100%
	SUB.- TOTAL (LPS)			44,228.04	44,228.04		L	-		L	44,228.04		L	44,228.04	100%
	SUBTOTAL MODULO SANITARIO			144,282.27	144,282.27		L	-		L	144,282.27		L	144,282.27	100%
	COSTO TOTAL DE PROYECTO			1,064,723.48	1,064,723.48		L	-		L	1,064,723.48		L	1,064,723.48	100%

DESCRIPCIÓN	Acumulado Anterior	Pagar
MONTO ESTIMADO		249,624.56
Anticipo		-
Retención por I.S.R.		-
Retención 5% por Calidad de Obra		12,481.21
Retención por Multa		-
Neto a Pagar		237,143.31

SUPERVISOR  FIRMA:	SUPERVISOR MUNICIPAL  FIRMA:	CONTRATISTA  FIRMA:	ALCALDE MUNICIPAL  FIRMA:
NOMBRE: NAHUM ORTEGA FECHA: 5 DICIEMBRE DEL 2020	NOMBRE: LUIS FERNANDO MARTINEZ FECHA: 5 DICIEMBRE DEL 2020	NOMBRE: YESSICA MEDINA C. (CONSTRUCTORA INGENIUM S DE RL) FECHA: 5 DICIEMBRE DEL 2020	NOMBRE: FRANCISCO BUSTILLO FECHA: 5 DICIEMBRE DEL 2020

Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

MANCOMUNIDAD	Informe de estimación avalando estimación	MANSUCOPA-2020
--------------	--	----------------

INFORME DE SUPERVISON DE OBRA

AVALANDO ESTIMACION

Proyecto "CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO EN EL INSTITUTO TÉCNICO RAFAEL PINEDA PONCE".

Nombre del contratista: CONSTRUCTORA INGENIUM

Nombre del supervisor: ING. NAUN ORTEGA

Fecha de presentación del informe: 02/11/2020 AL 05/12/2020

Datos:

1. Ordenes de cambio del periodo entre la anterior y la representación Estimación:
A la fecha no ha existido ninguno orden de cambio
2. Días no trabajados por fuerza mayor:
Todos los días se trabajaron.
3. Contratista/ CONSTRUCTORA INGENIUM
4. Responsable de obra: CONSTRUCTORA INGENIUM

Permanencia en obra	Permanente		Eventuales	Ocasionalmente
Dirección de obra		X		
Relación con la supervisión		X		
Conocimiento de la obra		X		

5. PROGRESO DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO

Cronograma:

Porcentaje ejecutado durante el periodo23.45%

Porcentaje acumulado ejecutado.....100.00%

Estos porcentajes deberán necesariamente estar repartidos por el cronograma de avance de obras vigentes.

Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

Estado financiero de la obra: expresado en avances de físico:

Avance físico previsto durante el periodo.....	23.45%
Porcentaje ejecutado durante el periodo.....	23.45%
Porcentaje acumulado ejecutado.....	100.00%

6. Calidad de los trabajos realizados

Los trabajos realizados por la constructora INGENIUM encargada de la obra, se ejecutan siguiendo los procedimientos estipulados en el contrato mediante la directrices del supervisor.

7. Trabajos de supervisión y modificaciones introducidas al proyecto.

La supervisión a este proyecto se hace constante durante la semana que se está ejecutando la obra de manera que el ejecutor cumpla con las actividades correspondientes a este proyecto estipuladas en el contrato entre el contratante y contratista.

Se verifica que no se encuentren desperdicios producto de los trabajos ejecutados por el contratista de obra antes mencionadas, que provoquen daños a las personas que circulen por los perímetros del proyecto.

En este periodo se han ejecutados los siguientes trabajos:

- CIMENTACION Y ESTRUCTURA
- Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40).
- Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).
- Suministro e instalación de Interruptor sencillo bajo repello
- Suministro e instalación de Tomacorriente de doble polarizado bajo repello
- Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 2 x 40 watts
- Suministro e instalación de luminaria fluorescente de 1 x 40 watts
- Suministro e instalación de Reflector doble de 100 watts
- Centro de carga de 6 espacios
- Mufa de 2"
- Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre
- PUERTAS Y VENTANAS
- Puerta metálica troquelada de 1.20 x 2.10m
- Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica
- Balcones metálicos de ángulo y varilla lisa de 1/2"

Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

- PINTURA
- Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.
- OBRAS ADICIONALES
- Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m3
- CIMENTACION Y ESTRUCTURA
- Piso de concreto 1:2:4 reforzada e=10cm #2@ 20 cm para acera
- REPELLO Y REVOQUES
- Tallado de elementos de L=0.20m
- Tallado de elementos de L=0.15m
- Tallado de elementos de L=0.10m
- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
- Suministro e instalación de tanque de polietileno de 750 litros
- PUERTAS Y VENTANAS
- Puerta de lámina metálica de 0.85 x 1.70mts
- Puerta de lámina metálica de 0.90 x 1.70mts
- PINTURA
- Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.
- OBRAS ADICIONALES
- Suministro e instalación de biodigestor de 1300 lts, incluye accesorios.
- Tapadera de protección para biodigestor de 1300 lts de 1.50 x 1.50 x 0.45 mts
- Caja de lodos de 0.80x 1.05 x 0.90 mts
- Pozo de absorcion 4.00 x 1.90 m
- Limpieza final de áreas exteriores
- Excavacion de material tipo II
- Relleno y compactado suelo cemento
- Relleno y compacto de material selecto en tuberías

La visita al proyecto por parte del supervisor se hace de lunes a viernes periódicamente.

8. Conclusiones y recomendaciones generales:

Los trabajos al proyecto de " **CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO, EN EL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE** " están ejecutados en un 100% sobre el contrato

No hay ninguna recomendación

Firma del supervisor: _____

Lugar (municipio de Cane, departamento de la Paz)

Fecha de presentación: 05 de Diciembre del año 2020



Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

AVANCE FINANCIERO

INFORME DE SUPERVICION

Proyecto: **"CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO, EN EL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA PONCE "**.

Ubicación del proyecto: COMUNIDAD DE CANE

Fuente de financiamiento, fondos de transferencias por medio de Gobernación y Justicia, como aporte municipal, por medio de la alcaldía municipal de CANE.

En esta se detallan el avance financiero del proyecto en base a los pagos efectuados durante el periodo que comprende del 02/11/2020 AL 05/12/2020 en base a la segunda estimación.

	Monto en Lps.	porcentajes
Monto del contrato	1,064,723.48	100.00%
Deducción del 5% de calidad	12,481.21	23.45%
Estimación 3	249,624.56	23.45%
Deducción del 12.5%	No aplica	No aplica
retención del 15% anticipo	No aplica	No aplica
AVANCE FINANCIERA		23.45%

RESUMEN

	MONTOS ACUMULADOS	% DE AVANCE MONETARIO
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	LPS. 53,236.15	100.00
Deducción del 12.5%	No aplica	No aplica
ESTIMACION 1,2,3	LPS. 1,064,723.48	100.00
Deducción del 15% anticipo	No aplica	No aplica

Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

RETENCIONES

RETENCIONES	
GARANTIA DEL 5% DE CALIDAD	LPS. 53,236.15
DEDUCCION DEL 12.5%	No aplica
DEDUCCIÓN DEL 15% ANTICIPO	No aplica

Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO




**"CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO
SANITARIO, EN EL INSTITUTO TECNICO RAFAEL PINEDA
PONCE, Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, CANE, LA
PAZ**

UBICACIÓN MUNICIPIO DE CANE DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

Fotografías a color de los procesos constructivo

Supervisión a la obra del supervisor por parte de la alcaldía y Gobernación

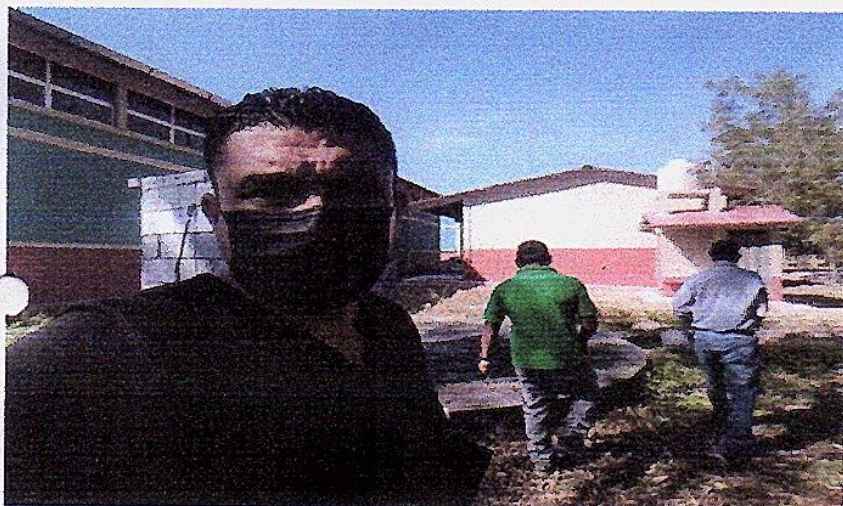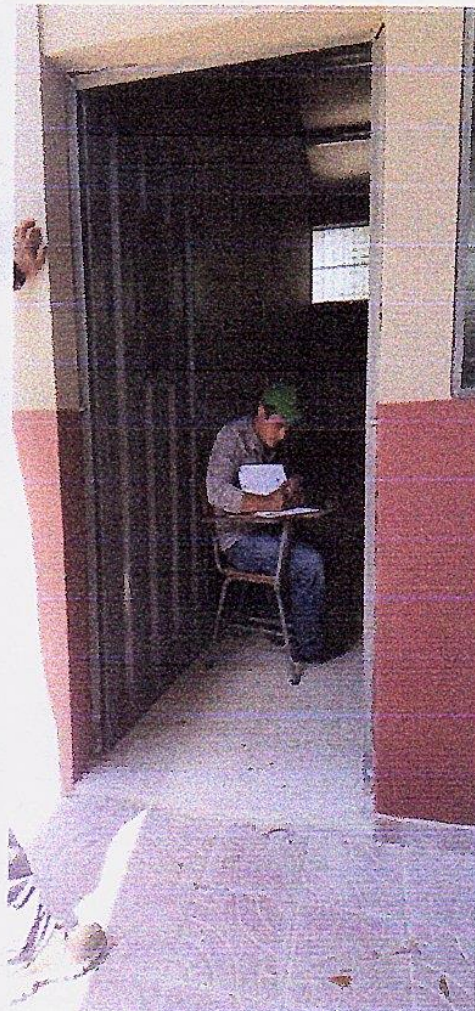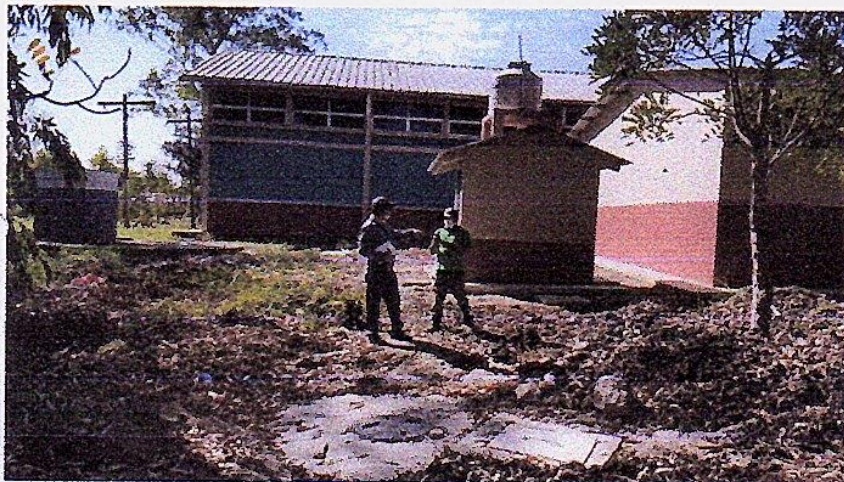


Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

1. Instalación de cerámica en lavamanos

Duración de la actividad: 2 días

% de avance: 100%

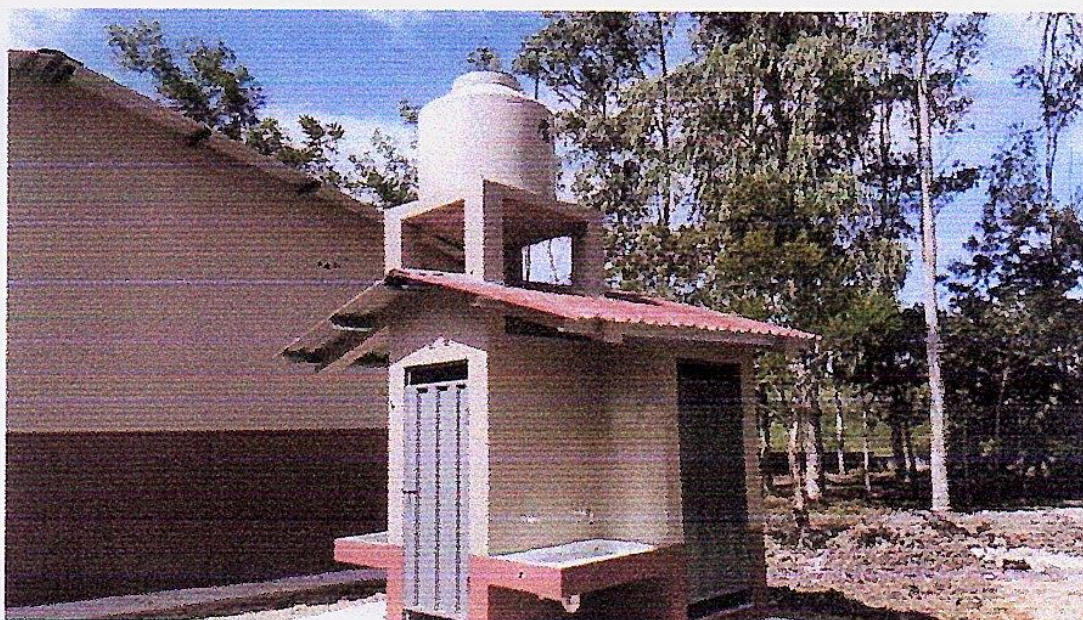


Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

1. INSTALACION DEL BIODIGESTOR

Duración de la actividad: 6 DIAS

% de avance: 100%


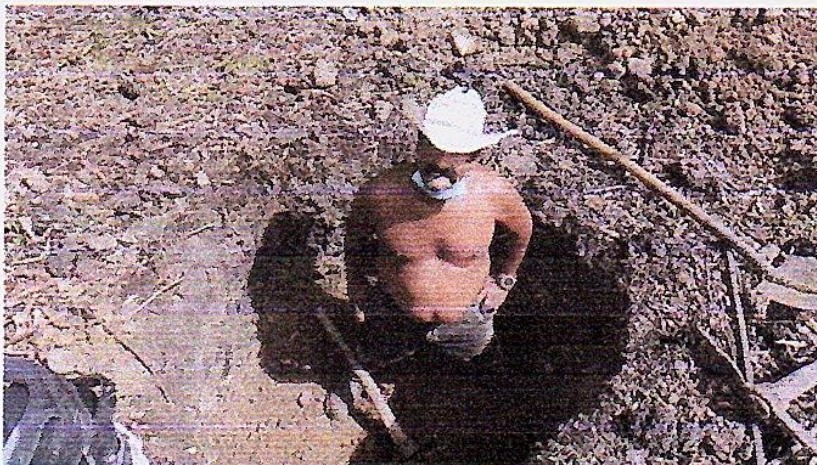


Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

1. Repello y Revoques

Duración de la actividad: 5 días

% de avance: 100%

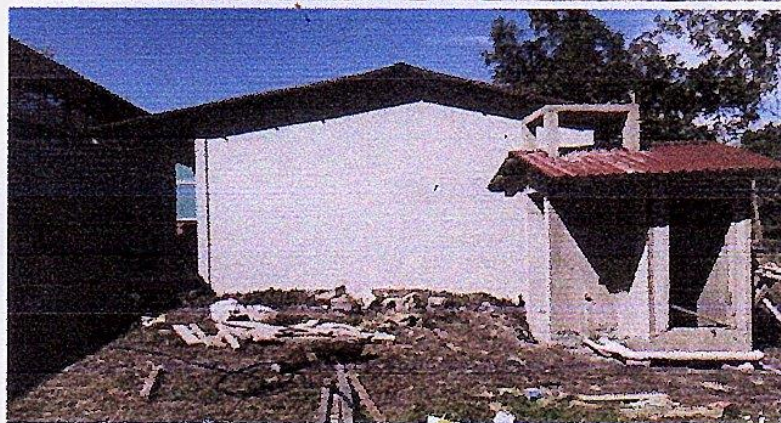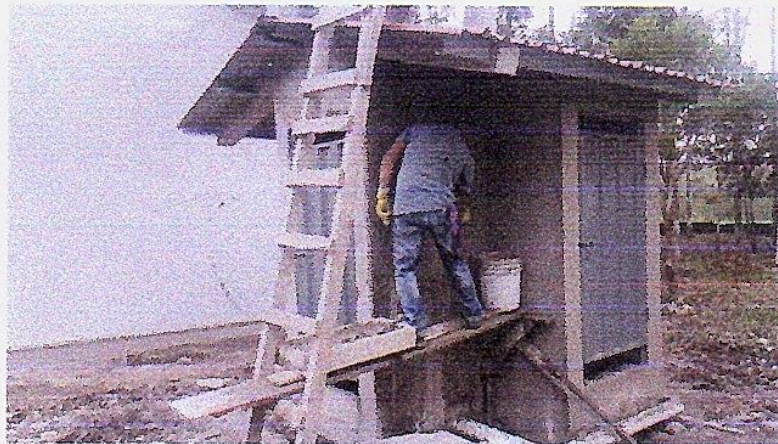


Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ


1. Piso de concreto 1:2:4 simple e=10cm para acera

Duración de la actividad: 7 días

% de avance: 100%

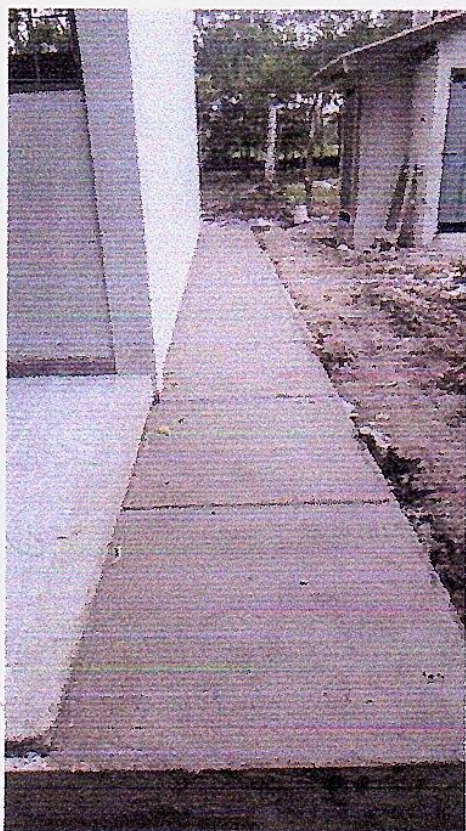

Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ


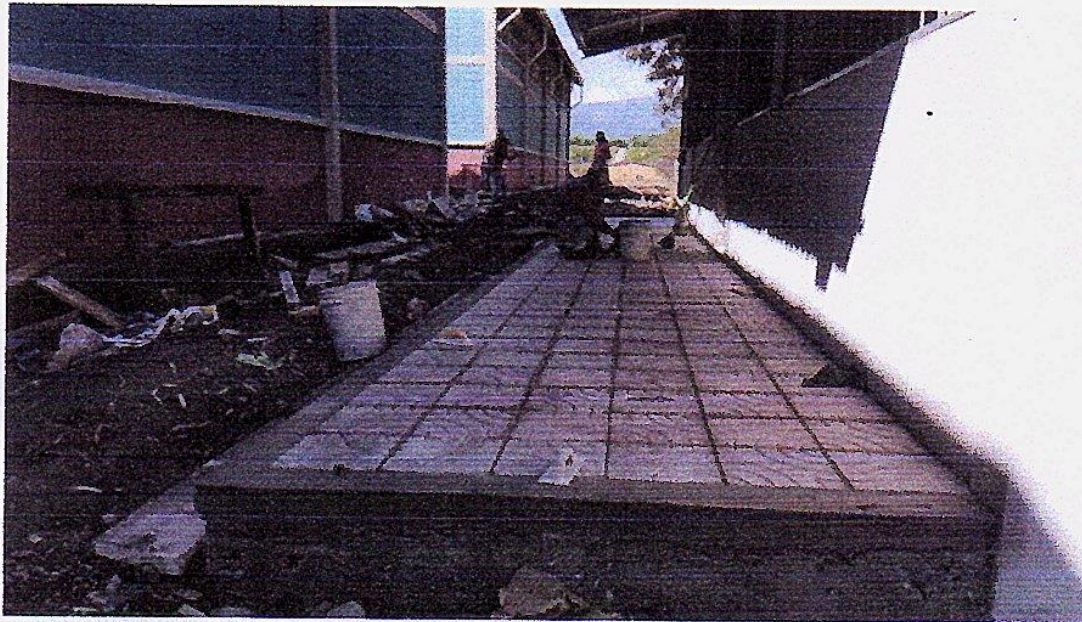


Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

1. INSTALACION DE PUERTA Y VENTANAS

Duración de la actividad: 3 días

% de avance: 100%

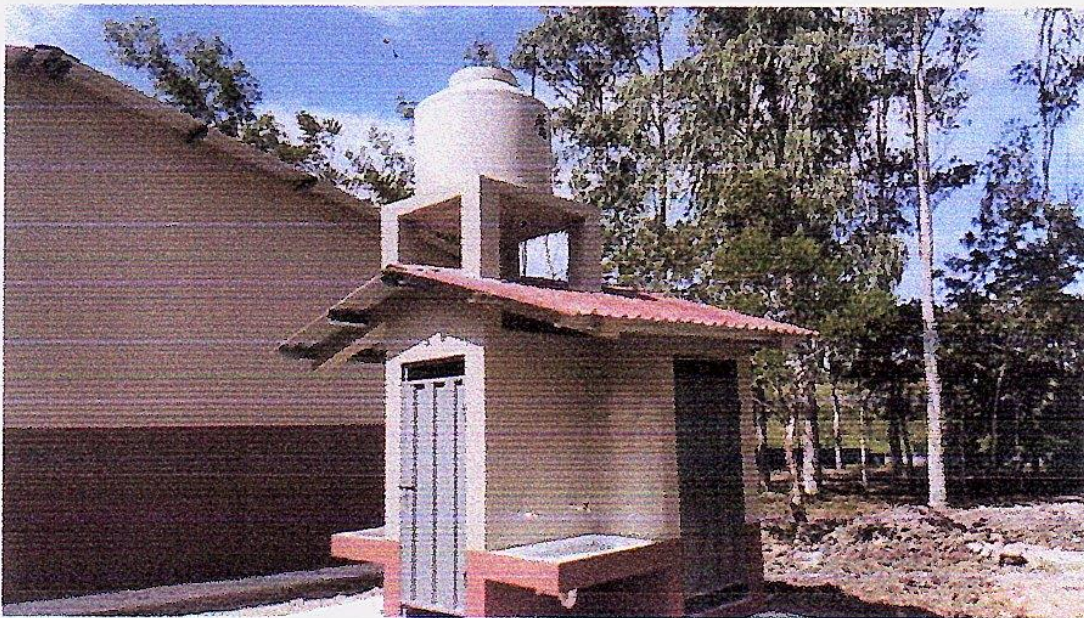
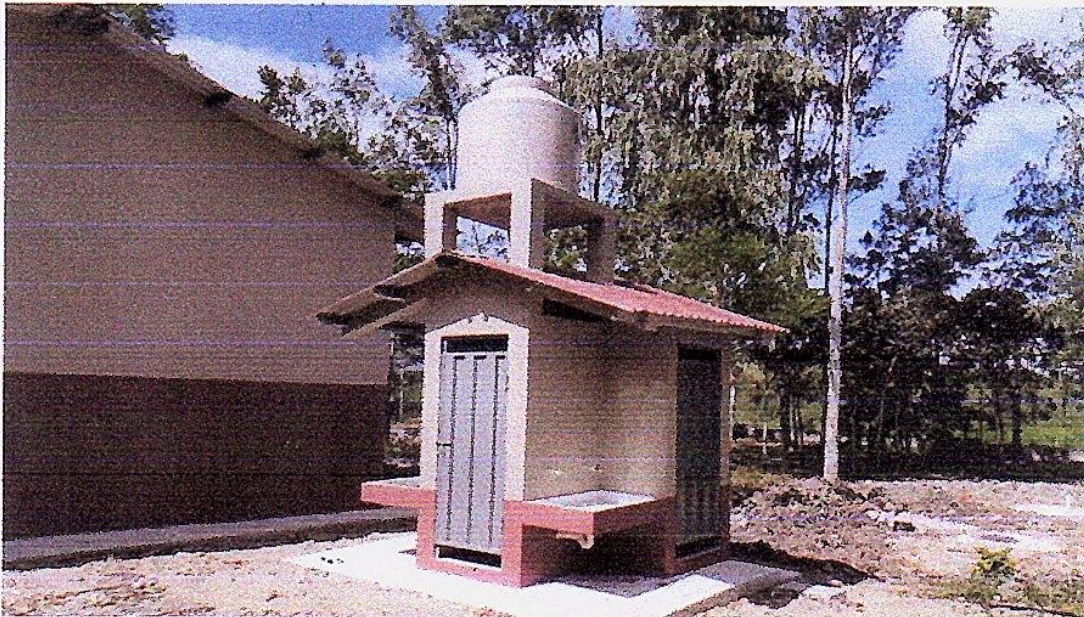


Informe de supervisión para soporte de la segunda estimación del PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN MODULO SANITARIO en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce , Ubicación del proyecto: Barrio el Porvenir, MUNICIPIO CANE, LA PAZ

2. PINTURA

Duración de la actividad: 6 días

% de avance: 100%

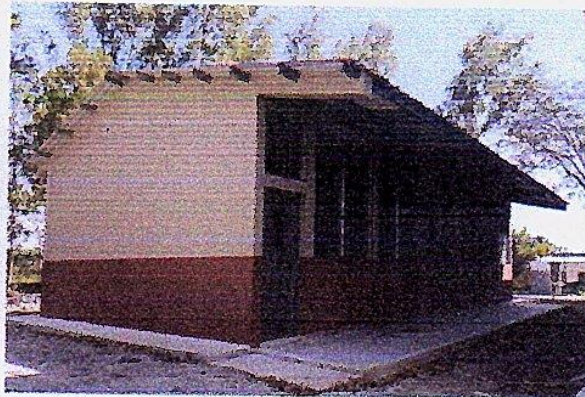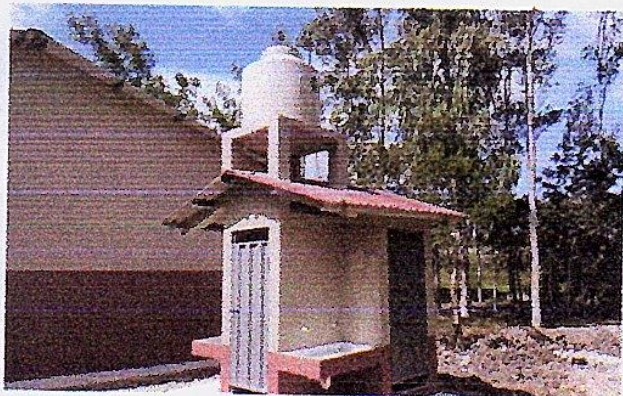



POLIZA DE FIANZA

Póliza No.: ZC-FC-84749

Desde: 05/12/2020

12 M.

Fecha de Emisión: 05/12/2020

Hasta: 05/12/2021

12 M.

Afianzado: CONSTRUCTORA INGENIUM, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Domicilio: LA PAZ, LA PAZ

Beneficiario: ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ

Domicilio: MARCALA, LA PAZ

Suma: L 53,236.17

Afianzada:

FIANZA DE CALIDAD DE OBRA
CONDICIONES GENERALES
CONTRATO GARANTIZADO

Garantía a favor de la "ALCALDIA MUNICIPAL CANE LA PAZ", para garantizarle que el afianzado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, reparará o corregirá cualquier falla o defecto de construcción por mano de obra o materiales empleados por el afianzado, en el proyecto: **CONSTRUCCION DE DOS MODULOS DE AULAS DE 7X8 Y CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE**. Garantía que asciende a la cantidad de: **L 53,236.17 (CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 17/100)**, todo de conformidad con los términos del contrato al efecto firmado entre el afianzado y el beneficiario, contrato que en lo procedente se considerará formando parte integrante de la presente póliza.

CLÁUSULA ESPECIAL: LA PRESENTE GARANTÍA SE HARÁ EFECTIVA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD, ACOMPAÑADA DE UN CERTIFICADO DE INCUMPLIMIENTO.

SEGUROS CREFISA, S.A., que en lo sucesivo se denominará la Compañía garantiza por la presente póliza a favor del beneficiario (arriba mencionado), el cumplimiento por parte del afianzado (también arriba mencionado), de todas las obligaciones estipuladas en el contrato garantizado arriba especificado.

Las Condiciones Particulares que se agreguen a esta póliza, con el consentimiento de las partes contratantes se entienden que hacen parte del seguro otorgado según los términos de este documento.

Las Condiciones Generales adjuntas que se agregan a esta Fianza, con el consentimiento de las partes contratantes forman parte integrante de la presente Póliza.

En fe de lo cual por Seguros Crefisa, se firma y sella en la Ciudad de:
TEGUCIGALPA, M.D.C. 05 de Diciembre del 2020

Firma Autorizada



 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

YESSICA DEL SOCORRO / MEDINA CLAROS




HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 27 MAYO 1985
SEXO: FEMENINO
EMITIDA EL 03 SEPTIEMBRE 2001

1201-1985-00481 
10107684-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá otorgar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

 **DIRECTOR R.N.R.**



SOLICITADA EN 1201
YESSICA DEL SOCORRO / MEDINA CLAROS
1201-1985-00481



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
CEL. (504) 9918-3582
E-mail: municane@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS DE AULAS DE 7X8 Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE**

Ubicación **MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales, con la excepción de lo abajo indicado.


Se acuerda la recepción definitiva para el día: 03/12/2020

REPARACIONES Y/O TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS:

Limpieza final de areas exteriores

03 DE DICIEMBRE DEL 2020

Fecha de recepción provisional


COMUNIDAD



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA



LIC. FRANCISCO BUSTILLO G.
ALCALDE MUNICIPAL
CEL. (504) 9918-3582
E-mail: municane@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCIÓN DE DOS MÓDULOS DE AULAS DE 7X8 Y CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN INSTITUTO RAFAEL PINEDA PONCE**

Ubicación **MUNICIPIO DE CANE, LA PAZ**

Se hace constar que la obra arriba mencionada fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir de la fecha abajo señalada, el solicitante asume la responsabilidad del adecuado mantenimiento y funcionamiento de la obra recién concluida y entregada al mismo, por lo que deberá contactar con la comunidad beneficiada y/o la(s) institución (es) del estado relacionada (s) con la obra ejecutada, para que asuman la responsabilidad que les corresponde.

En fe de lo anterior se firma esta Acta, dando por concluido y recibido el proyecto.

CANE, LA PAZ 5/12/2020

Lugar y fecha

LESLI YAVENE LICONA
COMUNIDAD



[Signature]
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
JEFE DE PRESUPUESTOS





LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 2774-4067
E-mail: municane@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Fecha: 30 de diciembre del 2020

Lugar: Cane la Paz.

Contrato de Obra: COT-CANE-03-2020

Proyecto: *"CONSTRUCCION DE UNA AULA Y DOS MODULOS
SANITARIOS EN LA ESCUELA MANUEL FRANCISCO
VELEZ"*

Contratista: Ing. Walter David Guzmán Salinas

Supervisión: Ing. Nahun Ortega

Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo

En el lugar y fecha descritos se reunieron el Contratista de Obra, el Supervisor de Obra, Alcalde municipal, Unidad Técnica Municipal con la finalidad de realizar una inspección al proyecto.

1. TIEMPO DE ENTREGA

Es importante destacar que el proyecto se terminó dentro del plazo de ciento veinte (120) días establecidos en el contrato.

Cumpliendo con el llenado de la bitácora del proyecto como en los informes que se han entregado a la Municipalidad.



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 2774-4067
E-mail: municane@yahoo.com

Sin dejar de considerar el incremento de obra en actividades contratadas y nuevas no contratadas que fueron necesarias para la buena terminación de la obra y que se respaldó a través de informes de Supervisión y aprobadas en corporacion municipal.

Valor Inicial del Contrato Lps. **745,915.04**

Monto Final del Contrato Lps. **745,915.04**

Incremento del Monto Lps. **0.00**

Fecha de Inicio 3 de febrero 2020

Fecha de terminación 18 de diciembre del 2020

2. OBSERVACION PARA EL CONTRATISTA

Realizando el recorrido con el señor alcalde, el auditor municipal, Unidad técnica Municipal, Contratista y supervisor, no hay ninguna observación en vista de que se realizó según contrato especificaciones técnicas y bajo la estricta supervisión.





LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 2774-4067
E-mail: municane@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION PROVINCIONAL

Fecha: 18 de diciembre del 2020

Lugar: Cane la Paz.

Contrato de Obra: COT-CANE-03-2020

Proyecto: *"CONSTRUCCION DE UNA AULA Y DOS MODULOS
SANITARIOS EN LA ESCUELA MANUEL FRANCISCO
VELEZ"*

Contratista: Ing. Walter David Guzmán Salinas

Supervisión: Ing. Nahún Ortega

Alcalde Municipal Lic. Francisco Bustillo

En el lugar y fecha descritos se reunieron el Contratista de Obra, el Supervisor de Obra, Alcalde municipal, Unidad Técnica Municipal con la finalidad de realizar una inspección al proyecto.

1. TIEMPO DE ENTREGA

Es importante destacar que el proyecto se terminó dentro del plazo de ciento veinte (120) días establecidos en el contrato.

Cumpliendo con el llenado de la bitácora del proyecto como en los informes que se han entregado a la Municipalidad.

Sin dejar de considerar el incremento de obra en actividades contratadas y nuevas no contratadas que fueron necesarias para la buena terminación de la obra y que se respaldó a través de informes de Supervisión y aprobadas en corporación municipal.



LIC. FRANCISCO BUSTILLO
ALCALDE MUNICIPAL
TELEFAX. (504) 2774-4067
E-mail: municane@yahoo.com

Valor Inicial del Contrato	Lps.	745,915.04
Monto Final del Contrato	Lps.	745,915.04
Incremento del Monto	Lps.	0.00

Fecha de Inicio	3 de febrero del 2020
Fecha de terminación	18 de diciembre del 2020

2. OBSERVACION PARA EL CONTRATISTA

Realizando el recorrido con el señor alcalde, el auditor municipal, Unidad técnica Municipal, Contratista y supervisor, no hay ninguna observación en vista de que se realizó según contrato especificaciones técnicas y bajo la estricta supervisión.

