



Republica de Honduras, C.A.  
Alcaldia Municipal de Taulabe Comayagua



Tel: 2784-5076 Telefax Tesoreria Mpal: 2784-5815  
0318-1973-00320

**12553** **ORDEN DE PAGO** **Nº 031817**

FECHA: RECIBO Nº 025578 Taulabe, Comayagua 23 DE Oct DEL 2020

Cheque No. 12010  
Valor efectivo L. \_\_\_\_\_  
L. \_\_\_\_\_

Señor Tesorero Municipal F.P.  
Páguese a la Orden de: Roger Antonio Portillo  
La Cantidad: Dieci noventa mil trescientos veinte

L. 19,320.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados  
Gastos Corrientes: \_\_\_\_\_  
Gastos de Inversión Social: \_\_\_\_\_  
Gastos por Deuda Pública: \_\_\_\_\_

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 01	Código:	Código:	Código:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
14	pago de viajes de		19,320.00
00	material selecto		
029	utilizados en la		
000	ejecución de proyecto		
001			
47210			
8			
90			
15 013 01	Embaulado Quebrada		
20	La Ceibita.		
74			
	Nota se retiene el 15%		
	de Impslv		2520.00
			16800.00

MUNICIPALIDAD DE TAULABE  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Taulabe, Comayagua

ALCALDIA TAULABE  
ALEXANDRO MALDONADO  
ALCALDE  
Taulabe, Comayagua

ALCALDIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO  
Taulabe, Comayagua

Recibido por: [Signature]  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Tarjeta Imp. Personal No. 0318197300320  
Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

VENTA DE MATERIALES  
R. DAVID Y MAS  
R.F.N. 03181973003203  
Tel. 2784-5076 / 0677-4785  
Comayagua



República de Honduras, C.A.  
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua

Tel. 2784-5076 Telefax: 2784-5815

RECIBO Nº 026579

POR L. 19,320.00

TAULABE, COMAYAGUA, 23 DE Octubre DEL 2020

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ VALOR EFECTIVO \_\_\_\_\_

CTA No. \_\_\_\_\_ CARGADO A \_\_\_\_\_

RECIBIMOS DE: Tesorera Municipal.

LA CANTIDAD DE: Diecinueve mil trescientos veinte

POR CONCEPTO DE: pago de Viajes de material  
Selecto utilizados en la ejecución de  
proyecto Embaulado Quebrada Los Cubitos.

FIRMA

IDENTIDAD No. 0318197300320



# VENTA DE MATERIALES R. DAVID Y MAS...

Contamos con servicio de retroexcavadora y transporte de equipo pesado.

Propietario: Roger Antonio Portillo


R.T.N. 03181973003203 Tel. 9985-7605 / 9862-2407 Email: rogeraportillo@yahoo.com  
Col. Los Almendros, frente a Mundo de Regalos, Taulabé, Comayagua.



Señor: Municipalidad de Taulabé

DIA	MES	AÑO
23	10	20

R.T.N.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
28	Viajes de Morterosal Selecto	600 <sup>2</sup>		16,800 ←
	Construcción y Embaldado de la Quebrada La Ceibita.			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				TOTAL L. 16,800 ←
CAI: 2D50E4-5CF0A4-6F4193-EE379E-C82B8E		R. T. N. 03181973003203		
F. Limite de Emisión: 06/12/2020		Imp. Exonerado L.		
Rango Autorizado 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003700		Imp. Exento L.		
 FIRMA		Imp. Gravado 15% L.		
		Taulabé, Comayagua 15% IMP. SV L. 2,520 ←		
				TOTAL L. 19,320 ←
Total en Letras L.: Diecinueve Mil Treientos veinte				

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 N° 003606**

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24



República De Honduras C. A.  
Alcaldía Municipal De Taulabé, Comayagua  
Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815  
RTN 0321-9001-034-319



Taulabe, Comayagua, 09 de octubre, 2020

**SR. LECTONIO MALDONADO**

**ALCALDE DE TAULABE**

**Presente**

Estimado Sr. Lectonio:

Por medio de la presente le comunico que de acuerdo con el contrato suscrito con el contratista **Sr. Roger Antonio Portillo**, con Identidad N° 0318-1973-00320, para la ejecución del proyecto: "**Construcción y Embaulado de la Quebrada La Ceibita**", ubicado en el Barrio La Ceibita del municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua. Se verifica que el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el contrato, por lo que se le puede hacer **UN PAGO DE ACUERDO A ESTIMACIÓN # I** de la obra.

Monto del contrato es de: \_\_\_\_\_ L. 19,320.00


ESTIMACION #I: \_\_\_\_\_ L. 19,320.00

**TOTAL A PAGAR: L. 19,320.00**

Por lo que se le solicita autorizar el desembolso del Pago de la Estimación # I del proyecto al Contratista.

Sin otro particular, queda de usted,

Atentamente,

  
**ING. ELI JOSUE DIAZ**

Unidad Tecnica Municipal

CC.: Archivo UTM

MUNICIPALIDAD DE TAULABE  
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
 ESTIMACIÓN DE OBRA N° 1

PROYECTO: CONSTRUCCION Y EMBAULADO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA  
 UBICACIÓN: BARRIO LA CEIBITA DEL MUNICIPIO DE TAULABE.

CONTRATISTA: ROGER ANTONIO PORTO  
 SUPERVISOR: ING. ELI JOSUE DIAZ

DETALLE	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUM. ANTER		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUM. A LA FECHA		SALDO		
	UND	CANT.	PRECIO U.	TOTAL	CANT.	TOTAL	% AVAN	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	
<b>VIAJES DE MATERIAL BALASTRO</b>												
VIAJES DE MATERIAL		VIAJE	28.00	L. 690.00	-	-	28.00	100.00%	28.00	19320.00	0.00	L. 0.00
		SUB TOTAL		L. 19,320.00	L. 0.00	L. 19,320.00	100.00%		19320.00		L. 0.00	

CONTRATO INICIAL	L. 19,320.00
PAGOS A LA FECHA	L. 19,320.00
SALDO PENDIENTE	L. 0.00

RESUMEN		PRESENTE
ESTIMACION DE OBRA # 1		L. 19,320.00
NETO A PAGAR		L. 19,320.00

*Roger Antonio Porto*  
 ROGER ANTONIO PORTO  
 CONTRATISTA



ING. ELI JOSUE DIAZ  
 SUPERVISOR TECNICA MUNICIPAL (SUPERVISION)





República De Honduras C. A.



Alcaldía Municipal De Taulabé, Comayagua

Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815

**INFORME DE SUPERVISION**

# 1

PROYECTO:	<b>CONSTRUCCION Y EMBAULADO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA</b>
UBICACIÓN:	<b>Barrio La Ceibita del Municipio de Taulabe, departamento de Comayagua.</b>

RESPONSABLES	
Ejecutor Supervisor	<b>Sr. ROGER ANTONIO PORTILLO Ing. ELI JOSUE DIAZ</b>

CONTROL DE PROYECTO			
Fecha de Inicio	<b>01-DE OCT-2020</b>	Avance Físico	<b>100%</b>
Plazo	<b>10 Días</b>	Avance financiero	<b>0%</b>
Ampliación de Plazo	<b>--</b>	Avance en tiempo	<b>100%</b>

Supervisión realizada	<b>Durante el tiempo de ejecución</b>
Fecha de presentación de informe	<b>09-10-2020</b>

OBSERVACIONES GENERALES						
CLIMA		PERSONAL		EQUIPO		HERRAMIENTA
Sin lluvia	X	Operador de maquina	1	Moto Niveladora	0	palas
Con lluvia	--	Motorista	1	Vibro bomag	0	piochas
		peones	0	Retro-excavadora	0	barras
				Tanque cisterna	0	Etc...
				Volqueta	1	

CALIDAD DE OBRA			
BUENA	X	REGULARAR	MALA

AVANCE DE OBRA				
ITEM	DESCREPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	EJECUTADA ESTE PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA
1.00	VIAJES DE MATERIAL	VIAJES	100%	100%





República De Honduras C. A.  
Alcaldía Municipal De Taulabé, Comayagua

Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815

**Descripción de Ejecución de la obra**

- ✚ La obra dio inicio el día 01 de Octubre del presente, con la actividad de suministro de material para realizar el relleno de áreas de proyecto de embaulado, con la finalidad de dejar a la misma altura de losa de Embaulamiento este día se suministraron 10 viajes de material.
- ✚ Posteriormente el día viernes 02 de octubre se continuó con el suministro de material en el que se suministraron 14 viajes de material.
- ✚ Luego el día sábado 03 de octubre se llevó a cabo el acarreo de material en el que se suministró 4 viajes dejando a nivel de losa de concreto de embaulado.

**Observaciones en la Obra:**

Situaciones:

- ✚ Las obras se terminaron de ejecutar el día sábado 03 de octubre del 2020, antes del tiempo contractual.
- ✚ Durante la ejecución de la obra se le brindaron recomendaciones, al ejecutor, las cuales tomó en cuenta de forma inmediata y anuente.

**Conclusiones:**

- ✚ La obra hasta ahora presenta un porcentaje de avance en su ejecución de un 100%.
- ✚ La obra se ejecutó en tiempo y forma, dentro de las condiciones contractuales.

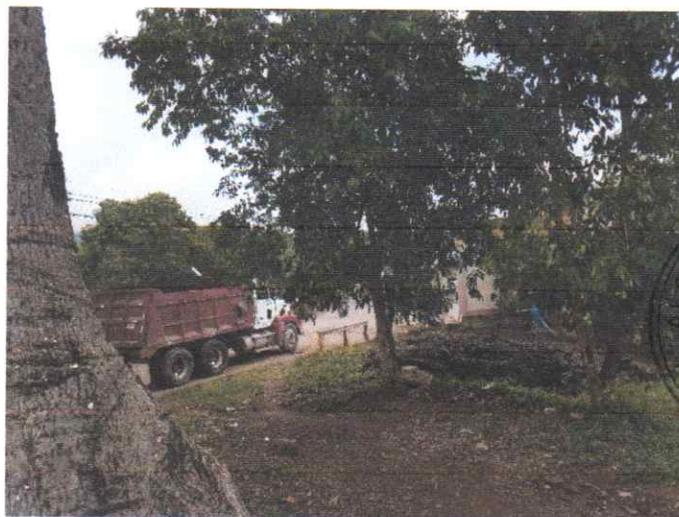




República De Honduras C. A.  
Alcaldía Municipal De Taulabé, Comayagua



Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815





República de Honduras C. A.  
 Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua  
 Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815

**ORDEN DE INICIO**

**PROYECTO:** CONSTRUCCION Y EMBAULADO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA

**UBICACION:** BARRIO LA CEIBITA DEL MUNICIPIO DEL TAULABE,  
 DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.

En este acto se hace formal la autorización del inicio de los trabajos de "CONSTRUCCION Y EMBAULADO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA" ubicado en el Barrio la Ceibita del municipio de Taulabe, departamento de Comayagua, haciendo constatar que se han cumplido los requisitos necesarios para el inicio del mismo, sin objeción de alguna de las partes interesadas.

Se acuerda la fecha de inicio para el 01 de octubre del 2020

En fe, de lo anterior se firma la presente Acta.

En el Municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua, 28 de septiembre 2020.

ING. ENRIQUE DIAZ  
 Identidad: 0318-1985-01523  
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

SR. ROGER ANTONIO FORTALE  
 Identidad 0318-1973-00320  
 CONTRATISTA

LECTONIO MALDONADO  
 Identidad. 1705-1980-00232  
 ALCALDE MUNICIPAL




UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ALCALDIA DE TAULABE

## PAGARE

Yo, **ROGER ANTONIO PORTILLO** residente del Municipio de TAULABE, departamento de Comayagua, actuando en mi condición de **CONTRATISTA DECLARO Y HAGO CONSTAR**: Que **DEBO Y PAGARE** incondicionalmente a la Alcaldía Municipal de Taulabe, departamento de Comayagua, la cantidad de **DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (L 2,898.00 )** para garantizar el Cumplimiento de contrato del proyecto: **“CONSTRUCCION Y EMBAULAMIENTO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA”** Ubicado en el Barrio La Ceibita Municipal del municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua, los que pagaré sin pretextos ni excusas de ninguna clase en el Municipio de Taulabe, departamento de Comayagua, renunciando al fuero de mi domicilio, para someterme al del acreedor.

Taulabe, Comayagua, 28 de septiembre de 2020.

  
**Roger Antonio Portillo**  
Id. 0318-1973-00320





*República de Honduras C. A.*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua*  
*Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815*



## **CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA**

Nosotros **LECTONIO MALDONADO**, actuando en mi condición como Alcalde Municipal, mayor de edad, casado y vecino de este Termino Municipal, con identidad No. 1705-1980-00232 actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua, nombrado para tal cargo mediante acta especial 17 de Diciembre 2017 y autorizada por la ley para esta clase de actos quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATANTE** por una parte y por la otra el señor: **ROGER ANTONIO PORTILLO**, mayor de edad, y vecino del Municipio de Taulabé y con tarjeta de identidad No. 0318-1973-00320, que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato Temporal de trabajo por obra determinada, mismo que se registrá por lo estipulado en el presente contrato, en la ley de Contratación del Estado, y la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. **PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto contratar los servicios para: "MATERIAL PARA RELLENO DE EMBAULADO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA", Ubicado en el Barrio La Ceibita del municipio de Taulabe, el cual incluye las siguientes actividades:

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTID	PRECIO/VIAJE	SUB-TOTAL
1.00	VIAJES DE MATERIAL BALASTRO	VIAJES	28.00	L. 690.00	L. 19,320.00
<b>TOTAL LPS</b>					L. 19,320.00



*República de Honduras C. A.*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua*  
*Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815*



Todas estas actividades deberán de ejecutarse de acuerdo al diseño y las especificaciones técnicas presentadas por la Unidad Técnica Municipal (de igual o superior calidad). **SEGUNDA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo de este contrato es de Diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. **TERCERA: MONTO Y FORMA DE PAGO:** El monto del presente asciende a la suma de DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (L. 19,320.00) El cual se hará efectivo mediante un solo desembolso vía estimación al estar concluida la obra y de acuerdo a la disponibilidad financiera actual de La Municipalidad y sin recargo por concepto de intereses. **CUARTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará como tal la fecha establecida en la notificación de la ORDEN DE INICIO al Contratista para el inicio de la obra. **QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** Tanto LA MUNICIPALIDAD como EL CONTRATISTA, se obligan al cumplimiento estricto de lo especificado en este contrato.- La mano de obra que utilice el Contratista, será bajo su responsabilidad, así como también el equipo que utilice.- y se aclara que la Alcaldía Municipal no responde por el pago de los trabajadores, ni daños a terceros. **SEXTA: GARANTÍAS:** A la firma de este contrato, EL CONTRATISTA, está en la obligación de presentar a favor de la Municipalidad de Taulabe las garantías siguientes: a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Se establece una garantía de cumplimiento equivalente al 15% del monto del contrato, con vigencia de tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra. **SEPTIMA: MODIFICACION AL CONTRATO:** El Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando se acuerde por los



República de Honduras C. A.  
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua  
Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815



una aprobación de la Unidad Técnica Municipal (Supervisión). **OCTAVA: CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO:** a) El mutuo acuerdo entre las partes, b) Incumplimiento de contrato, debidamente acreditado, c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, o uso inapropiado de equipo, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por la Unidad Técnica Municipal (Supervisión) y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato. d) Caso fortuito o Fuerza Mayor, debiendo entenderse ésta como todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato, e) Resolución de contrato decretada por autoridad competente. **NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS:** Cualquier controversia que surgiera de este contrato, será sometida en todo al derecho administrativo, siendo la jurisdicción competente para conocer las cuestiones que de los mismos se deriven, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo que la Municipalidad designe. **DECIMA:** Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y firman para constancia en el municipio de Taulabé a los 28 días del mes de septiembre del año 2020.



Sr. LECTONIA MALDONADO  
Alcalde Municipal de Taulabé

  
SR. ROGER ANTONIO PORTILLO  
Identidad No. 0318-1973-00320  
Contratista  
Taulabé Comayagua



# MUNICIPALIDAD DE TAULABE



## COTIZACION DE OBRA

**PROYECTO:** CONSTRUCCION Y EMBAULAMIENTO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA

**UBICACION:** BARRIO LA CEIBITA DEL MUNICIPIO DE TAULABE.

Se le solicita darnos cotización de la siguiente obra:

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTID	PRECIO/VIAJE	SUB-TOTAL
1.00	VIAJES DE MATERIAL	VIAJE	28.00	690	19,320
				TOTAL LPS	

OFRESCO REALIZAR LAS OBRAS ARRIBA DESCRITAS POR LA CANTIDAD DE:

(LPS. \_\_\_\_\_).

Dado en el municipio de Taulabe, departamento de Comayagua, a los \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.

Nombre:  
Identidad No.

Contratista





# MUNICIPALIDAD DE TAULABE



## COTIZACION DE OBRA

**PROYECTO:** CONSTRUCCION Y EMBAULAMIENTO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA

**UBICACION:** BARRIO LA CEIBITA DEL MUNICIPIO DE TAULABE.

Se le solicita darnos cotización de la siguiente obra:

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTID	PRECIO/VIAJE	SUB-TOTAL
1.00	VIAJES DE MATERIAL	VIAJE	28.00		
<b>TOTAL LPS</b>					

OFRESCO REALIZAR LAS OBRAS ARRIBA DESCRITAS POR LA CANTIDAD DE:

\_\_\_\_\_ (LPS. \_\_\_\_\_).

Dado en el municipio de Taulabe, departamento de Comayagua, a los \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2020.



Juan Carlos Obando  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Identidad No. 0318-1967-00437  
Contratista





**MUNICIPALIDAD DE TAULABÉ**  
 Calle Principal de Taulabé, Comayagua, Honduras, C.A.  
 Tel: (504) 2784-5815  
 Cuenta N.º: 11-605-000169-0

CHEQUE No. **00012010**

Taulabé 23/10/2020  
 Lugar y Fecha

Roger Antonio Portillo

L 16,800.00

Páguese a la orden de

Dieciséis mil Ochocientos exactos

Lempiras

**Banco de Occidente**  
 Banco de Occidente, S.A.

ALCALDIA MUNICIPAL  
 FATIMA PINEDA  
 TESORERA

ALCALDIA TAULABÉ  
 LECTONIO MALDONADO  
 ALCALDE

Firma (s)

16050001690100012010

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FIN-FUN	FTE-FIN	ORG-FIN	FTE-ESP
N.º DE CUENTA								
DESCRIPCIÓN								
					DEBE		HABER	

ALCALDIA MUNICIPAL  
 PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL  
 FATIMA PINEDA  
 TESORERA

ALCALDIA TAULABÉ  
 LECTONIO MALDONADO  
 ALCALDE

VENTA DE MATERIALES  
 R. DAVID Y MAS  
 R.T.M. 03181973003203  
 Tel. 2784-5484 / 9977-4785  
 Taulabé, Comayagua

RECIBÍ CONFORME



Republica de Honduras, C.A.  
Alcaldía Municipal de Taulabe Comayagua



Tel: 2784-5076 Telefax Tesorería Mpal: 2784-5815  
0318 1973 00320.

**12552** **ORDEN DE PAGO** **Nº 031815**

FECHA: TAULABE, COMAYAGUA 23 DE Oct DEL 2020

Cheque No. 12009  
Valor efectivo L. 6,440.00

Señor Tesorero Municipal F.P.  
Páguese a la Orden de: Roger Antonio Portillo.  
La Cantidad: Seis mil Cuatrocientos Cuarenta.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios prestados  
Gastos Corrientes: \_\_\_\_\_  
Gastos de Inversión Social: \_\_\_\_\_  
Gastos por Deuda Pública: \_\_\_\_\_

FONDO	PROGRAMA	SUB PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código:	Código: 01	Código:	Código:	Código:

Objeto de Gastos	DESCRIPCION	VALORES EN LEMPIRAS	
		SEGUN OBJETO	TOTAL
14 00 029 000 001 47210 8 90 15 013 01 20 74	pago de horas de retroescavadora utilizadas en ejecución de proyecto construcción y Embautamiento de la Quebrada "La Cabita"		6440.00
	Nota Se retiene el 15% de Imp STU		840.00
			5600.00

MUNICIPALIDAD DE TAULABE  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Taulabe, Comayagua

ALCALDIA TAULABE  
ANTONIO MALDONADO  
ALCALDE  
Taulabe, Comayagua

ALCALDIA MUNICIPAL  
Firma y Sello Encargado Presupuesto  
Taulabe, Comayagua

Recibido por: Roger A. Portillo  
Identidad No. \_\_\_\_\_  
Tarjeta Imp. Personal No. 0318197300320  
Fecha de Pago: \_\_\_\_\_

VENTA DE MATERIALES  
R. DAVID Y MAS  
Tel: 2784-5076 2784-5815  
Taulabe, Comayagua



República de Honduras, C.A.  
 Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua

Tel. 2784-5076 Telefax: 2784-5815

RECIBO Nº 026577

POR L. 6440.00.

TAULABE, COMAYAGUA, 23 DE Octubre DEL 2020

CHEQUE No. \_\_\_\_\_ VALOR EFECTIVO \_\_\_\_\_

CTA No. \_\_\_\_\_ CARGADO A \_\_\_\_\_

RECIBIMOS DE: Tesorenia Upad

LA CANTIDAD DE: Seis mil Cuatrocientos Cuarenta.

POR CONCEPTO DE: pago de horas de retroescavadora utilizadas en ejecución de proyecto Construcción y embaulado de la Quebrada La Ceibita.

[Handwritten Signature]  
 FIRMA



IDENTIDAD No. 0318 197300320



República De Honduras C. A.  
Alcaldía Municipal De Taulabé, Comayagua  
Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815  
RTN 0321-9001-034-319



Taulabe, Comayagua, 09 de octubre, 2020

**SR. LECTONIO MALDONADO**  
**ALCALDE DE TAULABE**

Presente

Estimado Sr. Lectonio:

Por medio de la presente le comunico que de acuerdo con el contrato suscrito con el contratista **Sr. Roger Antonio Portillo**, con Identidad N° 0318-1973-00320, para la ejecución del proyecto: "**Construcción y Embaulado de la Quebrada La Ceibita**", ubicado en el Barrio La Ceibita del municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua. Se verifica que el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el contrato, por lo que se le puede hacer **UN PAGO DE ACUERDO A ESTIMACIÓN # I** de la obra.

Monto del contrato es de: \_\_\_\_\_ L. **6,440.00**

ESTIMACION #I: \_\_\_\_\_ L. **6,440.00**

**TOTAL A PAGAR: L. 6,440.00**

Por lo que se le solicita autorizar el desembolso del Pago de la Estimación # I del proyecto al Contratista.

Sin otro particular, queda de usted,

Atentamente,

  
**ING. ELI JOSUE DIAZ**

Unidad Tecnica Municipal

CC.: Archivo UTM

MUNICIPALIDAD DE TAULABE  
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ESTIMACION DE OBRA N° 1

PROYECTO: CONSTRUCCION Y EMBALUADO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA  
 UBICACION: BARRIO LA CEIBITA DEL MUNICIPIO DE TAULABE.

CONTRATISTA: ROGER ANTONIO PO  
 SUPERVISOR: ING. ELI JOSUE DIAZ

M	DETALLE	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUM. ANTER	EJECUTADO ESTE PERIODO	ACUM. A LA FECHA	SALDO							
		UND	CANT.	PRECIO U.					TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL		
0	HORAS RETROEXCAVADORA		HRS	7.00	L. 920.00	L. 6,440.00	-	-	7.00	6,440.00	100.00%	7.00	6440.00	0.00	L. 0.00
	SUB TOTAL					L. 6,440.00		L. 0.00		L. 6,440.00	100.00%		6440.00		L. 0.00
	CONTRATO INICIAL					L. 6,440.00				L. 6,440.00					L. 0.00
	PAGOS A LA FECHA					L. 6,440.00				L. 6,440.00					L. 0.00
	SALDO PENDIENTE					L. 0.00				L. 0.00					L. 0.00

RESUMEN		PRESENTE
ESTIMACION DE OBRA # 1		L. 6,440.00
NETO A PAGAR		L. 6,440.00

*Roger Antonio Po*  
 ROGER ANTONIO PO  
 CONTRATISTA

VENTA DE MATERIALES  
 R. DAVID Y MAS  
 Tel. 2764-5484 / 5277-4785  
 Taulabé Comayagua



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (SUPERVISION)  
 ELI JOSUE DIAZ

V.oBo  
 DONIDO MALDONADO  
 ALCALDE MUNICIPAL

ALCALDIA TAULABE  
 DONIDO MALDONADO  
 ALCALDE MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE TAULABE**  
**UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**  
**ESTIMACION DE OBRA N° 1**  
**PROYECTO: CONSTRUCCION Y EMBALADO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA**  
**UBICACION: BARRIO LA CEIBITA DEL MUNICIPIO DE TAULABE.**


**CONTRATISTA: ROGER ANTONIO PORTILLO**  
**SUPERVISOR: ING. ELI JOSUE DIAZ**

DETALLE	PRESUPUESTO CONTRATADO			ACUM. ANTER		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUM. A LA FECHA			SALDO		% A OBRA	
	UND	CANT.	PRECIO U.	TOTAL	CANT.	TOTAL	CANT.	TOTAL	% AVAN	CANT.	TOTAL	CANT.		TOTAL
HORAS RETROEXCAVADORA	HRS	7.00	L. 920.00	L. 6,440.00	-	-	7.00	6,440.00	100.00%	7.00	6440.00	0.00	L. 0.00	100
<b>SUB TOTAL</b>				<b>L. 6,440.00</b>		<b>L. 0.00</b>					<b>6440.00</b>		<b>L. 0.00</b>	
CONTRATO INICIAL				L. 6,440.00									L. 0.00	
COS A LA FECHA				L. 6,440.00									L. 0.00	
TRABAJO PENDIENTE				L. 0.00									L. 0.00	

RESUMEN	
ESTIMACION DE OBRA # 1	PRESENTE
NETO A PAGAR	L. 6,440.00

  
 ROGER ANTONIO PORTILLO  
 CONTRATISTA

  
 U.T.M.  
 ING. ELI JOSUE DIAZ  
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (SUPERVISION)

  
 V.Bo  
 ING. ELI JOSUE DIAZ  
 SUPERVISOR



República De Honduras C. A.  
**Alcaldía Municipal De Taulabé, Comayagua**

Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815

**INFORME DE SUPERVISION**

# 1

PROYECTO:	<b>CONSTRUCCION Y EMBAULADO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA</b>
UBICACIÓN:	<b>Barrio La Ceibita del Municipio de Taulabe, departamento de Comayagua.</b>

RESPONSABLES	
Ejecutor	<b>Sr. ROGER ANTONIO PORTILLO</b>
Supervisor	<b>Ing. ELI JOSUE DIAZ</b>

CONTROL DE PROYECTO			
Fecha de Inicio	<b>01-DE OCT-2020</b>	Avance Físico	<b>100%</b>
Plazo	<b>10 Días</b>	Avance financiero	<b>0%</b>
Ampliación de Plazo	<b>--</b>	Avance en tiempo	<b>100%</b>

Supervisión realizada	<b>Durante el tiempo de ejecución</b>
Fecha de presentación de informe	<b>09-10-2020</b>

OBSERVACIONES GENERALES						
CLIMA		PERSONAL		EQUIPO		HERRAMIENTA
Sin lluvia	X	Operador de maquina	1	Moto Niveladora	0	palas
Con lluvia	--	Motorista	1	Vibro bomag	0	piochas
		peones	0	Retro-excavadora	1	barras
				Tanque cisterna	0	Etc...
				Volqueta	0	

CALIDAD DE OBRA			
BUENA	X	REGULAR	MALA

AVANCE DE OBRA				
ITEM	DESCREPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD	EJECUTADA ESTE PERIODO	EJECUTADA ACUMULADA
1.00	HORAS RETROEXCAVADORA	HORAS	100%	100%





República De Honduras C. A.   
Alcaldía Municipal De Taulabé, Comayagua

Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815

**Descripción de Ejecución de la obra**

- La obra dio inicio el día 01 de Octubre del presente, con la actividad de regado de material común (tipo I) para realizar el relleno de áreas de proyecto de embaulado, con la finalidad de dejar a la misma altura de losa de Embaulamiento este día se utilizó 1 hora de retroexcavadora.
- Luego el día sábado 03 de octubre se llevó a cabo el regado de material tierra en el que se hizo uso 6 horas de retroexcavadora para el regado de material.

**Observaciones en la Obra:**

Situaciones:

- Las obras se terminaron de ejecutar el día sábado 03 de octubre del 2020, antes del tiempo contractual.
- Durante la ejecución de la obra se le brindaron recomendaciones, al ejecutor, las cuales tomó en cuenta de forma inmediata y anuente.

**Conclusiones:**

- La obra hasta ahora presenta un porcentaje de avance en su ejecución de un 100%.
- La obra se ejecutó en tiempo y forma, dentro de las condiciones contractuales.





República De Honduras C. A.  
Alcaldía Municipal De Taulabé, Comayagua  
Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815



ILUSTRACIONES





República De Honduras C. A.   
Alcaldía Municipal De Taulabé, Comayagua  
Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815





República de Honduras C. A.  
 Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua  
 Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815

**ORDEN DE INICIO**

**PROYECTO: CONSTRUCCION Y EMBAULADO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA**


**UBICACION: BARRIO LA CEIBITA DEL MUNICIPIO DEL TAULABE,  
 DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.**

En este acto se hace formal la autorización del inicio de los trabajos de "CONSTRUCCION Y EMBAULADO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA" ubicado en el Barrio la Ceibita del municipio de Taulabe, departamento de Comayagua, haciendo constatar que se han cumplido los requisitos necesarios para el inicio del mismo, sin objeción de alguna de las partes interesadas.

Se acuerda la fecha de inicio para el 01 de octubre del 2020

En fe, de lo anterior se firma la presente Acta.

En el Municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua, 28 de septiembre 2020.



JOSÉ ELI JOSUE DIAZ  
 Identidad. 0318-1985-01523  
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



*Lectorio Maldonado*  
 LECTORIO MALDONADO  
 Identidad. 1705-1980-00232  
 ALCALDE MUNICIPAL



SR. ROGER ANTONIO CORTILLO  
 Identidad 8318-1973-00820  
 CONTRATISTA  
 Tel: 2784-5484 / 2777-4138  
 Taulabé, Comayagua




UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ALCALDIA DE TAULABE

## PAGARE

Yo, **ROGER ANTONIO PORTILLO** residente del Municipio de TAULABE, departamento de Comayagua, actuando en mi condición de **CONTRATISTA DECLARO Y HAGO CONSTAR**: Que **DEBO Y PAGARE** incondicionalmente a la Alcaldía Municipal de Taulabe, departamento de Comayagua, la cantidad de **NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (L 966.00 )** para garantizar el Cumplimiento de contrato del proyecto: **“CONSTRUCCION Y EMBAULAMIENTO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA”** Ubicado en el Barrio La Ceibita Municipal del municipio de Taulabe, Departamento de Comayagua, los que pagaré sin pretextos ni excusas de ninguna clase en el Municipio de Taulabe, departamento de Comayagua, renunciando al fuero de mi domicilio, para someterme al del acreedor.

Taulabe, Comayagua, 28 de septiembre de 2020.

  
**Roger Antonio Portillo**  
Id. 0318-1973-00320





## CONTRATO DE TRABAJO POR OBRA DETERMINADA

Nosotros **LECTONIO MALDONADO**, actuando en mi condición como Alcalde Municipal, mayor de edad, casado y vecino de este Termino Municipal, con identidad No. 1705-1980-00232 actuando en condición de Alcalde Municipal del Municipio de Taulabé, Departamento de Comayagua, nombrado para tal cargo mediante acta especial 17 de Diciembre 2017 y autorizada por la ley para esta clase de actos quien en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATANTE** por una parte y por la otra el señor: **ROGER ANTONIO PORTILLO**, mayor de edad, y vecino del Municipio de Taulabé y con tarjeta de identidad No. 0318-1973-00320, que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar, como al efecto celebramos, el presente contrato Temporal de trabajo por obra determinada, mismo que se regirá por lo estipulado en el presente contrato, en la ley de Contratación del Estado, y la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. **PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto contratar los servicios para: "HORAS RETROEXCAVADORA PARA RELLENO DE EMBAULADO DE LA QUEBRADA LA CEIBITA", Ubicado en el Barrio La Ceibita del municipio de Taulabe, el cual incluye las siguientes actividades:

N°	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTID	PRECIO/HORA	SUB-TOTAL
1.00	HORAS RETROEXCAVADORA	HORA	7.00	L. 920.00	L. 6,440.00
<b>TOTAL LPS</b>					L. 6,440.00



*República de Honduras C. A.*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua*  
*Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815*



Todas estas actividades deberán de ejecutarse de acuerdo al diseño y las especificaciones técnicas presentadas por la Unidad Técnica Municipal (de igual o superior calidad). **SEGUNDA: DURACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo de este contrato es de Diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. **TERCERA: MONTO Y FORMA DE PAGO:** El monto del presente asciende a la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (L. 6,440.00 ) El cual se hará efectivo mediante un solo desembolso vía estimación al estar concluida la obra y de acuerdo a la disponibilidad financiera actual de La Municipalidad y sin recargo por concepto de intereses. **CUARTA: ORDEN DE INICIO:** Se considerará como tal la fecha establecida en la notificación de la ORDEN DE INICIO al Contratista para el inicio de la obra. **QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:** Tanto LA MUNICIPALIDAD como EL CONTRATISTA, se obligan al cumplimiento estricto de lo especificado en este contrato.- La mano de obra que utilice el Contratista, será bajo su responsabilidad, así como también el equipo que utilice.- y se aclara que la Alcaldía Municipal no responde por el pago de los trabajadores, ni daños a terceros. **SEXTA: GARANTÍAS:** A la firma de este contrato, EL CONTRATISTA, está en la obligación de presentar a favor de la Municipalidad de Taulabe las garantías siguientes: a) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, Se establece una garantía de cumplimiento equivalente al 15% del monto del contrato, con vigencia de tres (3) meses después del plazo previsto para la ejecución de la obra. **SEPTIMA: MODIFICACION AL CONTRATO:** El Contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en alguna o todas las cláusulas siempre y cuando se acuerde por los



República de Honduras C. A.  
 Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua  
 Tel: 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815



firmantes del mismo, previa una aprobación de la Unidad Técnica Municipal (Supervisión). **OCTAVA: CAUSAS DE TERMINACION DEL CONTRATO:**  
 a) El mutuo acuerdo entre las partes, b) Incumplimiento de contrato, debidamente acreditado, c) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, o uso inapropiado de equipo, de conformidad con los resultados de los informes emitidos por la Unidad Técnica Municipal (Supervisión) y de lo cual se pueda presumir que existe el riesgo de que se malogre o distorsione el objeto del contrato. d) Caso fortuito o Fuerza Mayor, debiendo entenderse ésta como todos los actos, hechos o acontecimientos futuros e imprevisibles en este momento, que impidan de una manera absoluta y directa cumplir con las estipulaciones de este contrato, e) Resolución de contrato decretada por autoridad competente. **NOVENA: RESOLUCION DE CONTROVERSIAS:** Cualquier controversia que surgiera de este contrato, será sometida en todo al derecho administrativo, siendo la jurisdicción competente para conocer las cuestiones que de los mismos se deriven, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo que la Municipalidad designe. **DECIMA:** Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas anteriores y firman para constancia en el municipio de Taulabe a los 28 días del mes de septiembre del año 2020.




LECTON MALDONADO  
 Sr. LECTON MALDONADO  
 Alcalde Municipal de Taulabe

*[Firma manuscrita]*  
 SR. ROGER ANTONIO PORTILLO  
 Identidad No. 0318-7973-00320  
 Contratista  
 Taulabé, Comayagua

4522

**MATERIALES DAVID Y MAS.**  
 Municipalidad de Tezcuahuacan  
 25 de Mayo

CANT.	DESCRIPCION	PU	TOTAL
7	Horas de Retopercauda	800	5,600 <
Construcción y Embaulado de la quebrada de la Cebolita.			



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"	TOTAL L.	5,600 =
CAI: 2D50E4-5CF0A4-6F4193-EE379E-C82B8E-087	Imp. Exonerado	L.
F. Limite de Emisión: 06/12/2020	Imp. Exento	L.
Rango Autorizado 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003700	Imp. Gravado 15%	L.
<i>[Firma]</i> FIRMA	15% IMP. SV	L. 840 <
Total en Letras L.: Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta	TOTAL	L. 6,440 <

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
**FACTURA 000-001-01-00** Nº **003607**  
 Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque CERTIFICADO No 9231-19-10500-24

# VENTA DE MATERIALES R. DAVID Y MÁS

Col. Prado Alto Taulabé, Comayagua

Teléfonos: 9985-7605 / 9862-2407

R.T.N: 0318-1973-00320-3



## COTIZACIÓN

### CASCO URBANO TAULABE

Sr. Municipalidad de Taulabé

**Teléfono:** 2784-5815

**Dirección:** Taulabé, Comayagua

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P/UNIT.
1	METRO DE ARENA	1	L. 460.00
2	METRO DE GRABA TRITURADA	1	L. 690.00
3	METRO DE PIEDRA	1	L. 345.00
4	HORA DE RETROEXCAVADORAS	1	L. 920.00
5	VIAJE DE BALASTRO	1	L. 1,400.00

**NOTA:** LOS PRECIOS YA INCLUYEN EL I.S.V.

Cotización valida desde el 02/06/2020 hasta el 30/12/2020

AUTORIZADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. David y Más', written over a horizontal line.

FIRMA Y SELLO



# **Educ Auto Parts & David Truck**

Ubicado En La Carretera CA-5 Km. 141

Taulabé, Comayagua

## **Precio Casco Urbano**


**Sr. MUNICIPALIDAD DE TAULABÉ**

**Teléfono: 2784-5815**

**Direc: TAULABÉ, COMAYAGUA**

VALIDO 02/ JUNIO/ 2020 - 30 DICIEMBRE 2020

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>P/UNIT.</b>
Metro De Arena	1	L. 683.00
Metro De Graba Triturada	1	L. 845.00
Metro De Piedra	1	L. 475.00
Hora De Retroexcavadora	1	L. 1,100.00
Viaje De Balastro Jaitique	1	L. 1,550.00



*Juan Carlos Dobado Cruz*

FIRMA Y SELLO



LAULABÉ

Comandancia, Honduras, C.A.

CHEQUE No. 00012009

Taulabé 23/10/2020  
Lugar y Fecha

Roger Antonio Portillo L 5,600.00

Páguese a la orden de

Cinco mil seiscientos exactos - Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.

Firma (s)



01605079:00116050001690100012009

PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	FIN-FUN	FTE-FIN	ORG-FIN	FTE-ESP

N.º DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER

ALCALDIA MUNICIPAL  
PRESUPUESTO  
00012009

ALCALDIA MUNICIPAL  
FATIMA PINEDA  
TESORERA

ALCALDIA Taulabé  
BALANCE  
ANTONIO MALDONADO  
ALCALDE

VENTA DE MATERIALES  
R. DAVID Y MAS  
R.T.M. 03181973093263  
Tel. 2784-5484 / 9977-4785  
Taulabé, Comayagua

RECIBI CONFORME

4522
