



Tegucigalpa, 15 de Enero 2021

Licenciada Patricia Asfura
Directora Ejecutiva
Patronato Nacional de la Infancia PANI
Su Oficina


Estimada Lic. Asfura



Por medio de la presente, se remite documentación de la ejecución de gastos del Convenio de Financiamiento para proyecto entre el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), y la Fundación Para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER), para la construcción, Reparación, y mejoras de la sala de Consulta externa de pediatría, Ginecología, Adulto Mayor Discapacidad y Mujeres Embarazadas del antiguo Hospital Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí departamento del Paraíso.

Se adjunta Tres copias de la documentación en físico, y 3 CD respectivamente, correspondiente al segundo desembolso recibido por un valor de L 2,961,188.83, del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), mismo que se está liquidando en un 100% , monto de la liquidación L 2,961,188.83.

Esperando que todo este de conformidad, me suscribo de usted.

Atentamente


Ing. Miguel Ángel Benilla Reyes
Director Ejecutivo
FUNDER



funder

Liquidacion de Gastos Correspondiente al Segundo Desembolso

Fecha	Valor	Concepto
12/10/2020	1,200.00	Marlin Claros: compra de equipo de Bioseguridad
28/10/2020	6,451.16	David Erazo: reembolso de gastos Caja Chica
28/10/2020	27,437.50	Hector Zelaya: pago de 15 días de trabajo
30/10/2020	8,280.00	Concresa: compra de Arena y Bloque
30/10/2020	11,602.77	Construred: compra de pulido y Cemento
30/10/2020	3,500.00	Jose Gallo: compra de Equipo de Bioseguridad
30/10/2020	69,713.50	Funder: Gastos Administrativos
30/10/2020	298.00	Comisiones Bancarias
2/11/2020	2,553.00	Oscar Giron: Mantenimiento de Vehículo
4/11/2020	1,745.00	Jose Gallo: compra de Equipo de Bioseguridad
4/11/2020	144,272.02	Rolando Alexis: 20% anticipo para trabajo de enclelado
6/11/2020	52,241.42	Carlos Amabri: Pago planilla numero 12 correspondiente al periodo 26 de octubre al 07 de noviembre
7/11/2020	5,350.00	Jose Gallo: Fondo para reparacion de Computadora asignada a David Erazo
11/11/2020	3,675.93	Construred: compra de pulido y Cemento
13/11/2020	41,156.25	Hector Zelaya: pago correspondiente al periodo del 26 de Octubre al 15 de Noviembre 2020
13/11/2020	9,750.00	Noc Ramirez: Pago correspondiente al periodo del 26 Octubre al 15 de Noviembre 2020
13/11/2020	7,365.00	Variedades Pintogama: Compra de Sellador para concreto
16/11/2020	223,802.10	Granitos y Terrazos: pago del 50% para compra de Pisos, Granitos y Molduras
16/11/2020	5,700.19	Jose David Erazo: reembolso de gastos de caja chica
16/11/2020	218,716.42	Dicons: Tercer Pago de Electricidad
17/11/2020	22,994.00	Ferreteria Danli: pago por compra de canales de alto caudal
18/11/2020	69,034.29	Funder: Gastos Administrativos
19/11/2020	221,787.72	Rolando Alexis: Primer pago según contrato de enclelado
21/11/2020	47,092.86	Carlos Amabri: Pago planilla numero 13 correspondiente al periodo 09 de noviembre al 21 de noviembre
21/11/2020	700.00	Combustibles y Lubrificantes

Liquidacion de Gastos Correspondiente al Segundo Desembolso

Fecha	Valor	Concepto
24/11/2020	7,365.00	Variedades Pintogama: Compra de Sellador para concreto
24/11/2020	4,216.00	Ferreteria Danli: Compra de 4 canales de alto caudal y sus accesorios
26/11/2020	8,640.37	Ferreteria Manineña: compra de Tuberia y accesorios para bajante de agua lluvia
27/11/2020	7,365.00	Variedades Pintogama: Compra de Sellador para concreto
27/11/2020	142,300.75	mas contramarcos
30/11/2020	7,475.00	Granitos y Terrazos: pago del primer flete
30/11/2020	3,632.00	Comisiones Bancarias
1/12/2020	2,040.00	Concreta: Compra de Arena para pegado de Piso
1/12/2020	8,949.83	Construred: Pago por compra de Pulido y Cemento
3/12/2020	248,982.91	Rolando Alexis Segundo Pago segun contrato de enclelado
3/12/2020	59,309.97	23 de noviembre al 05 de diciembre 2020
7/12/2020	7,475.00	Granitos y Terrazos: pago del segundo flete
7/12/2020	19,499.66	Construred: Compra de Cemento
8/12/2020	2,963.50	Ferreteria Manineña: compra de materiales para elaborar puertas de metal a cuarto electrico
9/12/2020	223,802.10	Granitos y Terrazos: Cancelacion del 50% final para la compra de pisos
9/12/2020	6,120.00	Concreta: Compra de Arena para pegado de piso
9/12/2020	176,666.66	Funder: Gastos Administrativos
9/12/2020	7,475.00	Granitos y Terrazos: Pago del tercer flete
14/12/2020	113,847.20	Nelson Andino: pago del 20% al contrato mas contramarcos
14/12/2020	54,875.00	Hector Zelaya: Pago correspondiente al periodo del 16 de noviembre al 15 de Diciembre 2020
14/12/2020	13,000.00	Noe Ramirez: Pago correspondiente al periodo del 16 de Noviembre al 15 de Diciembre 2020
14/12/2020	14,009.98	Construred: Pago compra de cemento
14/12/2020	7,475.00	Granitos y Terrazos: pago Final por flete
14/12/2020	76,956.13	Carlos Amabri: Pago planilla numero 15 periodo correspondiente al periodo del 07 de Diciembre al 19 de Diciembre 2020
14/12/2020	106,317.43	Rolando Alexis Tercer y Ultimo pago segun Contrato de enclelados



Liquidacion de Gastos Correspondiente al Segundo Desembolso

Fecha	Valor	Concepto
24/12/2020	113,847.20	Nelson Andino: Tercer Pago correspondiente al 20% por elaboracion de puertas y ventanas
24/12/2020	1,473.00	Variedades Pintogama: compra de sellador para concreto
24/12/2020	3,019.00	Ferreteria Danli: Compra de materiales para enchape de Baños
24/12/2020	9,749.83	Constured: Compra de Cemento
24/12/2020	7,140.00	Concresa: Compra de Arena para pegado de Piso
24/12/2020	15,549.60	Ferreteria Manineña: Compra de ceramica para enchape
30/12/2020	9,749.83	Constured: Compra de Cemento
30/12/2020	66,721.30	Carlos Amabri: pago planilla numero 16 periodo 21 al 31 de Diciembre 2020
31/12/2020	1,420.00	Constured: Compra de Cemento Blanco
31/12/2020	4,760.00	Concresa: Compra de Arena para pegado de Piso
31/12/2020	2,806.00	Comisiones Bancarias
6/1/2021	54,875.00	Hector Zelaya: pago correspondiente al periodo del 16 de Diciembre al 15 de Enero 2021
6/1/2021	5,849.90	Constured: Compra de Cemento
6/1/2021	13,000.00	Noe Ramirez correspondiente al periodo del 16 Diciembre al 15 de Enero 2021
7/1/2021	1,854.98	Constured: Compra de Cemento Griss y Cemento Blanco
7/1/2021	11,070.99	David Erazo: reembolso de gastos
11/1/2021	2,924.94	Constured: Compra de Cemento Griss
11/1/2021	1,180.00	Ferreteria Danli: Compra de Pegamento para enchape
11/1/2021	1,807.40	Noe Ramirez, Liquidacion de gastos
11/1/2021	42,140.37	Carlos Amabri Pago correspondiente a la planilla numero 17
11/1/2021	19,426.25	Hector Zelaya: Liquidacion de gastos
11/1/2021	33,789.62	Nelson Andino: parcial para la elaboracion de puertas y ventanas
11/1/2021	430.00	Comisiones Bancarias
11/1/2021	77.00	Comisiones Bancarias

Total Gastos 2,961,188.83



Informe De Gasto

SEGUNDA LIQUIDACION DE TRASFERENCIA RECIBIDA POR UN VALOR DE L 2,961,188.83

Funder/Pani

	Presupuesto General Anual	EJECUCION REALIZADA AL PRIMER DESEMBOLSO	EJECUCION REALIZADA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO	Total Ejecucion	Total Disponible
PROYECTO PANI					
COMPONENTE 2					
01 OBRA GRIS PISOS Y AGUAS NEGRAS TECN	7,831,000.00	3,103,565.26	2,403,008.47	5,506,573.73	2,324,426.27
COMPONENTE 4					
01 INGENIEREROS A CARGO ASISTENTE DE OB	439,000.00	315,531.25	123,468.75	439,000.00	0.00
COMPONENTE 5					
01 RECONOCIMIENTO POR PRE INVERSION IN	60,000.00	0.00	0.00		60,000.00
COMPONENTE 6					
01 IMPREVISTOS	500,000.00	74,169.01	76,374.16	150,543.17	349,456.83
02 COMISIONES TASA DE SEGURIDAD	0.00	8,646.00	7,173.00	15,819.00	-15,819.00
COMPONENTE 7					
01 COORDINA RRHH LEGAL ADMON DE PROY	880,000.00	446,340.24	351,164.45	797,504.69	82,495.31
COMPONENTE 8					
01 AUDITORIA 1	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
02 AUDITORIA 2	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GENERAL	9,800,000.00	3,948,251.76	2,961,188.83	6,909,440.59	2,890,559.41

Valor Recibido	2,961,188.83
Total Ejecutado	2,961,188.83
Disponible	0.00




DECLARATORIA DE GASTOS


La Fundación para el desarrollo empresarial Rural (FUNDER) declara que se ha presentado copia de la documentación correspondiente al segundo desembolso recibido según convenio suscrito entre Funder y el Pani, para la "Construcción, Reparación y Mejoras de la sala de Consulta Externa de Pediatría, Ginecología, adulto mayor, discapacidad y mujeres embarazadas del Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí, El Paraíso" por un valor de **L.2,961,188.83**

Se adjunta el detalle de gastos por la cantidad antes mencionada.

Tegucigalpa M.D.C, 15 de Enero 2021



Gerente Administrador
Lic. Alvaro Rodríguez



Contador General
Lic. Nancy Aguilera



INFORME DE AVANCE 2do DESEMBOLSO

**Construcción, reparación y mejoras de la sala de
consulta externa de Pediatría, Ginecología, Adulto
Mayor, Discapacidad y Mujeres embarazadas del
antiguo Hospital Gabriela Alvarado de la Ciudad de
Danlí, Departamento de El Paraíso**

**Del 26 DE OCTUBRE DE 2020 AL 15 DE ENERO DE
2021**

Elaborado por:

Ing. Hector Zelaya Larios

e Ing. Hector Zelaya Appel



INTRODUCCIÓN:


Con el objetivo de beneficiar al menos 15,000 familias que viven en la pobreza y pobreza extrema, brindándoles salud, orientación familiar y una atención de calidad, El PANI destinará los recursos necesarios para Construcción, reparación y mejoras de la sala de consulta externa de Pediatría, Ginecología, Adulto Mayor, Discapacidad y Mujeres embarazadas del antiguo Hospital Gabriela Alvarado de la Ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso.



Esto permitirá ampliar y optimizar el número de atenciones médicas para madres e hijos con servicios de calidad y calidez para los pacientes de todo el departamento que visiten el Antiguo Hospital Gabriela Alvarado. Además de reducir el riesgo por enfermedades infectocontagiosas para madres e hijos durante las visitas al centro hospitalario en un ambiente limpio, seguro y con servicios sanitarios acorde a su recinto.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:


A continuación, se da una breve explicación y documentación mediante imágenes de las principales actividades ejecutadas durante este período, en el cual se ha finalizado la restauración de las paredes del antiguo edificio del hospital, se ha colocado todo el cableado para iluminación y fuerza junto con el armado de todos los paneles; se ha armado toda la estructura de los encielados de pvc, también se ha colocado todo el piso y se ha iniciado la instalación de puertas y ventanas.

Entablicados: La Actividad consiste en crear un murete que sirva de sello entre las paredes y la estructura de techo para evitar la entrada de animales y suciedad entre el espacio de cielos falsos y techo. En este caso se utilizó bloque sobrante para hacer el entablicado.



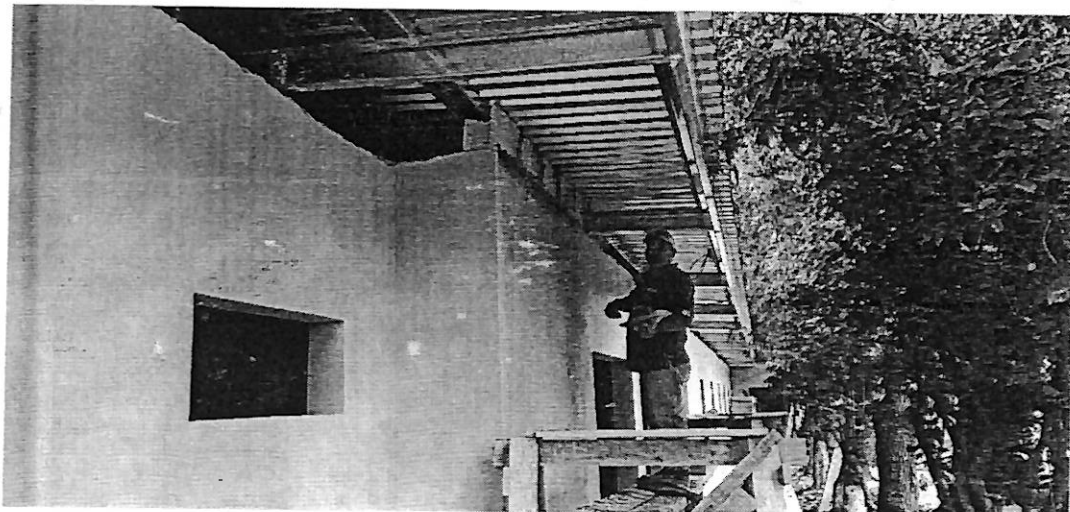
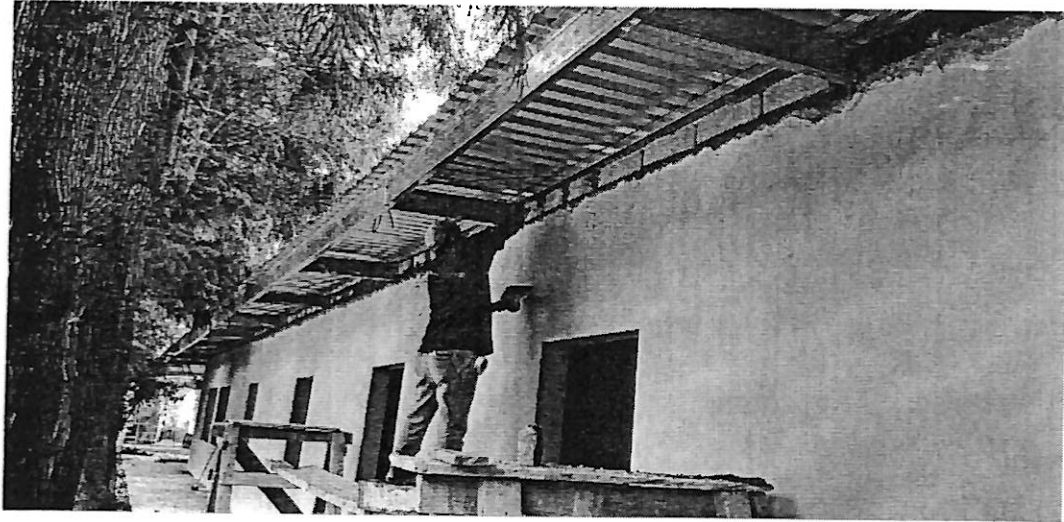


Cableado para salidas de Iluminación, Interruptores y Tomacorrientes: La actividad consiste en la inserción de cables con la ayuda de una cinta pescante dentro de la tubería eléctrica instalada para dicho propósito, permitiendo así la habilitar las salidas para la instalación de lámparas, interruptores y tomacorrientes, a los cuales solo haría falta colocar el accesorio final para cada caso.

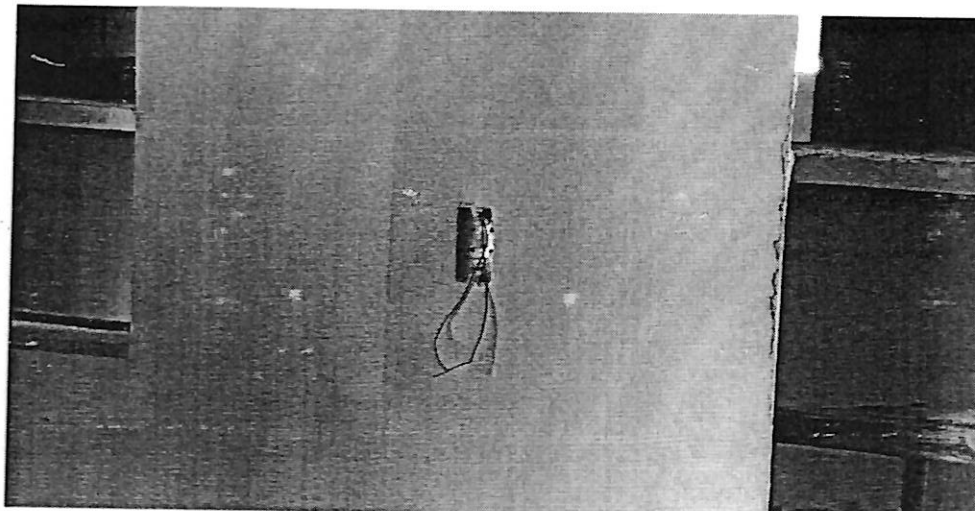

Instalación de Paneles Eléctricos Finales TP, CC1, CC2 y cableado final para tomacorrientes:




Tal como se describe, se han instalado los paneles principales que controlan la energía eléctrica de los edificios, así como el armado interno de circuitos y breakers.

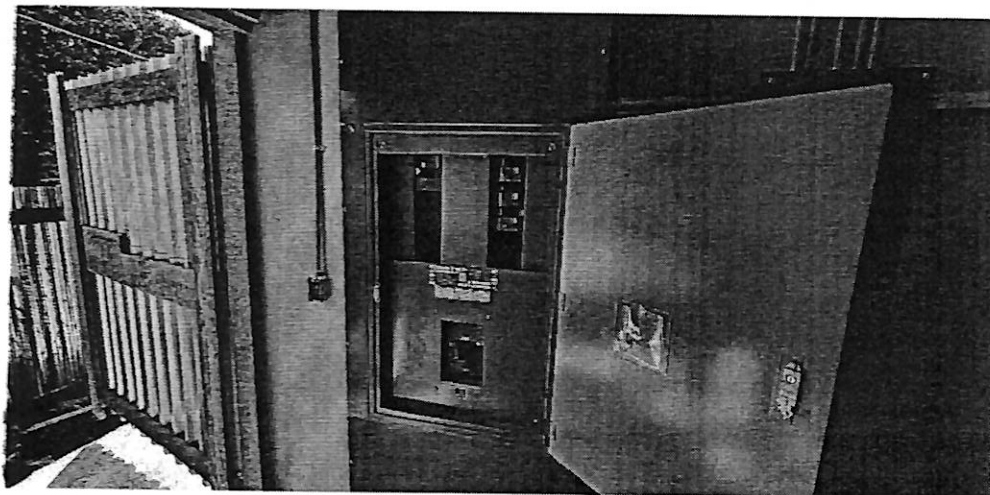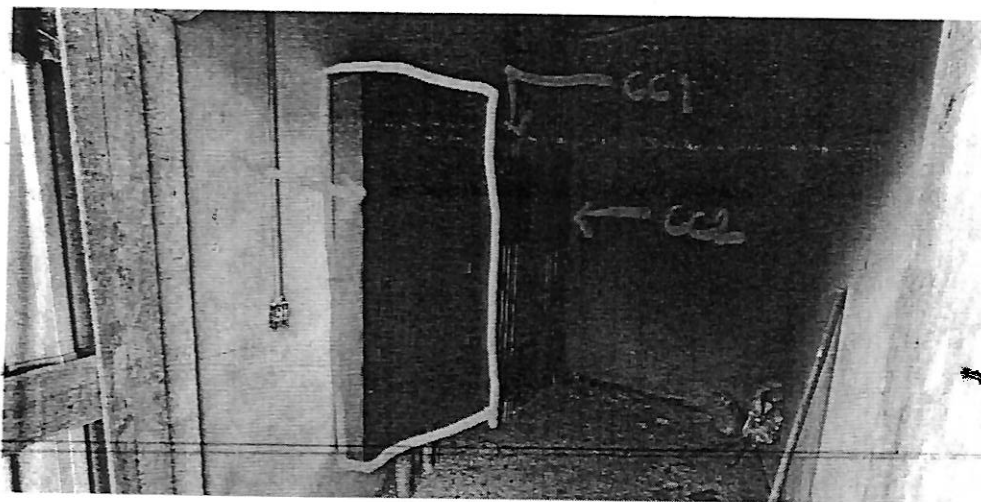




En la siguiente imagen se muestra la enumeración de los breakers de acuerdo con el presupuesto:






Restauración de Paredes: Esta actividad ha consistido en algunos casos en reconstruir paredes completamente, aparte de resanar, repellar y pulir nuevamente las paredes de la zona antigua del hospital.

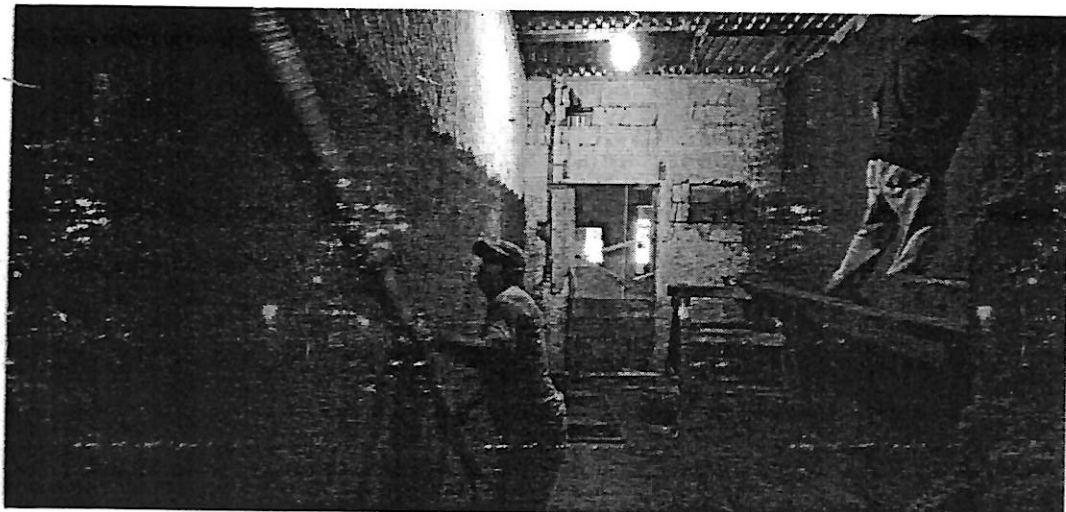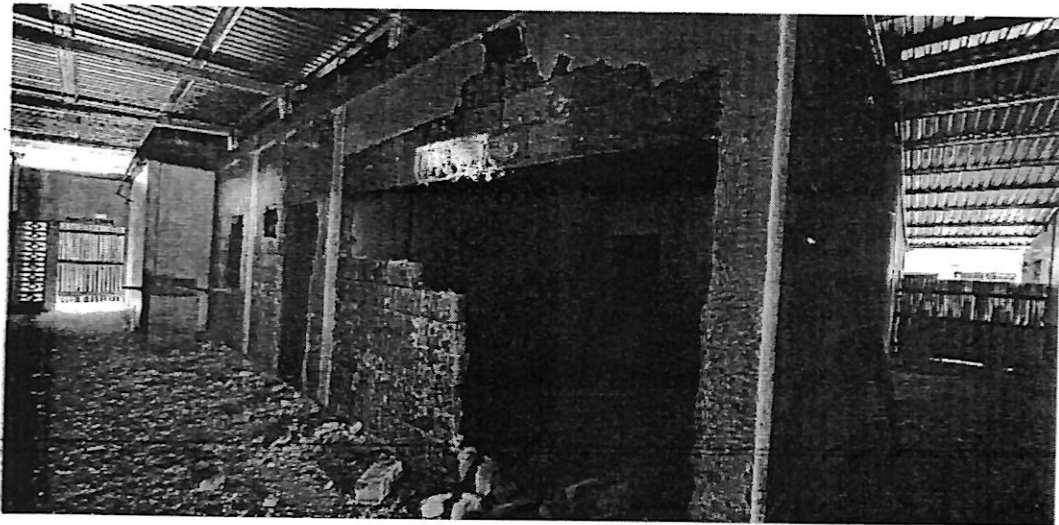



- Pulido en Paredes:** Consiste en la colocación del acabado final en las paredes que elimina la textura rugosa del repello, previo a la colocación de las capas de sellador y pintura. Esta actividad ha quedado finalizada durante este período.

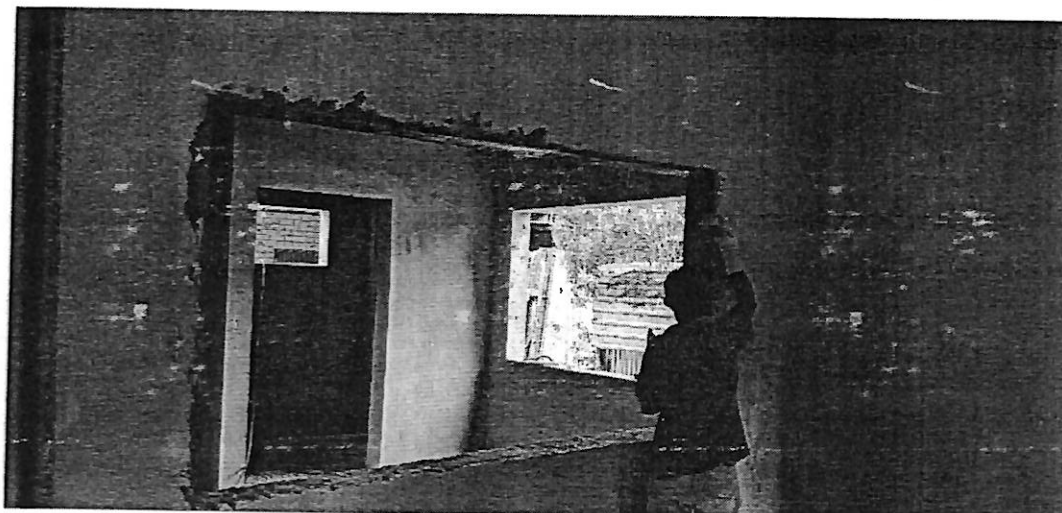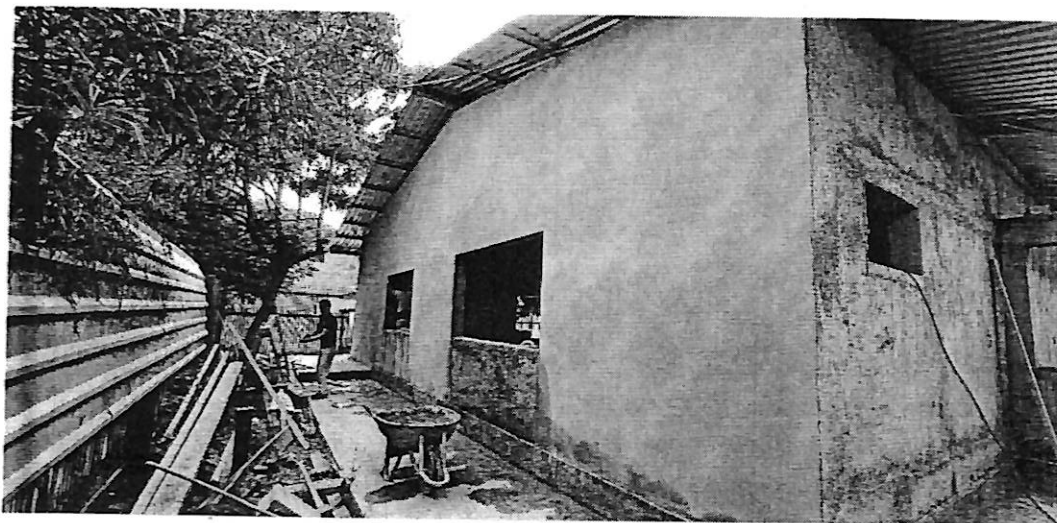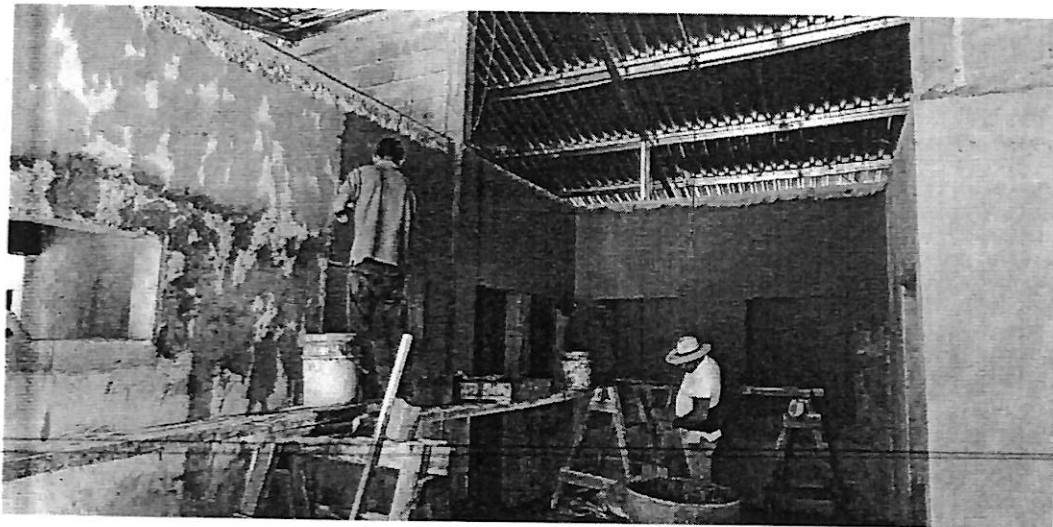



Lijado y Sellado de Paredes: Esta actividad ha consistido en lijar todas las paredes de la edificación, eliminando así cualquier rugosidad e imperfección existente apoyándose también de la utilización de masilla para resanar golpes menores y pequeñas fisuras, posterior a este proceso se procedió a colocar un mano de sellador de blanco, esta actividad cumple la función de preparar las paredes previo a la colocación de la pintura.

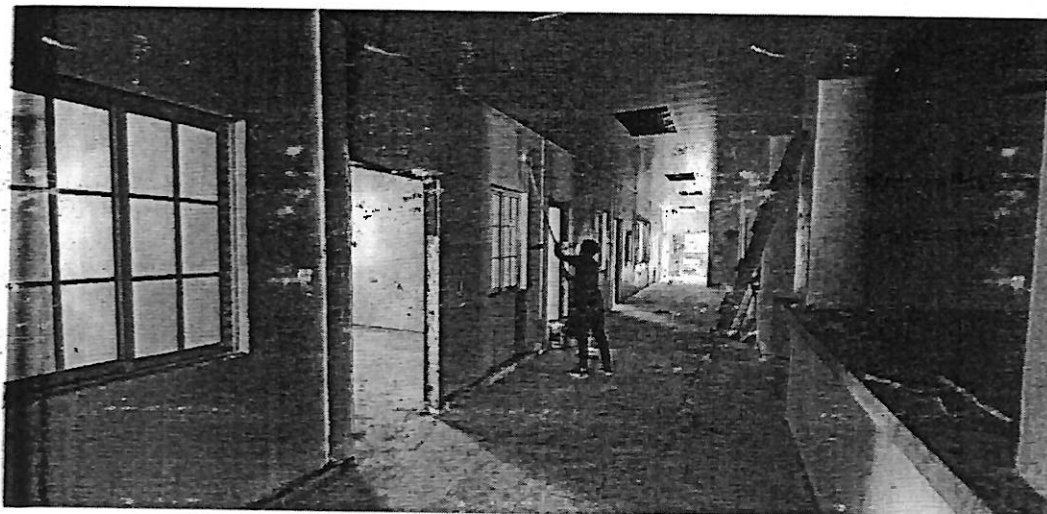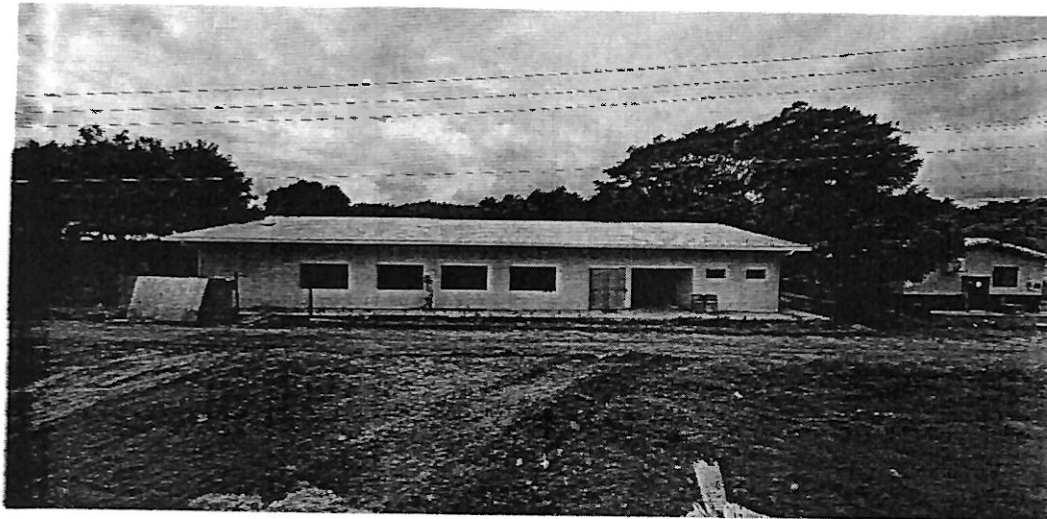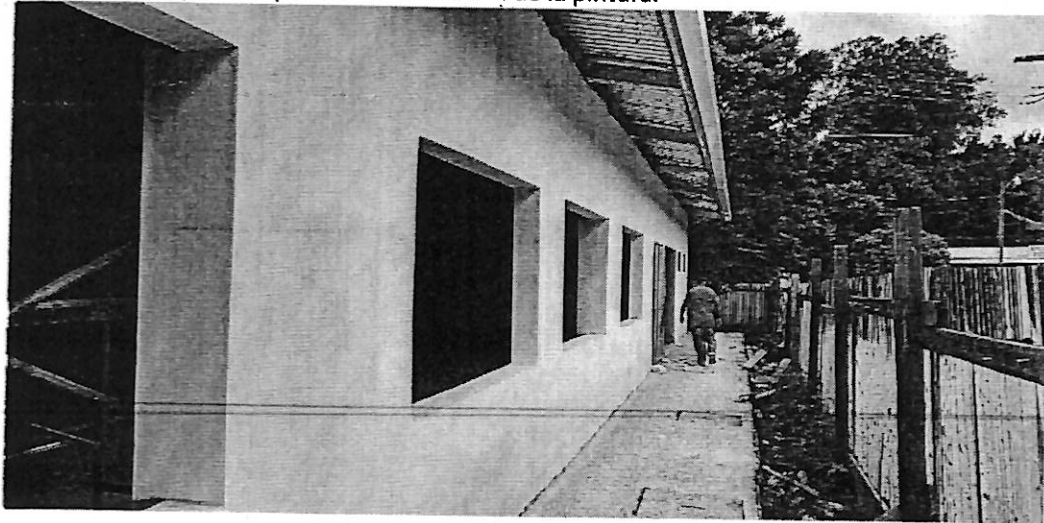




Encielados de PVC: Esta actividad consistió en el armado de una estructura metálica que sirve como soporte a las tablillas de pvc que conforman el encielado.


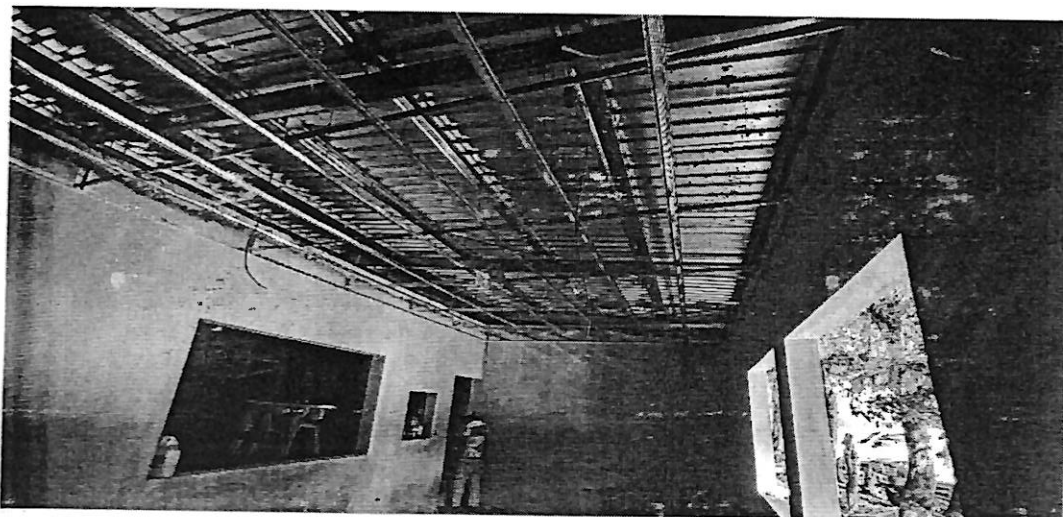
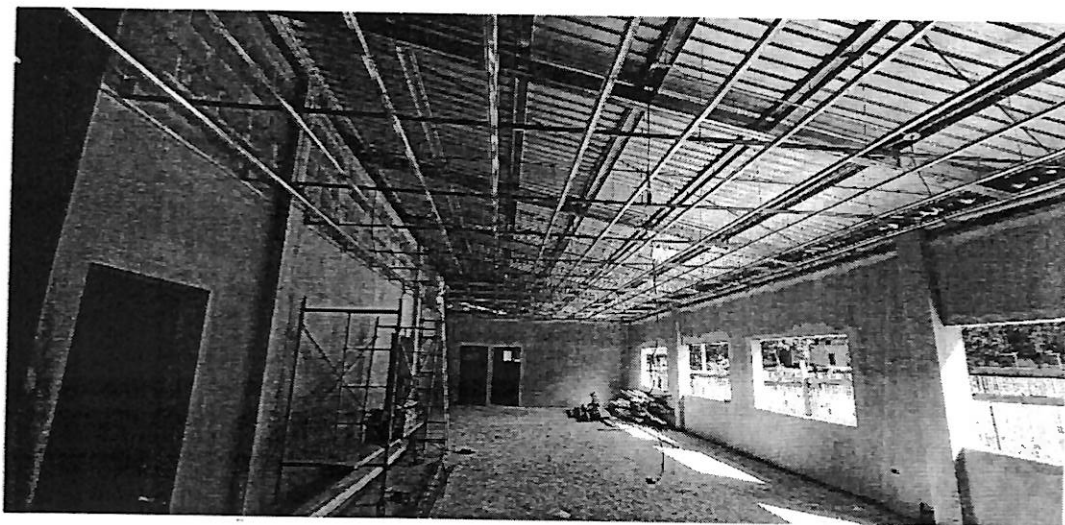


ifunder
GERENCIA ADMINISTRATIVA

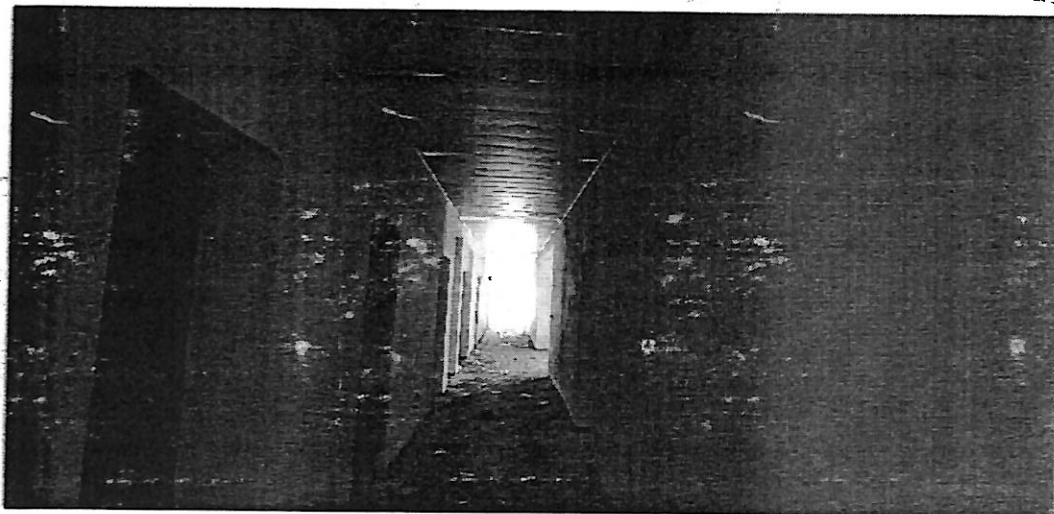
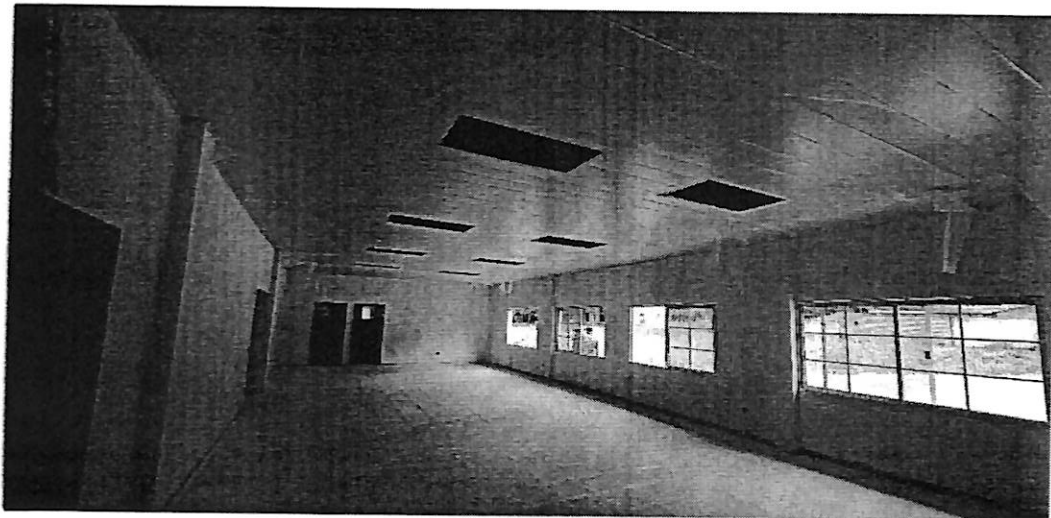


[Handwritten signature]
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

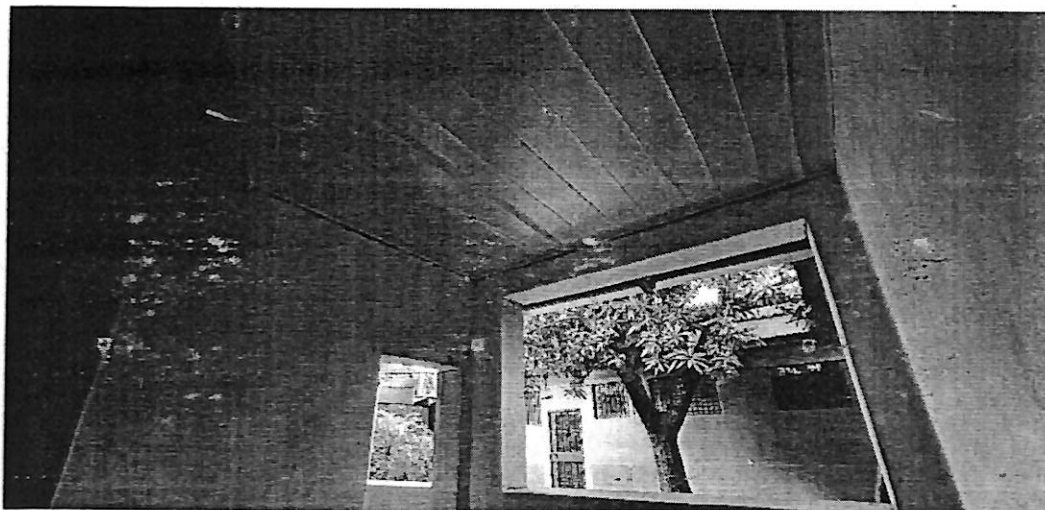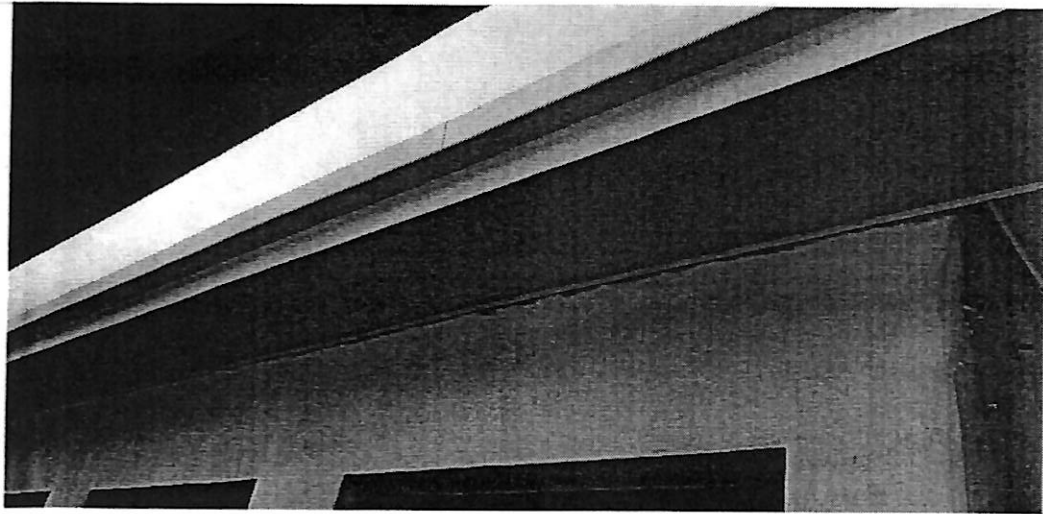

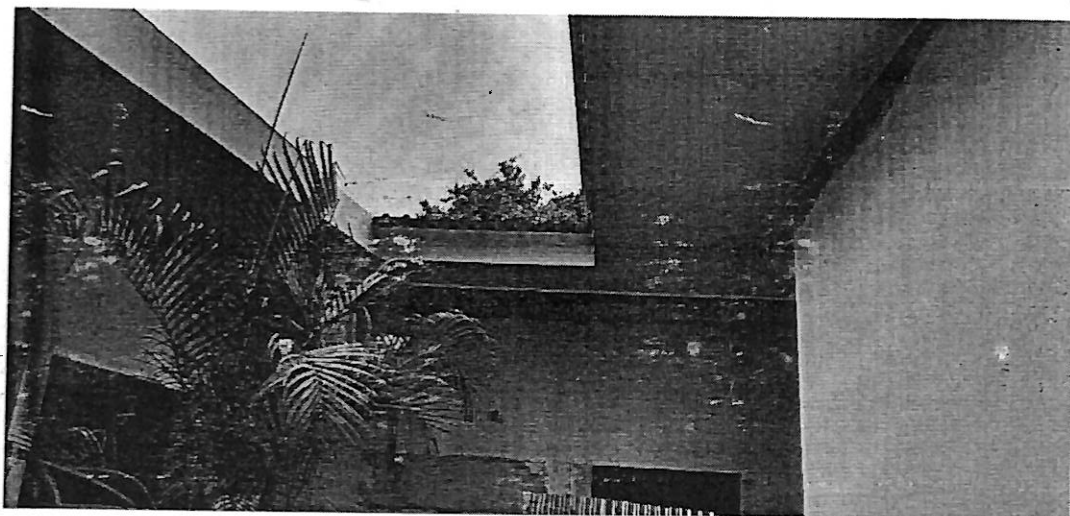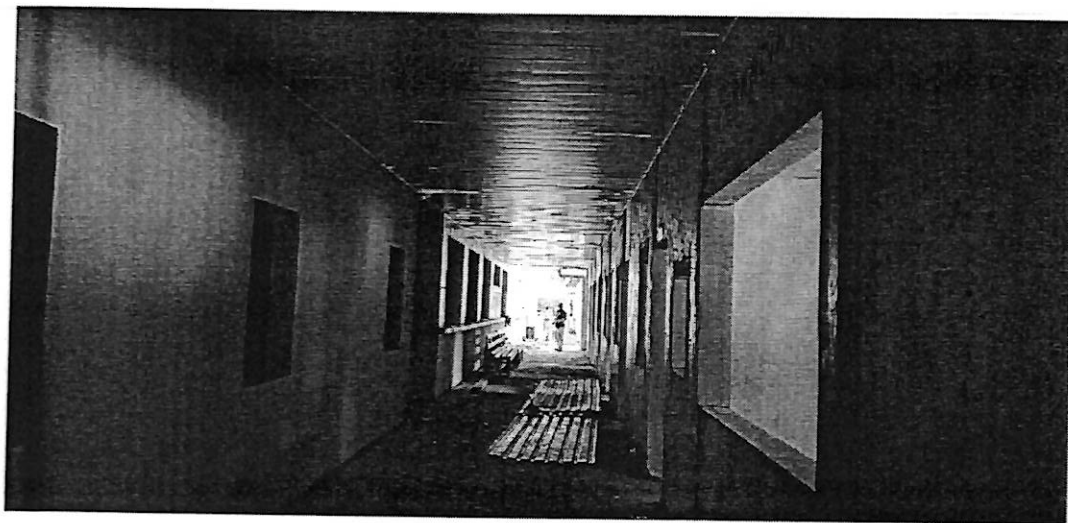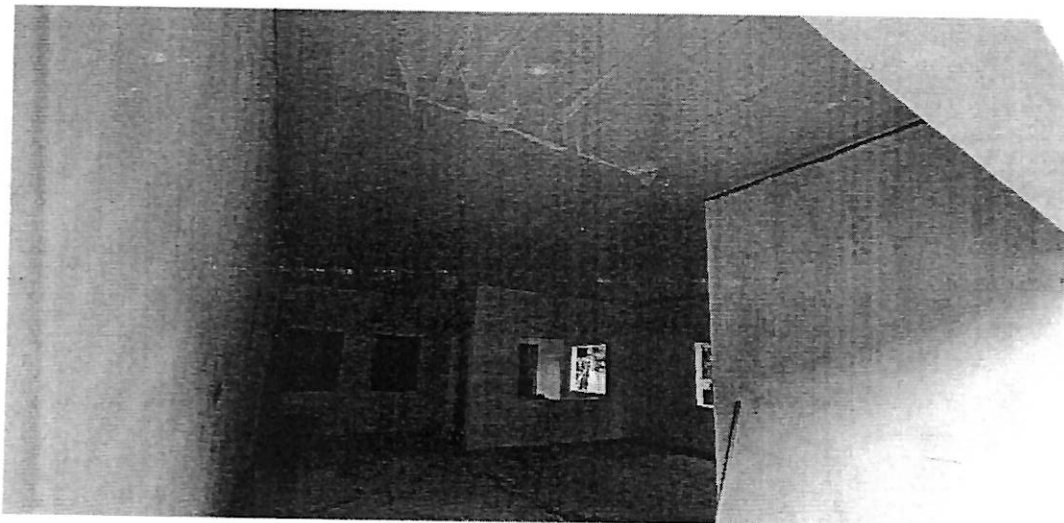


[Handwritten signature]
DIRECCIÓN GENERAL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

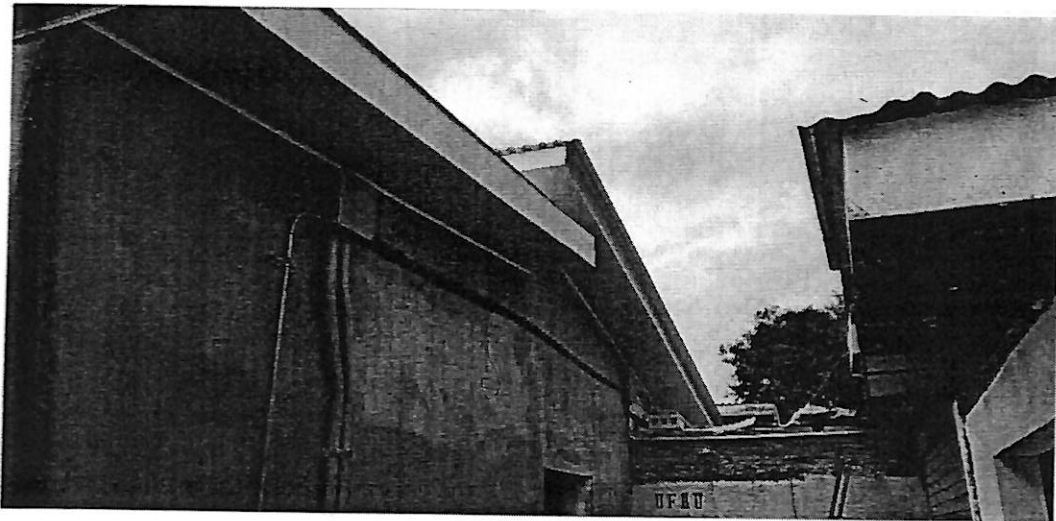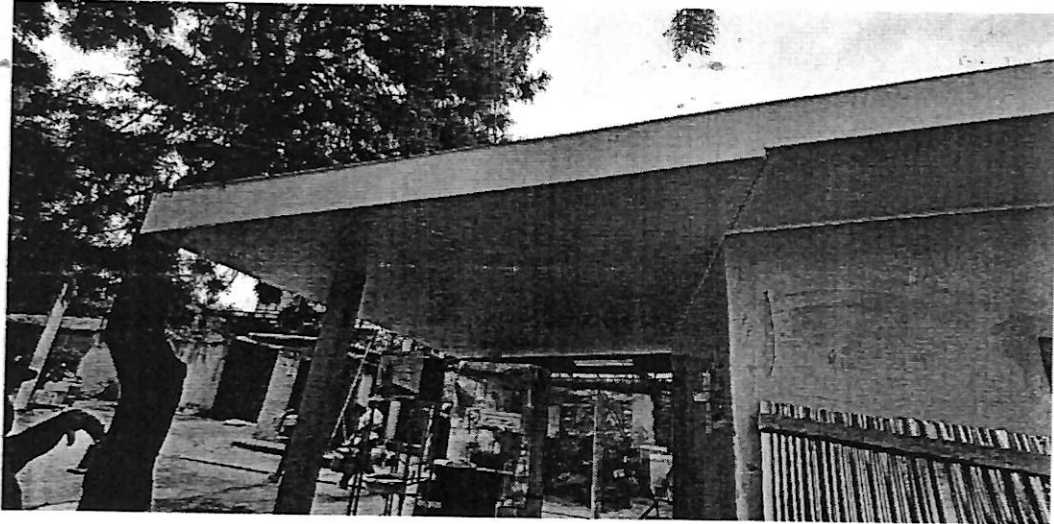




RECEIVED
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
10/10/2010

Instalación de Piso de terrazo de 40x40cms, con de 7x40cms:




Este trabajo consistirá en la colocación de piezas de 40 x 40 cms de piso de granito. Para pegar las piezas de ladrillo granito se utiliza un firme de mortero (arena y cemento en proporción 1:4) en capas de espesor variable entre 2.0 y 4.0 cm, teniendo la precaución de humedecer las superficies de contacto. Se instaló primero una línea maestra que guiará la colocación de toda el área, se ha mantenido las alineaciones en las piezas utilizando separadores de 4mm.

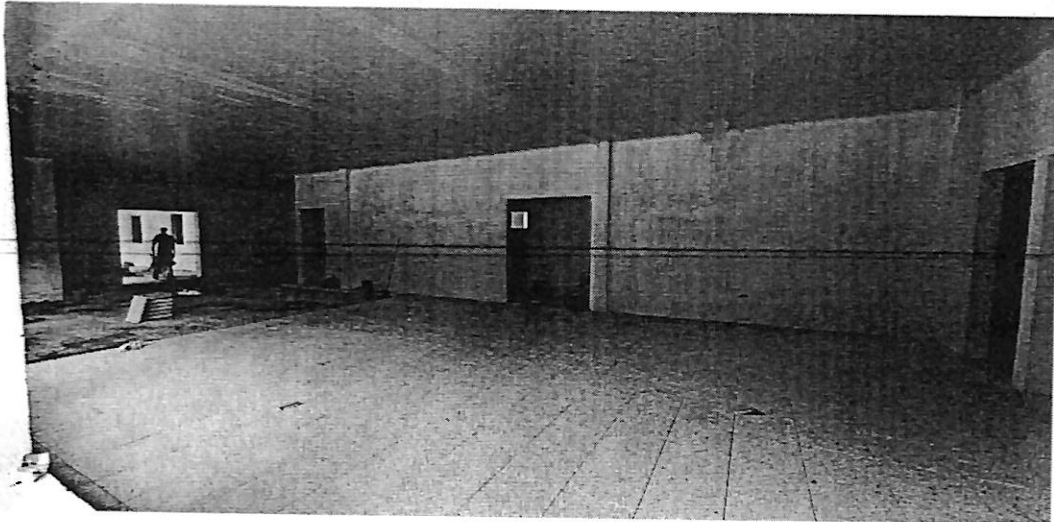




 GERENCIA
 ADMINISTRATIVA

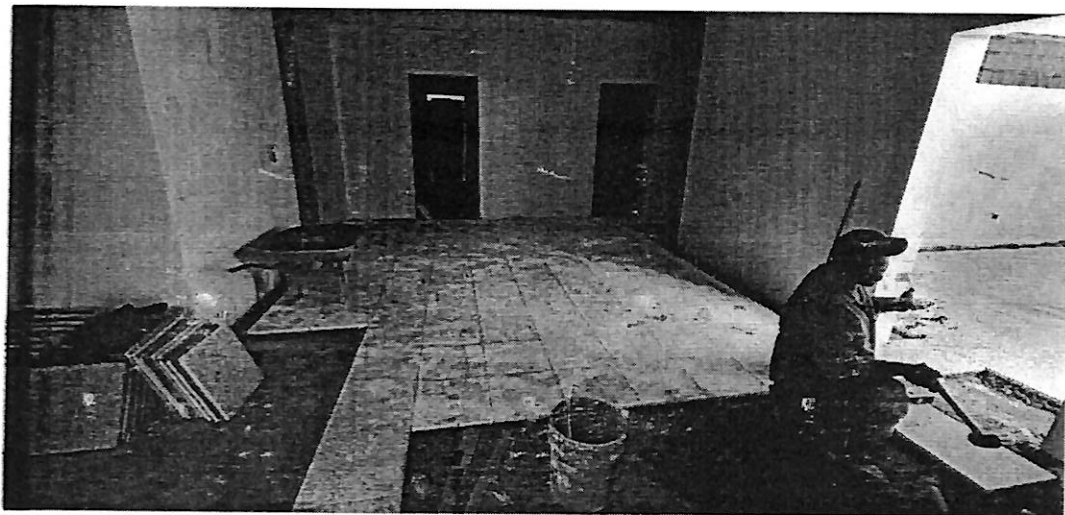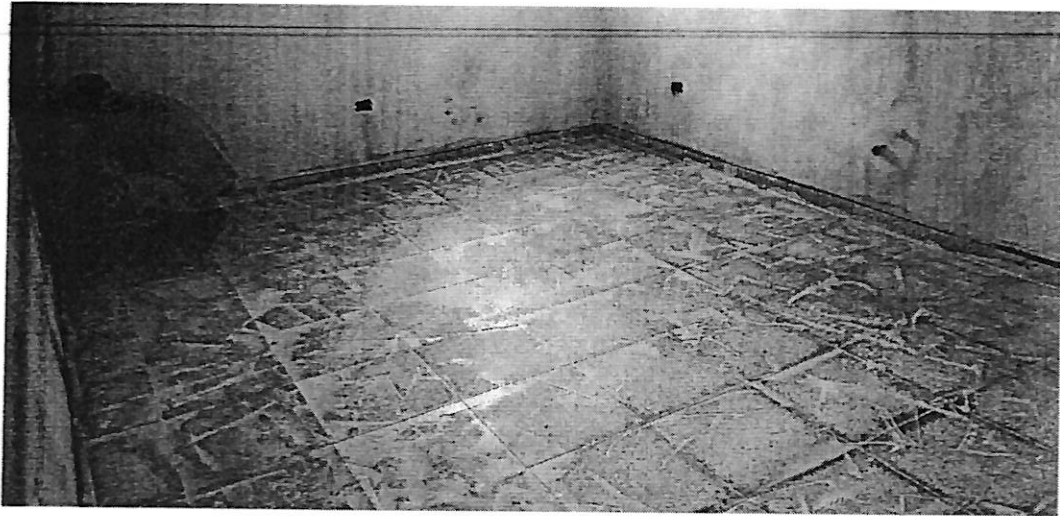

[Handwritten signature]
RECEIVED
ADMINISTRATIVE

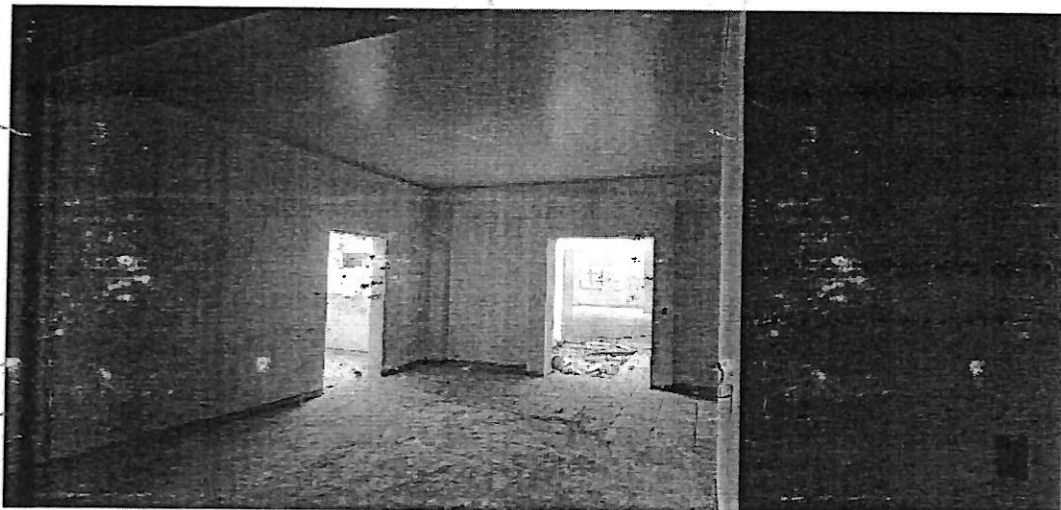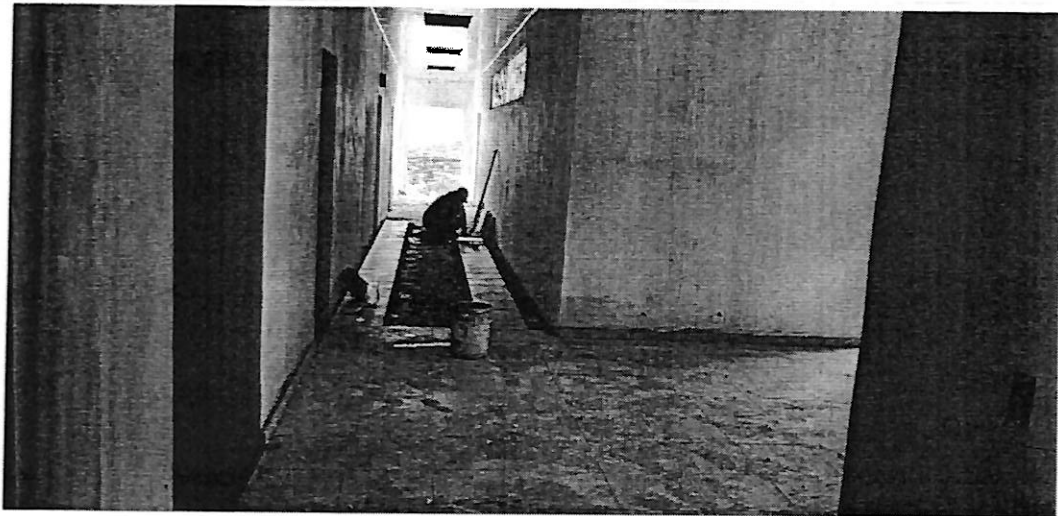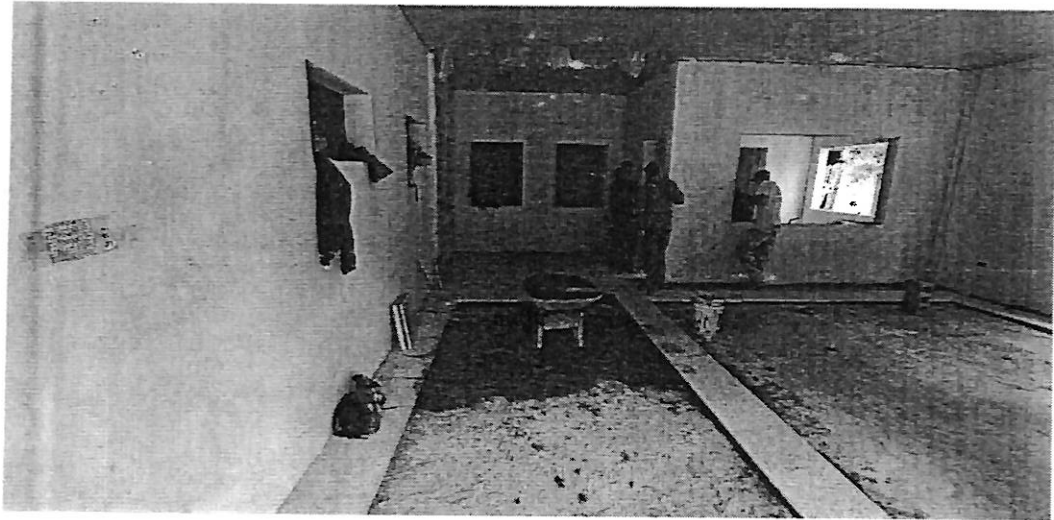


Handwritten signature
Circular stamp: **SECRETARIA DE SALUD**
FOLIO: *140*
ADMINISTRACION
El Paraiso

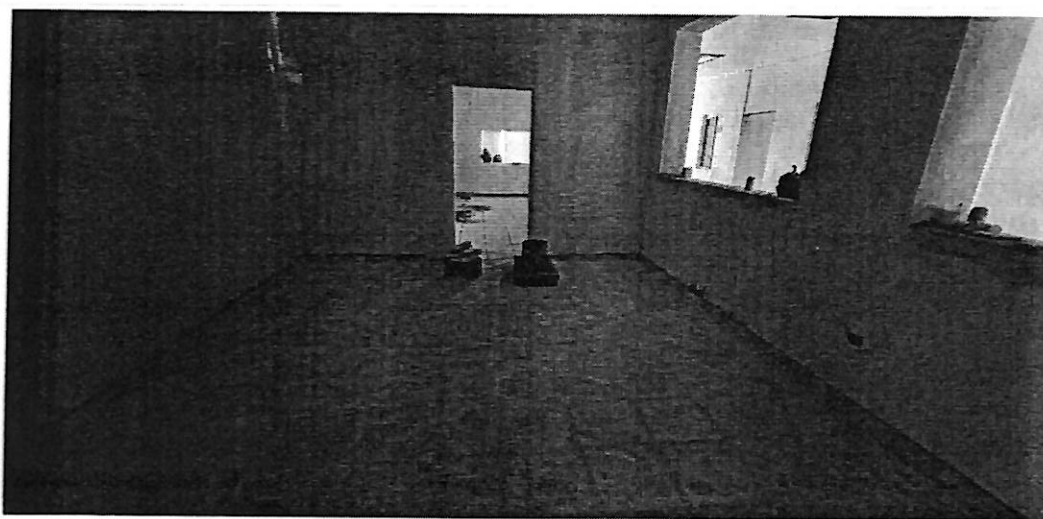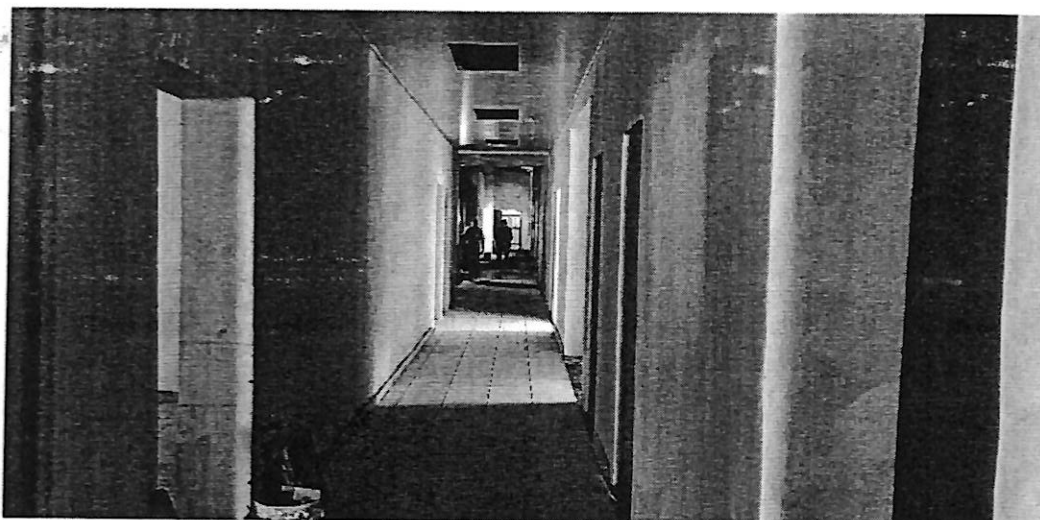




Handwritten signature and a circular stamp. The stamp contains the text: "RECEIVED", "GENERAL ADMINISTRATIVE", and "EL PARAISO".

Instalación de Ventana de Aluminio:



Este trabajo consiste en el suministro y la instalación de ventanas elaboradas en perfiles de aluminio y vidrio fijo de tamaños variables de acuerdo con el boquete de cada ventana, incluye malla mosquitera, según el sistema especificado y los diseños que se señalen en los planos del proyecto. Los perfiles de aluminio deberán estar limpios de rebabas, rectos, de dimensiones, color y espesor constantes. Previo a su fabricación han verificado las dimensiones de los marcos en el sitio de la obra. Las ventanas de vidrio fijo incluyen: operadores manuales, tela metálica y todos los accesorios necesarios para su instalación.

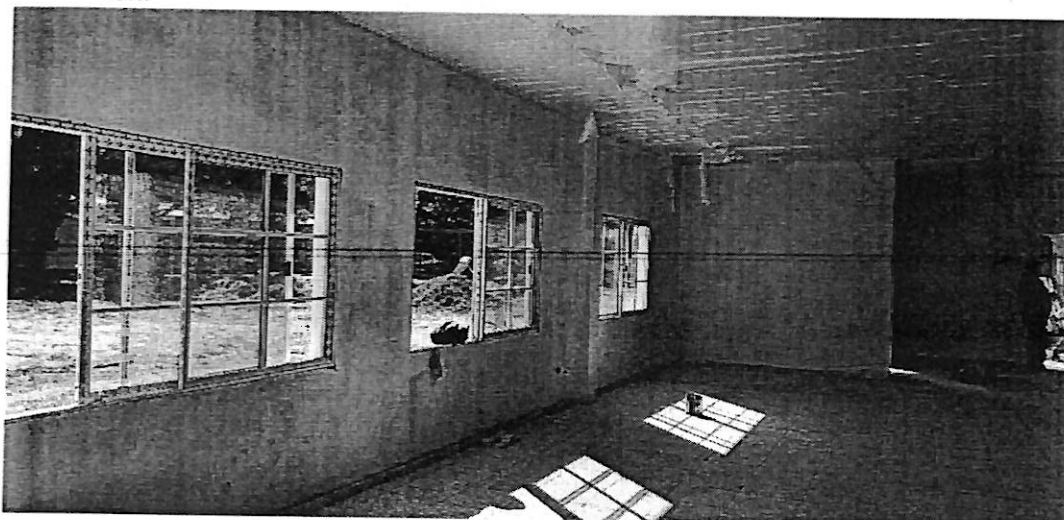

[Handwritten signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

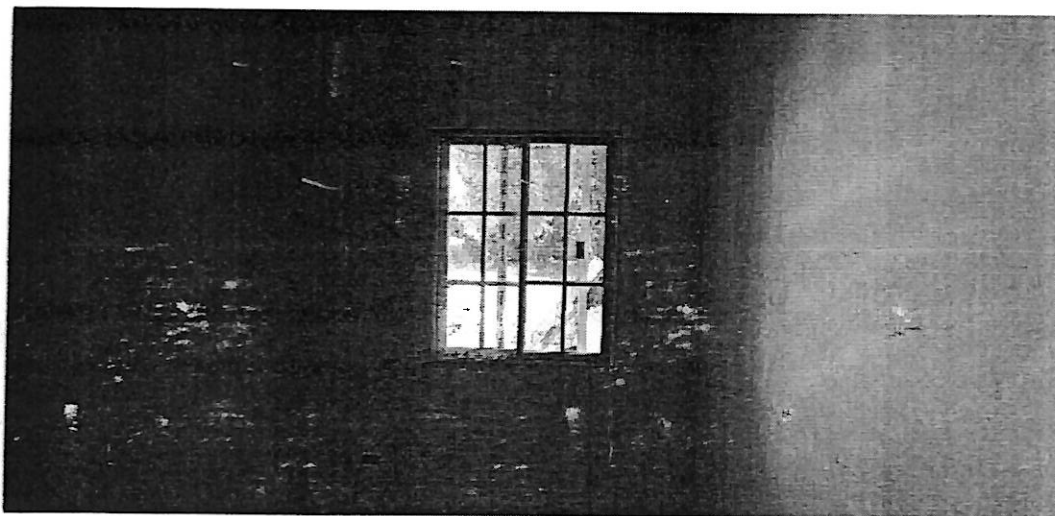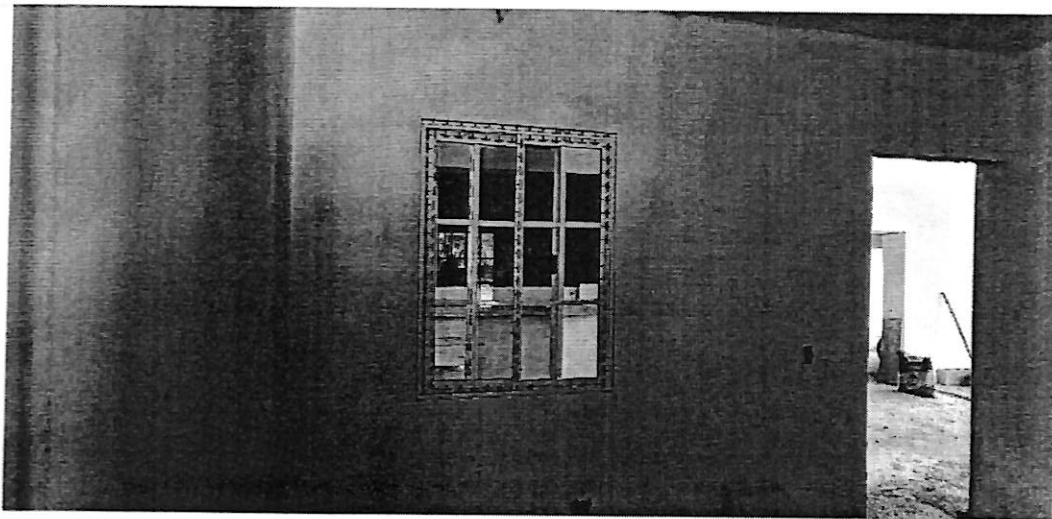
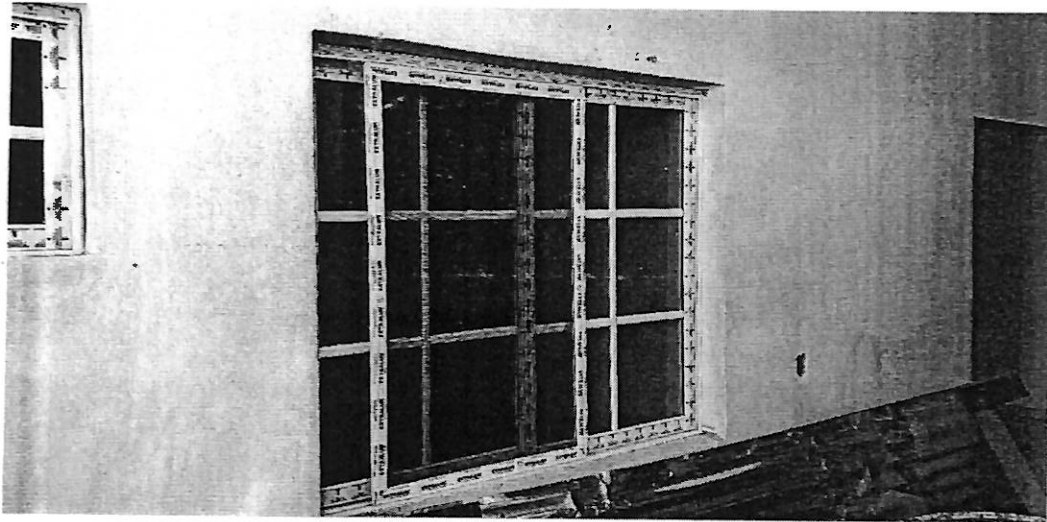


14/11/2019
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA
[Signature]

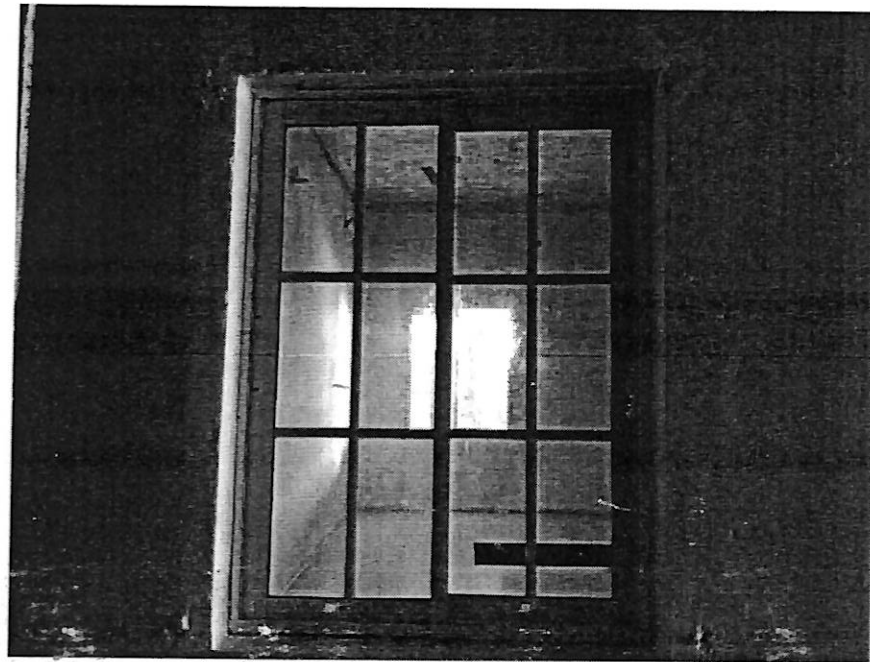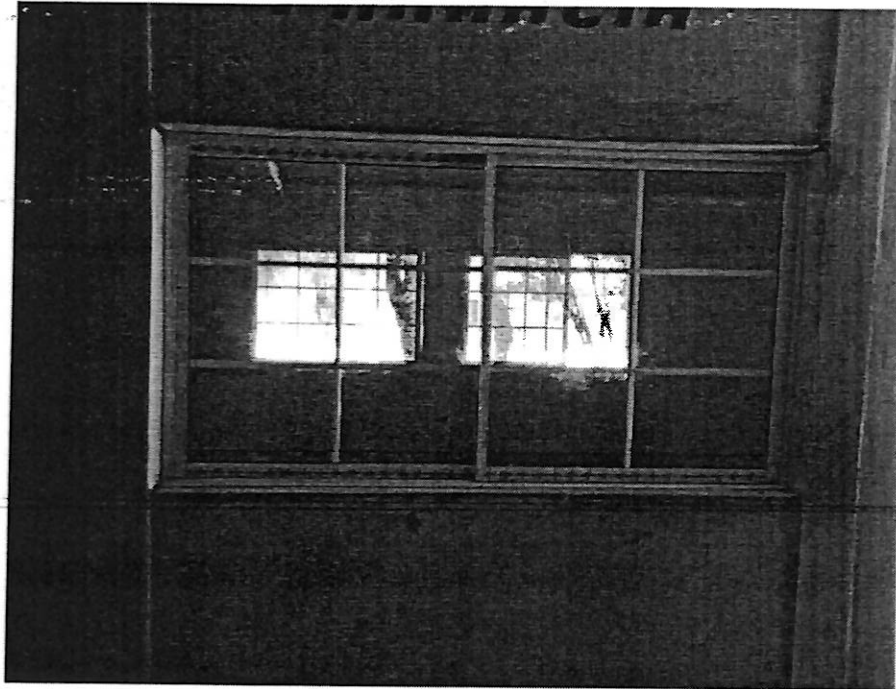


129

IFUNDER
GERENCIA
ECONOMICA

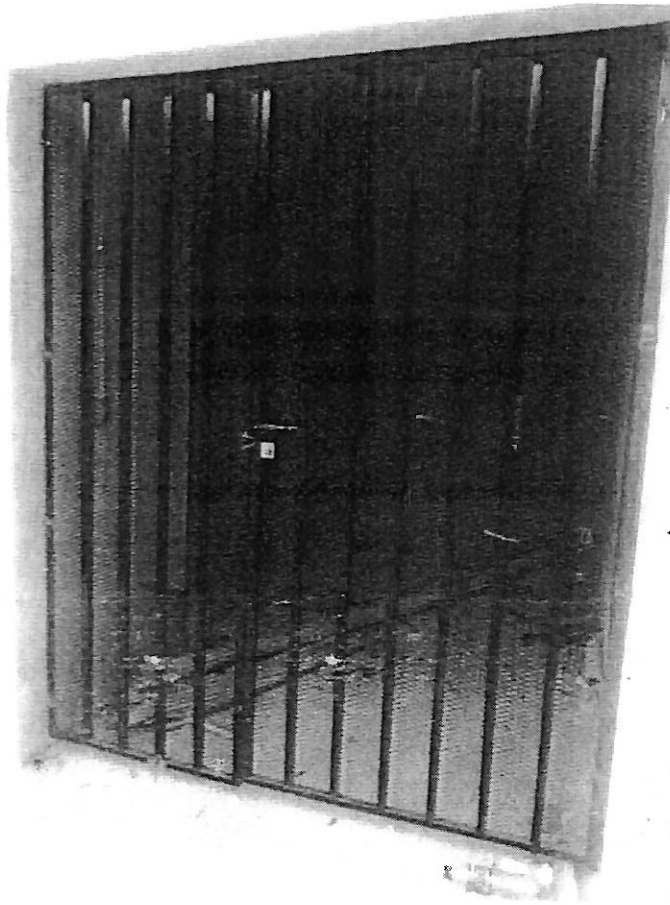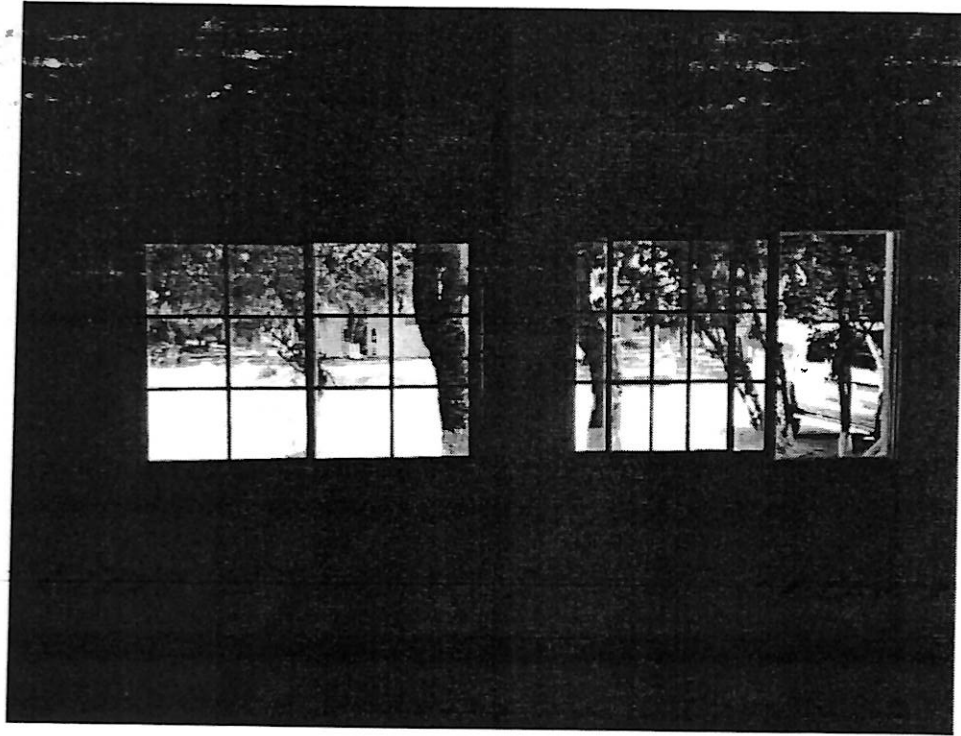

segundo desembolso L2,961,188.83

RESUMEN FINANCIERO HASTA LA FECHA				
Descripción	Cantidad	Factura	Fecha	Nombre
Caja Chica #3	L19,426.25	ver caja chica		Hector Zelaya
50 sacos de Pulido y 30 Bolsas de Cemento	L11,602.77	11482	28/10/2020	Ferretería Construred
300 bloques #6 y 2 viajes de Arena	L8,280.00	349	30/10/2020	Concreta Construcciones
Pago de Anticipo para Encielados de PVC	L144,272.02	151	4/11/2020	Rolando Alexis Rosales
Pago de Planilla #12	L52,241.42	213	7/11/2020	Carlos Rodríguez
15 sacos de pulido y 10 de Cemento	L3,675.93	11964	11/11/2020	Ferretería Construred
5 cubetas de sellador Sherwin	L7,365.00	125072	13/11/2020	Variedades Pintogama
Pago Estimación #3 Obras Eléctricas	L218,716.42	202	17/11/2020	DICONS S.de RL
Compra de Piso Terrazo (50% anticipo)	L223,802.10	31766	17/11/2020	Granitos y Terrazos S.A
Caja Chica David Erazo	L5,700.19	ver caja chica	17/11/200	David Erazo
Compra de Canales de PVC para Aguas Lluvias	L22,394.00	32383	18/11/2020	Ferretería Danlí
Pago#1 para Encielados de PVC	L221,787.72	214	20/11/2020	Rolando Alexis Rosales
Pago de Avance de Obra #13	L47,092.86	153	21/11/2020	Carlos Rodríguez
5 cubetas de Sellador Sherwin	L7,365.00	125553	25/11/2020	Variedades Pintogama
Canales Adicional	L4,216.00	32669	23/11/2020	Ferretería Danlí
Tubería para bajantes	L8,649.37	46326	24/11/2020	Ferretería Manineña
5 cubetas de Sellador Sherwin	L7,365.00	125661	27/11/2020	Variedades Pintogama
flete Rastra #1	L7,475.00	31950	30/11/2020	Granitos y Terrazos S.A
40 cemento, 10 pulido	L8,949.83	12852	30/11/2020	Construred
Pago de Avance de Mano de Obra#14	L59,309.97	154	4/12/2020	Carlos Rodríguez
Pago#2 para Encielados de Pvc	L248,982.91	215	4/12/2020	Rolando Alexis Rosales
flete Rastra #2	L7,475.00	32020	7/12/2020	Granitos y Terrazos S.A
Viaje de Arena	L2,040.00	352	7/12/2020	Concreta Construcciones
100 bolsas de cemento	L19,499.66	13095	8/12/2020	Ferretería Construred
Compra de Piso Terrazo (2do 50%)	L223,802.10	32053	9/12/2020	Granitos y Terrazos S.A
flete Rastra #3	L7,475.00	32054	9/12/2020	Granitos y Terrazos S.A
Anticipo Puertas y Ventanas	L142,309.75	151	27/11/2020	Nelson Andino
3 viajes de Arena	L6,120.00	354	11/12/2020	Concreta Construcciones
Materiales para Porton	L2,963.50	48492	5/12/2020	Ferretería Manineña
50 cemento gris y 15 de cemento blanco	L14,009.98	13591	15/12/2020	Ferretería Construred
Pago 1 Puertas y Ventanas	L113,847.20	152	15/12/2020	Nelson Andino
Pago de Mano de Obra #15	L76,956.13	156	18/12/2020	Carlos Rodríguez
Flete Rastra #4	L7,475.00	32121	17/12/2020	Granitos y Terrazos S.A
Pago #3 para encielados de PVC	L106,317.43	217	22/12/2020	Rolando Alexis Rosales
Pago 2 Puertas y Ventanas	L113,847.20	153	24/12/2020	Nelson Andino
Cemento Blanco, Separadores	L3,019.00	34623	22/12/2020	Ferretería Danlí
1 cubeta de sellador Blanco	L1,473.00	127204	26/12/2020	Variedades Pintogama
Cerámica Blanca para Baños	L15,549.60	819	21/12/2020	Ferretería Manineña
50 bolsas de Cemento	L9,749.83	14084	23/12/2020	Ferretería Construred
3 viajes de Arena	L7,140.00	357	28/12/2020	Concreta Construcciones
Pago de Mano de Obra #16	L66,721.30	157	31/12/2020	Carlos Rodríguez



50 bolsas de Cemento Bijao	L9,749.83	14296	31/12/2020	Ferretería Construred
5 bolsas de Cemento Blanco	L1,420.00	14477	4/1/2021	Ferretería Construred
2 Viajes de Arena	L4,760.00	358	4/1/2021	Concreta Construcciones
30 de Cemento Bijao	L5,849.90	14571	4/1/2021	Ferretería Construred
7 de Cemento Bijao y 1 cemento Blanco	L1,854.98	14732	7/1/2021	Ferretería Construred
Pago de Mano de Obra #17	L42,140.37	159	8/1/2021	Carlos Rodríguez
15 de Cemento Bijao	L2,924.94	14831	8/1/2021	Ferretería Construred
10 pegamento para cerámica uniblock	L1,180.00	37754	9/1/2020	Ferretería Danli
Pago #3 Puertas y Ventanas	L33,789.62	154	13/1/2021	Nelson Andino
caja chica David Erazo	L11,070.99	ver caja chica	14/1/2021	David Erazo
Caja Chica Noe Ramirez	L1,807.40	ver caja chica	15/1/2021	Noe Ramirez

Total Gastado en obra civil 2do Desembolso L2,403,008.47

Acumulado Gastado Desembolsos 1+2 L5,506,573.23

70.32%

Porcentaje Total de Avance Financiero

Saldo total de Obra para ejecutar L2,324,426.77



*ESTE DOCUMENTO REPRESENTA LOS AVANCES PORCENTUALES DE OBRA, MÁS NO EL AVANCE ECONOMICO REAL. EL AVANCE ECONOMICO REAL ES EL QUE SE REPRESENTA EN EL INFORME TÉCNICO FORME DE LA OBRA

AVANCE DE OBRA GLOBAL HASTA EL 15 DE ENERO DE 2021

PROYECTO "CONSTRUCCION, AMPLIACION Y MEJORAS DE LA SALA DE CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y MUJERES EMBARAZADAS DEL ANTIGUO HOSPITAL GABRIELA ALVARADO"

Ubicación: Doni, El Paraiso

Fecha: hasta el 15 de Enero de 2021

No.	Descripción de Actividades	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Total	Cantidad	Total	Cantidad	Total	Periodo Actual	Cantidad	Total	Acumulado	Total	%
PRELIMINARES															
1.1	Botado/corte, destronque y desmenuado de árbol (incluye botado en predio	Unidad	2.00	4,399.20	8,798.40	2	18,798.40	0	0	10.00	2	18,798.40	100.00%	100.00%	100.00%
1.2	Desmontaje de cubierta de techo y estructura existente (incluye el estibado del	M2	800.50	79.20	63,399.60	800.5	163,399.60	0	0	10.00	800.5	163,399.60	100.00%	100.00%	100.00%
1.3	Desmontaje de cielo falso (incluye el estibado del material donde la supervisión	M2	767.90	95.04	72,981.22	738.91	170,226.01	0	0	10.00	738.91	170,226.01	96.22%	96.22%	96.22%
1.4	Desmontaje de puertas con su respectivo contramarco (incluye el estibado del	Unidad	30.00	198.00	5,940.00	30	15,940.00	0	0	10.00	30	15,940.00	100.00%	100.00%	100.00%
1.5	Desmontaje de ventana con su respectivo marco (incluye el estibado del	Unidad	47.00	123.55	5,806.94	47	15,806.94	0	0	10.00	47	15,806.94	100.00%	100.00%	100.00%
1.6	Desmontaje de balconera existente (incluye el estibado del material donde la	Unidad	46.00	79.20	3,643.20	46	13,643.20	0	0	10.00	46	13,643.20	100.00%	100.00%	100.00%
1.7	Desmontaje de lavaman (incluye el estibado del material donde la supervisión	Unidad	12.00	198.00	2,376.00	11	12,178.00	0	0	10.00	11	12,178.00	91.67%	91.67%	91.67%
1.8	Desmontaje de inodoro (incluye el estibado del material donde la supervisión	Unidad	6.00	198.00	1,188.00	5	1,990.00	0	0	10.00	5	1,990.00	83.33%	83.33%	83.33%
1.9	Desmontaje de lámparas fluorescentes, ductería y cableado eléctrico (incluye el	Global	1.00	6,652.80	6,652.80	1	16,652.80	0	0	10.00	1	16,652.80	100.00%	100.00%	100.00%
1.10	Desmontaje de interruptores y tomacorrientes (incluye el estibado del material	Global	1.00	2,500.00	2,500.00	1	12,500.00	0	0	10.00	1	12,500.00	100.00%	100.00%	100.00%
1.11	Desmontaje de piso mosaico existente (incluye el acarreo del material donde la	M2	716.62	49.50	35,472.69	154.57	17,651.22	25.77	11,275.62	11.275.62	180.34	18,926.83	25.17%	25.17%	25.17%
1.12	Demolicion de firme de concreto en piso existente (incluye el acarreo del	M2	716.62	99.00	70,945.38	2.84	12,811.16	0	0	10.00	2.84	12,811.16	0.40%	0.40%	0.40%
1.13	Demolicion de acera de concreto (incluye el acarreo del material donde la	M2	158.48	99.00	15,689.52	99.01	19,801.99	0	0	10.00	99.01	19,801.99	62.47%	62.47%	62.47%
1.14	Demolicion de tanque elevado de concreto, incluye columna de concreto de	Global	1.00	5,544.00	5,544.00	1	15,544.00	0	0	10.00	1	15,544.00	100.00%	100.00%	100.00%
1.15	Demolicion de losa de concreto (incluye el acarreo del material donde la	M2	12.20	198.00	2,415.60	12.2	12,415.60	0	0	10.00	12.2	12,415.60	100.00%	100.00%	100.00%
1.16	Demolicion de repello y pulido (incluye el acarreo del material donde la	M2	81.02	49.50	4,010.49	81.02	14,010.49	0	0	10.00	81.02	14,010.49	100.00%	100.00%	100.00%
1.17	Demolicion de paredes (incluye el acarreo del material donde la supervisión lo	M2	49.73	79.20	3,938.62	49.73	13,938.62	0	0	10.00	49.73	13,938.62	100.00%	100.00%	100.00%
1.18	Trazado y marcado	ML	169.75	37.04	6,288.02	169.75	16,288.02	0	0	10.00	169.75	16,288.02	100.00%	100.00%	100.00%
1.19	Resane de paredes (incluye lijado y enmasillado).	Global	1.00	4,489.50	4,489.50	1	14,489.50	0	0	10.00	1	14,489.50	100.00%	100.00%	100.00%
1.20	Cerco perimetral para protección con lamina de zinc acanalado y estructura de	M2	61.05	237.60	14,505.52	61.05	14,505.52	0	0	10.00	61.05	14,505.52	100.00%	100.00%	100.00%
1.21	Botado de material fuera del establecimiento (predio designado por la Alcaldía	Global	1.00	8,100.00	8,100.00	1	18,100.00	0	0	10.00	1	18,100.00	100.00%	100.00%	100.00%
Sub Total Preliminares=					344,685.49	TOTAL	1,237,161.05	TOTAL	11,275.62	TOTAL	123,843.67	63.18%	63.18%	63.18%	63.18%
CIMENTACION Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES															
2.1	Excavación de material tipo I (material común).	M3	104.52	265.32	27,731.25	92.21	124,465.16	0	0	10.00	92.21	124,465.16	88.22%	88.22%	88.22%
2.2	Capa de arena en zapata e=0.05 m.	M3	5.10	887.80	4,527.76	5.1	14,527.76	0	0	10.00	5.1	14,527.76	100.00%	100.00%	100.00%
2.3	Zapata corrida de 0.60 x 0.25 m, S4 y #3 @ 0.20 m	ML	169.75	1,090.87	185,175.11	169.75	1,185,175.11	0	0	10.00	169.75	1,185,175.11	100.00%	100.00%	100.00%
2.4	Zapata aislada de 1.00 x 1.00 m, e=0.25 m, 6x5 A.S.	Unidad	15.00	1,491.84	22,377.56	15	12,377.56	0	0	10.00	15	12,377.56	100.00%	100.00%	100.00%
2.5	Sobrecimiento de bloque de 8", fundido y reforzado con varilla #5 c/esp. 10"	M2	151.55	1,309.32	198,427.18	113.81	1,349,013.51	0	0	10.00	113.81	1,349,013.51	75.10%	75.10%	75.10%
2.6	Relevo y compactación con material cemento del sitio.	M3	127.31	308.09	39,222.68	123.47	138,039.63	0	0	10.00	123.47	138,039.63	96.98%	96.98%	96.98%
2.7	Columna (C-2) 0.25x0.25, 4x4 y #3 @ 0.15 m.	ML	69.45	798.18	55,433.79	69.45	155,433.79	0	0	10.00	69.45	155,433.79	100.00%	100.00%	100.00%
2.8	Castillo (C-2) 0.15x0.15 m, 4x4 y #3 @ 0.20 m.	ML	248.32	411.59	102,205.17	248.32	1,102,205.17	0	0	10.00	248.32	1,102,205.17	100.00%	100.00%	100.00%
2.9	Lamba (L-1) de 0.10x0.15 m, 2x3 y #2 @ 0.20 m.	ML	49.45	239.11	11,824.05	49.45	11,824.05	0	0	10.00	49.45	11,824.05	100.00%	100.00%	100.00%
2.10	Balante de 0.10x0.15 m, 2x3 y #2 @ 0.20 m.	ML	18.48	239.11	4,418.77	18.48	14,418.77	0	0	10.00	18.48	14,418.77	100.00%	100.00%	100.00%
2.11	Solera inferior de 0.20x0.20, 4x3 y #2 @ 0.20 m.	ML	173.53	404.13	70,128.70	173.53	170,128.70	0	0	10.00	173.53	170,128.70	100.00%	100.00%	100.00%
2.12	Solera intermedia de 0.15x0.15, 4x3 y #2 @ 0.20 m.	ML	173.53	332.69	57,730.89	173.53	157,730.89	0	0	10.00	173.53	157,730.89	100.00%	100.00%	100.00%
2.13	Solera Superior de 0.15x0.15, 4x4 y #3 @ 0.20 m.	ML	173.53	332.69	57,730.89	173.53	157,730.89	0	0	10.00	173.53	157,730.89	100.00%	100.00%	100.00%
2.14	Viga de 0.25x0.25, 4x4 y #3 @ 0.20 m.	ML	98.58	798.14	78,680.24	0	0	0	0	10.00	0	0	0.00%	0.00%	0.00%



2.15 Tiliado de elementos estructurales									
Sub Total Climatización y Elementos Estructurales									
III	TECHO Y CIELO FALSO	ML	319.67	87.37	27,928.67	319.68	L27,929.54	0	10.00
3.1	Suministro e instalación de estructura metálica con tubo industrial de 6"x6" y canalera de 6" con pendiente hacia la exterior, incluye pintura anticorrosiva	M2	1562.13	659.05	1,029,523.31	1448.78	L955,478.93	0	10.00
3.2	Recubrimiento de techo con ladrillo rojo (prohibe repetido/pulido)	ML	264.32	259.59	68,615.27	90.4	L23,467.09	0	10.00
3.3	Suministro e instalación de cielo falso de PVC, color blanco, (incluye estructura metálica lisa con alambre galvanizado #14)	M2	1036.79	600.64	622,734.52	1036.79	L632,734.52	0	10.00
3.4	Suministro e instalación de cielo falso en alero con lamina de (bocanamiento de 2" x 2", embaldinado de madera de pino cuada, incluye fascia)	M2	235.45	769.43	181,161.51	235.45	L181,161.51	0	10.00
3.5	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias alto caudal de PVC, incluye	ML	186.14	414.92	77,233.73	144	L59,748.88	0	10.00
3.6	Suministro e instalación de bajantes para aguas lluvias de PVC de 4", incluye	ML	57.46	334.75	19,235.00	57.46	L19,235.00	0	10.00
3.7	Suministro e instalación de flashing de lamina de zinc lis, incluye sellado con	ML	36.97	140.10	5,179.55	36.97	L5,179.55	0	10.00
Sub Total Techo y Cielo Falso					2,003,682.90		L1,867,005.49		10.00
IV	PAREDES								
4.1	Pared de bloques de concreto de 6", 143@2 hileras	M2	415.00	607.77	252,224.73	413.94	L251,580.49	0	10.00
4.2	Mamparas en baños (incluye puertas)	M2	5.00	34,979.28	174,896.40	0	L0.00	0	10.00
4.3	Sellado de boquetes de puertas con bloques de concreto de 6" en posición	M2	23.52	952.28	22,397.61	23.53	L22,407.13	0	10.00
Sub Total Paredes					449,518.74		L273,987.63		10.00
V	PISOS								
5.1	Relevo y compactación con material selecto	M3	216.01	392.62	88,736.72	0	L0.00	0	10.00
5.2	Firme de concreto para piso de 0.08m con refuerzo de acero #3 @0.20m A/S	M3	113.01	662.67	74,888.04	50.73	L33,617.12	1.8	11,192.80
5.3	Piso terrazo de micrograno de 40x40cm de 6 mm de espesor, color a decidir por	M2	1130.06	710.57	802,990.66	355.14	L273,670.27	626.51	L445,181.39
5.4	Zocalo de terrazo de micrograno de 7x40cm de 5 mm de espesor, color a decidir	ML	917.94	195.80	179,730.90	226.16	L44,281.70	541.03	L105,932.64
5.5	Suministro e instalación de piso antideslizante en pasillo interno, color a decidir	M2	33.64	730.00	24,557.20	0	L0.00	0	10.00
Sub Total Pisos					1,170,903.53		L351,569.08		1552,306.83
VI	ACABADOS								
6.1	Repele y pulido en paredes de 2.00 cm, armado y reforzado con malla	M2	830.00	194.18	161,171.90	827.88	L160,760.24	0	10.00
6.2	Pintura latex Mate High Standard marca Protecto o de calidad similar, dos	M2	2320.00	124.70	289,310.50	1502.52	L187,366.45	68.94	L8,597.01
6.3	Cerámica en paredes de baño de 0.25X0.70 m relieve factory o similar, color a	M2	144.52	703.20	101,625.87	0	L0.00	0	10.00
Sub Total Acabados					552,108.27		L346,128.69		L8,597.01
VII	PUERTAS Y VENTANAS								
7.1	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-4) de 0.75x2.10 m, una hoja	Unidad	3.00	2,555.06	7,965.17	0	L0.00	0	10.00
7.2	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-3) de 0.80x2.10 m, una hoja	Unidad	4.00	2,275.06	11,100.22	0	L0.00	0	10.00
7.3	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-9) de 0.85x2.10 m, una hoja	Unidad	2.00	2,835.06	5,670.11	0	L0.00	0	10.00
7.4	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-8) de 0.90x2.10 m, una hoja	Unidad	1.00	2,895.06	2,895.06	0	L0.00	0	10.00
7.5	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-1) de 0.95x2.10 m, una hoja	Unidad	23.00	3,021.06	69,346.27	0	L0.00	0	10.00
7.6	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-2) de 1.00x2.10 m, una hoja	Unidad	10.00	3,135.06	31,350.55	0	L0.00	0	10.00
7.7	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-10) de 1.15x2.10 m, una hoja	Unidad	1.00	3,375.06	3,375.06	0	L0.00	0	10.00
7.8	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-11) de 1.35x2.10 m, una	Unidad	1.00	3,495.06	3,495.06	0	L0.00	0	10.00
7.9	Suministro e instalación de Puerta Termoformada (P-12) de 1.55x2.10 m, una	Unidad	1.00	3,735.06	3,735.06	0	L0.00	0	10.00
7.10	Suministro e instalación de Puerta de Vidrio (P-6) de 1.20x2.10 m, doble hoja de	Unidad	1.00	13,215.06	13,215.06	0	L0.00	0	10.00
7.11	Suministro e instalación de Puerta de Vidrio (P-5) de 1.80x2.10 m, doble hoja de	Unidad	1.00	14,415.06	14,415.06	0	L0.00	0	10.00
7.12	Suministro e instalación de Puerta de Vidrio (P-7) de 2.00x2.10 m, doble hoja de	Unidad	3.00	15,615.06	46,845.17	0	L0.00	0	10.00
7.13	Suministro e instalación de portón metálico de tubo estructural (P-13) de	Unidad	1.00	2,895.06	2,895.06	0	L0.00	0	10.00
7.14	Suministro e instalación de Ventana Tipo francesa (V-1) corredera de 0.31 m de	Unidad	15.00	2,275.00	34,125.00	4	L9,100.00	8	L18,200.00
Sub Total Puertas y Ventanas					18,597.01		L356,725.70		64.61%





9.12	Suministro e instalación de breaker 3 polos, 150 A, 240V, similar o superior a	Unidad	1.00	24,523.46	24,523.46	1	L24,523.46	0	10.00	1	L24,523.46	100.00%
9.13	Suministro e instalación de breaker 2 polos, 80 A, 240V, similar o superior a	Unidad	4.00	16,989.87	67,959.48	4	L67,959.48	0	10.00	4	L67,959.48	100.00%
9.14	Suministro e instalación de Alimentador monofásico desde tablero principal	Unidad	8.00	L1,410.38	11,283.06	8	L11,283.06	0	10.00	8	L11,283.06	100.00%
9.15	Suministro e instalación de tablero eléctrico monofásico CC-1 con main de 125	Unidad	1.00	8,992.40	8,992.40	1	L8,992.40	0	10.00	1	L8,992.40	100.00%
9.16	Suministro e instalación de Alimentador desde tablero principal hasta tablero	Unidad	30.00	1,034.09	31,022.61	30	L31,022.61	0	10.00	30	L31,022.61	100.00%
9.17	Suministro e instalación de tablero eléctrico monofásico con main de 125 amp	Unidad	1.00	5,542.52	5,542.52	1	L5,542.52	0	10.00	1	L5,542.52	100.00%
9.18	Suministro e instalación de lámpara empotrable en cielo falso. Tubos tipo LED, 4	Unidad	107.00	1,045.09	111,824.68	7	L111,824.68	0	10.00	7	L111,824.68	100.00%
9.19	Suministro e instalación de lámpara tipo spot de 6", 120V, 4000K.	Unidad	35.00	793.75	27,781.25	7	L27,781.25	0	10.00	7	L27,781.25	100.00%
9.20	Suministro e instalación de interruptor sencillo, 120V, 15A, bajo repello.	Unidad	40.00	116.00	4,640.00	36	L4,640.00	0	10.00	36	L4,640.00	100.00%
9.21	Suministro e instalación de interruptor vaivén, 120V, 15A, bajo repello.	Unidad	16.00	164.47	2,631.45	14	L2,631.45	0	10.00	14	L2,631.45	100.00%
9.22	Suministro e instalación de interruptor vaivén doble, 120V, 15A, bajo repello.	Unidad	3.00	170.41	511.22	2.7	L511.22	0	10.00	2.7	L511.22	100.00%
9.23	Suministro e instalación de salida para iluminación, 2 #12+1#12 THHN AWG.	Unidad	150.00	1,188.48	178,272.45	150	L178,272.45	0	10.00	150	L178,272.45	100.00%
9.24	Remover y reubicar poste de concreto de 35 pies hacia la ubicación descrita en	Unidad	103.00	6,325.00	139,497.60	92.7	L139,497.60	0	10.00	92.7	L139,497.60	100.00%
9.25	Suministro e instalación de luminaria LED tipo industrial, 8 pies, 120V, 4100K.	Unidad	2.00	6,325.00	12,650.00	2	L12,650.00	0	10.00	2	L12,650.00	100.00%
9.26	Suministro e instalación de luminaria LED tipo industrial, 4 pies, 120V, 4100K.	Unidad	7.00	2,720.18	19,041.29	0	L19,041.29	0	10.00	0	L19,041.29	0.00%
9.27	Desmontaje y acarreos (donde la supervisión indique) de tres transformadores	Unidad	1.00	2,105.46	2,105.46	0	L2,105.46	0	10.00	0	L2,105.46	0.00%
9.28	Reeducción de instalaciones eléctricas (Rx y edificios anexos) existentes hacia	Unidad	1.00	7,935.00	7,935.00	1	L7,935.00	0	10.00	1	L7,935.00	100.00%
9.29	Reeducción de instalaciones eléctricas (Rx y edificios anexos) existentes hacia	Unidad	1.00	45,002.90	45,002.90	0.75	L45,002.90	0	10.00	0.75	L45,002.90	75.00%
Sub Total Instalaciones Eléctricas				1,159,302.40	1,159,302.40	TOTAL	L1,004,001.55	0	10.00	TOTAL	L1,004,001.55	83.72%
X OTROS												
10.1	Suministro e instalación de tanque Bi-capa para almacenamiento de agua y	Unidad	1.00	22,000.00	22,000.00	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
10.2	Estructura metálica de tubo industrial de 6"x6", incluye losa de concreto	Unidad	1.00	9,000.00	9,000.00	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
10.3	Pileta de asfalto, armada con var #3 @0.40m A.S de 1.00mx0.60m, acabado fino	Unidad	1.00	3,500.00	3,500.00	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
10.4	Jardinería en pasillo interior con paredes de bloques de 4" de 0.32 x 15.50 m.	Unidad	1.00	4,200.00	4,200.00	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
10.5	Mueble modular para información de pacientes forrado con forma color a	Unidad	1.00	4,000.00	4,000.00	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
10.6	Camilla para examen médico	Unidad	2.00	20,000.00	40,000.00	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
10.7	Sillas para sala de espera de acero inoxidable (bloques de 3 asientos/sillas).	Unidad	31.00	4,003.87	124,119.97	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
10.8	Sillas de espera visita	Unidad	8.00	786.37	6,290.96	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
10.10	Escritorio	Unidad	6.00	5,100.00	30,600.00	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
10.11	Armario de dos puertas metálicos	Unidad	4.00	4,945.00	19,780.00	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
10.12	Escarifiera	Unidad	4.00	4,555.13	18,220.52	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
10.13	Limpieza General	Unidad	4.00	2,990.00	11,960.00	0	L0.00	0	10.00	0	L0.00	0.00%
Sub Total Otros				300,671.45	300,671.45	TOTAL	L7,000.00	0	10.00	1	L7,000.00	2.33%
Sub Total				7,828,093.64	7,828,093.64	TOTAL	L5,072,759.26	0	10.00	TOTAL	L5,072,759.26	74.65%

[Handwritten signature]
