



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

Colomoncagua Intibucá 2 de Agosto del 2021

Señor: Nelson Alfredo Gózales Yáñez

Oficial de acceso a la información pública

Municipalidad de Colomoncagua Intibucá

Su oficina

Remito a usted la información de este departamento de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Julio del 2021 para que sea cargada a los postales del instituto de acceso la información pública

Adjunto el cuadro de gastos en proyectos en el mes Julio de 2021


ENCARGADA DE UTM AMFI




ENCARGADA DE UTM





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



n	Nombre del proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del proyecto	Fuentes de financiamiento	Monto presupuestado del proyecto	Ampliación del proyecto	Monto ejecutado en el mes	Estado del proyecto
1	Mejoramiento carretera	Cerro verde	Mejorar las condiciones de acceso a la comunidad	A nivelación de carretera cuneteo y balastreo	Municipal		150,000.00	150,000.00	Ejecutado
2	Apertura carretera	La tejera	habilitar una vía de acceso para la comunidad	Se apertura carretera al caserío de Tejera	Municipal	0.0	200,000.00	200,000.00	Ejecutado
3	Construcción de kínder	La Joya San Marcos	Proporcionar un lugar adecuado para que los niños reciban sus clases	Construcción de kínder	Municipal	0.0	200,000.00	143,290.00	En ejecución
4	Mejoramiento de carretera	El Apintal	Mejoramiento de tramos de carretera en mal estado y balastreo	Raspado y balastreo de carretera	Municipal	298,300.00	0.0	191,000.00	Ejecutado
5	Construcción de posta policial	San Marcos	La policía puede permanecer en la comunidad Permanentemente	Construcción de casa de habitación para posta policial	Municipal	0.0	100,000.00	43,700.00	En ejecución
6	Mejoramiento de carretera	La tortuga	Mejorar al acceso a la comunidad	Raspado de carretera	Municipal	0.0	143,000.00	44,196.00	En ejecución
7	Pavimento de calle	Barrio san Sebastián	Mejorar las condiciones de las carreteras	Pavimentación con concreto ciclópeo en	Municipal	400,000.00	00	400,000.00	En ejecución



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA



DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

9	Mejoramiento de carretera	Hacienda el naranjo	Mejorar el acceso de vehículos y personas	tramo de carretera	Municipal	0.0	200,000.00	200,000.00	Ejecutado
10	Construcción casa Casa comunal	Castaño I San Miguelito	Proporcionar un espacio para poder realizar	Construcción de casa comunal	Municipal	0.0	80,000.00	69,062.50	En ejecución
11	finalización de casa Comunal	San Rafael	Proporcionar un lugar	Construcción d posta policial	Municipal	0.0	80,000.00	43,700.00	En Ejecución
12	Mejoramiento de carretera	El Limoncillo		A nivelación, y balasteo de carretera	Municipal	100,000.00	88,393.96	165,820.10	En ejecución
13	Apertura de carretera	La Tejera	Habilitar acceso a la comunidad	Apertura de tramo carretero	Municipal	.0	180,000.00	180,000.00	Ejecutado
14	Mejoramiento de carretera	Santa Ana a Las lomas	Mejorar las condiciones de la carretera	A nivelación y balasteo de tramos	Municipal	0.0	300,000.00	300,000.00	ejecutado



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

Ficha de supervisión: 8 Julio del 2021

Hora de llegada al proyecto 8:40 hora de salida 9:50

Nombre del proyecto: Construcción de Kinder

Ubicación La Joya San Marcos

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución



abandonado



Terminada



Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Al llegar al lugar de la Construcción de Kinder en la Joya San Marcos se encontro al encargado de la obra terminando de pegar las lineas de bloques para Continuar con el techo, bajo la supervisión del presidente patronato de la comunidad, el proyecto se esta desarrollando de la forma estipulada.

Firma del supervisor asignado



Notividad Sánchez

contratista

Emérito Pérez



Visto bueno de:


Presidente Patronato

CONSTRUCCION DE KINDER LA JOYA





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: 12 Julio del 2021

Hora de llegada al proyecto 9:30 hora de salida

Nombre del proyecto: Construcción Posta Policial

Ubicación San Rafael

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Al llegar al lugar de la construcción (Casa Comunal) postal policial, se encontró a la Comunidad fundiendo la terraza el proyecto se está ejecutando de la mejor forma, lo cual vendrá a beneficiar con la seguridad de la población.

Miguel Ramos.

Firma del supervisor asignado

contratista

Presidente Patronato


Visto bueno de:

Alcalde



Posta policial San Rafael





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: 14 Julio de 2021

Hora de llegada al proyecto 9:00 hora de salida 9:30

Nombre del proyecto: Construcción Posta Policial

Ubicación San Marcos

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

En el lugar de la construcción de la
posta policial, se está pegando el
bloque para el levantamiento de
parcelas, el trabajo está avanzando
muy bien con apoyo de los líderes
de la comunidad.


Firma del supervisor asignado


contratista


Visto bueno de
presidente patronato




Posta policial san marcos



Posta policial san marcos





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

Ficha de supervisión: dia viernes 28 de mayo

Hora de llegada al proyecto 9:15 AM hora de salida 9:45 AM

Nombre del proyecto: mejoramiento de carretera

Ubicación Comunidad el apital.

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se encontro las maquinarias Trabajando en el lugar, la retro en la balastiera y las bulguetas, acarreando el material y el Petrol Comenzando la carretera ya esta en proceso de finalización del Proyecto porque esta llegando asta el dueño quetero segun los vecinos son pocas las que estan Colaborando en la ejecución del Proyecto Pe estan agradecidos porque era un problema muy grande en esta carretera

[Firma]
Firma del supervisor asignado

contratista

J. A. [Firma]
Visto bueno de:



Mejoramiento de carretera el apintal





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: _____

Hora de llegada al proyecto hora de salida

Nombre del proyecto: Mejoramiento Carretera

Ubicación Santa Cruz hasta las Lomas

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se encontro a la reto trabajando en sacando
el lodo de la carretera para luego
regar el balastre, bajo la direccion
de lideres comunitario, el trabajo
esta quedando muy bien.

Miguel Ramos

Firma del supervisor asignado

contratista

*Emérito Pérez

Visto bueno de:






Asociación de Municipios
Fronterizos de Chiapas



Calle aledaña fundida en su totalidad

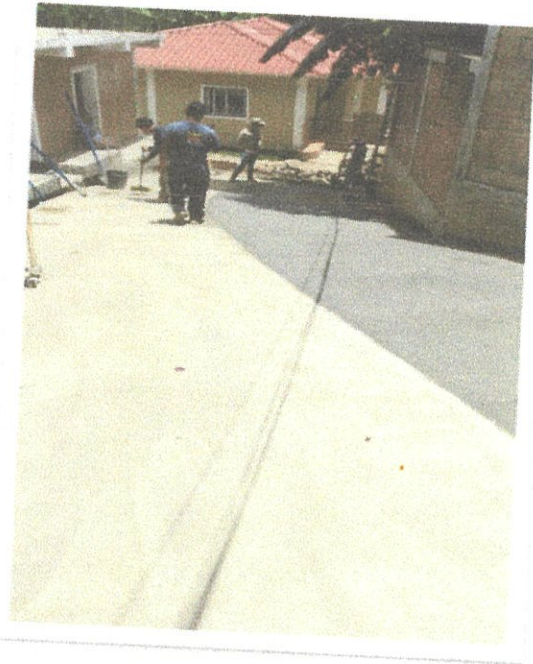

Encofrado y fundición de bordillo con
concreto 1:2:2

Vista de tramo casi terminado con sus barras
pasa juntas y barras de amarre colocadas



Fundición de tramo casi al final de la obra
