



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Colomoncagua Intibucá 7 de Mayo del 2021

Señor:

Nelson Alfredo Gózaes Yáñez

Oficial de acceso a la información pública

Municipalidad de Colomoncagua Intibucá

Su oficina

Remito a usted la información de este departamento de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2021 para que sea cargada a los postales del instituto de acceso la información pública

Adjunto el cuadro de gastos en proyectos en el mes Mayo de 2021


ENCARGADO DE UTM AMFI


ENCARGADA DE UTM



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



n	Nombre del proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del proyecto	Fuentes de financiamiento	Monto presupuestado del proyecto	Ampliación del proyecto	Monto ejecutado en el mes	Estado del proyecto
1	Alcantarillado sanitario	La travesía		Alcantarillado sanitario	Municipal	0.0	370,477.58	370,000.00	Ejecutado
2	Construcción de kínder	el almendro	Proporcionar un lugar adecuado para que los niños reciban sus clases	Construcción de kínder	Municipal	0.0	65,542.98	12,300.00	En ejecución
3	Construcción de kínder	Los Amates	Proporcionar un lugar adecuado para que los niños reciban sus clases	Construcción de kínder	Municipal	0.0	45,000.00	8,261.36	Ejecución
4	Mejoramiento carretera	El Hondable	Mejoramiento de tramos de carretera en mal estado	Se construirá un muro de contención en tramo de carretera	Municipal	0.0	23,880.00	22,800.00	Ejecutado
5	Mejoramiento de campo de fútbol los amates	Los amates	Proporcionar lugares para la san recreación	Construcción de muro de contención de campo de fútbol	Municipal	0.0	95,604.00	77,500.00	En ejecución
6	Mejoramiento de centro salud	San Marcos	Proporcionar un lugar adecuado para	Arreglo de techo ,pintura de edificio	Municipal	0.0	143,000.00	44,196.00	En ejecución



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



			la atención de pacientes						
7	Construcción de kínder I	La Joya San Marcos	Proporcionar un lugar adecuado don de los niños puedan recibir las clases	Construcción de kínder	Municipal	0.0	2,000.00	6750.00	En ejecución
8	Construcción de kínder Pueblo viejo	Pueblo viejo	Proporcionar un lugar adecuado don de los niños puedan recibir las clases	Construcción de Kínder	Municipal	0.0	200,000.00	24,000.00	En ejecución
9	Sistema de electrificación	La Arenera Matazano		Electrificación de comunidad de	Municipal	0.0	350,000.00	86,000.00	En ejecución
10	Mejoramiento de carretera	El Apintal		Mejoramiento de carretera	Municipal	0.0	280,000.00	100,000.00	En ejecución
11	Mejoramiento carretera	El Callejones	Mejoramiento tramo de carretera	Raspado de carretera ,cunetas y balestre	Municipal	0.0	100,000.00	100,000.00	Ejecutado
12	Reparación y mantenimiento de carretera	El Picacho			Municipal	0.0	249,965.00	76,840.00	En ejecución
13	Ampliación de aula tecnológica	Barrio san Sebastián IMRA	Proporcionar un lugar idóneo para impartir	Construcción de aula	Municipal	.0	58,658.00	13,000.00	En ejecución



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



		talleres							
14	Mejoramiento carretera el picacho	El Picacho	Mejorar las condiciones de la carretera		Municipal	0.0	430,000.00	427,000.00	ejecutado
15	Construcción de caja puente	Piedra Parada	Habilitar paso en carretera durante el invierno por la crecida del río	Construcción de 2 cajas puentes	Municipal	0.0	170.000	85,000.00	En ejecución



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

Ficha de supervisión: 31 Mayo del 2021

Hora de llegada al proyecto 10:00 hora de salida 10:40

Nombre del proyecto: Construcción de Kinder

Ubicación: Pueblo Viejo

Descripción del estado en que se encuentra la obra:


En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Al llegar al lugar de la obra se encontró al encargado de la construcción del Kinder, iniciando con los arangues de lo que va ser el Kinder, con la colaboración de la comunidad el proyecto está iniciando y los beneficiarios están comprometidos y entusiasmados por el proyecto.


Firma del supervisor asignado

Benedicto Viji
contratista


Visto bueno de:





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: viernes 9 de abril

Hora de llegada al proyecto 12:15 Bm hora de salida 2:00 pm.

Nombre del proyecto: mejoramiento de carretera

Ubicación Comunidad Lagitas y Picacho

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☐ abandonado ☐ Terminada ☒

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se visitó la Comunidad de Picacho donde se estuvo haciendo la reparación de la Carretera del río negro, Lagitas y Picacho. Proyecto que es ejecutado con fondos municipales por lo que los vecinos están muy agradecidos, y dan fe que el proyecto fue ejecutado con mucho interés y responsabilidad por ser un proyecto mancomunado en dos Comunidades lo orden final es firmada por el Presidente de Patronato de Picacho

[Firma]
Firma del supervisor asignado





[Firma]
Visto bueno


Ampliación y mejoramiento de carretera de callejones hasta rio negro



Terminación de mejoramiento de carretera de rio negro hasta lajitas y
picacho

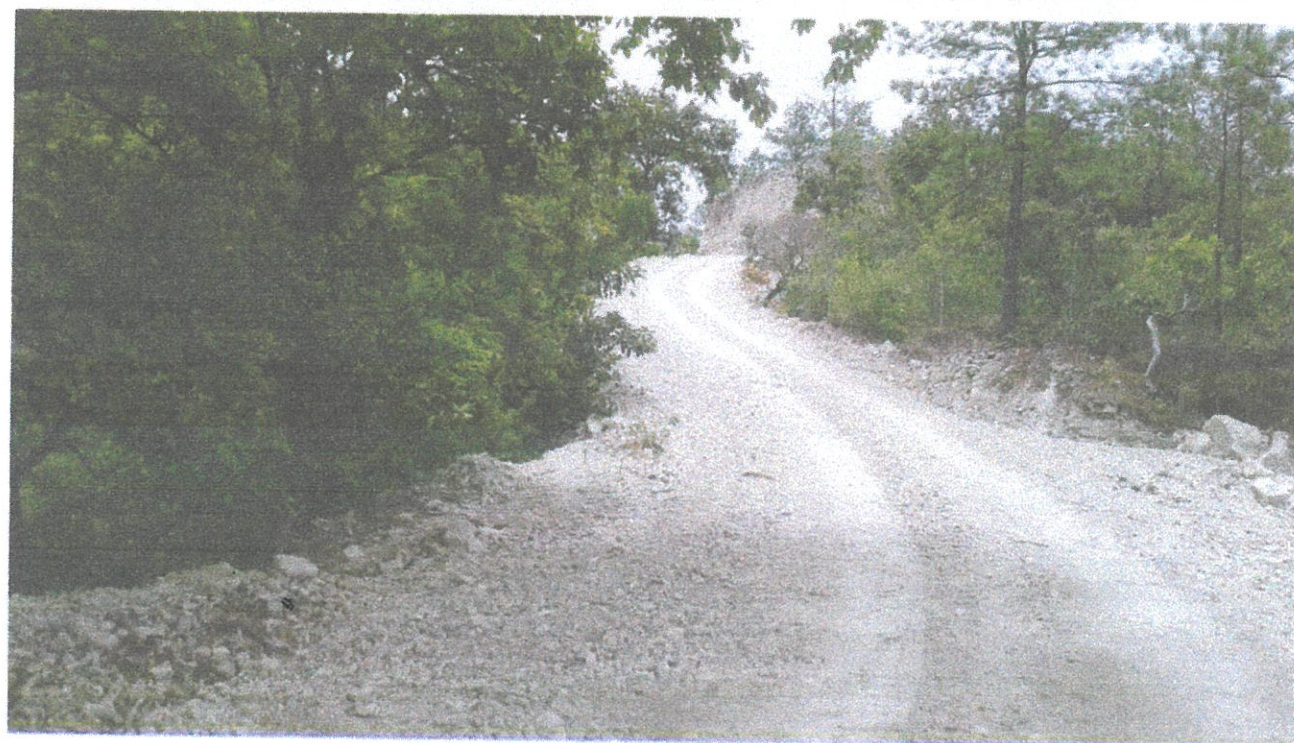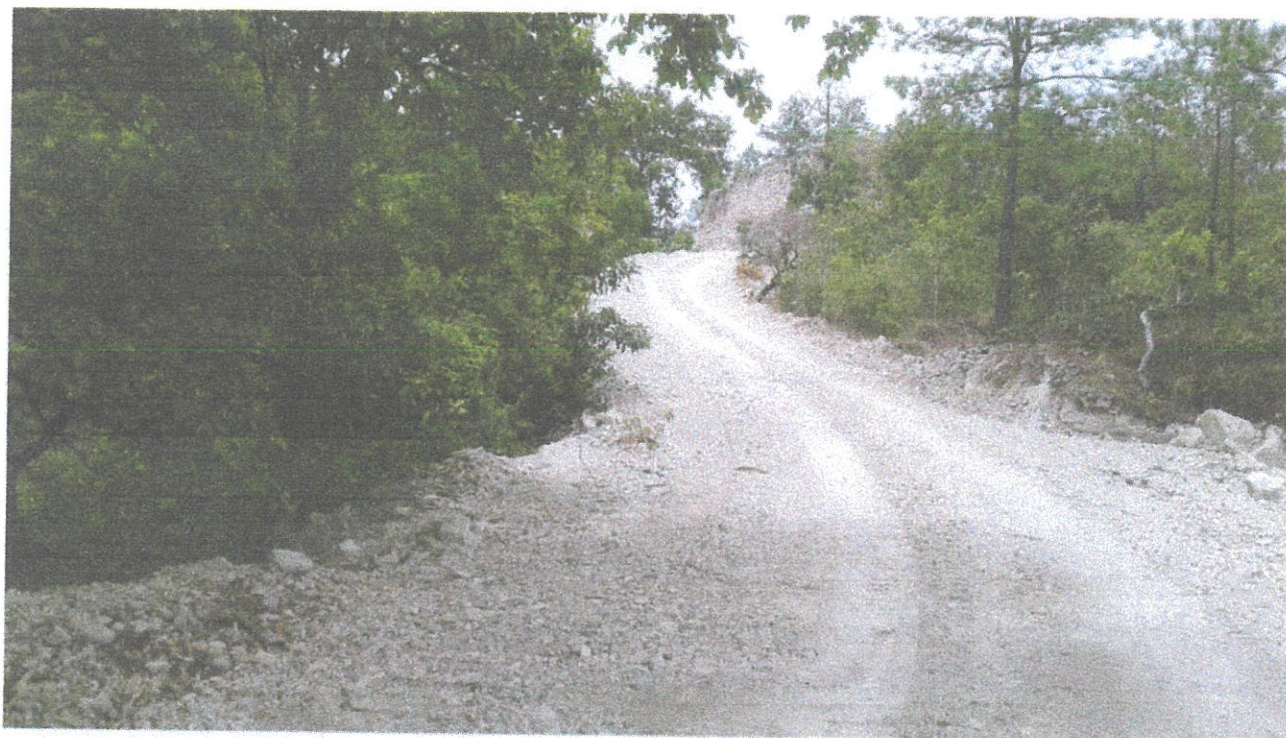

Construcción de kínder en La Joya San Marcos

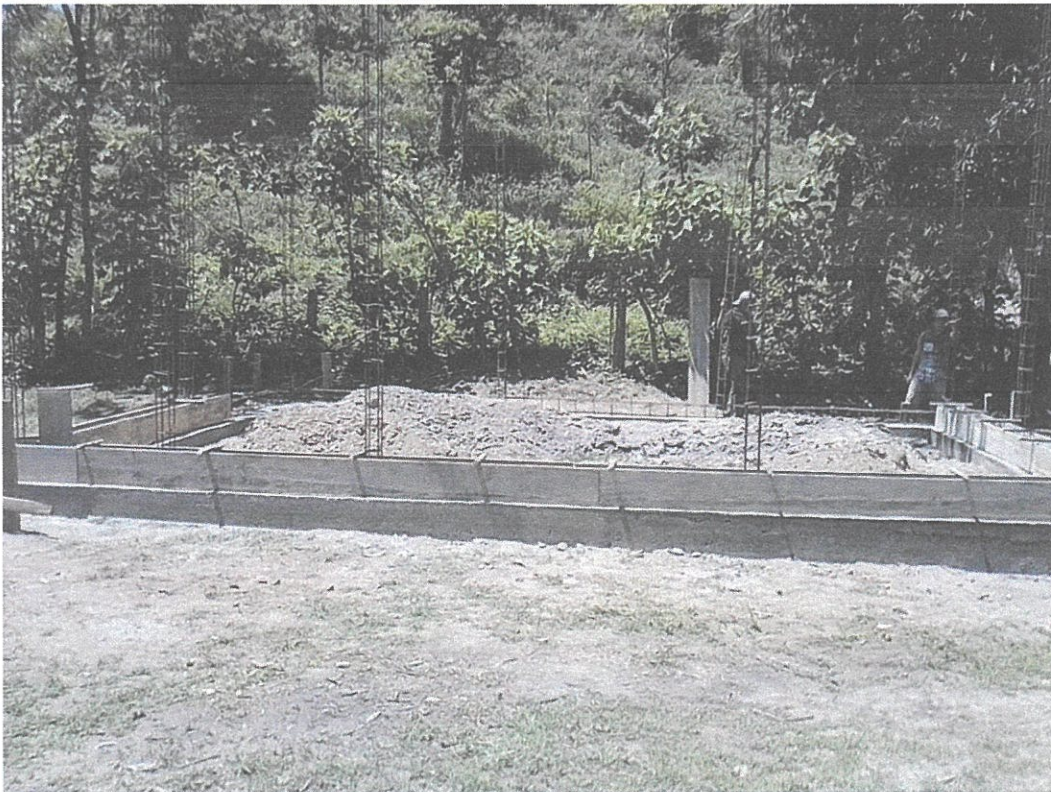



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: día jueves domingo 2021

Hora de llegada al proyecto 10:am hora de salida 11:ma

Nombre del proyecto: Construcción casa Comunal

Ubicación Tejera

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se visito la comunidad de Tejera para supervisar los avances de la casa comunal por lo que los vecinos nos comentaron que solo falta terminar una viga de corredor para seguir con la construcción del techo el cual tienen una dificultad que se les termino el cemento pero, ya se hizo la solicitud para, seguir y terminar luego el trabajo.

Firma del supervisor asignado



contratista

Visto bueno de:

Construcción de casa comunal en comunidad tejera





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

Ficha de supervisión: dia viernes 28 de mayo

Hora de llegada al proyecto 9:15 AM hora de salida 9:45 AM

Nombre del proyecto: mejoramiento de carretera

Ubicación Comunidad el apital

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución

☒

abandonado

☐

Terminada

☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se encontro las maquinas trabajando en el lugar, la retro en la balastiera y las balquetas, acarreado el material y el Petrol Comprimado la carretera ya esta en proceso de finalización del Proyecto porque esta llegando asta el de via quetero segun los vecinos son pocas las que estan colaborando en la ejecución del Proyecto Pe estos agradecidos porque era un problema muy grande en esta carretera

Firma del supervisor asignado

contratista

Visto bueno de:

Balastreo y mejoramiento en carretera el apintal





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: 11-05-2021

Hora de llegada al proyecto ☐ hora de salida ☐

Nombre del proyecto: Mejoramiento Carretera El Picacho

Ubicación El Picacho

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Los Comentaríos de los Vecinos
ya tienen las Cantarías en pesadas y
una Terminada, estan recogiendo arena
Piedra, para la Caja Puente.
ya les esto poniendo el Cemento que
les había falta para Terminar con el
Proyecto,

Firma del supervisor asignado



A 00

contratista

Visto bueno



Presidente Patronato

Mantenimiento y reparación actual de carretera de rio lajitas, hasta picacho





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: 24/Mayo/2021

Hora de llegada al proyecto ☐ hora de salida ☐

Nombre del proyecto: Construcción Kinder la Joya

Ubicación La Joya San Marcos

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☐ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Al llegar al lugar del proyecto
de la construcción de kinder
se encontro al encargado emperando,
a Pegar bloque para emperar
las paredes.
Siempre con apoyo de la Comunidad.


Firma del supervisor asignado

contratista

Visto bueno de:

Eme





Kínder el Almendro



