



Honduras, C.A.

SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2021

Hora : 01:55 p.m.

USUARIO: J.GOMEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5741

L.: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3317

Fecha de Emisión: 20/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MAYKOL ALBERTO MENENDEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 0318199100819

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MAYKOL ALBERTO MENENDEZ HERNANDEZ POR PAGO DE FINALIZACION DE CONTRATO EN BALASTREO DE CALLE DE PALITO VERDE Y CALLE DE CHUPUCAY DE LA BALASTRERA AL CAMPO DE FUTBOL, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO POR UN MONTO LPS 80,000.00.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 009 001 000 23400 11-001-01	APERTURA DE CALLE PALITO VERDE CHUPUCAY	80,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	80,000.00
Monto Total:		80,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		80,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		80,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Maykol Alberto Menendez Hernandez

Identidad No.: 0318-1991-02412



Municipalidad San Miguelito, Intibucá

Bo. EL CENTRO, SAN MIGUELITO,  
INTIBUCA, HONDURAS, C.A.  
TEL.: 2787-9340



CHEQUE No. 00003396

CUENTA No. 11-301-002475-0

Lugar y Fecha

20 de mayo de 2021

MAYKOL ALBERTO MENENDEZ HERNANDEZ

80,000.00

Páguese a la orden de

OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆30⑆079⑆00⑆⑆30⑆0024750⑆00003396

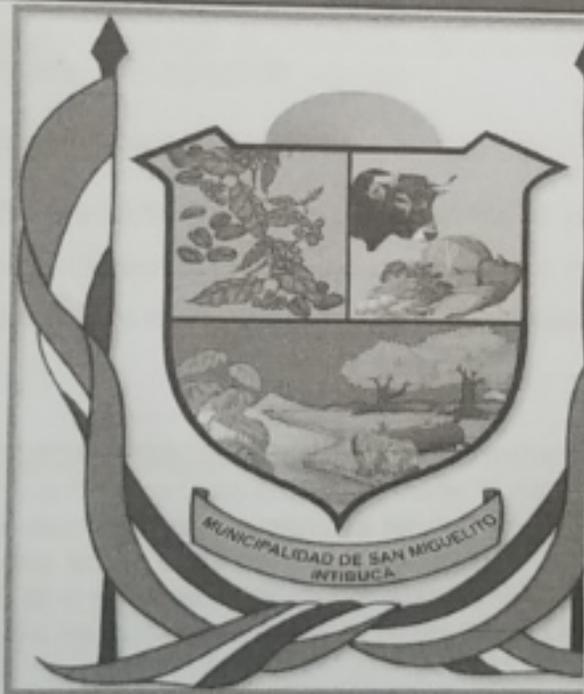
CONCEPTO DEL PAGO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11-301002475-0	PAGO DE PAGO DE DOCUMENTO O/P EMISION DE CTIBQUE A NOMBRE DE MAYKOL ALBERTO MENENDEZ HERNANDEZ POR PAGO DE FINALIZACION DE CONTRATO EN BALASTREO DE CALLE DE PALITO VERDE Y CALLE DE CHUPUCAY DE LA BALASTRERA AL CAMPO DE FUTBOL, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO POR UN MONTO LPS 80,000.00.	80,000.00	80,000.00
<b>TOTAL Lps.</b>		0018190100819	
<b>CHEQUE No.</b> 00003396	<b>REVISADO</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>IDENTIDAD No.</b>
		<i>[Signature]</i>	0318-1771-00819
		<b>NOMBRE Y FIRMA</b>	



2021

# BALASTREO Y AMPLIACION DE CALLE RURAL



MUNICIPALIDAD DE  
SAN MIGUELITO  
INTIBUCA

TRANSPORTE Y  
CONSTRUCCIONES M.H

17-5-2021



## CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE CALLES RURALES.

### CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO INTIBUCA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION M.H

PROYECTO: BALASTREO Y AMPLIACION DE CALLE RURAL.

LUGAR: BALASTREO DE CALLE DE PALITO VERDE CHUPUCAY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA

MAQUINARIA: TRACTOR, RETRO EXCABADORA Y BOLQUETAS

**MONTO DEL CONTRATO:** LPS. 155,000.00 (CIENTO SINCUESTA Y SINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.)

**Nosotros.** Julio Cesar Reyes Hernández, mayor de edad, hondureño, actuando en mi condición de Alcalde Municipal del **Municipio de San Miguelito Departamento de Intibucá**, con tarjeta de identidad Número, 10141970-00007. Quien por efectos de este contrato se denominara como **CONTRATANTE, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES M.H** representada por el Sr. **MAYCOL ALBERTO MENENDEZ HERNANDEZ**, mayor de edad, **casado**, Hondureño, Comerciante individual, Con Identidad. **0318-1991-00819** quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA**, para celebrar el presente contrato de: BALASTREO DE CALLE RURALES el Proyecto se ejecutara en los lugar de: BALASTREO DE CALLE DE PALITO VERDE CHUPUCAY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO

. El cual se regirá por las cláusulas siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO:** El presente contrato tiene por objeto contratar los servicios de **transporte y construcciones m.h**, para que realice los trabajos de obra civil para la ejecución del proyecto antes mencionado **que** consta de las actividades, cotizadas y firmadas por el Contratista.

**CLAUSULA SEGUNDA: DURACION DEL CONTRATO.** El contrato una vez suscrito por las partes entrara en vigencia a partir de la Fecha de Orden de Inicio día martes 18 mayo del año 2021 y tendrá una duración de 20 días avilés, este plazo podrá ser prorrogado a solicitud del contratista justificando el impedimento en la terminación o caso fortuito debidamente comprobado por la **CONTRATANTE**, Si el **CONTRATISTA**, no entrega el trabajo en el tiempo destinado dará derecho a la **CONTRATANTE** a la deducción del 5% del valor contrato diario salvo los casos de fuerza mayor antes que la **CONTRATANTE**, de lugar a la prórroga de ejecución.

**CLAUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO,** Como plena compensación de los servicios en el proyecto a ejecutar en el sector de: BALASTREO DE CALLE DE PALITO VERDE CHUPUCAY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO

El **CONTRATANTE** pagara al **CONTRATISTA** la cantidad de LPS. LPS. 155,000.00 (CIENTO SINCUESTA Y SINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.)Según se especifica en el siguiente cuadro de valores:



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA  
Correo Electrónico: munisanmiguelito.81@gmail.com



BALASTREO Y DE CALLE RURAL				
MAQUINA UTILIZADA	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS	OBSERVACION
TRACTOR	40	L.2,200	88,000.00	
RETROEXCADADORA	20	L.1,200	24,000.00	
BOLQUETA	43	L.1,000	43,000.00	
<b>TOTAL</b>			<b>L 155,000.00</b>	

**CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO.** - LA MUNICIPALIDAD pagará a EL CONTRATISTA en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras, mediante cheque. "transporte y constructora m .h" recibirá un monto LPS. (155,000.00 (CIENTO SINCUENTA Y SINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.)) Valor que será cancelado en DOS pagos EL 50% COMO ACTICPOY LO RESTANTE AL finalizar el proyecto y firmar finiquito.

**CONTRATANTE.** La Municipalidad no hará la respectiva deducción si el contratista presenta la solvencia de pagos a cuenta.

**CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDAD Y DAÑOS:** El **CONTRATISTA** será responsable de toda reclamación civil proveniente por daños y perjuicios a su propio personal o a terceras personas, asimismo EL **CONTRATISTA AL CONTRATANTE deja exento de** toda reclamación, demanda, actuaciones judiciales por consecuencia de aplicación de las Leyes Laborales de previsión o seguridad social respecto a personal que este a su servicio.

**CLAUSULA SEXTA: REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA.** - EL **CONTRATISTA** tendrá representación diaria en el trabajo y será responsable por la correcta ejecución del trabajo objeto de este contrato, así como exigirle a su personal buena calidad en el desarrollo del trabajo hasta la terminación de la obra.

**CLAUSULA SEPTIMA: REPRESENTACIÓN DE LA CONTRATANTE.** - Esta se hará representar personalmente en la obra o por personal designado al efecto, quien tendrá responsabilidad de velar por el trabajo sea completado a cabalidad y de una buena calidad.

**CLAUSULA OCTAVA. - MODIFICACIONES.** - Este contrato podrá darse disuelto en los siguientes casos:  
El Atraso injustificado de dar comienzo al trabajo por más de 5 días por ambas partes.  
Que se traspase o transmita o por cualquier otro título el presente contrato sin autorización previa y por escrito de la **CONTRATANTE**.  
Que el **CONTRATISTA** deje de cumplir con cualquiera de las estipulaciones de este contrato.  
Que la **CONTRATANTE** deje de cumplir cualquiera de las estipulaciones de este contrato.



REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA  
Correo Electrónico: munisanmiguelito.81@gmail.com




**CLAUSULA NOVENA. - CONTROVERSIAS**, Las controversias que surjan por la aplicación de este contrato, que no puedan resolver amigablemente se someten a la jurisdicción y competencia del Juzgado Primero de Letras de lo Civil del Departamento de Intibucá.

**CLAUSULA DECIMA: LA ASEPTACION:**

LA MUNICIPALIDAD Y EL CONTRATISTA manifiestan que aceptan el contenido de todas y cada una de las cláusulas del presente contrato y en consecuencia se compromete a cumplirlos en toda su extensión. - En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el municipio de San Miguelito, Departamento de Intibucá, a los 17 días del mes de mayo del año dos mil veinte 2021

  
\_\_\_\_\_  
JULIO CESAR YERES HERNANDEZ  
ALCALDE

  
\_\_\_\_\_  
MAYKOL ALBERTO MENENDEZ  
CONTRATISTA





**ORDEN DE INICIO**

**MARTES 18 DE MAYO DEL 2021.**


**CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO INTIBUCA TRANSPORTE Y  
CONSTRUCCION M.H**

**PROYECTO:** BALASTREO Y AMPLIACION DE CALLE RURAL.  
**LUGAR:** BALASTREO DE CALLE DE PALITO VERDE CHUPUCAY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO  
DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  
**MAQUINARIA:** TRACTOR, RETRO EXCABADORA Y BOLQUETAS


**MONTO DEL CONTRATO:** LPS. 150,000.00 (CIENTO SINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS.)

Reunidos en La Alcaldía Municipal del Municipio de San Miguelito, Departamento de Intibucá Contamos con la presencia del señor alcalde. Julio Cesar Reyes Hernández, *mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad Número, 10141970-00007.* Quien habiendo celebrado contrato con el sr. **MAYCOL ALBERTO MENENDEZ** representante de la Empresa

"TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES M.H hace de su conocimiento que inicia la ejecución de la obra dando como tiempo plazo de 20 días a partir de la firma de esta orden de Inicio.

  
Señor. Julio Cesar Reyes Hernández  
Alcalde Municipal De San Miguelito Intibucá  
Contratista



  
MAYCO MENENDEZ  
Contratante





**ACTA RECEPCION FINAL DE OBRA PÚBLICA**

**MARTES 27 DE ABRIL DEL 2021.**

**CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO INTIBUCA TRANSPORTE Y  
 CONSTRUCCION M.H**

**PROYECTO:** BALASTREO Y AMPLIACION DE CALLE RURAL.  
**LUGAR:** BALASTREO DE CALLE DE PALITO VERDE CHUPUCAY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO  
 DEPARTAMENTO DE INTIBUCA  
**MAQUINARIA:** TRACTOR, RETRO EXCABADORA Y BOLQUETAS

**MONTO DEL CONTRATO:** LPS. 155,000.00 (CIENTO SINCUESTA SINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.)


Los suscritos reunidos en el sitio del proyecto en representación de la empresa constructora, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES M.H Señor MAYKOL ALBERTO MENENDEZ HERNANDEZ CON N MAYKOL ALBERTO MENENDEZ HERNANDEZ CON N# DE IDEN: 0318-1991.00819 de la Municipalidad de San Miguelito, Departamento de Intibucá señor alcalde municipal, **Julio Cesar Reyes Hernández, mayor de edad, hondureño, con tarjeta de identidad Numero, 10141970-00007.** Se procede a realizar recorrido del tramo carretero proyecto BALASTREO DE CALLE DE PALITO VERDE CHUPUCAY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUELITO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA


Habiendo utilizado la maquinaria antes mencionada. Con el propósito de ejecutar una obra de calidad y realizar la inspección final del mismo como consecuencia.

Hacemos constar que los trabajos ejecutados por la empresa TRANSPORTEY CONSTRUCCIONES M.H según contrato suscrito entre la Municipalidad de San Miguelito Departamento de Intibucá firmado con fecha de inicio **MARTES (18) del mes de MAYO del año 2021, por un monto: LPS. 155,000.00 (SIENTO CINCUENTA Y SINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS.)** De acuerdo con el informe del coordinador de la unidad técnica quien sirvió de supervisión del proyecto y a la verificación efectuada por ambas partes, de recepción de la obra se ejecutó de acuerdo con los planos, especificadores generales y además documentos contractuales habiendo finalizado los trabajos el 26 de mayo del año 2020,

Por tanto:

En fe de lo cual firmamos la presente acta de recepción final del Proyecto en el municipio de San Miguelito, Departamento de Intibucá, a los 26 días del mes de mayo del año dos mil veinte y uno 2021.

  
 JULIO CESAR REYES HERNANDES  
 2018-2022  
 CONTRATANTE

  
 MAYKOL ALBERTO MENENDEZ  
 CONTRATISTA

## DETALLE DE OBRA



**MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUELITO**  
**INTIBUCA**

<b>PROYECTO</b>	<b>BALASTREO DE CALLE PALITO VERDE CHUPUCAY</b>
<b>LUGAR</b>	<b>CALLE Y PALITO VERDE .</b>

### TRABAJOS DE MAQUINARIA TRACTOR

FECHA	HOR. INICIAL	HOR. FINAL	T. HORAS	P. UNIT	TOTAL LPS.	PROYECTO / ACTIVIDAD REALIZADA
18-may-21	25000	25010	10	L 2,200.00	L 22,000.00	EXCABACION DE MATERIAL SELECTO BALASTRO
19-may-21	25010	25015	5	L 2,200.00	L 11,000.00	EXCABACION DE MATERIAL SELECTO BALASTRO
20-may-21	25015	25020	5	L 2,200.00	L 11,000.00	CONFORMACION DE MATERIAL CALLE PALITO VERDE
21-may-21	25020	25024	4	L 2,200.00	L 8,800.00	CONFORMACION DE MATERIAL CALLE PALITO VERDE
22-may-21	25024	25028	4	L 2,200.00	L 8,800.00	CONFORMACION DE MATERIAL CALLE PALITO VERDE
24-may-21	25028	25032	4	L 2,200.00	L 8,800.00	CONFORMACION DE MATERIAL CALLE PALITO VERDE
25-may-21	25032	25036	4	L 2,200.00	L 8,800.00	CONFORMACION DE MATERIAL CALLE PALITO VERDE
26-may-21	25036	25040	4	L 2,200.00	L 8,800.00	CONFORMACION DE MATERIAL CALLE PALITO VERDE
<b>Total</b>			<b>40</b>		<b>L 88,000.00</b>	

### TRABAJOS DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA

FECHA	HOR. INICIAL	HOR. FINAL	T. HORAS	P. UNIT	TOTAL LPS.	PROYECTO / ACTIVIDAD REALIZADA
20-may-21	25000	25004	4	L 1,200.00	L 4,800.00	CARGAR MATERIAL ( BALASTRO)
21-may-21	25004	25007	3	L 1,200.00	L 3,600.00	CARGAR MATERIAL ( BALASTRO)
22-may-21	25007	25010	3	L 1,200.00	L 3,600.00	CARGAR MATERIAL ( BALASTRO)
24-may-21	25010	25014	4	L 1,200.00	L 4,800.00	CARGAR MATERIAL ( BALASTRO)
25-may-21	25014	25017	3	L 1,200.00	L 3,600.00	CARGAR MATERIAL ( BALASTRO)
26-may-21	25017	25020	3	L 1,200.00	L 3,600.00	CARGAR MATERIAL ( BALASTRO)
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>L 24,000.00</b>	

### TRABAJOS DE MAQUINARIA VOLQUETAS

FECHA	HOR. INICIAL	HOR. FINAL	T. HORAS	P. UNIT	TOTAL LPS.	PROYECTO / ACTIVIDAD REALIZADA
20-may-21	25007	25014	7	L 1,000.00	L 7,000.00	ACARREO DE MATERIAL BALASTRO PALITO VERDE
21-may-21	25014	25022	8	L 1,000.00	L 8,000.00	ACARREO DE MATERIAL BALASTRO PALITO VERDE
22-may-21	25022	25029	7	L 1,000.00	L 7,000.00	ACARREO DE MATERIAL BALASTRO PALITO VERDE
24-may-21	25029	25036	7	L 1,000.00	L 7,000.00	ACARREO DE MATERIAL BALASTRO PALITO VERDE
25-may-21	25036	25043	7	L 1,000.00	L 7,000.00	ACARREO DE MATERIAL BALASTRO PALITO VERDE
26-may-21	25043	25050	7	L 1,000.00	L 7,000.00	ACARREO DE MATERIAL BALASTRO PALITO VERDE
<b>Total</b>			<b>43</b>		<b>L 43,000.00</b>	

BALASTREO DE CALLE RURAL PALITO VERDE					
MAQUINA UTILIZADA	CANTIDAD DE HORAS	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS	OBSERVACION	
RETROEXCA BADORA	20	L. 1,200	24,000.00		
BOLQUETA	43	L. 1,000	43,000.00		
TRACTOR	40	2200	88,000.00		
TOTAL			155,000.00		





REPUBLICA DE HONDURAS  
MUNICIPALIDAD SAN MIGUELITO INTIBUCA

Correo Electrónico: munisammiguelito.81@gmail.com

COTIZACION

CASA COMERCIAL: Wingsbury Construcción "MH"  
 DIRECCION: Sigra Ingenieros Constructor  
 PROYECTO: Urbanización de Colinas

FECHA 20/05/2021  
 TELEFONO 96793800  
 COMUNIDAD Colinas Valle

N°	MATERIALES	PRECIO UNITARIO	TOTAL
40	Horas de Trabajo	3,200	88,000
43	Horas de Vigilancia	1,000	43,000
20	Horas de Pago	1,200	24,000
Partido Político Verde Democrático			
Partido Político Democrático			
TOTAL			155,000

FIRMA Y SELLO SOLICITANTE  
 DEPARTAMENTO Intibuca

NOMBRE PROVEEDOR Mayko Hernandez  
 RTN Y SELLO 258-191-00895

