

11-207-005057-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS, CORTES
BO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 79325473

POTRERILLOS, CORTES

12/02/2021

Lugar y Fecha

Carlos Miranda Moreno


L 62,411.25

Páguese a la orden de

Seenta y Dos mil Cuatrocientos once Lempiras con 25/100


Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.


Firma(s)



⑈01207079⑈00112070090572⑈79325473

X 



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: ROSIBEL.AMAYA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13008

L.: 62,411.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11325

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS MIRANDA MORENO

Id/RTN: 0505196400006

La Cantidad en Letras: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Caja Puente de 6.50x4.00x1.50, Ubicado en el Barrio Suyapa.
(Fondos Fuerza Honduras II ETA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 000 004 47210 11-001-01	Construcción De Cajas Puentes, En El Barrio Suyapa.	62,411.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	62,411.25
	Monto Total:	62,411.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	62,411.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	62,411.25

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:


0505-1964-00006

RECIBO POR LPS. 62,411.25 *OK DMA*

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos, Cortes la Cantidad de SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS. **(Lps. 62,411.25)**. Por Concepto de pago correspondiente a la ESTIMACION N 1 del valor total del contrato: **CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA DEL MUNICIPIO**. Según documentos adjuntos.

Potrerillos, Cortes

12 DE FEBRERO DEL 2021



CARLOS MIRANDA MORENO

Ident. 0505 1964 00006



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50X4,00X1.50

NOMBRE DEL CONTRATISTA

CARLOS MIRANDA MORENO

UBICACIÓN DEL PROYECTO

BARRIO SUYAPA

FECHA DE ORDEN DE INICIO

1 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO S/C

SUPERVISION

Unidad Tecnica Municipal

COSTO TOTAL

119,805.00

CUADROS DE PAGOS

DESCRIPCION TIPO DE PAGO	FECHA	REFERENCIA	ORDEN DE PAGO	CANTIDAD	% PAGADO	SALDO
ANTICIPO	29/01/2021			17,970.75	0.15	101,834.25
ESTIMACION N 1	12/01/2021			62,411.25	0.521	39,423.00

ING. GEOVANNI MONTAÑA
COORDINADOR U.T.M.



PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50.00X4.00X1.50

UBICACIÓN: BARRIO SUYAPA

ESTIMACION N 1

FECHA: 12 DE FEBRERO DEL 2021

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL	ESTIMACION ACTUAL	TOTAL
LIMPIEZA	1.00	GL	1,750.00	1,750.00	1.00	1,750.00
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,800.00	2,800.00	1.00	2,800.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	250.00	2,375.00	9.50	2,375.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,800.00	25,200.00	9.00	25,200.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,800.00	27,300.00	9.75	27,300.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,800.00	21,280.00	5.00	14,000.00
LOSA DE CONCRETO 6.50X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,100.00	28,600.00		-
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	2,800.00	10,500.00		-
TOTAL			LPS	119,805.00	LPS	73,425.00

ANTICIPO 15%

LPS 17,970.75

RETENCION POR ANTICIPO

LPS 11,013.75

PAGO TOTAL

LPS **62,411.25**

ING GEOVANNI MONTOMAYOR
UTM



ABOGADA JUANA ARACELY PAVON ALCERRO
ALCALDESA



CARLOS MIRANDA MORENO
CONTRATISTA





TEL. 2673-8183 / FAX. 2673-9026

e-mail: munipot@yahoo.es



CONTRATO : CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA POR EL VALOR DE LPS 119,805.00

Nosotros: Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes Representado por la Abogada JUANA ARACELY PAVON ALCERRO, Hondureña, Mayor de edad, Casada, Vecina de Potrerillos, Cortes, con Tarjeta de Identidad Numero 0505-1972-00469, extendida en Potrerillos, Cortes, en su condición de Alcaldesa Municipal de este Término, con acuerdo en Punto Único de la Sesión Celebrada el Día 17 de Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete, por el Tribunal Supremo Electoral y habiendo tomado Posesión del cargo el Día 25 de Enero del Año Dos Mil Dieciocho, y con facultades suficientes para celebrar este tipo de actos que en adelante se llamara Municipalidad de Potrerillos, Cortes, y el Señor Carlos Miranda Moreno, con Identidad Numero 0505 1964 00006 extendido en Potrerillos, Cortes, y con residencia en este Municipio, Mayor de Edad, Casado, Hondureño, y que en adelante se llamara el CONTRATADO, convenimos en celebrar como en efecto celebramos el presente contrato por los daños causados por los huracanes IETA y IOTA con fondos de FUERZA HONDURAS II, el cual se registrará bajo las siguientes cláusulas: PRIMERA: La Municipalidad ha convenido en contratar los servicios del Señor Carlos Miranda Moreno, para que realice el Siguiente trabajo el cual consiste en: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO SUYAPA DEL MUNICIPIO. CON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL
LIMPIEZA	1.00	GL	1,750.00	1,750.00
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,800.00	2,800.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	250.00	2,375.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,800.00	25,200.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,800.00	27,300.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,800.00	21,280.00
LOSA DE CONCRETO 6.50X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,100.00	28,600.00
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	2,800.00	10,500.00
TOTAL				119,805.00 LP S

SEGUNDA: Especificaciones Técnicas a) SE HARA LA EXCAVACION DE 1.00X0.50.b) SE CONSTRUIRA EL MURO DE MAMPOSTERIA DE 1.10X0.50 MT c) SE CONSTRUIRA EL PISO DE MAMPOSTERIA 6.50X4.00X0.20. d) SE CONSTRUIRA LA LOSA DE CONCRETO DE 6.50X4.00X0.20. TERCERA . La Vigencia del Contrato Individual comprende de 60 días, a partir de la fecha que se emita la orden de inicio. CUARTA: El costo total por el trabajo a desempeñar es de CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS. (Lps. 119,805.00). , Se le dara un 15% como anticipo del valor total del contrato correspondiente a DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS .(lps. 17,970.75). La diferencia será cancelada por estimaciones según avance de la obra. QUINTA: El contratista dara como garantía por anticipo una letra de cambio por el valor del mismo a favor de la municipalidad de Potrerillos Cortes SEXTA: Por cada día de atraso se le deducirá el 1% del valor total de contrato. SEPTIMA:El Contratado el Señor Carlos Miranda Moreno, libra de toda responsabilidad laboral a la Municipalidad de Potrerillos, Cortes por cualquier problema o por los obreros que subcontrate para la realización de dicho trabajo. OCTAVA: El Contratado el Señor Carlos Miranda Moreno, dice que es cierto lo expresado en este contrato y que lo acepta bajo estas condiciones. En fe de lo cual firmamos el presente contrato de prestación de servicios por duplicado quedando una copia en los archivos del patrono y otra que recibe el trabajador, en el Municipio de Potrerillos, Cortes, a los Treinta Días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintiuno.

JUANA ARACELY PAVON ALCERRO
Alcaldesa Municipal

CARLOS MIRANDA MORENO
Contratado



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL**

TEL. 2673-8183 / 2676-86-51

E-mail: munipot@yahoo.es



COTIZACION

PROYECTO:

Construcción de Caja Puente de 6.50X4.00X1.50

UBICACIÓN:

Barrio Suyapa

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza	1	GL	L 1,750.00	L1,750.00
2	Demolición de la estructua existente	1	GL	L 2,800.00	L2,800.00
3	Excavación 1.00X.50X19.00	9.5	MT3	L 250.00	L2,375.00
4	Cimentación de mampostería 1.50X0.50X13.00	9	MT3	L 2,800.00	L25,200.00
5	Muros de mampostería 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	L 2,800.00	L27,300.00
6	Piso de mampostería 9.50X4.00X0.20	7.6	MT3	L 2,800.00	L21,280.00
7	Losa de concreto 6.50X4.00X0.20 #4 0.15 A.S	26	MT3	L 1,100.00	L28,600.00
8	Cabecal de mampostería 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	L 2,800.00	L10,500.00
SUB TOTAL					L119,805.00
IMPUESTO 15%					L0.00
TOTAL					L119,805.00

Proveedor: Carlos Miranda Moreno

ID/R.T.N: 05051964000068

Fecha: 27/01/2021

Vigencia de la oferta: 15 días

FIRMA DEL PROVEEDOR

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

CARLOS / MIRANDA MORENO

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 130 DICIEMBRE 1964
SEXO: MASCULINO
VALIDA HASTA EL 19 OCTUBRE 2013

0505-1964-00006

04577881-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la inscripción de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Firma]
DIRECTOR RNP

SOLICITADA EN 0505

CARLOS / MIRANDA MORENO
0505-1964-00006



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05051964000068

CARLOS MIRANDA MORENO
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☐ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licores
Prestamista	☐

Fecha de Emisión: 20140401

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Firma]



Ministra Directora

Jefe de Departamento/Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1581582

Transacción: 29B4ED

MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES

El Suscrito, HACE CONSTAR:

Que el Contribuyente:

Carlos Miranda Moreno

Ha pagado sus impuestos municipales correspondientes al año 20 **21** de conformidad a lo prescrito en el Art. 77 de la Ley de Municipalidades vigente por lo que se le extiende esta Constancia. Sin perjuicio del impuesto adicional que pueda resultar del examen de sus declaraciones.

Nº 31601

27 Enero 2021

Fecha

	MUNICIPALIDAD POTRERILLOS, CORTES	
	Nº 032	
Nombre:	Carlos Miranda Moreno	
Categoría:	Constructor	
Identidad:	0508-1998-00006	
Alcalde Municipal		



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-39311

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **MIRANDA MORENO CARLOS**
Con Registro Tributario Nacional: **05051964000068**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-39311 en fecha 31/07/2020 y Recibo Oficial de Pago No. 25712264216 de fecha 27/07/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.


ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 27280345671, presentada el 27/07/2020 la presente Constancia vence el 30/04/2021.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número 201-20-10500-39311 o mediante el siguiente código QR:



PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.50.00X4.00X1.50
UBICACIÓN: BARRIO SUYAPA

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL
LIMPIEZA	1.00	GL	1,890.00	1,890.00
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,900.00	2,900.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	300.00	2,850.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,900.00	26,100.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,900.00	28,275.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,900.00	22,040.00
LOSA DE CONCRETO 6.50X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,200.00	31,200.00
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	3,000.00	11,250.00
TOTAL			LPS	126,505.00

Miguel Guevara
OFERENTE

REPUBLICA DE GUINEA-BISSAU
MINISTERIO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TAQUETA DE IDENTIDAD

SEXO / GÊNERO: **MALE**



IDENTIFICACION NACIONAL
 NOME DE: **JOE JIMENEZ**
 PARA: **IDENTIFICACION**
 DATA DE: **20-08-2000**

0005-1075-00004 

MINISTERIO DE LAS PERSONAS



IDENTIFICACION NACIONAL

SEXO / GÊNERO: MALE

0005-1075-00004



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS

DEPARTAMENTO DE CORTES

HONDURAS, C.A.

Tel. 2673-8183/ 2673-8651



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal de Potrerillos Cortes, **CERTIFICA:** Que en Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, El Día Martes 19 de Enero del Año Dos Mil Veintiuno, Según Acta 0105-2021, **Punto 9. ACUERDOS Y RESOLUCIONES**, Inciso (**G**) Que Literalmente Dice. (**G**) La Abogada, **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**, Alcalde Municipal, Somete a Consideración en Calidad **MOCION** Para Aprobación, EL Perfil de Proyecto, **CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.500X00X1.50 UBICADA** En El Barrio SUYAPA. A un Costo total de Lps. 175,075.00, estos fondos salen de Fuerza Honduras II. **SECUNDA LA MOCION**, La Regidora, **Román García Gonzales**, Levantaron su mano al estar de Acuerdo La Abogada, Juana Aracely Pavón Alcerro, Alcalde Municipal y los Regidores, Carlos Noé Rivera Manzanares, Regidor I, Miguel Ángel Ferrera Benegas, Regidor II, Román García Gonzales, Regidor III, Karla Patricia Rodríguez Lagos, Regidor IV, Rosalía Villanueva Molina, Regidor V, Wilfredo Canales Alfaro, Regidor VI, Lourdes Suyapa Torres Gutiérrez, Regidora VII, y German Gonzales Hernández, Regidor VIII, **POR TANTO:** Dicha **MOCION** Se Da Por **APROBADA** Por Unanimitad de la Honorable Corporación Municipal.

Se extiende la presente CERTIFICACION en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes, a los 17 Días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veintiuno.


ALEJANDRO DUARTE GARCIA
Secretario Municipal

11-207-009057-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS, CORTES
DO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 79325472

POTRERILLOS, CORTES

Lugar y Fecha

12/02/2021

Nery Mejia Bardales

Páguese a la orden de

L 65,583.45

Sesenta y cinco mil quinientos ochenta y tres Lempiras con 45/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

00120707900011207009057279325472

X

CONSTRUCCIONES
12 FEB 2021
MEJIA LAINEZ



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021

Hora : 11:35 a.m.

USUARIO: ROSIBEL.AMAYA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13003

L.: 65,583.45

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11320

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NERY MEJIA BARDALES

Id/RTN: 0503198800189

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Primera Estimación del Proyecto Reconstrucción de Cerco de Estadio Municipal, Ubicado en el Barrio El Pedregal.
(Fondos Fuerza Honduras II ETA).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	65,583.45

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	65,583.45
	Monto Total:	65,583.45

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,583.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,583.45

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

CONSTRUCCIONES

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: 1

Identidad No.:

MEJIA LAINEZ

0503-1588-00189

RECIBO POR LPS. 65,583.45

OK Draft

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos, Cortes la Cantidad de SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS. **(Lps. 65,583.45)**. Por Concepto de pago correspondiente a la ESTIMACION N 1 del valor total del contrato: **REPARACION DEL CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO EL PEDREGAL DEL MUNICIPIO.** Según documentos adjuntos.

Potrerillos, Cortes

12 DE FEBRERO DEL 2021



NERY MEJIA BARDALES

Ident. 0503 1988 00189

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL

UBICACIÓN: ESTADIO MUNICIPAL

POTRERILLOS, CORTES

ESTIMACION N 1

12 DE FEBRERO DEL 2021

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL	ESTIMACION ACTUAL	TOTAL
MARCAJE Y LIMPIEZA	24.00	MTL	20.00	480.00	24.00	480.00
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	24.00	MTL	120.00	2,880.00	24.00	2,880.00
EXCAVACION 1.00X0.60	24.00	MTL	150.00	3,600.00	24.00	3,600.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 0.60X0.60	8.64	MT3	2,800.00	24,192.00	8.64	24,192.00
PARED DE BLOQUE DE SOBRECIMIENTO, CON VAR #3 A CDA 0.20 MT	24.00	MT2	670.00	16,080.00	24.00	16,080.00
SOLERA INFERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	600.00	14,400.00	24.00	14,400.00
CERCO DE BLOQUE H=2.00 MT, CON VAR #3 A CADA 0.40 MT	48.00	MT2	523.00	25,104.00	25.00	13,075.00
SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	590.00	14,160.00		-
CASTILLOS DE 0.15X0.15, 4#3 Y #2 A 0.20	28.80	MTL	490.00	14,112.00	5.00	2,450.00

TOTAL

LPS 115,008.00 LPS

77,157.00

ANTICIPO 15%

LPS 17,251.20


RETENCION POR ANTICIPO

PAGO TOTAL

ING GEOVANNI MONTAÑA
UTM



ABOGADA JUANA ARACELY PAVON ALCERRO
ALCALDESA



LPS 11,573.55

LPS 65,583.45



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



NOMBRE DEL PROYECTO

RECONSTRUCCION DEL CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NERY MEJIA BARDALES

UBICACIÓN DEL PROYECTO

BARRIO EL PEDREGAL

FECHA DE ORDEN DE INICIO

1 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO S/C

SUPERVISION

Unidad Tecnica Municipal

COSTO TOTAL

115,008.00

CUADROS DE PAGOS

DESCRIPCION TIPO DE PAGO	FECHA	REFERENCIA	ORDEN DE PAGO	CANTIDAD	% PAGADO	SALDO
ANTICIPO	08/01/2021			17,251.20	0.15	97,756.80
ESTIMACION N 1	12/02/2021			65,583.45	0.570	32,173.35

ING. GEOVANNI MONTAÑA
COORDINADOR U.T.M.





MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
TEL. 2673-8183 / FAX. 2673-9026
e-mail: munipot@yahoo.es



CONTRATO : RECONSTRUCCION DEL CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO EL PEDREGAL
POR EL VALOR DE LPS 115,008.00


Nosotros: Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes Representado por la Abogada JUANA ARACELY PAVON ALCERRO, Hondureña, Mayor de edad, Casada, Vecina de Potrerillos, Cortes, con Tarjeta de Identidad Numero 0505-1972-00469, extendida en Potrerillos, Cortes, en su condición de Alcaldesa Municipal de este Término, con acuerdo en Punto Único de la Sesión Celebrada el Día 17 de Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete, por el Tribunal Supremo Electoral y habiendo tomado Posesión del cargo el Día 25 de Enero del Año Dos Mil Dieciocho, y con facultades suficientes para celebrar este tipo de actos que en adelante se llamara Municipalidad de Potrerillos, Cortes, y el Señor NERY MEJIA BARDALES, con Identidad Numero 0503 1988 00189 extendido en Potrerillos, Cortes, y con residencia en este Municipio, Mayor de Edad, Casado, Hondureño, y que en adelante se llamara el CONTRATADO, convenimos en celebrar como en efecto celebramos el presente contrato por los daños causados por los huracanes IETA Y IOTA y con fondos de FUERZA HONDURAS II, el cual se registrará bajo las siguientes cláusulas: PRIMERA: La Municipalidad ha convenido en contratar los servicios del Señor NERY MEJIA BARDALES, para que realice el Siguiente trabajo el cual consiste en RECONSTRUCCION DEL CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO EL PEDREGAL CON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO/UNT	TOTAL
MARCAJE Y LIMPIEZA	24.00	MTL	20.00	480.00 ✓
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTE	24.00	MTL	120.00	2,880.00 ✓
EXCAVACION 1.00X0.60	24.00	MTL	150.00	3,600.00 ✓
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 0.60X0.60	8.64	MT3	2,800.00	24,192.00 ✓
PARED DE BLOQUE DE SOBRECIMIENTO, CON VAR #3 A CDA 0.20 MT	24.00	MT2	670.00	16,080.00 ✓
SOLERA INFERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	600.00	14,400.00 ✓
CERCO DE BLOQUE H=2.00 MT, CON VAR #3 A CADA 0.40 MT	48.00	MT2	523.00	25,104.00 ✓
SOLERA SUPERIOR 0.15X0.15, 4#3 Y #2 @0.15	24.00	MTL	590.00	14,160.00 ✓
CASTILLOS DE 0.15X0.15, 4#3 Y #2 A 0.20	28.80	MTL	490.00	14,112.00 ✓
TOTAL			LPS	115,008.00 ✓

MC
DMX

SEGUNDA: Especificaciones Técnicas a) SE DEMOLERA LA ESTRUCTURA EXISTENTE.b) SE HARA UNA EXCAVACION DE 1.00X0.60 MT c) SE CONSTRUIRA UNA CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE 0.60X0.60. d) SE COLOCARA PAREDES DE SOBRECIMIENTO CON BLOQUE DE 6". e) SE COLOCARA SOLERA INFERIOR Y SUPERIOR DE 0.15X0.15 CON 4#3 Y #2 A 0.20. f) SE COLOCARAN COLUMNAS DE CONCRETO CADA 2.50 MT DE 0.15X0.15 CON 4#3 Y #2 A 0.20. TERCERA . La Vigencia del Contrato Individual comprende de 60 días, a partir de la fecha que se emita la orden de inicio. CUARTA: El costo total por el trabajo a desempeñar es de CIENTO QUINCE MIL OCHO LEMPIRAS. (Lps. 115,008.00). , Se le dara un 15% como anticipo del valor total del contrato correspondiente a DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS.(lps. 17,251.20). Si no presenta su pago a cuenta se le deducirá el 12.5% del valor total del contrato equivalente a catorce mil trescientos setenta y seis lempiras (14,376.00 lps).La diferencia será cancelada por estimaciones según avance de la obra. QUINTA: El contratista dara como garantía por anticipo una letra de cambio por el valor del mismo a favor de la municipalidad de Potrerillos Cortes SEXTA: Por cada día de atraso se le deducirá el 1% del valor total de contrato. SEPTIMA:El Contratado el Señor NERY MEJIA BARDALES, libra de toda responsabilidad laboral a la Municipalidad de Potrerillos, Cortes por cualquier problema o por los obreros que subcontrate para la realización de dicho trabajo. OCTAVA: El Contratado el Señor NERY MEJIA BARDALES, dice que es cierto lo expresado en este contrato y que lo acepta bajo estas condiciones. En fe de lo cual firmamos el presente contrato de prestación de servicios por duplicado quedando una copia en los archivos del patrono y otra que recibe el trabajador, en el Municipio de Potrerillos, Cortes, a los Treinta Días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintiuno.


JUANA ARACELY PAYON ALCERRO
Alcalde(a) Municipal



CONSTRUCCIONES
17 FEB 2021
NERY MEJIA BARDALES
Contratado



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL**

TEL. 2673-8183 / 2676-86-51

E-mail: munipot@yahoo.es



COTIZACION

PROYECTO:

Reconstrucción de Cerco Perimetral

UBICACIÓN:

Estadio Municipal, Barrio El Pedregal

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Marcaje y Limpieza	24	MTL	L 20.00	L480.00
2	Demolición de estructura existente	24	MTL	L 120.00	L2,880.00
3	Excavación 1.00X0.60	24	MTL	L 150.00	L3,600.00
4	Cimentación de mampostería 0.60X0.60	8.64	MT3	L 2,800.00	L24,192.00
5	Pared de bloque de sobrecimiento, con var #3 a cda 0.20MT	24	MT2	L 670.00	L16,080.00
6	Solera inferior 0.15X0.15, 4#3 y #2 @15	24	MTL	L 600.00	L14,400.00
7	Cerco de bloque H=2.00 mt, con var #3 a cada 0.40 mt	48	MT2	L 523.00	L25,104.00
8	Solera superior 0.15X0.15, 4#3 y #2 @15	24	MTL	L 590.00	L14,160.00
9	Castillos de 0.15, 4#3 y #2 a 0.20	28.8	MTL	L 490.00	L14,112.00
SUB TOTAL					L115,008.00
IMPUESTO 15%					L0.00
TOTAL					L115,008.00

Proveedor: Nery Mejia Bardales

ID/R.T.N: 0503198800189

Fecha: 27/01/2021

Vigencia de la oferta: 15 días

FIRMA DEL PROVEEDOR


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

NERV / ME.JA BARDALES



HONDUREÑO (E) DE NACIMIENTO
NACIO EN: 24 JUNIO 1989
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 02 SEPTIEMBRE 2017



0503-1988-00189


ARTICULO 81 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La violación de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



NERV / ME.JA BARDALES
0503-1988-00189



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RITN: 050319880018911

NERY MEJIA BARRALES	
Nombre o Razón Social	
Inscripciones	
Verifica Selectiva	☐ Productores Importadores de Cigarillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licorosos
Exportador	☐ Productor Alcoholes Licorosos
Imprentas	☐ Importador Alcoholes Licorosos
Presumista	☐

Fecha de Emisión: 20140918

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 452 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 15 del Decreto N° 26 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, N° 25 del Decreto N° 27, Art. 25 del Decreto N° 104 del 2001, Ley del Efectivo Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2002 de 15 de Abril de 2003, A la Ley de Ley N° 14

Presidencia No Bancario Acuerdo 43 publicado el 10 de Enero de 2004

Jefe de Departamento de Ingresos al Consumo

Señor Contribuyente: Se le informa que de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario, debe cumplir con sus obligaciones tributarias de acuerdo con Honduras.

Número de Documento DEI-412-1701527 Transacción: CASODA



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

TEL. 2673-8183 / 2676-86-51

E-mail: munipot@yahoo.es



COTIZACION

PROYECTO:

Reconstrucción de Cerco Perimetral

UBICACIÓN:

Estadio Municipal, Barrio El Pedregal


No	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Marcaje y Limpieza	24	MTL	L 30.00	L720.00
2	Demolición de estructura existente	24	MTL	L 170.00	L4,080.00
3	Excavación 1.00X0.60	24	MTL	L 220.00	L5,280.00
4	Cimentación de mampostería 0.60X0.60	8.64	MT3	L 4,200.00	L36,288.00
5	Pared de bloque de sobrecimiento, con var #3 a cda 0.20MT	24	MT2	L 680.00	L16,320.00
6	Solera inferior 0.15X0.15, 4#3 y #2 @15	24	MTL	L 670.00	L16,080.00
7	Cerco de bloque H=2.00 mt, con var #3 a cada 0.40 mt	48	MT2	L 600.00	L28,800.00
8	Solera superior 0.15X0.15, 4#3 y #2 @15	24	MTL	L 560.00	L13,440.00
9	Castillos de 0.15, 4#3 y #2 a 0.20	28.8	MTL	L 520.00	L14,976.00
SUB TOTAL					L135,984.00
IMPUESTO 15%					L0.00
TOTAL					L135,984.00

Proveedor: Carlos Miranda Moreno

ID/R.T.N: 05051964000068

Fecha: 27/01/2021

Vigencia de la oferta: 15 días

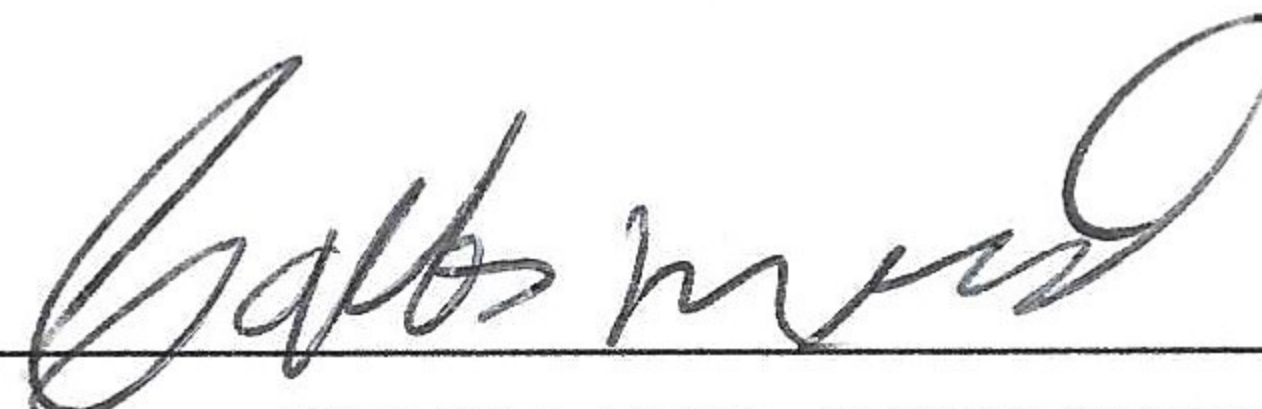
FIRMA DEL PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C.A.
Tel. 2673-8183/ 2673-8651



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal de Potrerillos Cortes, **CERTIFICA:** Que en Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, El Día Martes 19 de Enero del Año Dos Mil Veintiuno, Según Acta 0105-2021, **Punto 9. ACUERDOS Y RESOLUCIONES**, Inciso (F) Que Literalmente Dice. (F) La Abogada, **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**, Alcalde Municipal, Somete a Consideración en Calidad **MOCION** Para Aprobación, EL Perfil de Proyecto, **REPARACION DE CERCO DEL ESTADIO MUNICIPAL**, Ubicado en **EI BARRIO EL PEDREGAL** de Este Municipio, a un Costo Total de Lps. 136,464.00 estos fondos salen de Fuerza Honduras II. **SECUNDA LA MOCION**, La Regidora, **Karla Patricia Rodríguez Lagos**, Levantaron su mano al estar de Acuerdo La Abogada, Juana Aracely Pavón Alcerro, Alcalde Municipal y los Regidores, Carlos Noé Rivera Manzanares, Regidor I, Miguel Ángel Ferrera Benegas, Regidor II, Román García Gonzales, Regidor III, Karla Patricia Rodríguez Lagos, Regidor IV, Rosalía Villanueva Molina, Regidor V, Wilfredo Canales Alfaro, Regidor VI, Lourdes Suyapa Torres Gutiérrez, Regidora VII, y German Gonzales Hernández, Regidor VIII, **POR TANTO:** Dicha **MOCION** Se Da Por **APROBADA** Por Unanimidad de la Honorable Corporación Municipal.

Se extiende la presente CERTIFICACION en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes, a los 17 Días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veintiuno.


ALEJANDRO DUARTE GARCIA
Secretario Municipal

11-207-009057-2
ALCALDIA MUNICIPAL DE
POTRERILLOS, CORTES
BO. SAN MIGUEL, FRENTE AL PARQUE
CENTRAL, POTRERILLOS, CORTES

CHEQUE No. 79325475

POTRERILLOS, CORTES

12/03/2021

Lugar y Fecha

Juan Jose Chicas Rodriguez

L 55,224.50

Páguese a la orden de

Cincuenta y cinco mil Doscientos veinticuatro Lempiras con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.

44
Firma(s)

⑈01207079⑈00112070090572⑈79325475

X



Honduras, C.A.

POTRERILLOS, CORTÉS
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2021
Hora : 01:13 p.m.
USUARIO: ROSIBEL.AMAYA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 13006

L.: 55,224.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 11323

Fecha de Emisión: 12/2/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ

Id/RTN: 0505198600414

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago de Primera Estimación del Proyecto Construcción de Caja Puente de 6.00X4.00X1.50 , Ubicado en el Barrio Repartos del Pedregal.(Fondos Fuerza Honduras II ETA)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 000 001 47210 11-001-01	Construcción De Cajas puentes en Repartos del Pedregal.	55,224.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	55,224.50
Monto Total:		55,224.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		55,224.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		55,224.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

RECIBO POR LPS. 55,224.50

Recibí de la Municipalidad de Potrerillos, Cortes la Cantidad de CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS. **(Lps. 55,224.50)**. Por Concepto de pago correspondiente a la ESTIMACION N°1 del valor total del contrato: **CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.00X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO REPARTO DEL PEDREGAL DEL MUNICIPIO.** Según documentos adjuntos.

Potrerillos, Cortes

12 DE FEBRERO DEL 2021



JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ

Ident. 0505 1986 00414



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
TEL. 2673-8183 / FAX. 2673-9026
e-mail: munipot@yahoo.es



CONTRATO : CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.00X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO REPARTO DEL PEDREGAL POR EL VALOR DE LPS 117,965.00

Nosotros: Municipalidad de Potrerillos Departamento de Cortes Representado por la Abogada **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**, Hondureña, Mayor de edad, Casada, Vecina de Potrerillos, Cortes, con Tarjeta de Identidad Numero 0505-1972-00469, extendida en Potrerillos, Cortes, en su condición de Alcaldesa Municipal de este Término, con acuerdo en Punto Único de la Sesión Celebrada el Día 17 de Diciembre del Año Dos Mil Diecisiete, por el Tribunal Supremo Electoral y habiendo tomado Posesión del cargo el Día 25 de Enero del Año Dos Mil Dieciocho, y con facultades suficientes para celebrar este tipo de actos que en adelante se llamara Municipalidad de Potrerillos, Cortes, y el Señor **JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ**, con Identidad Numero 0505 1986 00414 extendido en Potrerillos, Cortes, y con residencia en este Municipio, Mayor de Edad, Casado, Hondureño, y que en adelante se llamara el **CONTRATADO**, convenimos en celebrar como en efecto celebramos el presente contrato por los daños causados por los huracanes IETA Y IOTA CON FONDOS DE FUERZA HONDURAS II , el cual se registrá bajo las siguientes cláusulas: PRIMERA: La Municipalidad ha convenido en contratar los servicios del Señor **JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ**, para que realice el Siguiete trabajo el cual consiste en: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.00X4.00X1.50 UBICADO EN EL BARRIO REPARTO DEL PEDREGAL DEL MUNICIPIO. CON LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL
LIMPIEZA	1.00	GL	1,700.00	1,700.00
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,670.00	2,670.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	300.00	2,850.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,700.00	24,300.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,600.00	25,350.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,700.00	20,520.00
LOSA DE CONCRETO 6.00X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,200.00	31,200.00
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	2,500.00	9,375.00
TOTAL				117,965.00 LPS

SEGUNDA: Especificaciones Técnicas a) SE HARA LA EXCAVACION DE 1.00X0.50.b) SE CONSTRUIRA EL MURO DE MAMPOSTERIA DE 1.10X0.50 MT c) SE CONSTRUIRA EL PISO DE MAMPOSTERIA 6.50X4.00X0.20. d) SE CONSTRUIRA LA LOSA DE CONCRETO DE 6.50X4.00X0.20. TERCERA . La Vigencia del Contrato Individual comprende de 60 dias, a partir de la fecha que se emita la orden de inicio. CUARTA: El costo total por el trabajo a desempeñar es de CIENTO DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS. (Lps. 117,965.00). , Se le dara un 15% como anticipo del valor total del contrato correspondiente a DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS .(lps. 17,694.75).Si no presenta pago a cuenta se le deducirá el 12.5% del valor total del contrato equivalente a CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 63/100 CENTAVOS (LPS.14,745.63)La diferencia será cancelada por estimaciones según avance de la obra. QUINTA: El contratista dara como garantía por anticipo una letra de cambio por el valor del mismo a favor de la municipalidad de Potrerillos Cortes SEXTA: Por cada día de atraso se le deducirá el 1% del valor total de contrato. SEPTIMA:El Contratado el JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ, libra de toda responsabilidad laboral a la Municipalidad de Potrerillos, Cortes por cualquier problema o por los obreros que subcontrate para la realización de dicho trabajo. OCTAVA: El Contratado el Señor JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ, dice que es cierto lo expresado en este contrato y que lo acepta bajo estas condiciones. En fe de lo cual firmamos el presente contrato de prestación de servicios por duplicado quedando una copia en los archivos del patrono y otra que recibe el trabajador, en el Municipio de Potrerillos, Cortes, a los Treinta Días del Mes de Enero del Año Dos Mil Veintiuno


ABOGADA **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**
Alcaldesa Municipal


JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ
Contratado



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS, CORTES
FICHA DE PROYECTO EJECUTADO
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



NOMBRE DEL PROYECTO

CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.00X4,00X1.50

NOMBRE DEL CONTRATISTA

JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ

UBICACIÓN DEL PROYECTO

BARRIO REPARTO DEL PEDREGAL

FECHA DE ORDEN DE INICIO

1 DE FEBRERO DEL 2021

FECHA DE FINALIZACION DE PROYECTO S/C

SUPERVISION

Unidad Tecnica Municipal

COSTO TOTAL

117,965.00

CUADROS DE PAGOS

DESCRIPCION TIPO DE PAGO	FECHA	REFERENCIA	ORDEN DE PAGO	CANTIDAD	% PAGADO	SALDO
ANTICIPO	30/01/2021			17,694.75	0.15	100,270.25
ESTIMACION N 1	12/02/2021			55,224.50	0.468	45,045.75

ING. GEOVANNI MONTTOYA
COORDINADOR



PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.00X4.00X1.50

UBICACIÓN: BARRIO REPARTO DEL PEDREGAL

ESTIMACION N 1

12 DE FEBRERO DEL 2021

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL	ESTIMACION ACTUAL	TOTAL
LIMPIEZA	1.00	GL	1,700.00	1,700.00	1.00	1,700.00
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,670.00	2,670.00	1.00	2,670.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	300.00	2,850.00	9.50	2,850.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,700.00	24,300.00	9.00	24,300.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,600.00	25,350.00	9.75	25,350.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,700.00	20,520.00	3.00	8,100.00
LOSA DE CONCRETO 6.00X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,200.00	31,200.00		-
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	2,500.00	9,375.00		-

TOTAL

LPS 117,965.00

LPS 64,970.00

ANTICIPO 15%

LPS 17,694.75

RETENCION POR ANTICIPO

LPS 9,745.50

TOTAL A PAGAR

LPS 55,224.50

ING GEOVANNI MONTOYA
UTM

ABOGADA JUANA ARACELY PAVON ALCERRO
ALCALDESA

JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ
CONTRATISTA


PROYECTO: CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE DE 6.00X4.00X1.50

UBICACIÓN: BARRIO REPARTO DEL PEDREGAL

COTIZACION

ACTIVIDAD	CANTIDAD	UND	PRECIO/UNT	TOTAL
LIMPIEZA	1.00	GL	1,700.00	1,700.00
DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE	1.00	GL	2,670.00	2,670.00
EXCAVACION 1.00X0.50X19.00	9.50	MT3	300.00	2,850.00
CIMENTACION DE MAMPOSTERIA 1.00X0.50X18.00	9.00	MT3	2,700.00	24,300.00
MUROS DE MAMPOSTERIA 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	2,600.00	25,350.00
PISO DE MAMPOSTERIA 9.50X4X0.20	7.60	MT3	2,700.00	20,520.00
LOSA DE CONCRETO 6.00X4.00X0.20, # 4 @ 0.15 A.S	26.00	MT2	1,200.00	31,200.00
CABEZAL DE MAMPOSTERIA 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	2,500.00	9,375.00
TOTAL			LPS	117,965.00

OFERENTE



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

JUAN JOSE / CHICAS RODRIGUEZ





HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 24 JUNIO 1986
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 15 OCTUBRE 2009

0505-1986-00414


04670624-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

JUAN JOSE / CHICAS RODRIGUEZ
0505-1986-00414

Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 06/03/2019 RTN: 05051986004141

JUAN JOSE CHICAS RODRIGUEZ
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas Selectivo ☐	Productores Importadores de Cigarillos ☐
Importador ☐	Productores Alcoholes Licores ☐
Exportador ☐	Distribuidores Alcoholes Licores ☐
Imprentas ☐	Importador Alcoholes Licores ☐
Prestatista ☐	

Artículo 1 del Decreto N° 202 de 1914, informado mediante Art. 2 de Decreto N° 256 de 2002, Art. 30 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 9 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista, No Banco y Acuerdo 43 de 1973, Art. 31, 34 y 56 Decreto N° 17 de 2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 56 numeral 1), 58 numeral 1), 65, 67 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.

Ministra Directora

Señor Obligado Tributario, recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

Tributar es ProgreSAR



**MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL**

TEL. 2673-8183 / 2676-86-51

E-mail: munipot@yahoo.es



COTIZACION

PROYECTO:

Construcción de Caja Puente de 6.50X4.00X1.50

UBICACIÓN:

Barrio Repartos del Pedregal

No	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Limpieza	1	GL	L 1,800.00	L1,800.00
2	Demolición de la estructua existente	1	GL	L 2,700.00	L2,700.00
3	Excavación 1.00X.50X19.00	9.5	MT3	L 400.00	L3,800.00
4	Cimentación de mampostería 1.50X0.50X13.00	9	MT3	L 2,900.00	L26,100.00
5	Muros de mampostería 1.50X0.50X13.00	9.75	MT3	L 2,800.00	L27,300.00
6	Piso de mampostería 9.50X4.00X0.20	7.6	MT3	L 2,900.00	L22,040.00
7	Losa de concreto 6.50X4.00X0.20 #4 0.15 A.S	26	MT3	L 1,230.00	L31,980.00
8	Cabecal de mampostería 0.50X(1.50+1.00)X6.00	3.75	MT3	L 2,890.00	L10,837.50
SUB TOTAL					L126,557.50
IMPUESTO 15%					L0.00
TOTAL					L126,557.50

Proveedor: Nery Mejia Bardales

ID/R.T.N: 0503198800189

Fecha: 27/01/2021

Vigencia de la oferta: 15 días


FIRMA DEL PROVEEDOR

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

NERV / MEJIA BARDALES



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL : 26 JUNIO 1969
SEXO : MASCULINO
EMITIDA EL : 02 SEPTIEMBRE 2017




0503-1988-00189




02757275-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0506

NERV / MEJIA BARDALES
0503-1988-00189



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05031988001891

NERY MEJIA BARDALES
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☐	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20140916

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 19 de Agosto de 2002, Art. 16 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-07, Art. 20 del Decreto 104-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 16 de Enero de 1973.



Ministra Directora



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumpla con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1701527

Transacción: C530DA



MUNICIPALIDAD DE POTRERILLOS
DEPARTAMENTO DE CORTES
HONDURAS, C.A.
Tel. 2673-8183/ 2673-8651



CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal de Potrerillos Cortes, **CERTIFICA:** Que en Sesión Ordinaria Celebrada por la Honorable Corporación Municipal, El Día Martes 19 de Enero del Año Dos Mil Veintiuno, Según Acta 0105-2021, **Punto 9. ACUERDOS Y RESOLUCIONES**, Inciso (**M**) Que Literalmente Dice. (**M**) La Abogada, **JUANA ARACELY PAVON ALCERRO**, Alcalde Municipal, Somete a Consideración en Calidad **MOCION** Para Aprobación, EL Perfil de Proyecto, **CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE DE 6.00X4.00X1.50 UBICADA EN EL BARRIO REPARTOS DEL PEDREGAL** de este Municipio. A UN COSTO TOTAL DE LPS. 141,000.00, estos fondos salen de Fuerza Honduras II. **SECUNDA LA MOCION** El Regidor, **Carlos Noe Rivera Manzanares**, Levantaron su mano al estar de Acuerdo La Abogada, Juana Aracely Pavón Alcerro, Alcalde Municipal y los Regidores, Carlos Noé Rivera Manzanares, Regidor I, Miguel Ángel Ferrera Benegas, Regidor II, Román García Gonzales, Regidor III, Karla Patricia Rodríguez Lagos, Regidor IV, Rosalía Villanueva Molina, Regidor V, Wilfredo Canales Alfaro, Regidor VI, Lourdes Suyapa Torres Gutiérrez, Regidora VII y German Gonzales Hernández, Regidor VIII, **POR TANTO:** Dicha **MOCION** Se Da Por **APROBADA** Por Unanimidad de la Honorable Corporación Municipal.

Se extiende la presente CERTIFICACION en el Municipio de Potrerillos Departamento de Cortes, a los 17 Días del Mes de Febrero del Año Dos Mil Veintiuno.


ALEJANDRO DUARTE GARCIA
Secretario Municipal
