



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

Colomoncagua Intibucá 6 de diciembre del 2021

Señor: Nelson Alfredo Gózales Yáñez

Oficial de acceso a la información pública

Municipalidad de Colomoncagua Intibucá


Su oficina

Remito a usted la información de este departamento de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Noviembre del 2021 para que sea cargada a los postales del instituto de acceso la información pública

Adjunto el cuadro de gastos en proyectos en el mes de Noviembre


ENCARGADO DE UTM AME




ENCARGADA DE UTM



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



n	Nombre del proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del proyecto	Fuentes de financiamiento	Monto presupuestado del proyecto	Ampliación del proyecto	Monto ejecutado en el mes	Estado del proyecto
1	Construcción de modulo escolar	Castaño II	Fortalecer la educación proporcionando	Construcción de módulos	Municipal	100,000.00		22,857.15	En ejecución
2	Ampliación de mejoramiento de cancha de futbol	Los palones	Proporcionar un lugar adecuado para sana recreación	construcción de cerca perimetral	Municipal	200,000.00		51,595.00	Ejecutado
3	Mejoramiento de kínder	Llano Grande	Mejorar las condiciones del kínder	Ampliación de aula	Municipal	140,000.00		21,785.71	ejecutado
4	Construcción de caja puente los amates	Los Amates	Mejorar las condiciones de la carretera	Construcción de caja puente en tramo de río	Municipal	110,000.00		46,800.00	En ejecución
5	Mejoramiento de campo Los Palones	Barrio Los Palones			Municipal	200,000.00		51,595.00	ejecutado
6	construcción de posta policial	San marcos	Proporcionar casa de habitación Resguardar la seguridad de los ciudadanos	Construcción de casa habitación	Municipal	100,000.00		43,700.00	En ejecución
7	Construcción de bodega cocina comedor	Escuela Los Amates	Proporcionar un lugar adecuado para preparación de alimentos	Construcción de cocina de cocina	Municipal	121,857.97	40,000.00	48,471.43	En ejecución
8	Mejoramiento de	Matazano	Mejorar las	Raspar ,cuentoó	Municipal	246,000.00		240,000.00	Ejecutado



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



carretera		condiciones de carretera	de carretera				
Mejoramiento de carretera	Guachipilín a san Antonio	Mejorar las condiciones de carretera para los transeúntes y vehículos	Raspado de carretera	Municipal	48,917.06		43,700.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: 11 noviembre del 2021

Hora de llegada al proyecto ☒ 8:00 hora de salida ☒ 9:00

Nombre del proyecto: Construcción de Cocina bodega Comedor

Ubicación Los Amates Centro Educativo

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Al llegar a lugar donde se esta
construyendo la Cocina bodega Comedor
se encontro al encargo del trabajo realizando
la descajonando las vigas que se fundaron
con apoyo de presidente patronato

Firma del supervisor asignado




Marco Antonio Lopez Sanchez
contratista

Visto bueno de:

Josué Pedro Men



Construcción de bodega cocina comedor en escuela Los Amates

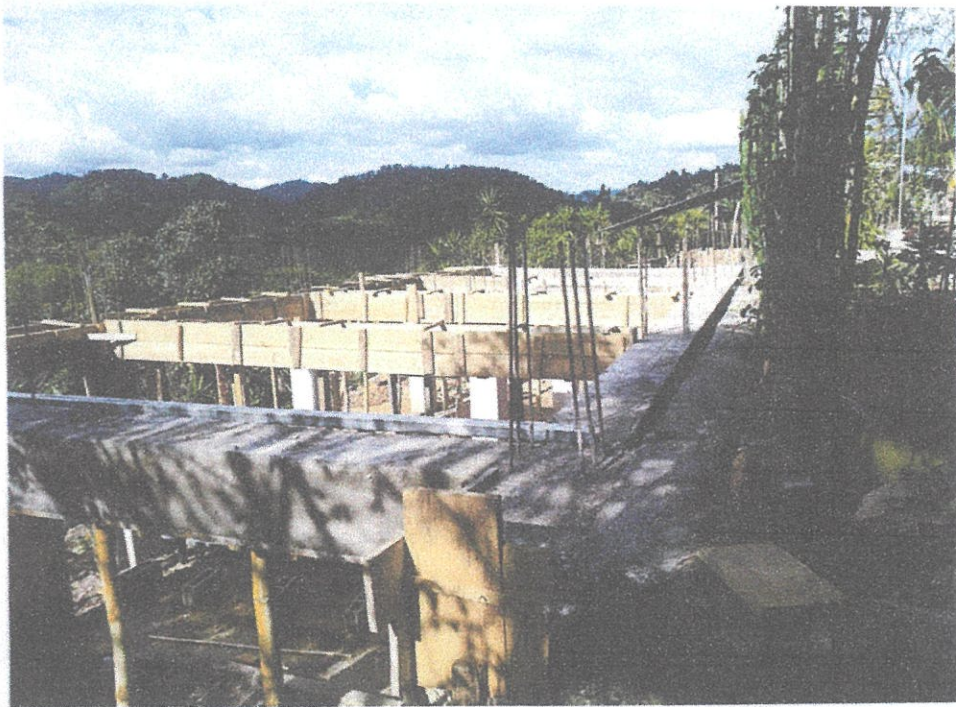



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: 30 Noviembre 2021

Hora de llegada al proyecto ☐ hora de salida ☐

Nombre del proyecto: Mejoramiento de Carretera

Ubicación Comunidad Los Hornos

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se esta realizando la construcción de
puente en quebrado que en
tiempo de invierno esta la carretera
impidiendo el paso de vehículos
Se esta trabajando con apoyo
de el presidente de patronato


[Firma]

Firma del supervisor asignado

Paustino Sánchez S.

contratista

[Firma]
Visto bueno de:

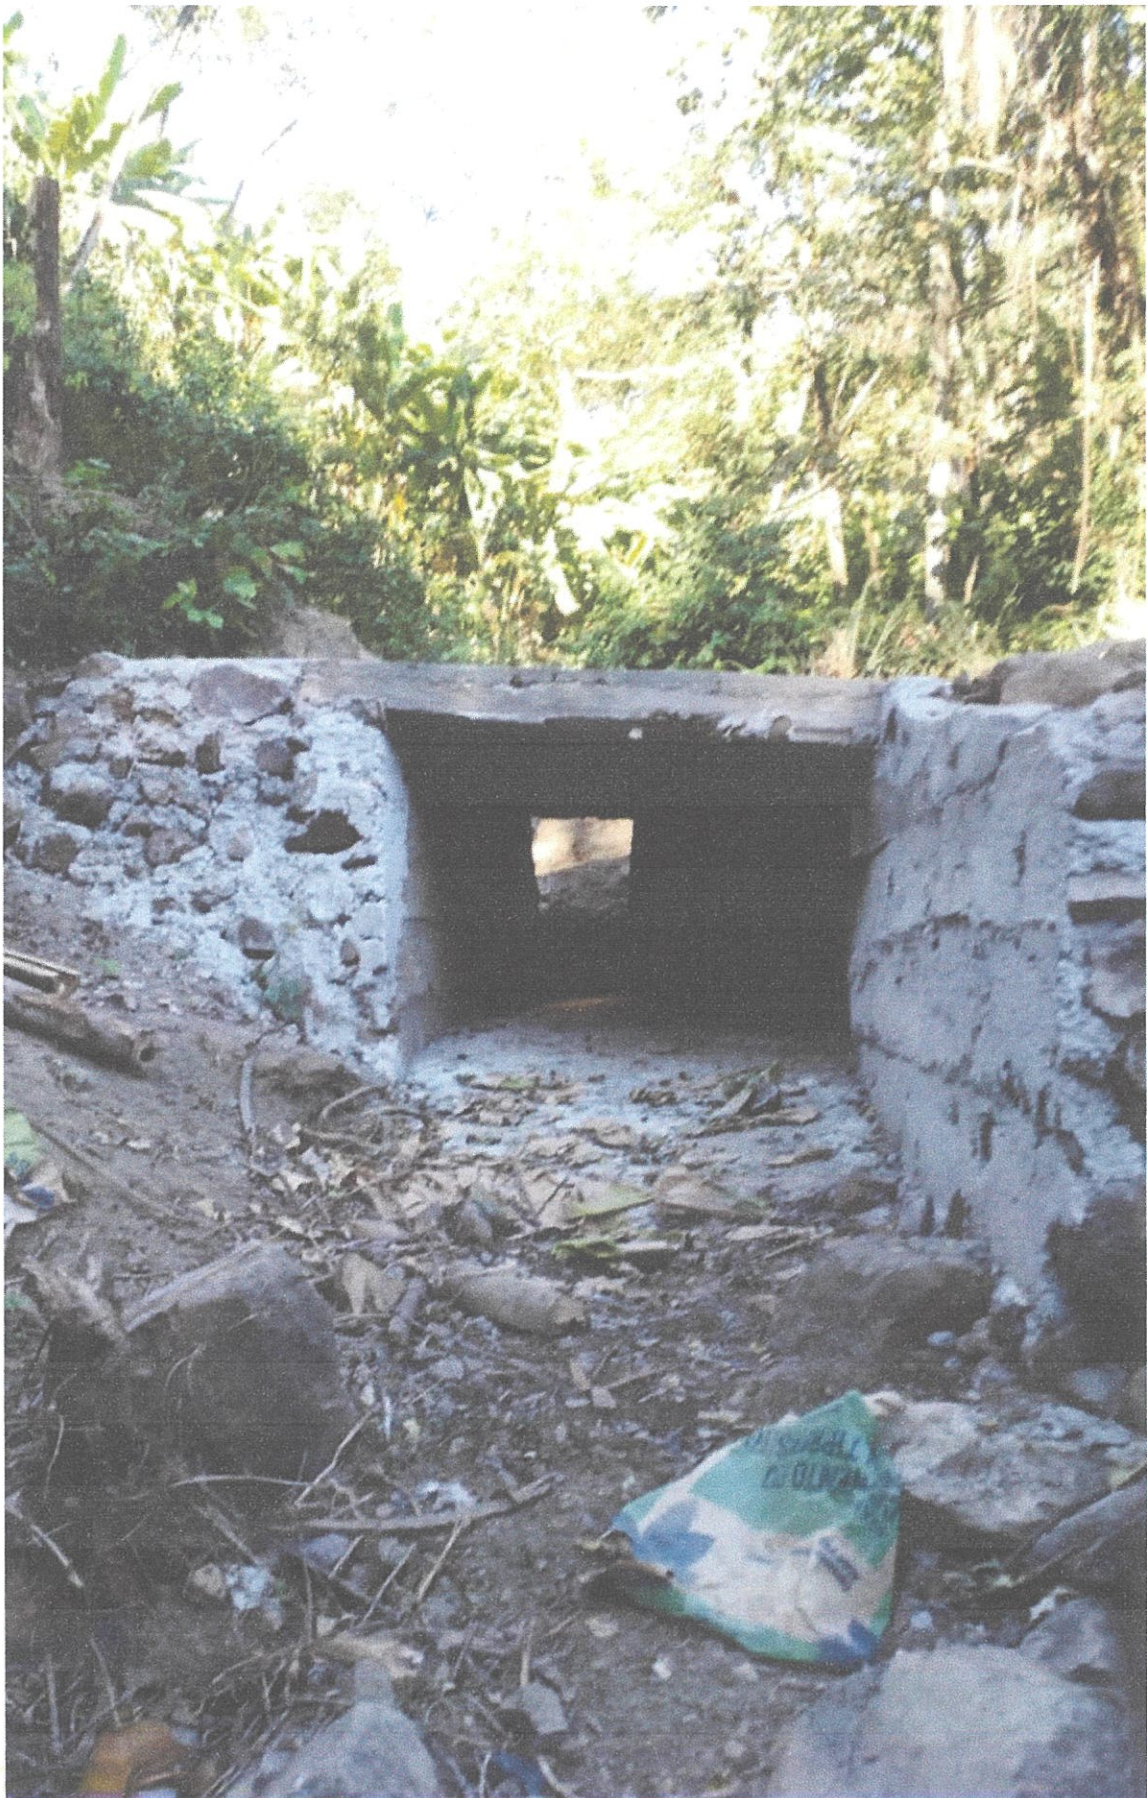









ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: 30 Noviembre del 2021

Hora de llegada al proyecto ☐ hora de salida ☐

Nombre del proyecto: Construcción de Cerca Perimetral

Ubicación: Potrillo

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se esta Sanjando para poder Construir
el muro para la Construcción de Cerca
perimetral Siempre con el apoyo
de la comunidad y bajo la
supervisión del presidente patronato.

[Firma]

Firma del supervisor asignado

Jos. Patronato Diaz Perez

Alejandro Perez

Visto bueno de:

presidente Patronato.



