

MEMORANDUM

IN-051-OIP 2016

Para: Dilia Martínez
Oficial de Información Pública

De: Ing. Neil Patrick Diaz
Jefe de Departamento

Asunto: Lo Descrito.

Fecha: 03 Mayo del 2016.



Por medio de la presente le estoy enviando el cuadro de Avance Físico Mensual de los proyectos en ejecución del mes de Abril del año 2016.

Atentamente.


cc. Archivo

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA (CCIVS)
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

RESUMEN DE EJECUCION FISICA DE PROYECTOS MES DE ABRIL DEL 2016

PROYECTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD VIGENTE	ACUMULADO ANTERIOR	EJECUTADO ABRIL	ACUMULADO A ABRIL	% AVANCE
01	CANALIZACIONES	M ³	485,250	0	0	0	0.0%
02	ESPIGONES	M ³	11,850	1,749	1,315	3,064	25.9%
03	ALCANTARILLAS	MIL	180	0	0	0	0.0%
04	BORDOS	M ³	400,000	0	0	0	0.0%






Ing. Neil Patrick Díaz R.
Jefe departamento Ingenieria.


CUADRO DE AVANCE FISICO
Año 2016

Ingeniero Coordinador de Proyectos: Harry Lobo
Periodo: 01 de ABRIL al 30 DE ABRIL 2016

No	Descripción de resultado de producción	Regionalización		Contratista	Número de contrato	Obra Contratada						Avance físico				Observaciones
		Departamento	Municipio			Descripción	Unidad	Cantidad	Obra Ejecutada Mes Anterior	Obra Ejecutada Mes	Obra Ejecutada Acumulada	Cantidad Anterior	Cantidades Mes	Cantidades Acumuladas	% Efectuado Acumulado	
1	Estructuras de Control															
1.1	Obras de Protección y reparación de Estructura del Alivio La fragua II Etapa	Yoro	El Progreso	CONSTRUCTORA PARAISO	P2-011-2015 CCIIVS	terraceria	M²	14,910.00	13,960.40	949.60	14,910.00	13,960.40	949.60	14,910.00	100.00%	proyecto finalizado
						concreto premezclado	M³	1,272.00	1,036.92	235.08	1,272.00	1,036.92	235.08	1,272.00	100.00%	
						gaviones	M³	2,071.00	1,941.00	130.00	2,071.00	1,941.00	130.00	2,071.00	100.00%	
						tablaestaca con polimeros UC.75	M³	144.00	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	100.00%	
						tablaestaca con polimeros UC.95	M³	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	100.00%	
TOTALES																



Ing. Harry Lobo
Coordinador de Proyectos
CCIVS







VoBo
Ing. Neil Diaz
Jefe Departamento de Ingeniería
CCIVS



GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula
INGENIERIA

Avance físico Abril 2016 proyecto: Obras de Protección y reparación de Estructura del Alivio La
fragua II Etapa

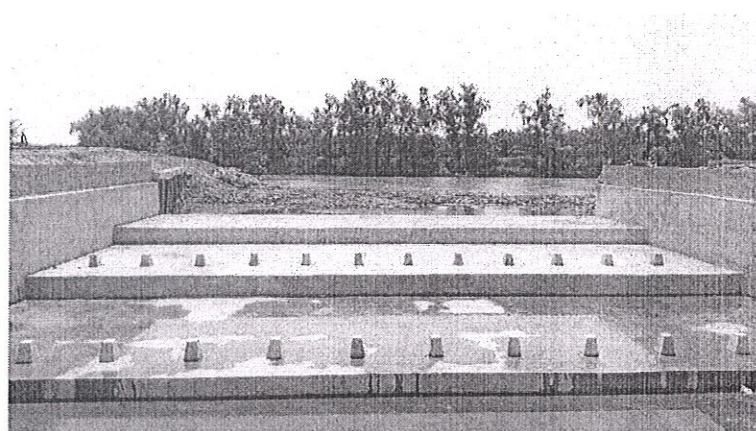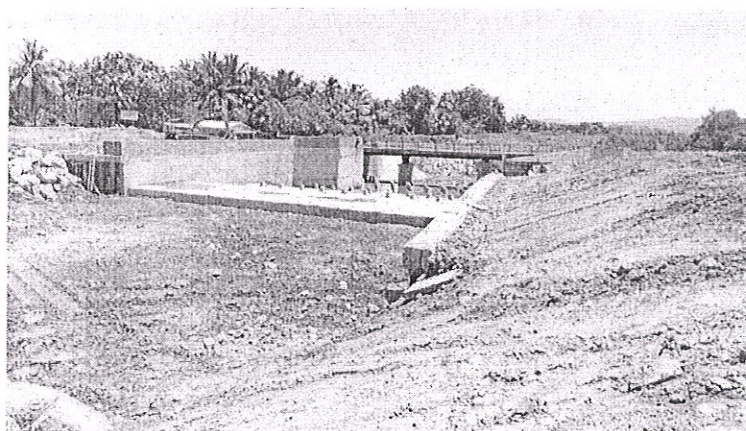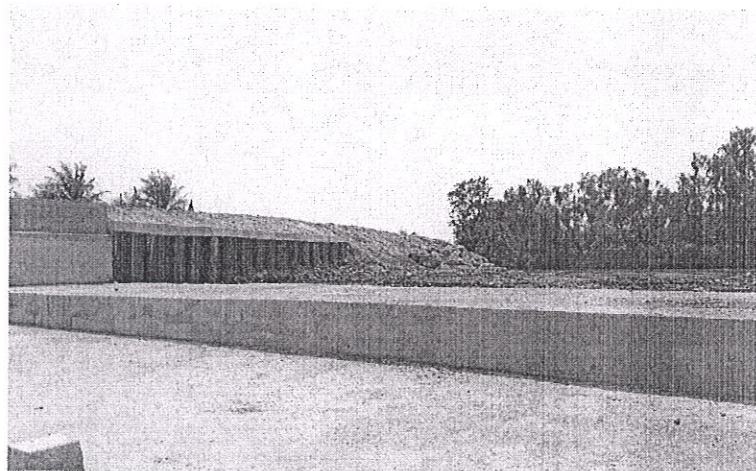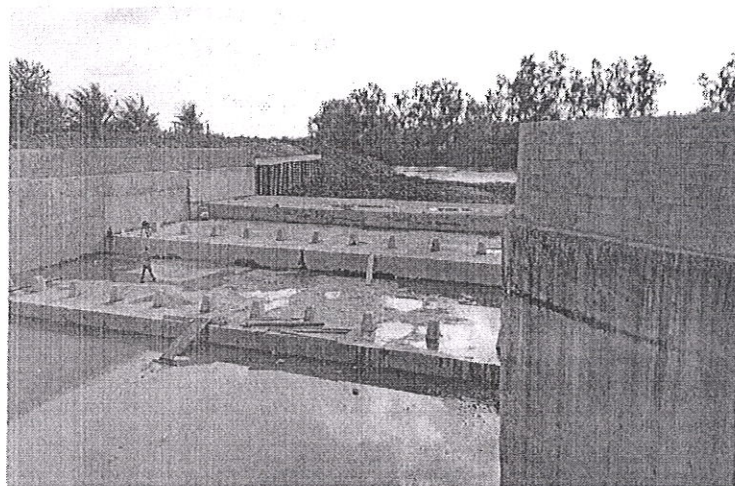

[Handwritten signature]
