




Gerencia General

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL

REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

ABRIL 2022



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



N° IM 0133-05-2022

MEMORANDUM

PARA: Licda. Cintya Mejía
Oficial de Acceso a La Información Pública

DE: Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 05 de mayo del 2022



Estimada Licenciada:

El motivo de la presente es para remitirle el **Reporte de Proyectos Ejecutados en el mes de abril del 2022.**

Sin otro particular

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA


GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA-MES DE ABRIL DEL 2022

N°	Nombre de Proyecto	Ubicación Proyecto	Alcance	Costo del Proyecto	Descripción Obra	Impacto Ambiental	Fuente Financiamiento	Monto Ejecutado Acumulado	Orden de Cambio			Fecha de Finalización	% de Avance
									Si	No	Just.		
1	Engavionado en Muelle Reynaldo Canales	El Centro, La Ceiba	Beneficiará toda la población de La Ceiba	L. 1.135,646.93	Construcción de obras	Ninguno	Fondos Municipales	L. 750,000.00				30 de junio del 2022	40%




I. FOTOGRAFÍAS

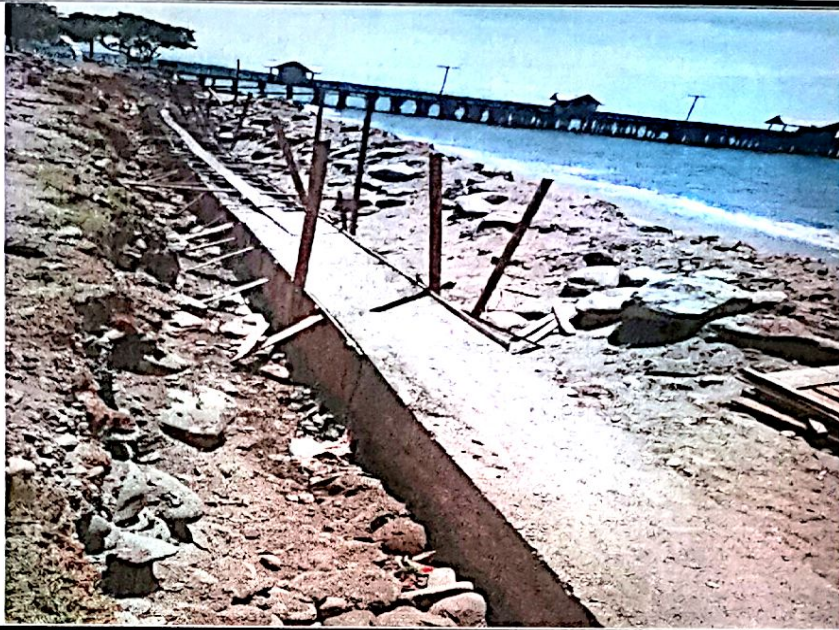

No.	Desencofrado de fundición	
1	Proyecto "Engavionado en Malecón Reynaldo Canales".	Fecha: abr/2022




No.	Desencofrado de fundición	
2	Proyecto "Engavionado en Malecón Reynaldo Canales".	Fecha: abr/2022

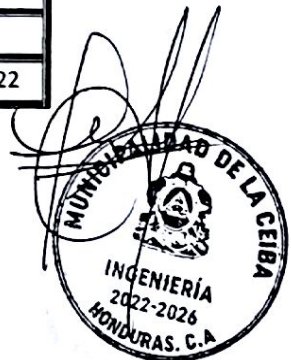



No.	Conformación de terreno	
3	Proyecto "Engavionado en Malecón Reynaldo Canales".	Fecha: abr/2022

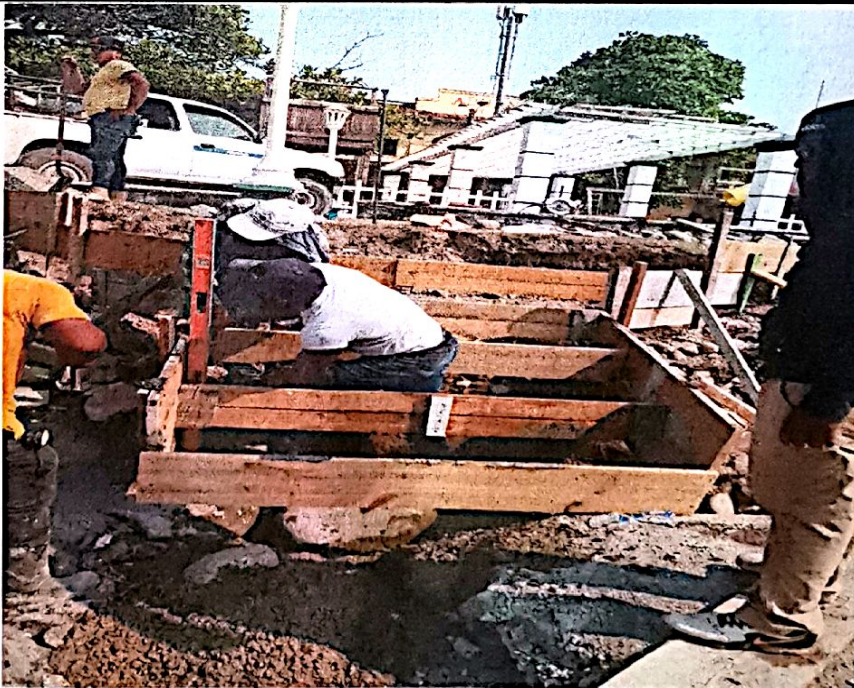

No.	Construcción de gradas para acceso a playa	
4	Proyecto "Engavionado en Malecón Reynaldo Canales".	Fecha: abr/2022





No.	Construcción de gradas para acceso a playa	
5	Proyecto "Engavionado en Malecón Reynaldo Canales".	Fecha: abr/2022



No.	Construcción de gradas para acceso a playa	
6	Proyecto "Engavionado en Malecón Reynaldo Canales".	Fecha: abr/2022

