



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO,
AGUA Y SANEAMIENTO
SEDECOAS

Informe de Ejecución Física y Financiera IDECOAS
Plan Operativo Anual POA-Presupuesto

IV Trimestre **2021**

Contenido

I. Antecedentes	3
II. Introducción	4
III. Logros al IV Trimestre 2021	5
VI. Ejecución Físico-Financiera al IV Trimestre 2021	7
A. Ejecución Física.....	7
B. Ejecución Presupuestaria SIAFI	21
C. Ejecución detallada 2021	23

I. Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).

II. Introducción

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) ejecuta proyectos de infraestructura social y comunitaria, incentivando el desarrollo de la economía, necesarios para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales y urbanas del país.

Este informe constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los fondos asignados y poder implementar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

III. Logros al IV Trimestre 2021

- Al cierre del III Trimestre se ha concluido la formulación de 4 proyectos:
 1. Construcción Sistema de Agua Potable, El Limonal, Choluteca, Choluteca.
 2. Proyecto de aguas en Marasias Intibucá.
 3. Construcción alcantarillado sanitario Sabana Grande.
 4. Construcción de Sistema de Alcantarillado, Col. Las Palmas, Gracias/ Lempira.
- Se realizó la contratación de los proyectos
 1. Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Gracias a Dios, Puerto Lempira.
 2. Perforación de pozo y sistema de agua potable en Choluteca, Limonar.
 3. Reposición Jardín de niños José Trinidad cabañas en Intibucá, Intibucá.
 4. Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Copan, San José.
 5. Construcción de pavimento de concreto hidráulico en el Paraíso, Trojes.
 6. Instalación de Puente Bailey en El Paraíso, Trojes.
 7. Reparación de línea de conducción de agua en Cortes, Omoa.
 8. Construcción Cerco Perimetral CEB Ramon Villeda en El Paraíso, Trojes.
 9. Construcción de vado sumergible en el Paraíso, Trojes.
- Se logró la finalización de 20 proyectos de infraestructura:

No.	CODIGO	NOMBRE DEL PROYECTO	MENU PROGRAMAS SGPR	DEPARTAMENTO	PROYECTOS FINALIZADOS			
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
1	107869	CONSTRUCCION AUDITORIO INSTITUTO LENCA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INTIBUCA	-	1	-	-
2	107880	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	DESARROLLO COMUNITARIO	INTIBUCA	-	1	-	-
3	107981	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	DESARROLLO COMUNITARIO	FRANCISCO MORAZAN	-	1	-	-
4	107989	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	DESARROLLO COMUNITARIO	COMAYAGUA	-	1	-	-
5	108005	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	DESARROLLO COMUNITARIO	YORO	-	1	-	-
6	108010	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	DESARROLLO COMUNITARIO	FRANCISCO MORAZAN	-	1	-	-
7	108011	BALASTADO DE CALLE	DESARROLLO COMUNITARIO	FRANCISCO MORAZAN	-	1	-	-
8	108013	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL.VALLE DE SULA 1	DESARROLLO COMUNITARIO	CORTES	-	1	-	-
9	108014	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	DESARROLLO COMUNITARIO	FRANCISCO MORAZAN	-	1	-	-
10	108109	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	DESARROLLO COMUNITARIO	LA PAZ	-	1	-	-
11	107878	REPARACIÓN CEB MIGUEL PAZ BARAHONA	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INTIBUCÁ	-	-	1	-
12	108012	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	DESARROLLO COMUNITARIO	GRACIAS A DIOS	-	-	1	-
13	107960	REPOSICIÓN CANCHA CEB LUIS BOGRÁN	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	INTIBUCÁ	-	-	1	-
14	107427	REPARACION CEB ALVARO CONTRERAS	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	FRANCISCO MORAZAN	-	-	1	-
15	107617	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR SUR	SANEAMIENTO	OLANCHO	-	-	-	1
16	107956	EXTENSION DE LINEA PRIMARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES	DESARROLLO COMUNITARIO	INTIBUCA	-	-	-	1
17	108055	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	DESARROLLO COMUNITARIO	INTIBUCA	-	-	-	1
18	107573	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	SANEAMIENTO	CHOLUTECA	-	-	-	1
19	107615	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	DESARROLLO COMUNITARIO	COPAN	-	-	-	1
20	108752	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	DESARROLLO COMUNITARIO	EL PARAISO	-	-	-	1
TOTAL					0	10	4	6

- En relación a los fondos del Programa de Conversión Deuda de Honduras frente a España (presupuesto asignado de L. 114, 153,474.00), la Secretaria de Finanzas proporciono un cronograma para la realización de las transferencias al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Se realizaron todas las transferencias programadas conforme a los recibos proporcionados por SEFIN a IDECOAS.

El presupuesto no ejecutado (L.7,885,715.63) debería ser rebajado por SEFIN en el marco de la Normativa Legal Vigente conforme a lo establecido en el Artículo 234 del Decreto Legislativo No.182-2020 “la SEFIN efectúa la liquidación del presupuesto al final del Ejercicio Fiscal (31 de diciembre 2021)”.


VI. Ejecución Físico-Financiera al IV Trimestre 2021

A. Ejecución Física

Tabla No.1 Ejecución de Metas

Programa	Productos	Meta Global 2021	Resultado Global alcanzado	Meta IV Trimestre 2021	Resultado IV Trimestre 2021	% Avance IV Trimestre 2021	% Avance Global 2021
MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	Proyectos de Desarrollo Social y/o Comunitario entregados . (PRODUCTO FINAL)	27	20	5	3	60,00%	74,07%
	Informe de Programa de Conversión de Deuda de Honduras frente a España. (PRODUCTO INTERMEDIO)	1	1	1	1	100,00%	100,00%
	Informes de Inspectoría realizados. (PRODUCTO INTERMEDIO)	57	61	4	8	200,00%	107,02%
	Formulación de proyectos (PRODUCTO INTERMEDIO)	4	4	0	0	Sin producción planificada	100,00%
	Contrato suscrito con ejecutores (PRODUCTO INTERMEDIO)	5	9	0	2	Sin producción planificada	180,00%

Grafico No.1 Avance al IV Trimestre 2021

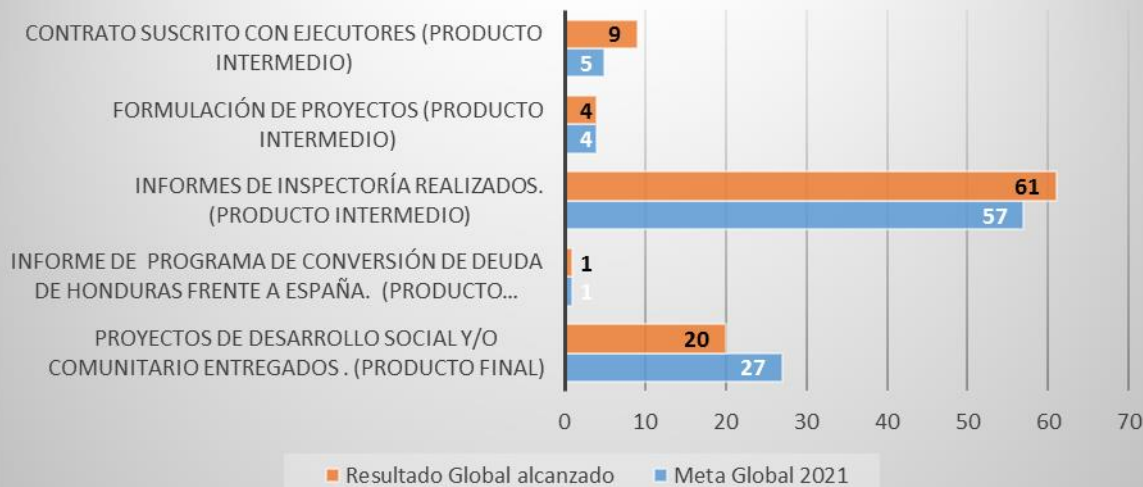

Proyectos IDECOAS 2021:

Durante el año 2021 se lograron finalizar 20 proyectos en total de los cuales corresponden a:

I Trimestre: 10 proyectos

II Trimestre: 4 proyectos

III Trimestre: 6 proyectos

De los cuales quedan pendientes:

2 proyectos que pasan ejecución a 2022 debido a su tipología (Agua Potable) y Alcances de los mismos, códigos 108688 y 108427.

1 proyecto suspendido debido a que se depende de otras instituciones para obtener todos los insumos necesarios para poder ejecutarlo en su totalidad, código 108739 Instalación Puente Bailey.

2 proyectos en proceso de Resolución por incumplimiento por parte de los Contratistas.

PROYECTOS CON SALDOS PENDIENTES

Código - 107956 -

Nombre: “EXTENCION DE LINEA PRIMARIA E INSTALACION DE TRANSFORMADORES”

Ubicación: Malguara, Intibucá, Intibucá.

Monto: Lps. L864, 521.44

Avance Físico: 100%

Fuente: IDECOAS

Beneficiarios: 48 habitantes

Descripción del Proyecto:

El proyecto consiste en la construcción de sistema de iluminación extensión de línea primaria e instalación de tres transformadores de 15 kva y lámparas de sodio de 100 w. Esto beneficia a 46 personas que habitan en la aldea.

Avance físico y actividades ejecutadas a la fecha:

Actualmente el proyecto tiene un avance físico de 100%.

Situación Actual:

Pendiente nada más con el trámite de cierre.

Fotografías:

Código 107956



Código 108739 – INSTALACION DE PUENTE BAILEY

Aldea:	Yamales
Municipio:	Trojes
Departamento:	El Paraíso
Avance Físico:	0%
Avance Financiero:	50%
Beneficiarios:	4,855 beneficiarios directos
Empleos a Generar:	15 empleos
Monto Total del Proyecto:	2, 112,789.26 Lps.
Fuente Financiamiento:	IDECOAS
Tiempo de Ejecución Original:	30 días
Fecha de inicio:	30/09/2021

Alcance del Proyecto:

Consiste en la construcción de una cimentación de concreto con zapata corrida y muro de bloque armado para las aproximaciones del puente y la instalación de un puente modular tipo Bailey

Observaciones:

Se retiraron algunas piezas del puente Bailey suministradas por COPECO el ejecutor realizo el traslado de dichas piezas hasta el municipio de Trojes en espera de poder completar el 100% del total de dichas piezas.

El proyecto se encuentra suspendido en vista que no se cuenta con el suministro completo de la estructura.

En base a informe actualizado de las piezas faltantes proporcionado por el ejecutor SEDECOAS realizó la solicitud a INVEST de dichas piezas y aún no se tiene una respuesta.

Se propuso al ejecutor presentar una propuesta económica para la elaboración de las mismas, pero manifiesta que necesita una muestra para dárselas al posible fabricante.

Se tomó en consideración con el ingeniero estructuralista y además responsable de la formulación de este proyecto si era factible la elaboración de las piezas y si hay empresas en el país que pudieran elaborarlas con los mismos criterios utilizados por ACROW garantizando así la calidad de las mismas.

El Ing. Estructuralista manifestó que en Honduras solo existen empresas galvanizadoras.

Por todo lo expuesto y en vista que desde el mes de septiembre se realizó el desembolso del 50% a la empresa ejecutora se propone la reformulación o en última instancia la resolución por mutuo acuerdo de este proyecto ya que no se puede completar con el suministro de la estructura del puente Bailey propuesto por la formulación.

Reporte Fotográfico:





Código 108752 – CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO

Aldea:	Trojes
Municipio:	Trojes
Departamento:	El Paraíso
Avance Físico:	99%
Beneficiarios:	200 beneficiarios directos
Empleos a Generar:	14 empleos
Monto Total del Proyecto:	2, 725,707.44 Lps.
Fuente Financiamiento:	IDECOAS
Tiempo de Ejecución Original:	90 días
Beneficiarios:	762 habitantes

Alcance del Proyecto:

Se propone la construcción de un pavimento de concreto hidráulico. El pavimento consta de: 2 Tramos, el tramo 1 posee una longitud de 42.68 ml con un ancho de 7.00 mts incluyendo bordillos y un espesor de 15 cm. El tramo 2 posee una longitud de 200.00 ml con un ancho de 7.00 mts incluyendo bordillos y un espesor de 15 cm. Dentro de este total de pavimento hidráulico se incluye lo siguiente: Volumen de corte de terreno natural: 507.65 m3 Área de Pavimento de concreto Hidráulico e=15cm: 1,820.42 m2 Bordillo de 0.15x0.15 m: 468.73 ml

Observaciones:

El proyecto se encuentra finalizado según reporte del ejecutor en espera de visita de recepción por parte de inspección.

Ya fueron enviados los formatos para la recopilación de documentos de cierre y estimación final por parte del contratista.

Se espera la autorización para programación de visita de inspección y poder así recepcionar el proyecto e iniciar los trámites administrativos pendientes.

Código 107573- “Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residual”

Aldea:	Casco Urbano
Municipio:	Duyure
Departamento:	Choluteca
Avance Físico:	100%
Avance Financiero:	76%
Beneficiarios:	2360 habitantes

Descripción del proyecto:

El proyecto consiste en la construcción de un sistema de recolección y una planta de tratamiento de aguas residuales. El objetivo es recolectar las aguas mediante acometidas domiciliarias y transportarlas por gravedad con pendientes mínimas del 50%, esto consiste en la construcción de una caja de registro por cada vivienda beneficiada, posteriormente dichas aguas son transportadas hasta la línea principal (es la que se ubica en el centro de la calle) haciendo uso de tubería de PVC con diámetro de 4 pulgadas, luego se trasladan por toda la línea principal por tuberías de 6 y 8 pulgadas, generando una ramificación en el sistema de recolección, en el caso de este proyecto en particular todas las aguas captadas se juntan posteriormente en el pozo # 8 y de este salen hacia el pozo # 13 por una tubería de 10 pulgadas.

Una vez recolectadas las aguas de todo el sistema estas pasaran a recibir un tratamiento de purificación el cual consiste en la construcción de un desarenador cuya función es la de separar todo tipo de desecho inorgánico que ha sido arrastrado por las corrientes en el interior de la tubería, así como también otra de sus funciones es retener las arenas en el fondo de su estructura de manera que periódicamente se deben practicar actividades de limpieza lo cual garantizara un adecuado funcionamiento de dicho elemento.

Posteriormente estas aguas pasaran a un reactor anaeróbico cuya función es la de separar el líquido de los sólidos de manera que en su interior los sólidos se sedimentan y se descomponen mediante un sistema anaeróbico y los líquidos son transportados a un lecho de secado de lodos cuya función es la de secar los lodos por medio de la evaporación y el líquido se traslada hacia un bio filtro el cual representa el ultimo tratamiento que se le da al agua y este consiste en la construcción de una laguna cuyo fondo se rellena con material granular lo cual permite la filtración del agua misma que al salir del bio filtro estas aguas ya tratadas son trasladadas a un cuerpo receptor. Cabe mencionar que ya en esta etapa el agua presenta bajos niveles de contaminación y puede

ser utilizada para actividades como ser el riego de cultivos, cría de peces etc. Más no así para el consumo humano directamente.

Avance físico y actividades ejecutadas a la fecha:

Actualmente el proyecto tiene un avance físico aproximado de 100%, dicho avance se obtiene mediante la ejecución de actividades como ser:

- Actividades de trazado y marcado haciendo uso de equipo de topografía
- Terracería en general, lo cual incluye actividades con ser la excavación, acarreo, conformación con material selecto y material del sitio.
- Suministro e instalación de tubería de PVC de los diámetros requeridos (4, 6, 8 y 10 pulgadas)
- Construcción de cajas de registro
- Elaboración de tapaderas de cajas de registro y pozos de inspección
- Construcción de pozos de inspección
- Pruebas hidrostáticas
- Construcción de cerco perimetral
- Construcción de elementos que componen la planta de tratamiento (desarenador, reactor anaeróbico, lecho de secado de lodos, bio-filtro y descarga)

Situación Actual:

A la fecha el proyecto se encuentra finalizado al 100% en la parte física, habiéndose recepcionado provisionalmente el 10 de Octubre de 2021 y de manera definitiva el 20 de Diciembre del mismo año. Se han ejecutado todas y cada una de las actividades que componen el alcance de la obra, de manera que dicho proyecto ya se encuentra en funcionamiento, solventando de esta manera uno de los principales problemas en el municipio, mejorando además las condiciones sanitarias y de vida de los pobladores.

FOTOGRAFIAS





Código 107197 – CONSTRUCCIÓN RED DE AGUA POTABLE

Comunidad: Lepaera

Municipio: Lepaera

Departamento: Lempira

Fuente Financiamiento: IDECOAS

Número de beneficiarios: 6,675

Fecha de última visita: 14 de diciembre de 2021

Actividades realizadas: Se realizó visita a campo en Lepaera, con el objetivo de medición total de obra ejecutada para proceso de rescisión de convenio. En dicha medición, se lograron cubrir 5 redes de distribución y sus debidas conexiones domiciliarias, obteniendo la siguiente información: **Red de distribución 1 Longitud: 3,421.80 ml de tubería instalada. Tubería: PVC 1 ½", 2", 3" Cajas de conexiones domiciliarias - Instaladas: 244 unidades Longitud: 752.20 ml de tubería instalada. Tubería: PVC ½" **Red de distribución 2 Longitud: 978.00 ml de tubería instalada. Tubería: PVC 1 ½", 2" Cajas de conexiones domiciliarias - Instaladas: 43 unidades Longitud: 221.60 ml de tubería instalada. Tubería: PVC ½" **Red de distribución 3 Longitud: 3,437.90 ml de tubería instalada. Tubería: PVC 1 ½", 2", 3", 4", 8" Cajas de conexiones domiciliarias - Instaladas: 98 unidades Longitud: 443.30 ml de tubería instalada. Tubería: PVC ½" **Red de distribución 5 Longitud: 1,216.00 ml de tubería instalada. Tubería: PVC 1 ½", 2", 3" Cajas de conexiones domiciliarias Instaladas: 49 unidades Longitud: 230.00 ml de tubería instalada. Tubería: PVC ½" **Red de distribución Torrecillas Longitud: 2,060.00 ml de tubería instalada. Tubería: PVC 1 ½", 2", 3", 4" Total tubería instalada PVC : 11, 113.7 ml (11.11 km) Total tubería instalada en conexiones domiciliarias: 1, 647.1 ml (1.6741 km) Total cajas domiciliarias instaladas: 434 unidades **AÚN FALTA OBRA POR MEDIR*

Código 108688 – REPARACIÓN LÍNEAS DE CONDUCCIÓN AGUA POTABLE

Comunidad: Omoa

Municipio: Omoa

Departamento: Cortés

Proceso actual: En ejecución

Número de beneficiarios: 28, 236

Fecha de última visita: 29 de octubre de 2021

Actividades realizadas: Se ha realizado visita para evaluación de las actividades en ejecución. Según seguimiento, los porcentajes de avance son los siguientes: COMUNIDAD PORCENTAJE DE AVANCE OMOA CENTRO 33.33% CUYAMEL 80.94% EL PARAÍSO 63.24% VERACRUZ 60.43% ACHIOTES 46.56% MILLA 3 0.00% MILLA 5 0.00% MUCHILENA 0.00% Se han ejecutado L 4, 528, 521.36 lo que representa el 46.92% del total del proyecto (L 9, 680, 795.1

Código 108427 – CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Aldea: Limonal
Municipio: Choluteca
Departamento: Choluteca
Beneficiarios: 474 beneficiarios
Fuente de Financiamiento: IDECOAS
Monto aprobado: 3, 796,727.69 Lps.
Orden de Inicio: 20/05/2021
Plazo de ejecución: 120 días
Finalización prevista: 17/09/2021
Suspensión: 42 días
Ampliación N.1: 32 días
Nueva Fecha de finalización: 30/11/2021
Responsable de la Ejecución: Constructora la Roca S.de R.L. de C.V.

Alcance del Proyecto:

Perforación de pozo, línea de impulsión de 3777.76 ml, tanque de distribución de 10,000 Gls., red de distribución de 1354.17 mt., 73 conexiones domiciliarias, hipoclorador por goteo.

Observaciones:

El proyecto se encuentra en la ejecución del tanque de almacenamiento de 10,000 Gls. La empresa ejecutora presenta retrasos no justificados y se presume próximamente la aplicación de multas en base cláusulas del convenio.

Con la suspensión por el segundo punto de perforación y la primera ampliación de 32 días por mal clima la fecha de finalización prevista fue el 30/11/2021 y próximamente se llevara a aprobación un adendum por tiempo en base a actividades de orden de cambio por actividades nuevas.

Entre estas actividades están:

1. Pasos aéreos como protección de la red en puntos por donde pasa la quebrada.
2. Refuerzo de cimentación del tanque de 10,000 Gls. Por inestabilidad del suelo encontrado al momento de las excavaciones.
3. Suministro e instalación de pilas prefabricadas por beneficiario para el almacenamiento del agua recolectada.

Reporte Fotográfico:



Código: 108589
Nombre: Reposición Jardín de Niños José Trinidad Cabañas
Ubicación: Aldea Malguara, Intibucá, Intibucá
Monto Contratado: Lps. 990,573.80
Fuente: IDECOAS
Ejecutor: Fundación Orientada a la Educación Integral Social Y Desarrollo Comunitario

El proyecto “**Reposición Jardín de Niños José Trinidad Cabañas**” ubicado en el departamento de Intibucá, municipio de Intibucá, aldea Malguara aprobado y previsto construirse con fondos IDECOAS, por un monto de L. 990,573.80, se tomó la determinación de realizar el proceso de resolución por incumplimiento, generando una orden de cambio negativa por el total del monto aprobado, esto debido al abandono del proyecto por parte del ejecutor en reiteradas ocasiones se les ha solicitado avanzar en la construcción del jardín de niños, haciendo caso omiso a las instrucciones giradas por mi persona, demuestran su falta de compromiso en cumplir los tiempos de ejecución se

observa la deficiencia y la mala calidad de los materiales en todas las áreas, no respetan las especificaciones técnicas requeridas.

Se estableció orden de inicio con fecha 07 de julio 2021, al día de hoy se encuentran en desfase desde el 29 de septiembre incurriendo en multa diaria, no alcanzan el avance de obra esperado a la fecha, la ampliación del jardín de niños debería estar finalizado en su totalidad inicialmente para el 05 de Septiembre, pero debido a las lluvias presentadas en la zona se concedió una ampliación de tiempo por 24 días calendarios, siendo su fecha máxima de finalización para el 29 de Septiembre, y en vista del abandono de la obra en construcción, a la falta de compromiso con las tareas asignadas en sitio, presentando deficiencia en los criterios técnicos, mala calidad de los materiales, no se considera ningún monto a favor del ejecutor; En las visitas realizadas se observó la falta de personal en el sitio, la mala calidad de la obra, por lo tanto se realiza la resolución por incumplimiento.

Se mencionan las causas de resolución.

CLAUSULA OCTAVA: CAUSAS DE SUSPENSIÓN, RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN DEL CONVENIO: El presente Convenio, podrá suspenderse siempre que mediare causa justificada, que será evaluada y analizada por las partes.- Se podrá invocar la Resolución del Convenio por siguientes causas: a) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, Sobrevinientes a la celebración del convenio, que imposibilite o agraven desproporcionadamente su ejecución; b) El mutuo acuerdo de las partes.- El Convenio

Podrá ser rescindido por las siguientes causas: a) El incumplimiento de una o más de las cláusulas convenidas; b) Por no iniciar la obra después de los cinco (5) días calendario después de la fecha establecida en la orden de inicio; e) Por deficiencia o mala ejecución de los trabajos debido a insuficiente mano de obra, mala calidad de los materiales o uso inapropiado de equipo, d) no cumplir con las instrucciones de inspección de la dirección de control y seguimiento el CONTRATANTE, anotadas en la bitácora o a través de correspondencia; e) En caso de utilización de los fondos para fines distintos del proyecto, f) Por aplicación de lo establecido en el Artículo 78 del Decreto Legislativo No.182-2020 (Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2021.) el que literalmente dice: *"En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del*

préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de

vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de necesidades imprevistas o de emergencia".-Una vez firme la resolución por incumplimiento del CONVENIO, se ejecutará la Garantía de Cumplimiento rendida por EL EJECUTOR y además se le aplicará la prohibición de celebrar nuevos convenios durante el plazo de dos (2) años, quedando durante ese período inhabilitado del Banco de Contratistas de la Institución.-

INFORME DE AVANCE IDECOAS IV TRIMESTRE 2021

B. Ejecución Presupuestaria SIAFI

El IDECOAS (Institución 241) alcanzó una ejecución financiera del 91.62% en relación a su Presupuesto Vigente 2021. A continuación, se presenta el avance financiero por actividad/obra:

Tabla No.2 Ejecución del Presupuesto por Programa

Programa	Actividad/Obra	Presupuesto Aprobado 2021	Presupuesto Vigente 2021	Programación Financiera IV Trimestre	Ejecución IV Trimestre	Ejecución Acumulada 2021	Crédito disponible	% Ejecución IV Trimestre	% Ejecución Acumulada 2021
MANEJO DE CUENCAS, ESTUDIOS Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS	COORDINACION Y ADMINISTRACION	L 14.650.515,00	L 14.650.515,00	L 3.662.628,00	L 4.364.252,43	L 14.337.563,43	L 312.951,57	119%	97,86%
	ESTUDIOS , CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA Y SAN EAMIENTO	L 134.153.474,00	L 134.153.474,00	L 34.469.612,00	L 27.005.677,57	L 121.998.761,13	L 12.154.712,87	78%	90,94%
TOTAL		L 148.803.989,00	L 148.803.989,00	L 38.132.240,00	L 31.369.930,00	L 136.336.324,56	L 12.467.664,44	82%	91,62%

Fuente: Reporte SIAFI

Tabla No.3 de Ejecución del Presupuesto por Grupo de Gasto

GRUPO DE GASTO		PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	L 13.002.923,00	L 12.915.695,58	L 87.227,42
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 1.284.288,00	L 1.044.990,94	L 96.784,06
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 363.304,00	L 376.876,91	L 128.940,09
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 134.153.474,00	L 121.998.761,13	L 12.154.712,87
TOTAL GENERAL:		L 148.803.989,00	L 136.336.324,56	L 12.467.664,44

Fuente: Reporte SIAFI

Grafico No. 2 - Ejecución Acumulada al IV Trimestre 2021

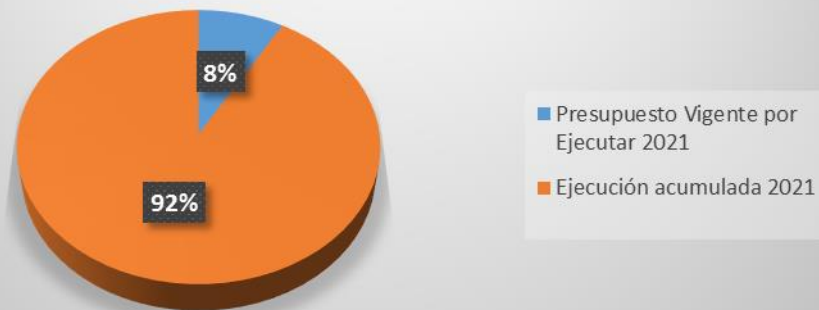


Grafico No. 3 Ejecución Actividad Coordinación y Administración

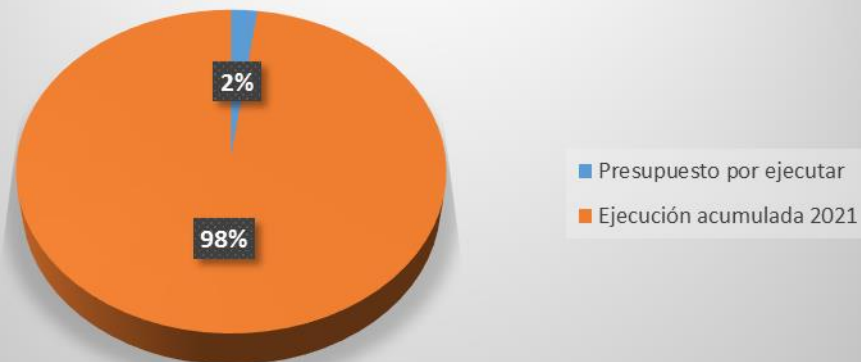


Grafico No. 4 Ejecución Estudios y Construcción de Proyectos



C. Ejecución detallada 2021

Tabla No.5 de Ejecución detallada por Objeto de Gasto

OBJETO DE GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	L 6.602.005,00	L 6.602.005,00	L -
11510	Decimotercer Mes	L 552.005,00	L 550.000,00	L 2.005,00
11520	Decimocuarto Mes	L 550.000,00	L 549.611,11	L 388,89
11600	Complementos	L 431.173,00	L 346.339,74	L 84.833,26
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones d	L 957.291,00	L 957.290,73	L 0,27
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 67.372,00	L 67.372,00	L -
14300	Gastos de Representacion en el País	L 180.000,00	L 180.000,00	L -
16200	Compensaciones	L 3.663.077,00	L 3.663.077,00	L -
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	L 970.000,00	L 970.000,00	L -
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 51.578,00	L 11.750,00	L 39.828,00
26110	Pasajes Nacionales	L 16.900,00	L -	L 16.900,00
26210	Viáticos Nacionales	L 63.297,00	L 63.240,94	L 56,06
29100	Ceremonial y Protocolo	L 40.000,00	L -	L 40.000,00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	L 3.100,00	L 3.099,85	L 0,15
33100	Productos De Papel Y Cartón	L 55.909,00	L 55.908,17	L 0,83
35620	Diesel	L 200.000,00	L 199.994,00	L 6,00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 26.000,00	L -	L 26.000,00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 80.000,00	L 33.400,83	L 46.599,17
39600	Repuestos y Accesorios	L 140.808,00	L 84.474,06	L 56.333,94
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	L 20.000.000,00	L 15.731.002,76	L 4.268.997,24
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 114.153.474,00	L 106.267.758,37	L 7.885.715,63
TOTAL		L 148.803.989,00	L 136.336.324,56	L 12.467.664,44
