

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN



2016

Informe de Proyectos de Inversión. Abril

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

I. Identificación del Proyecto

| | |
|---------------------------|--|
| Propietario del proyecto: | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán |
| Sector, Sub sector: | Gobernabilidad y Descentralización |
| Nombre del Proyecto: | Construcción del Edificio del aula N° 14 de la UPNFM |
| Ubicación del Proyecto | Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán |
| Propósitos: | Demanda satisfecha de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. |
| Descripción del Proyecto: | El proyecto "Construcción del Edificio de aulas 14 de la UPNFM", servirá para generar más y mejores condiciones de infraestructura para el desarrollo de espacios Pedagógicos adecuados a las exigencias del entorno educativo en que se desenvuelve el Centro de Investigación Educativa. |

II. Elaboración del Proyecto

| | |
|--|---|
| Alcance del proyecto: | Mejorar en un 5% el acceso a Educación Superior en el área de la docencia de la población de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. |
| Impacto ambiental: | El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial |
| Impacto en el terreno y asentamientos: | No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se desarrollará el proyecto. |
| Detalles del contacto: | Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores, 50499411275, jalvarez@upnfm.edu.hn |
| Fuentes de financiamiento: | Fondos del estado |
| Propuesta del Proyecto | L. 36,246,000.00 |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | 2013 |
| Estado actual del proyecto | Etapa de Construcción |
| Costo de financiación(proyectada): | L. 38,158,282.70 |
| Fecha de finalización (proyectada): | Abril de 2017 |

III. Ejecución del Proyecto

Relación de la planificación con los productos entregados de manera trimestral:

Se han hecho avances significativos en la obra.

Variación en el costo total del proyecto:

No se puede determinar ya que el proyecto se encuentra en ejecución

Variación en el alcance y duración del proyecto:

Ninguna

Razones de los cambios


Ninguna

Responsable de la elaboración del informe(nombre y firma)



Luis Eduardo Alvarenga

30 de abril de 2016

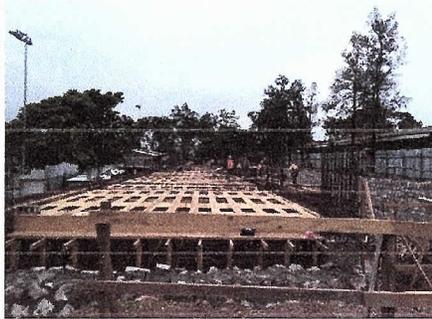

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán

I. Identificación del Proyecto

| | |
|---------------------------|--|
| Propietario del proyecto: | Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán |
| Sector, Sub sector: | Gobernabilidad y Descentralización |
| Nombre del Proyecto: | Construcción del Edificio de Talleres del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM |
| Ubicación del Proyecto | San Pedro Sula, Departamento de Cortés. |
| Propósitos: | Demanda satisfecha de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en San Pedro Sula, Departamento de Cortés. |
| Descripción del Proyecto: | Con la construcción de espacios físicos se pretende incrementar y mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades a nivel universitario. |

II. Elaboración del Proyecto

| | |
|--|---|
| Alcance del proyecto: | Atender el 90% de los estudiantes del Centro Universitario Regional de San Pedro Sula |
| Impacto ambiental: | El proyecto no tendrá impacto negativo en el medio ambiente. En la fase de construcción se implementará un plan de manejo de materiales de acuerdo a parámetros de seguridad industrial |
| Impacto en el terreno y asentamientos: | No existen problemas de inundación, deslizamientos y otros riesgos en la zona donde se desarrollará el proyecto. |
| Detalles del contacto: | Nombre: Jorge Alberto Álvarez Flores, 50499411275, jalvarez@upnfm.edu.hn |
| Fuentes de financiamiento: | Fondos del estado |
| Propuesta del Proyecto | L. 33,264,000.00 |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | 2013 |
| Estado actual del proyecto | Etapas de Pre inversión |
| Costo de financiación(proyectada): | L. 33,264,000.00 |
| Fecha de finalización (proyectada): | Diciembre de 2017 |

III. Ejecución del Proyecto

Relación de la planificación con los productos entregados de manera trimestral:

Se han entregado los planos, presupuestos, especificaciones y estudio de impacto ambiental en el tiempo establecido.

Variación en el costo total del proyecto:

No se puede determinar.

Variación en el alcance y duración del proyecto:

Ninguna

Razones de los cambios

Ninguna

Responsable de la elaboración del informe(nombre y firma)




Luis Eduardo Alvarenga

30 de abril de 2016
