

República de Honduras

Municipalidad de Taulabé

Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
CUADRO RESUMEN DE CONTRATOS MES DE MAYO 2023

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	DETALLE	PROYECTO O ACTIVIDAD	EJE	CONTRATISTA	LUGAR
12/5/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe de Supervisión	Instalación de techo en clínicas Odontológicas	Salud	José Wilmer Ponce Flores	Taulabé, Comayagua, Centro de Salud
16/5/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe de Supervisión	Construcción de instalaciones de centro de acopio	Agua y Saneamiento	Rolando Pineda Machado	Sabanas de Ocote, Crematorio Municipal
22/5/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe Fotográfico	Carga y descarga de material de Asfalto con maquinaria	Infraestructura vial	Melvin Medina Fuentes	Taulabé, Comayagua.


Jefe de Unidad Técnica Municipal
17 Ing. Edin Pineda Morales
Taulabé, Comayagua





Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **INSTALACION DE TECHO EN CLINICAS ODONTOLOGICAS.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Centro de Salud.

Responsables:

Ejecutor: José Wilmer Ponce.

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	12 de mayo de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	2
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:

Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:


- Se comienza tomando niveles y pendientes para la estructura de techo.
- Toda la instalación se hace completamente con canaleta intermedia de 2 x 4.
- Se hace la instalación de canal para drenaje de aguas lluvias en los laterales de la estructura de techo
- Se realiza toda la estructura y se procede a instalar, toda la lámina de Aluzinc.}


CONCLUSIONES:

- Se realiza todo el trabajo en su totalidad, completando todas las actividades expuestas.
- No se presentan contratiempos de ningún tipo.


SUPERVISIÓN UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

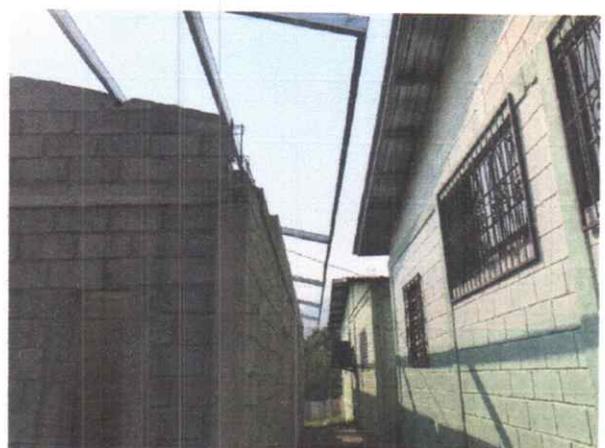

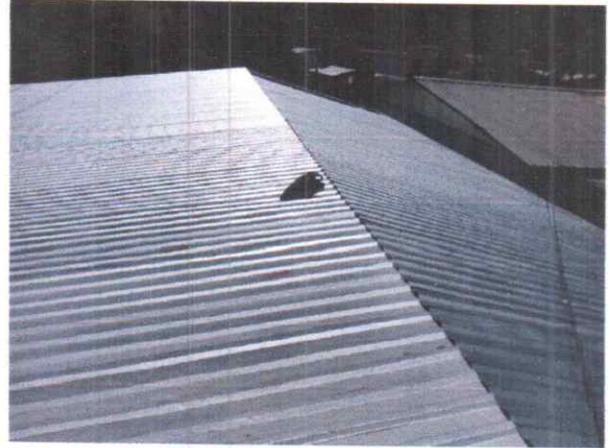



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE CENTRO DE ACOPIO**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Crematorio Municipal, Sabanas de Ocote.

Responsables:

Ejecutor: Rolando Pineda Machado.

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	16 de mayo de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Albañiles	4
				Peón	3

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:

Bueno

Regular

DESARROLLO DE LA OBRA:



- Se inician actividades de replanteo y marcación de todo el perímetro a trabajar, comprendido de dimensiones de 18 x 10 m.
- Se realiza excavación de zapatas asiladas de 80 x 80 cms, con un armado #3 @ 25 cms, con columnas de 30 x 30 cms, con armado de 4#3 y #3 @ 25 cms.
- Estas instalaciones cuentan con espacio, para la instalación de la maquina recicladora, una oficina y los baños, además contarán con un suficiente espacio para poder, almacenar material, reciclado.
- Se suministrará, todo el sistema eléctrico de tomacorrientes y sistema de iluminación.
- Se instala todo el sistema de estructura de techo y sistema hidrosanitario.

CONCLUSIONES:





- No se presentan contratiempos de clima, que tengan retraso en las actividades realizadas.
- El suministro de materiales en tiempo y forma estuvo pendiente del desarrollo de la obra.
- Se desarrollo completamente todo lo especificado anteriormente.


[Handwritten signature]
ALCALDIA MUNICIPAL
U.T.M.
TALPA DE CALANDIA
SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

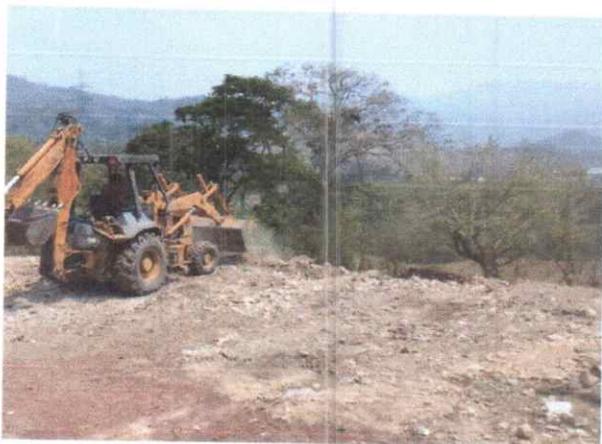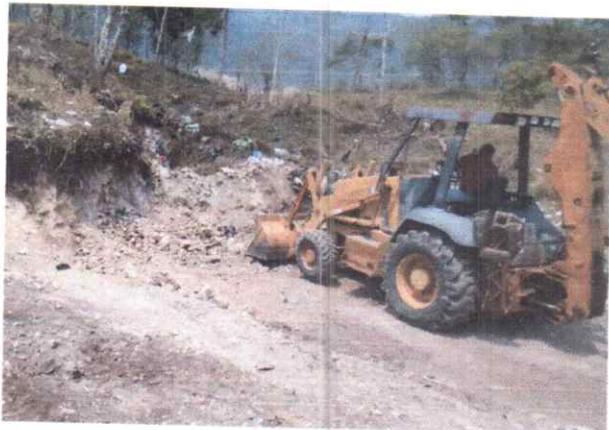



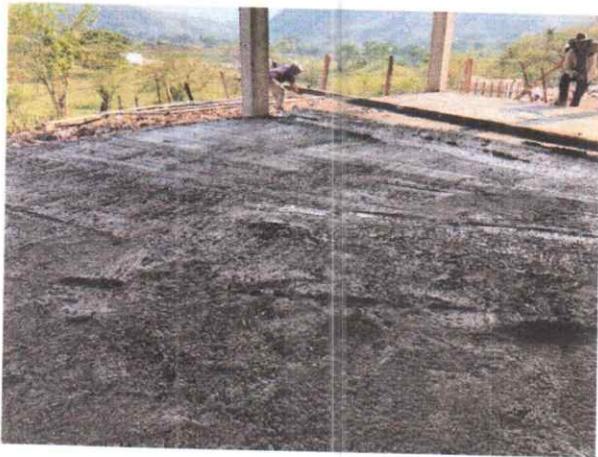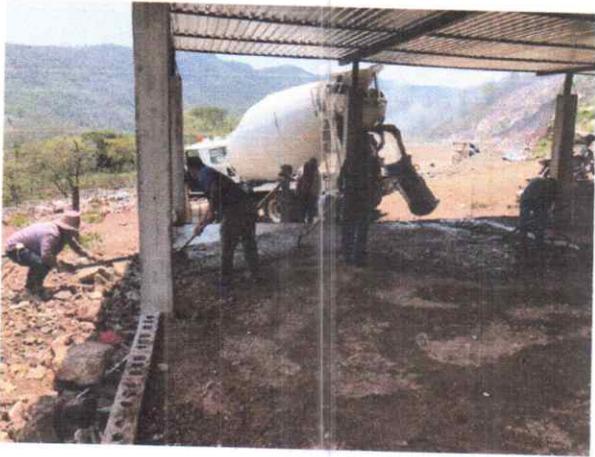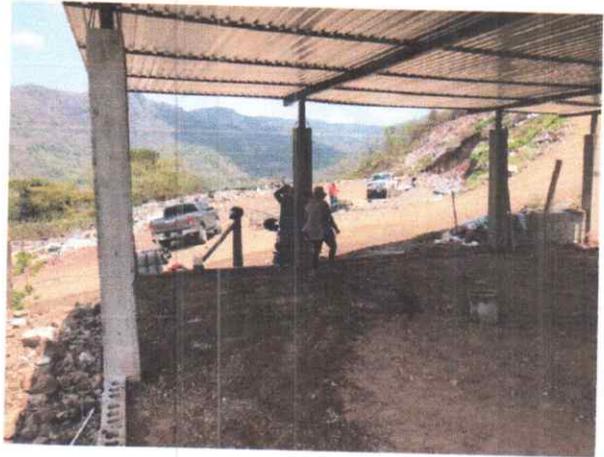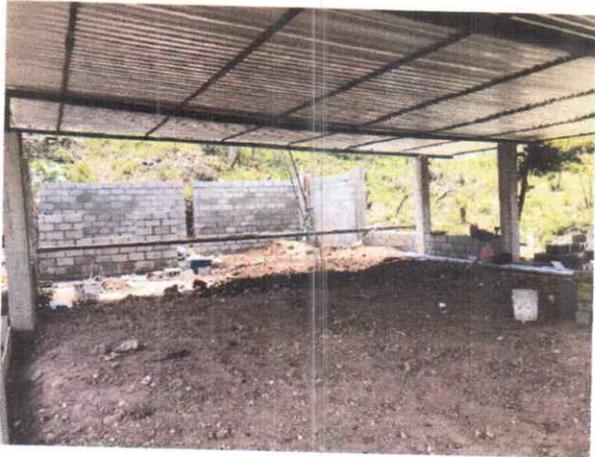

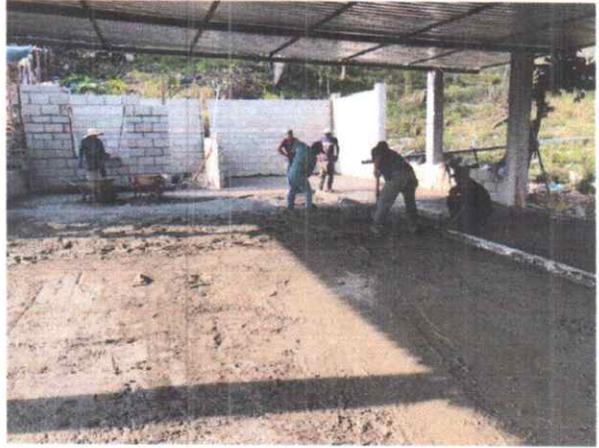





Informe Fotográfico.

Carga y descarga de Material Asfalto con maquinaria.

Este Material fue gestionado por el corte de fresado que se le hace al mantenimiento de carretera Internacional Ca-5, contabilizando aproximadamente 100 viajes de asfalto, que están siendo distribuidos para el mantenimiento de la red no pavimentada de casco urbano.



Departamento de Unidad Técnica Municipal.

REGISTRO FOTOGRAFICO

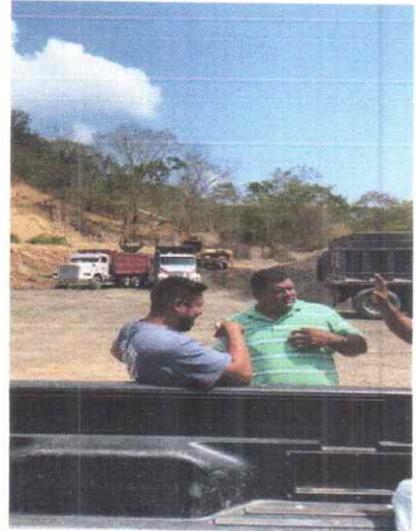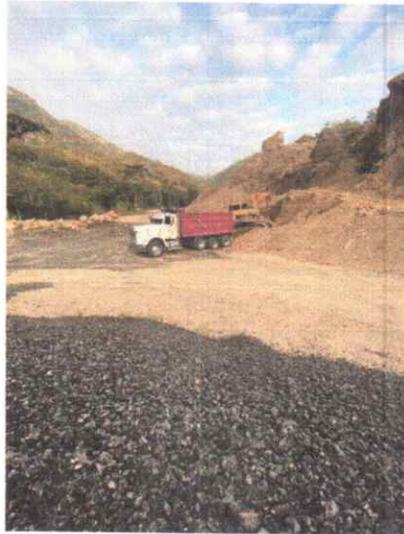



Republica de Honduras C.A
Alcaldía, Municipal de Taulabé, Comayagua
Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815

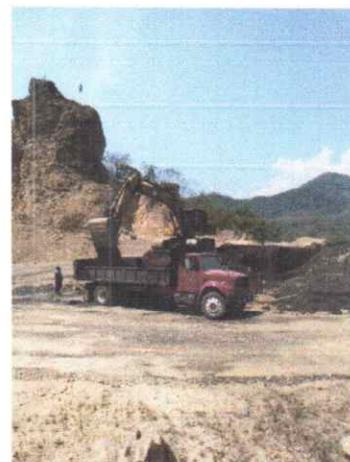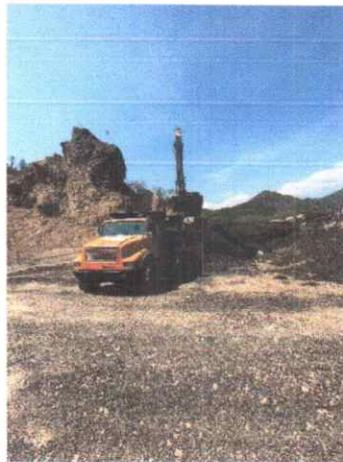



República de Honduras
Alcaldía Municipal de Taulabé
Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAMPO MES DE MAYO 2023

INFORME UTM

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2023

Sirva el presente para dar a conocer las diferentes actividades que formaron parte de las intervenciones de la Unidad Técnica Municipal (UTM). Durante el mes de MAYO, detallado de la siguiente manera:

A) Visitas Técnicas Y Supervisión.

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	LUGAR DE VISITA	DETALLE	RECORRIDO
5/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Taulabé, Comayagua, Barrio Santa Barbara	Supervisión de proyecto, reparación de pavimento por mantenimiento de sistema de alcantarillado Sanitario	N/A
	Ing Edin Pineda Morales, alcalde Denis Membreño	Sabanas de Ocote, Crematorio Municipal	Supervisión de proyecto construcción Centro De Acopio	N/A
	Ing Edin Pineda Morales	Taulabé, Comayagua, Centro de Salud	Supervisión de proyecto, construcción de clínicas Odontológicas	N/A
6/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Taulabé, Comayagua, Centro de Salud	Supervisión de proyecto, construcción de clínicas Odontológicas	N/A

8/5/2023	Ing Edin Pineda, Walner Martinez	La Providencia	Visita Técnica para relleno de zanjó por reparación de tubería red principal de agua potable	N/A
3	Ing Edin Pineda Morales	Sabanas de Ocote, Crematorio Municipal	Supervisión de proyecto construcción Centro De Acopio	N/A
	Ing Edin Pineda Morales	Municipalidad de Taulabé	Reunión con alcalde y jefes de departamento	N/A
9/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Taulabé, Comayagua, Barrio El Carmen	Supervisión de proyecto construcción de túmulos	N/A
10/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Taulabé, Comayagua, Centro de Salud	Supervisión de proyecto, construcción de clínicas Odontológicas	N/A
	Ing Edin Pineda Morales	Taulabé, Comayagua, Barrio El Carmen	Supervisión de proyecto construcción de túmulos	N/A
11/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Sabanas de Ocote, Crematorio Municipal	Supervisión de proyecto construcción Centro De Acopio	N/A
	Ing Edin Pineda Morales, alcalde Denis Membreño	El Peñón	Visita técnica para dragado de quebrada	N/A
12/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Taulabé, Comayagua, Cooperativa Taulabé.	Celebración día de las madres	N/A
15/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Sabanas de Ocote, Crematorio Municipal	supervisión de proyecto construcción Centro De Acopio	N/A
16/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Sabanas de Ocote, Crematorio Municipal	supervisión de proyecto construcción Centro De Acopio	N/A
17/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Taulabé, Comayagua, Centro de Salud	Supervisión de proyecto, construcción de clínicas Odontológicas	N/A
19/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Centro de Salud, Bacacia	Visita técnica para cálculo de materiales de construcción	N/A
22/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Taulabé, Comayagua, Barrio El Centro	Supervisión de proyecto construcción de túmulos	N/A
	Ing Edin Pineda Morales	Casa de La Cultura, Taulabé, Comayagua	Inicio de proyecto, construcción de centro de convenciones maestros jubilados	N/A
23/5/2023	Ing Edin Pineda Morales, Alcalde Denis Membreño, Brenda Cortez (OMM)	Sabanas de Ocote, Crematorio Municipal	Reunión y supervisión de proyecto de Centro de Acopio	N/A
24/5/2023	Ing Edin Pineda	Barrio Las Flores, Jardines	Visita técnica para cálculo de materiales de construcción	30 km
		Pto Solo	Visita técnica para cálculo de materiales de construcción	
25/5/2023	Ing Edin Pineda Morales	Buenos Aires	Visita técnica para cálculo de materiales de construcción	N/A
		Taulabé, Comayagua, Centro de Salud	Supervisión de proyecto, construcción de clínicas Odontológicas	

30/5/20 23	Ing Edin Pineda Morales	Taulabé, Comayagua, Centro de Salud Casa de La Cultura, Taulabé, Comayagua	Supervisión de proyecto, construcción de clínicas Odontológicas supervisión de proyecto, centro de convenciones Maestros Jubilados	N/A N/A
---------------	-------------------------	---	---	------------

JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



REGISTRO FOTOGRAFICO.

