



República de Honduras

Alcaldía Municipal de Taulabé

Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE CONTRATOS MES DE JULIO Y AGOSTO 2023

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	DETALLE	PROYECTO O ACTIVIDAD	EJE	CONTRATISTA	LUGAR
24/7/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	Cacora S de R.L.	Las Alejandras
2/8/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	Cacora S de R.L.	El Peñón, El Cedral y El Cerrón
9/8/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	Cacora S de R.L.	El Peñón y El Cedral (Antigua Calle)
10/8/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	Cacora S de R.L.	Palmichal Fátima
16/8/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Calle	Infraestructura Vial	Cacora S de R.L.	Sabanas de Ocote
20/8/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Construcción de Huellas Vehiculares	Infraestructura Vial	Patronato de Buenos Aires	Buenos Aires
20/8/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Construcción de Huellas Vehiculares	Infraestructura Vial	Patronato de San Antonio de Yurés	San Antonio de Yurés
22/8/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Construcción de Caja Puente	Infraestructura Vial	Anuar Joel Ramírez	El Cerrón
25/8/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Mantenimiento de Rastro Municipal	Agua y Saneamiento	Cacora S de R.L.	Las Flores Jaitique

25/8/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Instalación de porcelanato en Clínicas de Odontología	Salud	Henry Javier Baide	Centro de Salud Taulabe
28/8/2023	Ing Edin Pineda, jefe de Unidad Técnica Municipal	Informe de Supervisión	Restauración de estructura de techo y mejoras en mercado municipal	Economía	Municipalidad de Taulabe	Mercado Municipal




 Jefe de Unidad Técnica Municipal
 Ing. Edin Pineda Morales



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Las Alejandras.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	24 de julio de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:	
Suficiente:	
Aprobado:	Cumple con todas las especificaciones
No suficiente:	
Rechazado:	

CALIDAD DE OBRA:	Bueno	☒
	Regular	☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se realizan actividades de limpieza general y conformación de cunetas de acuerdo a la disponibilidad y condiciones que presenta el terreno.
- Escarificación del terreno existente en caso de ser necesario.
- Conformación y afinamiento de material de sitio con la incorporación de material balate nuevo en caso de ser necesario en capas de 5 o 10 cms.
- Se realiza el mantenimiento de 4.55 KM.
- La Municipalidad solamente toma la administración del control de maquina motoniveladora

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 4.55 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

CONTROL DE MAQUINARIA PATROL 670G JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
34.9	La Alejandria	11/7/2023	670G JHONN DEER	11581.7	11590.6	8.9	12,300.00	120,470.00
		12/7/2023	670G JHONN DEER	11590.6	11597.7	7.1	12,300.00	116,130.00
		13/7/2023	670G JHONN DEER	11597.7	11599.9	2.2	12,300.00	15,060.00
		14/7/2023	670G JHONN DEER		NO SE TRABAJO		12,300.00	10.00
		15/7/2023	670G JHONN DEER		NO SE TRABAJO		12,300.00	10.00
		16/7/2023	670G JHONN DEER		NO SE TRABAJO		12,300.00	10.00
		17/7/2023	670G JHONN DEER		NO SE TRABAJO		12,300.00	10.00
		18/7/2023	670G JHONN DEER	11599.9	11606.3	6.4	12,300.00	114,720.00
		19/7/2023	670G JHONN DEER	11606.3	11613.8	7.5	12,300.00	117,250.00
		20/7/2023	670G JHONN DEER	11613.8	11616.6	2.8	12,300.00	16,440.00
GRAN TOTAL								180,270.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:











Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: El Peñón, El Cedral y El Cerrón.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	2 de agosto de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:	
Suficiente:	
Aprobado:	Cumple con todas las especificaciones
No suficiente:	
Rechazado:	

CALIDAD DE OBRA:

Bueno ☒

Regular ☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se realizan actividades de limpieza general y conformación de cunetas de acuerdo a la disponibilidad y condiciones que presenta el terreno.
- Escarificación del terreno existente en caso de ser necesario.
- Conformación y afinamiento de material de sitio con la incorporación de material balate nuevo en caso de ser necesario en capas de 5 o 10 cms.
- Se realiza el mantenimiento de 9.28 KM.
- La Municipalidad solamente toma la administración del control de maquina motoniveladora

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 9.28 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: El Peñón a El Cedral (Antigua Calle).

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	9 de agosto de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:
Suficiente:
Aprobado: Cumple con todas las especificaciones
No suficiente:
Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:	Bueno	☒
	Regular	☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se realizan actividades de limpieza general y conformación de cunetas de acuerdo a la disponibilidad y condiciones que presenta el terreno.
- Escarificación del terreno existente en caso de ser necesario.
- Conformación y afinamiento de material de sitio con la incorporación de material balate nuevo en caso de ser necesario en capas de 5 o 10 cms.
- Se realiza el mantenimiento de 2.5 KM.
- La Municipalidad solamente toma la administración del control de maquina motoniveladora

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 2.5 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

CONTROL DE MAQUINARIA PAIROL 6700G JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACION	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
28.3	El Peñon El Central (Antigua Culla)	25/7/2023	6700G JHONN DEER	11644.1	11652.9	8.8	12,400.00	120,240.00
		26/7/2023	6700G JHONN DEER	11652.9	11656.1	3.2	12,400.00	17,360.00
		27/7/2023	6700G JHONN DEER	11656.1	11664.7	8.6	12,400.00	119,780.00
		28/7/2023	6700G JHONN DEER	11664.7	11672.4	7.7	12,400.00	117,210.00
		29/7/2023	6700G JHONN DEER			NO SE TRABAJO	12,400.00	10.00
		30/7/2023	6700G JHONN DEER			NO SE TRABAJO	12,400.00	10.00
		31/7/2023	6700G JHONN DEER			NO SE TRABAJO	12,400.00	10.00
		1/8/2023	6700G JHONN DEER			NO SE TRABAJO	12,400.00	10.00
		2/8/2023	6700G JHONN DEER			NO SE TRABAJO	12,400.00	10.00
		GRAN TOTAL						

REGISTRO FOTOGRAFICO:





Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Palmichal Fatima.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	10 de agosto de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:
Suficiente:
Aprobado: Cumple con todas las especificaciones
No suficiente:
Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:

Bueno ☒

Regular ☐

- DESARROLLO DE LA OBRA:**
- Se realizan actividades de limpieza general y conformación de cunetas de acuerdo a la disponibilidad y condiciones que presenta el terreno.
 - Escarificación del terreno existente en caso de ser necesario.
 - Conformación y afinamiento de material de sitio con la incorporación de material balate nuevo en caso de ser necesario en capas de 5 o 10 cms.
 - Se realiza el mantenimiento de 2.16 KM.
 - La Municipalidad solamente toma la administración del control de maquina motoniveladora

- CONCLUSIONES:**
- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
 - Se logra terminar los 2.16 km.
 - Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
 - Se cumple en contrato en tiempo y forma.

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Sabanas de Ocote.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	16 de agosto de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales: Suficiente: Aprobado: Cumple con todas las especificaciones No suficiente: Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:	Bueno	☒
	Regular	☐

DESARROLLO DE LA OBRA:


- Se realizan actividades de limpieza general y conformación de cunetas de acuerdo a la disponibilidad y condiciones que presenta el terreno.
- Escarificación del terreno existente en caso de ser necesario.
- Conformación y afinamiento de material de sitio con la incorporación de material balate nuevo en caso de ser necesario en capas de 5 o 10 cms.
- Se realiza el mantenimiento de 1.75 KM.
- La Municipalidad solamente toma la administración del control de maquina motoniveladora
- Se considera la limpieza de terreno que será destinado para área deportiva (cancha de futbol) en la comunidad.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 1.75 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

CONTROL DE MAQUINARIA PATROL 670G JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
21.9	Sabanas de Ocote	9/8/2023	670G JHONN DEER	11693.9	11702.5	8.6	L2,300.00	L19,780.00
		10/8/2023	670G JHONN DEER	11702.5	11711.8	9.3	L2,300.00	L21,390.00
		11/8/2023	670G JHONN DEER	11711.8	11715.8	4	L2,300.00	L9,200.00
GRAN TOTAL								L50,370.00



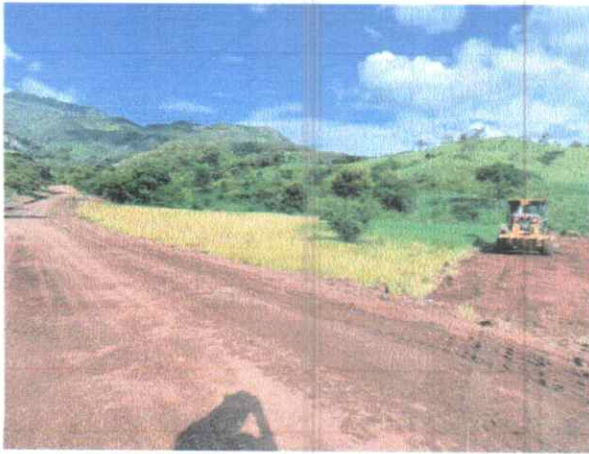



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Buenos Aires.

Responsables:

Ejecutor: Patronato de Buenos Aires

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	20 de agosto de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	10
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno ☒

Regular ☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la conformación y corte de terreno de forma manual, para posteriormente realizar todo el trazado y marcado de los detalles expuestos en planos.
- La construcción de huellas vehiculares, se define con dimensiones de 0.70 cm de ancho y 0.10 cm de espesor, con un mortero de 1:4 con piedra para el enchapado.
- Toda la comunidad de buenos aires esta involucrada en la mano de obra no calificada, para actividades de acarreo de material, preparación de terreno, trazado y marcado, corte y conformación, preparación de concreto, vaciados de concreto y afinado y codaleado de concreto.
- Según lo especificado se realiza un tramo de 600 metros lineales en toda su calzada.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
 - Se cumple en contrato en tiempo y forma.
-

REGISTRO FOTOGRAFICO:











Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: San Antonio de Yures.

Responsables:

Ejecutor: Patronato de San Antonio de Yures

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	20 de agosto de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	8
				Peón	

Materiales: Suficiente: Aprobado: Cumple con todas las especificaciones No suficiente: Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:

Bueno	☒
Regular	☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la conformación y corte de terreno de forma manual, para posteriormente realizar todo el trazado y marcado de los detalles expuestos en planos.
- La construcción de huellas vehiculares, se define con dimensiones de 0.70 cm de ancho y 0.10 cm de espesor, con un mortero de 1:4 con piedra para el enchapado.
- Toda la comunidad de buenos aires esta involucrada en la mano de obra no calificada, para actividades de acarreo de material, preparación de terreno, trazado y marcado, corte y conformación, preparación de concreto, vaciados de concreto y afinado y codaleado de concreto.
- Según lo especificado se realiza un tramo de 600 metros lineales en toda su calzada.
- El plan de trabajo, es primero realizar la primera parte en uno de los carriles tanto en el primer tramo como segundo, cabe mencionar que se hace de esta forma para no cortar el paso vehicular ya que las comunidades solamente cuenta con este acceso

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se cumple en tiempo y forma

REGISTRO FOTOGRAFICO:









Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: El Cerron.

Responsables:

Ejecutor: Anuar Joel Ramírez Jimenez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	22 de agosto de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	7
				Peón	

Materiales: Suficiente: Aprobado: Cumple con todas las especificaciones No suficiente: Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:

Bueno ☒

Regular ☐

DESARROLLO DE LA OBRA:


- Se comienza actividades con la desinstalación de alcantarilla existente y posteriormente procede a la excavación estructural
- Se realiza toda la recolección de piedra y limpieza general de terreno con la ayuda de patronatos de la comunidad de El Cerrón
- Se comienza actividades con el trazado y ubicación de caja puente.
- Se realiza todo el vaciado de concreto en la parte posterior de la caja puente con un armado de varilla de ½” 20 cms en ambos sentidos, de la misma forma toda la estructura se encuentra con bastones de ½”
- Se realiza un paso provisional para vehículos esta obra adicional es directamente del patronato
- Se realiza el dragado de agua con medios proporcionado por una bomba hidráulica
- Todas las especificaciones, detalladas según lo requerido en el perfil de proyecto presentado.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.
- Las condiciones de clima ha retraso las actividades programas de forma diaria.

REGISTRO FOTOGRAFICO:



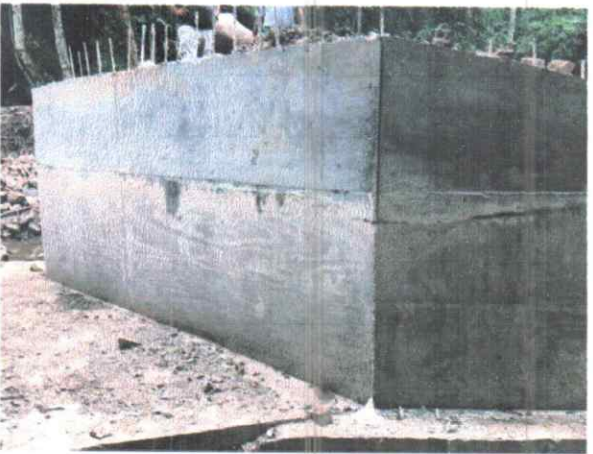







Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Rastro Municipal.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	25 de agosto de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	I
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	


Materiales: Suficiente: Aprobado: Cumple con todas las especificaciones No suficiente: Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:

Bueno	☒
Regular	☐

- DESARROLLO DE LA OBRA:**
- Se toma la iniciativa de realizar un plantel con la intención de proyectar oficinas del rastro municipal a futuro
 - Se realiza toda la limpieza general del terreno
 - Posteriormente se desplaza todo el material existente conformado un terreno adecuado y a nivel para futuras construcciones

- CONCLUSIONES:**
- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
 - Se cumple en contrato en tiempo y forma.

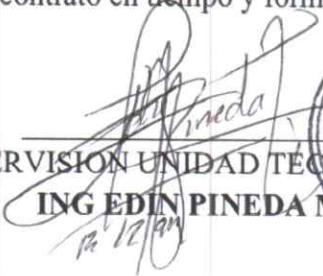
SUPERVISION UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES



CONTROL DE MAQUINARIA TRACTOR 850J IIG. JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR		UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA
11.9		Sibunas de Ocoite	18/8/2023	Tractor Jhonn Deer	4090.7	4102.6	11.9	12,800.00
GRAN TOTAL								
								133,320.00
								133,320.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION DE COMPLEJO ODONTOLOGICO.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Centro de Salud.

Responsables:

Ejecutor: Henry Javier Baide Guzmán

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	25 de agosto de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	2
				Peón	

REGISTRO FOTOGRAFICO:







Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **RESTAURACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y MEJORAS EN MERCADO MUNICIPAL.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Mercado Municipal, Barrio El Centro.

Responsables:

Ejecutor: Municipalidad de Taulabe

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	28 de agosto de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	8
				Peón	

Materiales:
Suficiente:
Aprobado: Cumple con todas las especificaciones
No suficiente:
Rechazado:


CALIDAD DE OBRA:	Bueno	☒
	Regular	☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se realizan actividades de desmontaje de estructura de techo.
- En una de las parte se monta una estructura e techo completa a una sola agua.
- Se realiza actividades de pulido en paredes
- Se realiza actividades de firme de piso.



CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se cumple en tiempo y forma.



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES



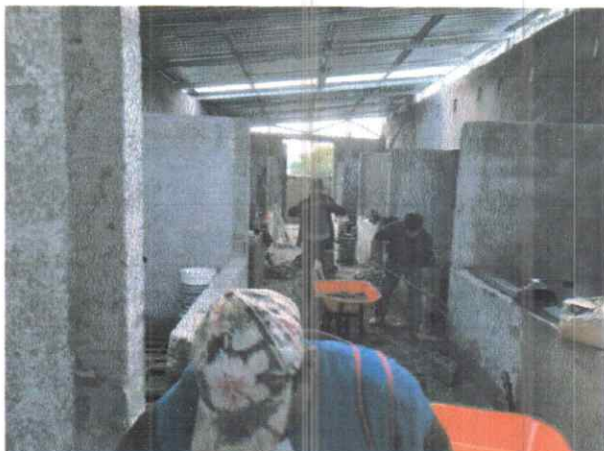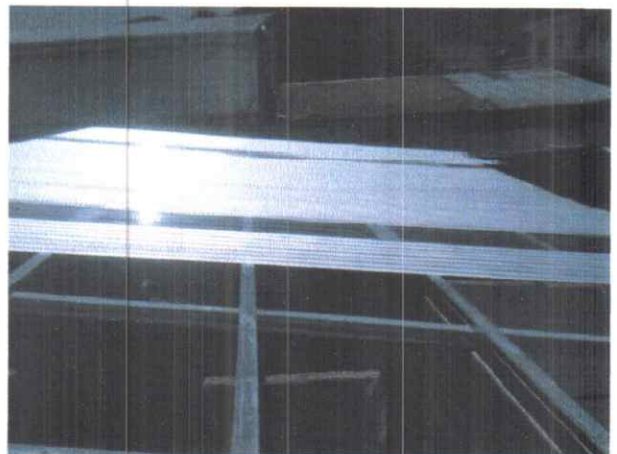



República de Honduras
Alcaldía Municipal de Tautabé
Tautabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAMPO MES DE AGOSTO 2023

INFORME UTM

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO 2023

Sirva el presente para dar a conocer las diferentes actividades que formaron parte de las intervenciones de la Unidad Tecina Municipal (UTM).
Durante el mes de Agosto, detallado de la siguiente manera:

A) Visitas Técnicas Y Supervisión.

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	LUGAR DE VISITA	DETALLE	RECORRIDO
1/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Baculia-Varsovia	Limpieza de escombros ocasionado por derrumbe	N/A
		Piedras de Afilar	Visita técnica para construcción de Huellas Vehiculares	N/A
		El Cerrón	Supervisión de proyecto, construcción de caja puente	N/A
		Buenos Aires	Supervisión de proyecto, Huellas Vehiculares	N/A
2/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Piedras de Afilar	Supervisión de proyecto, corte de talud	N/A
		El Cerrón	Supervisión de proyecto, construcción de caja puente	N/A

3/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Quebradas de Yurés		Inspección para construcción de caja puente	N/A
		San Antonio de Yurés		Inspección para proyecto de huellas vehiculares	N/A
		Piedras de Afilar		Supervisión de proyecto, perfilación de talud	N/A
4/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Piedras de Afilar		Supervisión de proyecto, perfilación de talud	N/A
		El Cerrón		Supervisión de proyecto, construcción de caja puente	N/A
		Municipalidad de Taulabe		Apertura de ofertas, Licitación Privada AMT 003-2023	N/A
5/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Las Flores Jardines		Entrega de pizarras	N/A
		Barrio Prado Alto			
		Mercado Municipal			
6/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM), Alcalde Denis Omar Membredo	Barrio Santa Barbara		Supervisión de proyecto, restauración de techo	N/A
		Cantillanos		Supervisión de mantenimiento de sistema de alcantarillado	N/A
		Sabanas de Ocote		Inspección de proyecto construcción de huellas vehiculares	N/A
8/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	El Cerrón		Supervisión de proyecto, mantenimiento de calles	N/A
		Buenos Aires		Supervisión de proyecto, construcción de caja puente	N/A
		El Chaparral		Supervisión de proyecto, construcción de huellas vehiculares	N/A
9/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Municipalidad de Taulabe		Visita técnica para cálculo de materiales, salón comunal	N/A
		Reunión jefes de Departamentos			N/A
		El Playón		Visita técnica para cálculo de materiales boca toma de agua	N/A
10/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Mercado Municipal		Supervisión de proyecto, restauración de techo	N/A
11/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	San Antonio de Yurés		Entrega de materiales para construcción de Huellas Vehiculares	N/A
14/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	El Cerrón		Supervisión de proyecto, construcción de caja puente	N/A
		Buenos Aires		Supervisión de proyecto, construcción de huellas vehiculares	N/A
		El Cedral		Supervisión de proyecto, instalación de alcantarilla de 36 "	N/A
15/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Municipalidad de Taulabe		Reunión con gobernación, Justicia y Descentralización, Unidad De Transparencia	N/A
16/8/2023	Ing Edin Pineda Morales	Parque Central José Trinidad Cabañas		Visita Técnica construcción de segunda etapa de parque central	N/A
21/8/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Barrio El Carmen		Supervisión de proyecto, construcción de pavimento de concreto hidráulico	N/A
		Barrio Vista Hermosa		Supervisión de proyecto, mantenimiento de calles	N/A

JEFE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

Ing. Edin Pineda



REGISTRO FOTOGRAFICO.

