



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES F.M. CUDRO DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO 2023

ITN	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO AL MES DE ENERO	MONTO EJECUTADO AL MES DE FEBRERO	MONTO EJECUTADO AL MES DE MARZO	MONTO EJECUTADO AL MES DE ABRIL	MONTO EJECUTADO AL MES DE MAYO	MONTO EJECUTADO AL MES DE JUNIO	MONTO EJECUTADO AL MES DE JULIO	MONTO EJECUTADO AL MES DE AGOSTO	% DE EJECUCIO:
1	CONSTRUCCION DE ACERAS DEL KINDER HECTOR V. MEDINA, VALLE DE ANGELES F.M.	L40,202.64	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	100.00
2	REPARACION DE 18 METROS DE CIELO FALSO EXTERNO EN INSTITUTO HECTOR V.MEDINA	L0.00	L6,840.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	100.00
3	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA LOS ANGELES BARRIO EL CANTON .	L0.00	L0.00	L133,170.00	L30,360.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	100.00

4	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA EN EL KINDER JOHAN MICHEL DE LA ALDEA CERROGRANDE	L0.00	L0.00	L80,696.38	L64,336.60	L27,760.00	L0.00	L0.00	L0.00	100.0
5	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE LA POZONA UBICADA EN LA ESPERANZA, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.	L0.00	L0.00	L0.00	L71,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	100.0
6	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE CUATRO VIVIENDAS DE 4X8 DE CADA UNA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES	L0.00	L0.00	L0.00	L111,992.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	100.0
7	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DEL BOTADERO MUNICIPAL, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.	L0.00	L0.00	L107,800.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	100.0


8	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE LA POZONA UBICADA EN LA ESPERANZA. VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.	L0.00	L0.00	L0.00	L71,500.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	100.00
9	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO DE CALLE EN LA ESPERANZA VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN	L0.00	L0.00	L0.00	L66,000.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	100.00
10	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA Y DONACION DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL TRAMO PARTE BAJA DE CALLE EN LA ESPERANZA VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN	L0.00	L0.00	L0.00	L33,000.00	L0.00	L0.00			100.00

11	CONSTRUCCION DE TREINTA TECHOS EN DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L165,000.00	L0.00	L0.00	100.0
12	CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS SOCIALES, UNA EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO Y UNA EN BARRIO LA SIMBRA, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN.	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L30,562.00			47.8
13	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA LA ESPERANZA	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L89,101.29	L0.00	L31,598.71		100.0

14	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL SECTOR DE MACUELIZO, VALLE DE ANGELES. FRANCISCO MORAZAN	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L1,699,861.96			87.6
15	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA REPARACION DE TECHO KINDER HECTOR V. MEDINA. BARRIO EL CENTRO, VALLE DE ANGELES. FRANCISCO MORAZAN.	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L8,800.00	L0.00			100.00
16	ACARREO DE MATERIALES DE LA POZONA UBICADA EN LA ESPERANZA VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L48,800.00	L0.00			100.00
17	MANO DE OBRA REPARACION DE GRADERIA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA CERRO GRANDE VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L5,800.00	L0.00			100.00

18	TRABAJO REALIZADO EN EL BOTADERO MUNICIPAL CON MATERIAL SELECTO. (MANO DE OBRA).	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L39,000.00	100.00
19	TRABAJO REALIZADO EN EL BOTADERO MUNICIPAL CON MATERIAL SELECTO. (MAQUINARIA).	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L107,000.00	100.00
20	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR DE LAS MARTITAS.								L484,911.15	L1,509,554.64	100.00
21	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR DE MACUELIZO	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L1,447,150.31	L133,082.21		L412,948.10	100.00
22	MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L32,600.00	100.00

Sr. Marvin Aguilar
Regidor de Infraestructura



Ing. Rony Romero
Unidad Técnica Municipal



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre del Proyecto: MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA LA ESPERANZA

Ubicación: Barrio la esperanza, Valle de Ángeles F.M

Ejecutado por: MERLIN JOEL ILIAS PONCE

Identidad: 0826-1987-00126

Monto: 120,701.29 Lempiras

Punto de acta: No. 15 del Acta No. 32

Por medio de la presente acta se hace constar que la obra arriba descrita fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir del 03 de agosto del 2023, el Contratante recibe el proyecto “**MANO DE OBRA DE CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA LA ESPERANZA**”

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto a los 3 días del mes de agosto del 2023, Valle de Ángeles F.M.

Lugar y fecha

Lic. Wilfredo Ponce
Alcalde Municipal
CONTRATANTE

Sr. Marvin Aguilar
Regidor de Infraestructura

Sr. Merlin Joel Ilias Ponce
CONTRATISTA


Ing. Rony Wilfredo Romero
Unidad Técnica Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES

Nombre del Proyecto: MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA LA ESPERANZA

Ubicación: Barrio la esperanza, Valle de Ángeles F.M

Ejecutado por: MERLIN JOEL ILIAS PONCE

Identidad: 0826-1987-00126

Monto: 120,701.29 Lempiras

Punto de acta: No. 15 del Acta No. 32

En esta fecha 7/7/2023 se rinde el informe de avance en el proyecto **MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA LA ESPERANZA**

En este informe del proyecto se realizaron las obras de.

1.04	REPELLO Y PULIDO	M2	L. 120.00	80.00	L9,600.00
1.06	INSTALACION ELECTRICA	GLO	L. 9,000.00	0.50	L4,500.00
1.08	FUNDICION DE GRADAS	GLO	L. 14,000.00	1.00	L14,000.00
1.09	ACARREO DE MATERIAL	GLO	L. 10,000.00	0.20	L2,000.00
1.11	INSTALACION DE PUERTAS	UND	L. 1,498.71	1.00	L1,498.71
total					L. 31,598.71

Por lo tanto, **MERLIN JOEL ILIAS PONCE** quien prestó sus servicios para la realización del proyecto, y con número de identidad 0826-1987-2031, aplica para que se le haga el desembolso por sus servicios prestados cumpliendo con el 100.00 % del trabajo.

En fe de lo anterior se firma esta acta.



Valle de Ángeles F.M. a los 7 días de Julio del 2023




LUGAR Y FECHA

SR. Marvin Aguilar
(Regidor de infraestructura)

ING. Rony Romero
(Unidad Técnica Municipal)

Fotografias:

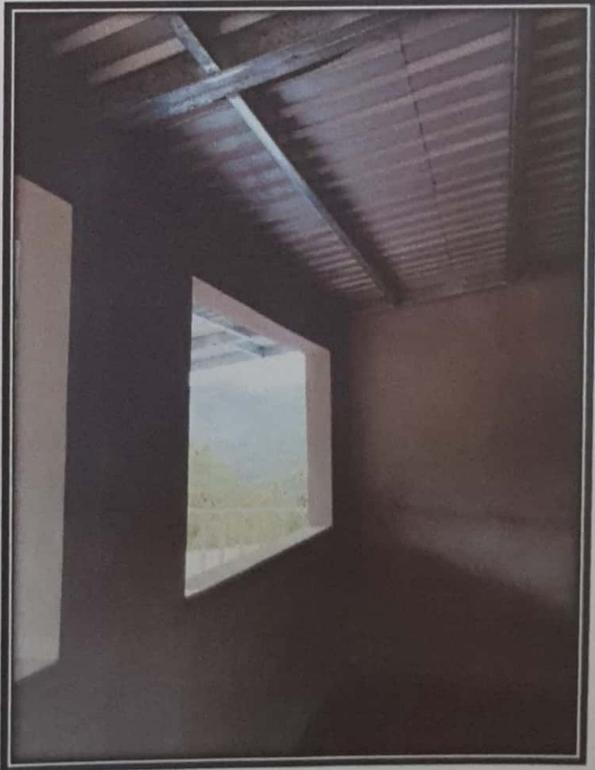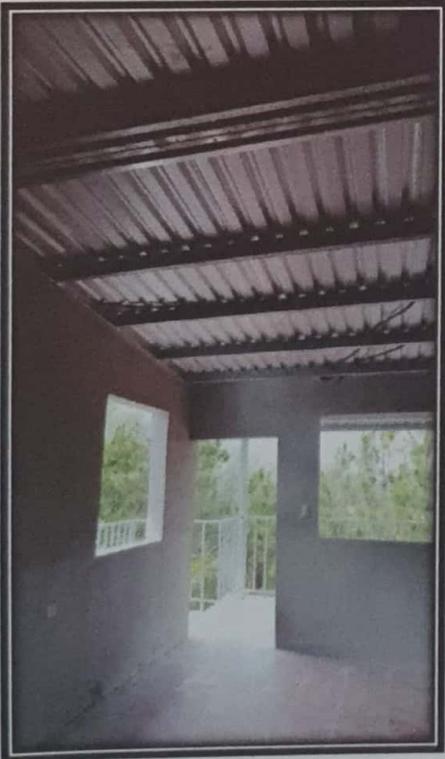

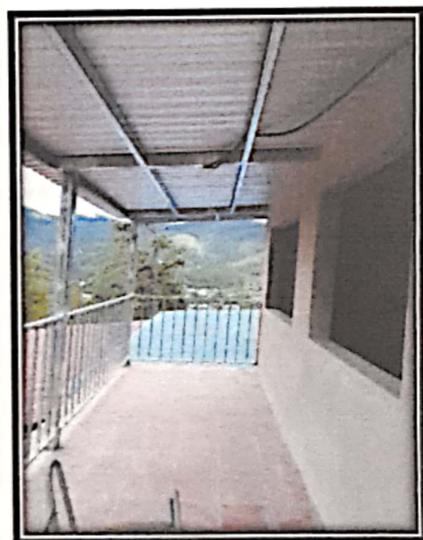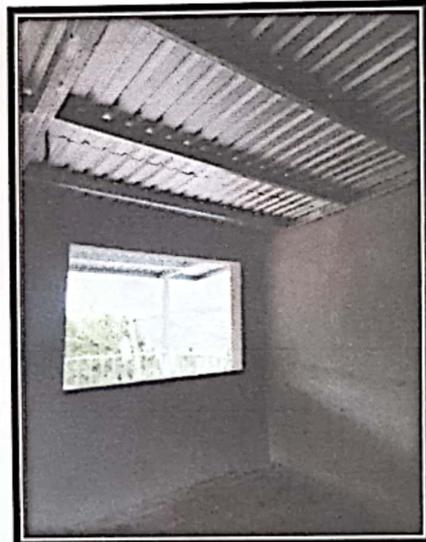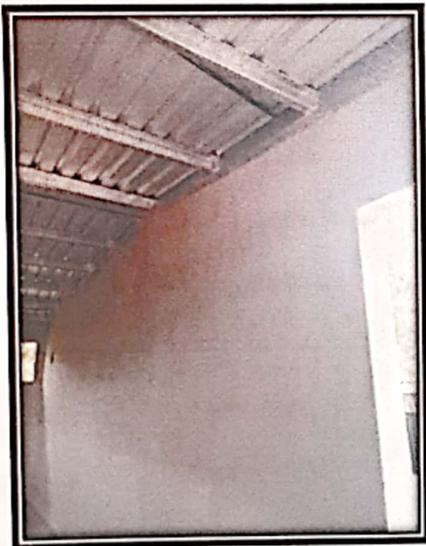



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax:2766-2295

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL SECTOR DE MACUELIZO, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN".

Ubicación: CALLE QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE MACUELIZO,

Ejecutado por: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. "INFRA"

RTN: 0801-9014-633598

MONTO CONTRATADO: 1,993,180.62 Lempiras

Punto de acta: No. 3 del Acta No.36

Fecha de aprobación: 29 de abril del 2023.

Por medio de la presente acta se hace constar que la obra arriba descrita fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir del 29 de abril del 2023, el Contratante recibe el proyecto "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE MACUELIZO, MUNICIPIO DE VALLE DE ANGELES DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN".

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto a los 28 días del mes de julio del 2023, Valle de Ángeles F.M.

Valle de Ángeles Municipio de Francisco Morazán, a los 16 días de agosto del 2023

Lugar y fecha

Lic. Wilfredo Ponce
Alcalde Municipal
CONTRATANTE

Sr. Marvin Aguilar
Regidor de Infraestructura

Sr. Hugo Kowasky Suazo
CONTRATISTA

Ing. Rony Romero
Unidad Técnica Municipal





ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DE ÁNGELES

Nombre del Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR DE MACUELIZO, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN.

Ubicación: CALLE QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE MACUELIZO,

Ejecutado por: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. "INFRA"

RTN: 0801-9014-633598

MONTO CONTRATADO: 1,993,180.62 Lempiras

MONTO AVANCE # 1: 505,364.05 Lempiras

MONTO AVANCE # 2: 606,351.62 Lempiras

MONTO AVANCE # 3: 335,434.64 Lempiras

MONTO AVANCE # 4: 133,082.21 Lempiras

Punto de acta: No. 3 del Acta No.36

En esta fecha 10/07/2023 se rinde el informe de avance en el proyecto **PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR DE MACUELIZO, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN.** En este informe del proyecto se realizaron las obras de.

No.	CONCEPTO DE OBRA	UNID.	CANT.	TOTAL L.
3	Bordillo de concreto de 15X15Cm	MI	160.00	L65,112.00
4	Concreto Hidráulico Fc=4,000 PSI e=15 cms incluye corte y curado	M3	12.00	L63,598.92
5	Acero de refuerzo grado inter Fy=2800Kg/Cm2	kg	21.92	L4,371.29
Total estimación				L. 133,082.21

Por lo tanto, la empresa INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. "INFRA" quien prestó sus servicios para la realización del proyecto, y con número de RTN 0801-9014-633598, aplica para que se le haga el desembolso por sus servicios prestados cumpliendo con el 94.28 % del trabajo.

En fe de lo anterior se firma esta acta.

Valle de Ángeles F.M. a los 10 días de julio del 2023




LUGAR Y FECHA

SR. Marvin Aguilar
(Regidor de infraestructura)


ING. Rony Romero
(Unidad Técnica Municipal)



Fotografías

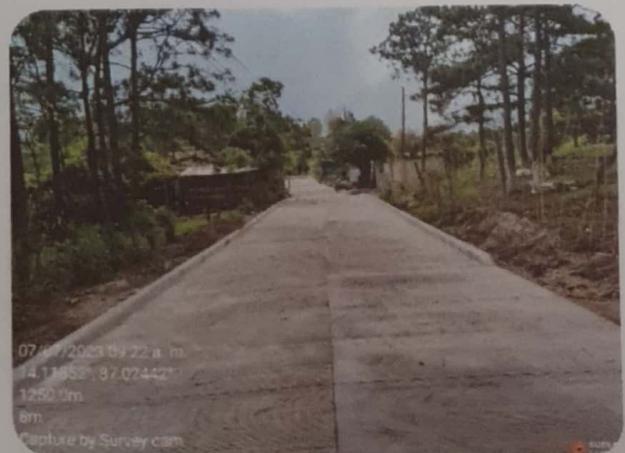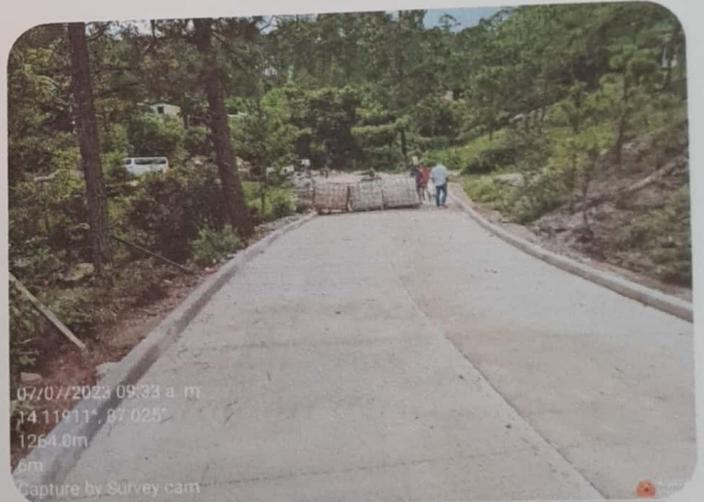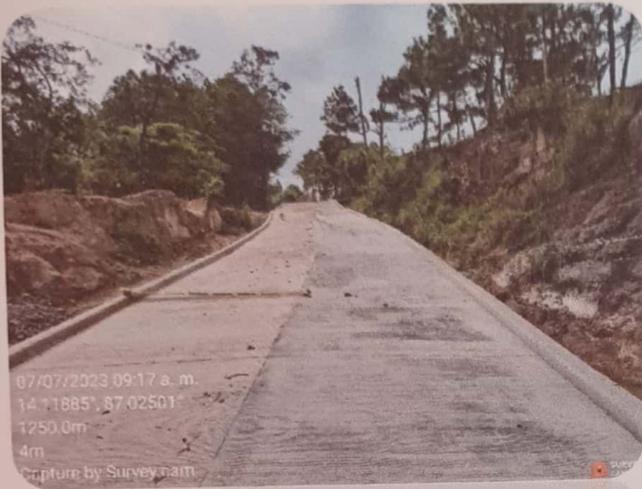



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax:2766-2295

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre del Proyecto: “MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN”.

Ubicación: Centro de Salud Valle de Ángeles.

Ejecutado por: Fredy Alexander Cruz Soto

ID: 0820-1995-00017

MONTO CONTRATADO: 32,600.00 Lempiras

Punto de acta: No. 10, del acta No. 42.

Fecha de aprobación: 13 de julio del 2023.

Por medio de la presente acta se hace constar que la obra arriba descrita fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir del 13 de julio del 2023, el Contratista recibe el proyecto “MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN”.

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto a los 16 días del mes de agosto del 2023, Valle de Ángeles F.M.

Valle de Ángeles Municipio de Francisco Morazán, a los 16 días de agosto del 2023

Lugar y fecha

Lic. Wilfredo Ponce
Alcalde Municipal
CONTRATANTE

Sr. Marvin Aguilar
Regidor de Infraestructura

Sr. Fredy Alexander Cruz Soto
CONTRATISTA

Ing. Rony Romero
Unidad Técnica Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax:2766-2295

INFORME CENTRO DE SALUD

Nombre del Proyecto: “MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN”.

Ubicación: Centro de Salud Valle de Ángeles.

Ejecutado por: Fredy Alexander Cruz Soto

ID: 0820-1995-00017

MONTO CONTRATADO: 32,600.00 Lempiras

MONTO EJECUTADO: 32,600.00 Lempiras

Punto de acta: No. 10, del acta No. 42 de fecha 13 de julio del 2023.

En esta fecha 16/08/2023 se rinde el informe final en el proyecto “**MANO DE OBRA CALIFICADA PARA CONSTRUCCION DE LA SALA DE ESPERA DEL CENTRO DE SALUD, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN.**” En este informe del proyecto se realizaron las obras de:

No.	CONCEPTO DE OBRA	UNID.	CANT.	TOTAL L.
1	Demolición	Global	1	5,000.00 L
2	Techado de sala de espera	M2	80	13,600.00 L
3	Excavación	M2	80	3,200.00 L
4	Fundición	M2	80	8,000.00 L
5	Botado de desperdicios	Global	1	2,800.00
TOTAL				32,600.00



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax:2766-2295

Por lo tanto, la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, a través de la Unidad Técnica Municipal hace constar que el trabajo de remodelación en el Centro de Salud de la zona antes mencionada se llevó acabo tal y como se estipulo en el contrato, siendo ejecutado el 100% del presupuesto aprobado para esta obra, se da por finalizado este proyecto.


En fe de lo anterior se firma este informe.

Valle de Ángeles F.M. a los 16 días de agosto del 2023

LUGAR Y FECHA

SR. Marvin Aguilar

**(Regidor de infraestructura)
Municipal)**


ING. Rony Romero

(Unidad Técnica)



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295

Fotografías





ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax:2766-2295

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

Nombre del Proyecto: “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR DE LAS MARTITAS, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN”.

Ubicación: CALLE QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS MARTITAS.

Ejecutado por: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. “INFRA”

RTN: 0801-9014-633598

MONTO CONTRATADO: 1,994,465.79 Lempiras.

Punto de acta: No. 2 del Acta No.39

Fecha de aprobación: 23 de junio del 2023.

Por medio de la presente acta se hace constar que la obra arriba descrita fue realizada por el ejecutor, cumpliendo con lo estipulado en el contrato y demás documentos contractuales.

A partir del 23 de junio del 2023, el Contratante recibe el proyecto “PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR DE LAS MARTITAS, VALLE DE ANGELES, FRANCISCO MORAZAN”.

En fe de lo anterior se firma esta acta, dando por concluido y recibido el proyecto a los 15 días del mes de agosto del 2023, Valle de Ángeles F.M.

Valle de Ángeles Municipio de Francisco Morazán, a los 17 días de agosto del 2023

Lugar y fecha

Lic. Wilfredo Ponce
Alcalde Municipal
CONTRATANTE

Sr. Marvin Aguilar
Regidor de Infraestructura

Sr. Hugo Kowasky Suazo
CONTRATISTA


Ing. Rony Romero
Unidad Técnica Municipal





ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax:2766-2295

INFORME LAS MARTITAS

Nombre del Proyecto: "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR DE LAS MARTITAS, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN."

Ubicación: Calle Que Conduce Hacia El Sector De Las Martitas.

Ejecutado por: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. "INFRA"

RTN: 0801-9014-633598

MONTO CONTRATADO: 1,994,465.79 Lempiras.

MONTO EJECUTADO: 1,994,465.79 Lempiras.

Punto de acta: No. 2 del Acta No.39

En esta fecha 16/08/2023 se rinde el informe final en el proyecto "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL SECTOR DE LAS MARTITAS, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN." En este informe del proyecto se realizaron las obras de:

No.	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	CANTIDAD	Total
1	Concreto Hidráulico F'c= 4,000 PSI e=15 cms (Incluye corte y curado)	M3	5299.91	6.33	L33,548.43
2	Acero de Refuerzo, Grado Inter Fy=2800 Kg/Cm2	KG	L199.42	22	L4,387.24
3	Junta de asfalto	ML	69.42	1393.2	L96,715.94
4	Limpieza general	M2	17.99	1548	L27,848.52
Total					L162,500.12



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax:2766-2295

Por lo tanto, la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, a través de la Unidad Técnica Municipal hace constar que el trabajo de pavimentación con concreto hidráulico en el sector de las Martitas antes mencionado se llevó acabo tal y como se estipulo en contrato, siendo ejecutado el 100% del presupuesto aprobado para esta obra, se da por finalizado este proyecto.

En fe de lo anterior se firma este informe.

Valle de Ángeles F.M. a los 16 días de agosto del 2023

LUGAR Y FECHA

SR. Marvin Aguilar

**(Regidor de infraestructura)
Municipal)**




ING. Rony Romero

(Unidad Técnica)



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax:2766-2295

Fotografías





ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295





ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295






ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.

Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Ciudad Turística

Telefax: 2766-2295

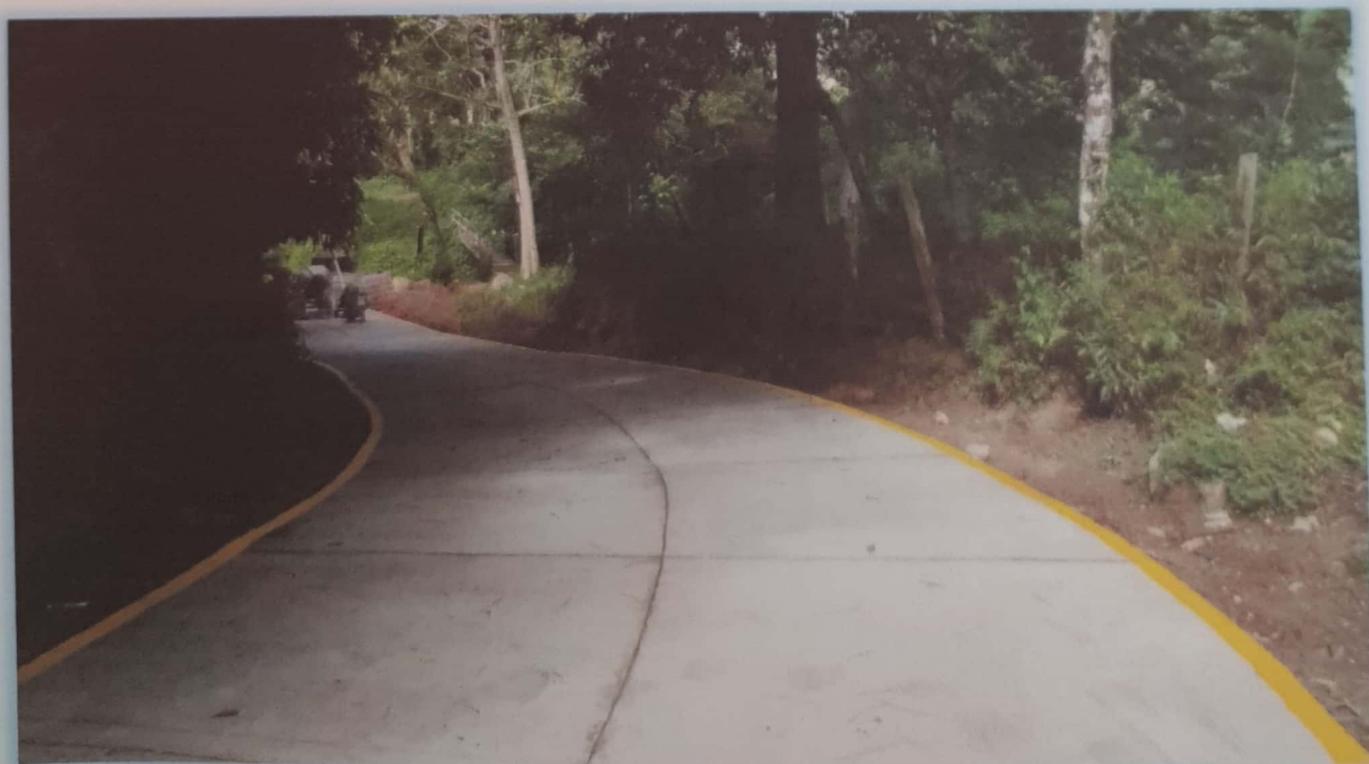



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax: 2766-2295





ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax:2766-2295

INFORME BOTADERO MUNICIPAL

Nombre del Proyecto: "Trabajo realizado en el Botadero Municipal con Material Selecto".

Ubicación: Botadero Municipal, Valle de Ángeles, FM.

Ejecutado por: Carlos Gabier Morazán Salgado

ID: 0826-1972-00002

MONTO CONTRATADO: 39,000.00 Lempiras

MONTO EJECUTADO: 39,000.00 Lempiras

Punto de acta: No. 9, del acta No. 42 de fecha 13 de julio del 2023.

En esta fecha 16/08/2023 se rinde el informe final en el proyecto "TRABAJO REALIZADO EN EL BOTADERO MUNICIPAL, CON MATERIAL SELECTO, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN." En este informe del proyecto se realizó la obra de:

No.	CONCEPTO DE OBRA	Precio Unidad	CANT.	TOTAL L.
1	Acarreo de material selecto	1,500.00 L	26	39,000.00 L
	TOTAL			39,000.00

Por lo tanto, la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, a través de la Unidad Técnica Municipal hace constar que el trabajo de acarreo de material selecto al botadero municipal se llevó acabo tal y como se estipulo en contrato, siendo ejecutado el 100% del presupuesto aprobado para esta obra, se da por finalizado este proyecto.

En fe de lo anterior se firma este informe.

Valle de Ángeles F.M. a los 16 días de agosto del 2023

LUGAR Y FECHA

SR. Marvin Aguilar

**(Regidor de infraestructura)
Municipal)**


ING. Rony Romero

(Unidad Técnica)



ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLE DE ANGELES, F.M.
Departamento de Francisco Morazán, Honduras, C.A.
Ciudad Turística
Telefax:2766-2295

INFORME BOTADERO MUNICIPAL CON MAQUINARIA PESADA RETRO

Nombre del Proyecto: “Trabajo realizado en el Botadero Municipal con Material Selecto”.

Ubicación: Botadero Municipal, Valle de Ángeles, FM.

Ejecutado por: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. “INFRA”

RTN: 0801-9014-633598

MONTO CONTRATADO: 107,800.00 Lempiras

MONTO EJECUTADO: 107,800.00 Lempiras

Punto de acta: No. 9, del acta No. 42 de fecha 13 de julio del 2023.

En esta fecha 16/08/2023 se rinde el informe final en el proyecto “**TRABAJO REALIZADO EN EL BOTADERO MUNICIPAL, CON MATERIAL SELECTO, VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN.**” En este informe del proyecto se realizó la obra de:

No.	CONCEPTO DE OBRA	Precio Unidad	CANT.	TOTAL L.
1	Hora Maquina Retro	1,100.00 L	98 horas	107,800.00 L
	TOTAL			107,800.00 L

Por lo tanto, la Alcaldía Municipal de Valle de Ángeles, a través de la Unidad Técnica Municipal hace constar que el trabajo con maquinaria retro al botadero municipal se llevó a cabo tal y como se estipuló en contrato, siendo ejecutado el 100% del presupuesto aprobado para esta obra, se da por finalizado este proyecto.

En fe de lo anterior se firma este informe.

Valle de Ángeles F.M. a los 16 días de agosto del 2023

LUGAR Y FECHA

SR. Marvin Aguilar

(Regidor de infraestructura)
Municipal)

ING. Rony Romero

(Unidad Técnica)
