



# ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA, CORTES

## PERFIL DE PROYECTOS

### ENERO-FEBRERO 2024

#### **PROYECTO DE CERCADO DE LA ESC. HECTOR VIRGILIO BARAHONA.**





### DATOS GENERALES DEL MUNICIPIO DE PIMIENTA

**Extensión Territorial:** 39.34 km<sup>2</sup>

**Población:** 26,084 personas

**Ubicación geográfica**

El Municipio de Pimienta se encuentra ubicado en el departamento de Cortés, al noreste del país. Se desarrolla principalmente a lo largo de la carretera CA-5 Norte que conecta a esa zona con el centro del país.

**Ubicación:** Geográficamente se localiza en las siguientes coordenadas:

desde	87°	58'	hasta	87°	58'	Longitud
		06"			40"	Oeste
desde	15°	16'	hasta	15°	17'	Latitud Norte
		49"			08"	

**Altura:** 60 msnm (promedio)

**Relieve:** La conformación de la superficie terrestre del municipio es plana ya que se encuentra, en su totalidad en un valle, con pendientes características que van de 0 a 5% de inclinación.

**Acceso:** El acceso al municipio se hace por la carretera CA-5 Norte, la cual cruza el municipio de norte a sur y conecta a las ciudades de Tegucigalpa con San Pedro Sula. Pimienta se ubica a escasos 26 km de San Pedro Sula.



**Colindancias:**

*Norte:* Municipios de San Manuel y Villanueva

*Sur:* Municipio de Potrerillos

*Este:* Municipio de El Progreso, Depto. de Yoro

*Oeste:* Municipio de Villanueva



**Historia del municipio**

El municipio de Pimienta se ubica en el Valle de Sula, en la parte sur del departamento de Cortés y es bañado por el caudaloso Río Ulúa. A sólo 3 km río abajo se localiza la unidad maya de Cerro Palenque, habitada hace más de 200 años y que, como parte del Patrimonio Cultural Tangible, es un sitio arqueológico actualmente reconocido como Monumento Arqueológico. Históricamente una considerable colonia de ciudadanos árabes, palestinos y centroamericanos instalaron sus negocios y empresas en Pimienta, dedicándose en su mayoría a la distribución de mercadería para el occidente de Honduras por a vía fluvial, lo mismo que como intermediarios en la explotación de varios productos provenientes del occidente. La zona de explotación del ferrocarril nacional representa una parte muy importante del desarrollo de Pimienta, con una sección de línea, patios de acopio y fuentes de empleo para muchos ferrocarrileros. En 1914, con la inauguración del puente ferroviario, queda





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



totalmente comunicada la zona de Potrerillos, ocupando Pimienta el lugar comercial de mayor crecimiento, pues las compañías bananeras instalaron allí la pagaduría de fruta de San Manuel, Villanueva y Potrerillos.

El 7 de junio de 1934, siendo alcalde municipal don Alfonso Pineda Torres, el río Ulúa en una enorme crecida arrasó con el poblado de Pimienta causando daños incalculables, por lo cual en 1936 la población es trasladada al nuevo sitio, conocido como Nueva Pimienta.



<b>Aldeas</b>	Aldea Santiago Aldea La Venta
	Total de Viviendas Urbano: 4,172                      Rural: 1,110
<b>Recursos Naturales</b>	Cerro el Palenque Río Ulúa
<b>Infraestructura Principal</b>	<p><u>RED VIAL</u> Carretera Interoceánica Carretera Secundaria</p> <p><u>CENTROS EDUCATIVOS</u> Pre-escolares: 9 Escuelas: 9 Centro Básico 1 Colegios: 4</p> <p><u>CENTROS DE ASISTENCIA MEDICA</u> Cesamo en Santiago Cesamo en Pimienta Filial Cruz Roja Hondureña Clínica de Odontología</p> <p><u>PARQUES RECREATIVOS</u> Parque Central en Santiago Parque Central en Pimienta Parquecito en Bo. Suyapa Parquecito de Col. Jordán</p> <p><u>CENTROS SOCIALES</u> Centro Cívico Municipal</p> <p><u>CENTROS DEPORTIVOS</u> Cancha Fútbol Col. Esquipulas con Graderías Estadio Municipal Santiagueño Rosendo Dubon</p>

ALDEA SANTIAGO	
1	Bo. Las Flores
2	Bo. Los Almendros
3	Bo. La Escuela
4	Bo. El Palenque
5	Bo. La Zona
6	Bo. La Bomba
7	Bo. Las Guaras
8	Bo. Abajo
9	Col. Velásquez Cabrera
10	Col. Marvin Umaña N 2
11	Sector La Bomba
12	Col. Izaguirre
13	Caserío Maranatha
PIMIENTA	
1	Bo. Suyapa
2	Bo. El Playón
3	Bo. El Terraplén
4	Bo. El Rastro
5	Bo. El Plantel
6	Bo. Las Acasias
7	Bo. El Bosque No. 1
8	Bo. El Bosque No. 2
9	Bo. El Tanque No. 1
10	Bo. El Tanque No. 2
11	Bo. El Centro
12	Col. Esquipulas
13	Col. El Jordán
14	Col. Villas del Carmen
15	Col. San Ramón
16	Col. Alemania No. 1
17	Col. Alemania No. 2
18	Col. Episcopal
19	Col. Cruz Roja
20	Col. La Promesa
21	Col. KM 86
22	Col. Buena Vista
ALDEA LA VENTA	
1	Caratasca
2	Ulúa
3	San Antonio



# PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA HÉCTOR VIRGILIO BARAHONA.

COL. EL JORDAN, PIMIENTA CORTES





## **1. Nombre del Proyecto**

Proyecto De Cercado perimetral de la Escuela Héctor Virgilio Barahona.

## **2. Descripción del Problema**

La Escuela Héctor Virgilio Barahona es un Centro de Educación básica, la cual a funcionado durante algunos años, recibe a aproximadamente 150 alumnos los cuales cursan los grados desde 1ero a 6to y es un fuerte para la población que reside a sus alrededores.

En la actualidad no cuenta con un cerco perimetral para delimitar el área de la escuela, causando así que algunos alumnos salgan o personas externas ingresen sin autorización a dicha escuela.

## **3. Objetivo**

El objetivo del Proyecto actual es brindar un mejor ambiente para los alumnos que reciben clases, además de mejorar la seguridad de cada uno al tener un espacio ya delimitado.

## **4. Población Beneficiada**

Se prevé beneficiar a más de 162 Estudiantes.

## **5. Generación de Empleos**

Empleos Directos: La Municipalidad contratará al personal calificado para realizar el trabajo, siendo 1 albañil y dos ayudantes.

## **6. Fuente de Financiamiento**

Fondos Municipales.

## **7. Dirección donde se ejecutará el proyecto**


Col. El Jordán, Pimienta Cortes.



## 8. Ubicación Satelital

Lat. 15° 17.063'P

Long. 87° 58.426'L

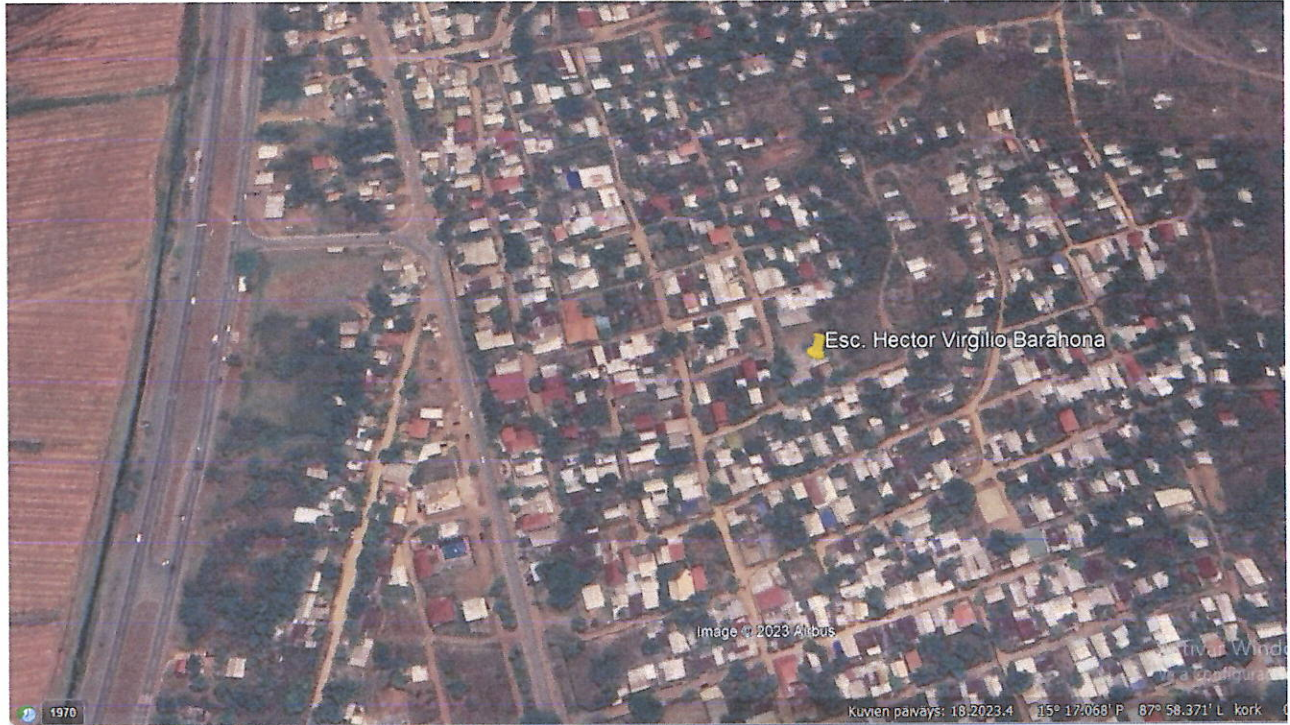

## 9. Período de ejecución:

El proyecto tendrá una vigencia de 4 Semanas.

## 10. Fecha de inicio y finalización

Fecha prevista de inicio: 29 de Enero del 2024.

Fecha prevista de Finalización: 24 de Febrero del 2024.





### 11. Presupuesto Inicial del proyecto

Materiales de ferretería	Pago de Mano de Obra
<b>L. 32,384.00</b>	<b>L. 22,000.00</b>

### 12. Presupuesto Inicial

Cant.	Descripción de Materiales	Precio/Unit	Total		
13	Tubo hg de 2" liviano	L685.00	L8,905.00		
35	Tapones para tubo hg de 2	L25.00	L875.00		
12	Cemento bolsa	L217.00	L2,604.00		
05	Varilla corrug. De 3/8" leg.	L170.00	L850.00		
05	Varilla lisa de 1/4"	L65.00	L325.00		
05	Libras de electrodos 60/11	L55.00	L275.00		
19	Rollo de alambre de púas	L850.00	L16,150.00		
01	1/4 de pegamento	L600.00	L600.00		
01	Viaje de arena	L1,800.00	L1,800.00		
<b>Total de Materiales</b>			<b>L. 32,384.00</b>		
<b>Descripción de Actividades</b>					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Excavación de agujeros	Unidad	30	L80.00	L2,400.00
2	Soldadura de pines en los tubos de 2"	Unidad	30	L100.00	L3,000.00
3	Fundición de tubo de 2" de 2 metros con concreto	Unidad	30	L200.00	L6,000.00
4	Instalación de 7 hiladas de alambre de púas	ML	66	L140.00	L9,240.00
5	Limpieza General	Unidad	1	L1,360.00	L1,360.00
<b>Pago de mano de obra</b>					<b>L22,000.00</b>
<b>Total</b>					<b>L54,384.00</b>

  
  
**Henry Javier Rodas Andino**  
 Jefe de UTM



## ANEXOS





PROYECTO

FECHA

DISEÑADO POR

PROYECTADO POR

Municipalidad  
de Pimenta  
Gortés

Escuela de la Escuela  
Sector Virgilio Soriano


CONTRATISTA

Cel: 91 Jordan  
Pimentel Gortés


Plano de Propuesta

FECHA	DESCRIPCIÓN


PROYECTO

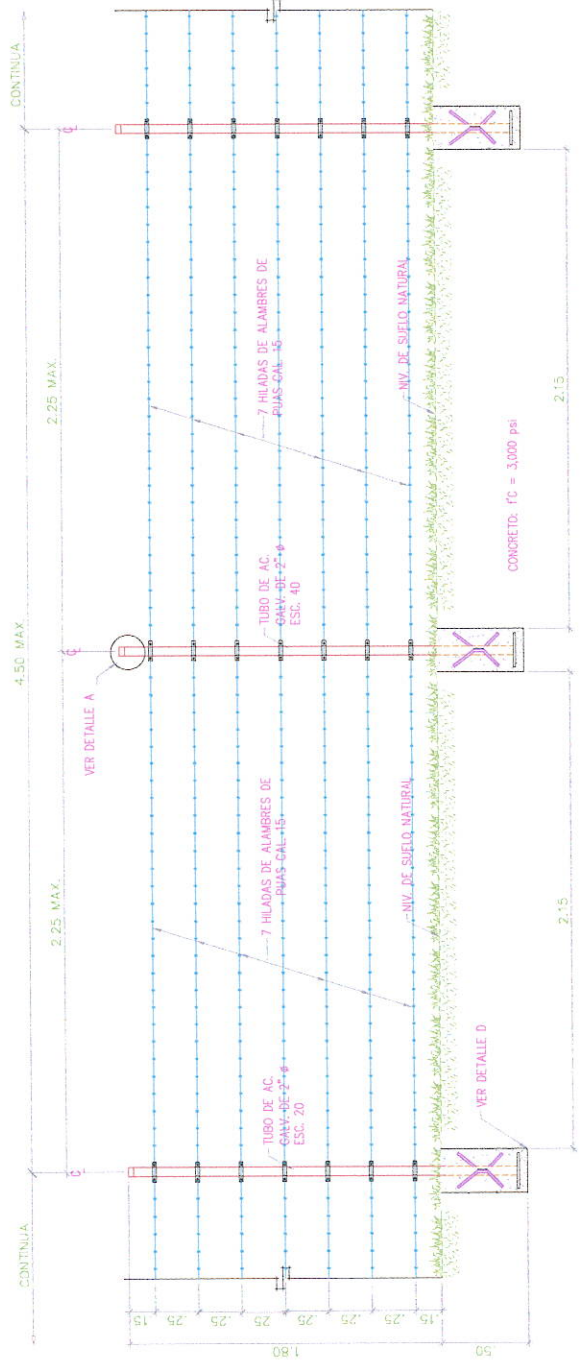

ELEVACION PARCIAL - DETALLE TIPICO  
ESC. 1:20

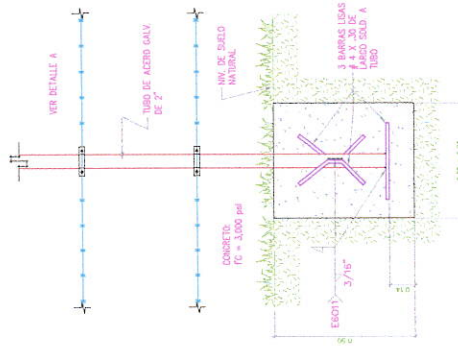

DETALLE D. CIMIENTO DE CERCA  
TUBO DE 2" ESC. 1:10

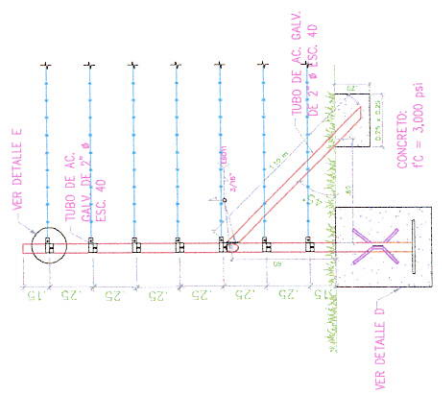

DETALLE DE TUBO DE ESCUINA  
TUBO DE 2" ESC. 1:15



## INFORME DE LIQUIDACION

# PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA HÉCTOR VIRGILIO BARAHONA.

COL. EL JORDAN, PIMIENTA CORTES





## INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad, la liquidación del proyecto de **PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA HÉCTOR VIRGILIO BARAHONA**, el cual se llevó a cabo en **COLONIA EL JORDNA**, ubicado en el en el Municipio de **PIMIENTA**, Departamento de **CORTES**; dicho Municipio cuenta con una gran diversidad de necesidades de infraestructura para el apoyo a la **EDUCACION**, una cuales pudo resolverse gracias a las gestiones del gobierno del Sr. Alcalde Municipal el Dr. Raúl Alfredo Ugarte y la Corporación Municipal.



# ACTA DE APROBACION DEL PROYECTO



## Solicitud

Pimienta, Cortes. 2/11/2023

Sr. Alcalde Municipal Dr. Raúl Ugarte

Reciba saludos de alumnos, maestras y padres de familia del C.E.B. Héctor Virgilio Barahona ubicado en la colonia San Ramon de este municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle la construcción del cerco perimetral en coordinación y apoyo a los padres de familia y docentes.

Sin más que decirle nos despedimos de usted agradeciendo de antemano su colaboración.

Atte.



*Elsa Andino*

Licda. Elsa Patricia Andino

Directora



**CERTIFICACIÓN**

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTE TÉRMINO CERTIFICA QUE EN EL LIBRO DE ACTAS QUE LLEVA ESTA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022-2026, SE ENCUENTRA EL ACTA CUYO PREAMBULO Y PUNTO CONDUCENTE LITERALMENTE DICE: ACTA No.603, EN EL MUNICIPIO DE PIMIENTA, CORTES A LOS 13 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 EN SESION ORDINARIA CONVOCADA POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DR. RAUL ALFREDO UGARTECON LA ASISTENCIA DE LOS SEÑORES REGIDORES: ELSY LORENA RODAS ANDINO, HECTOR EDUARDO FUENTES PERLA, DELMER AGUSTO GUEVARA, DONALDO QUIROZ BAUTISTA, JUAN PABLO CUELLAR REYES, MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS, CARLOS MAURICIO REYES, OSCAR ARMANDO PEREZ PAZ, LIC. ALEJANDRO RAMOS MARMOL VICE ALCALDE MUNICIPAL, MIEMBROS DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, COMISIONADA MUNICIPAL, ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL QUE DA FE Y RESPETANDO LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD. 1°.....2°.....3°.....4°.....5°.....6° CONTINUA LA JOVEN LINNETH MARISOL CONTRERAS JEFE DE PRESUPUESTO DETALLANDO :

**PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL AÑO 2024**

Programa	NOMBRE DEL PROYECTO	FONDOS PROPIOS 15-Inv.	FONDOS TRANSFERENCIA 11-Inv.	TOTALES
<b>11</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>L4,124,708.00</b>	<b>L0.00</b>	<b>L4,124,708.00</b>
1	Proyecto de Mantenimiento de Red de distribución de Agua	L1,600,000.00		L1,600,000.00
2	Proyecto de Mantenimiento, Sopleteo y Limpieza de Pozos	L1,125,038.00		L1,125,038.00
3	Proyecto de Construcción de Cerco Perimetral del Pozo de la Col. Izaguirre, Aldea Santiago	L300,000.00		L300,000.00
4	Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua impulsión y distribución, en Bo. El Bosque #2, sector la línea.	L100,000.00		L100,000.00
5	Proyecto de Anexión de para llenado de Tanques en Bo. Las Flores.	L100,000.00		L100,000.00
6	Proyecto de Mantenimiento de los Predios de las bombas y Tanques del Municipio	L99,670.00		L99,670.00
7	Proyecto de Mantenimiento y Limpieza de las Vías Públicas	L800,000.00		L800,000.00
<b>12</b>	<b>FORTEALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	<b>L899,000.65</b>	<b>L3,025,409.67</b>	<b>L3,924,410.32</b>
1	Proyecto de Reparación de Calles en el Casco Urbano	L290,000.00	L700,000.00	L990,000.00
2	Proyecto de Reparación de Calles en el Area Rural	L409,000.65	L552,584.86	L961,585.51
3	Proyecto de Mantenimiento de los Centros de Salud en el Municipio	L50,000.00	L50,000.00	L100,000.00
4	Proyecto de Mantenimiento del botadero controlado en Comunidad Maranatha	L100,000.00	L100,000.00	L200,000.00
5	Proyecto de mantenimiento de cementerios municipales	L50,000.00	L50,000.00	L100,000.00
6	Proyecto de Construcción y mejoramiento de viviendas sociales		L900,000.00	L900,000.00
7	Proyecto de construcción de módulos sanitarios en la ESC. Hilaria Velásquez de Aldea Santiago		L72,824.81	L72,824.81
8	Proyecto equipamiento del pozo de agua e instalación de la red de impulsión al tanque de almacenamiento de Aldea la Venta		L600,000.00	L600,000.00
<b>13</b>	<b>FORTEALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	<b>L850,000.00</b>	<b>L2,944,805.53</b>	<b>L3,794,805.53</b>
1	Proyecto de Mantenimiento de las Canchas de Futbol del Municipio	L50,000.00	L50,000.00	L100,000.00
2	Mantenimiento del alumbrado publico	L150,000.00	L200,000.00	L350,000.00
3	Construcción y mejoramiento de viviendas sociales con contraparte	L100,000.00	L494,736.53	L594,736.53
4	Proyecto de mejoramiento del estadio Dubón de la Aldea Santiago		L500,000.00	L500,000.00
5	Proyecto de Mantenimiento de Parques del Municipio	L100,000.00	L300,000.00	L400,000.00

6	Mantenimiento de la plaza deportiva Luis Cruz	L300,000.00		L300,000.00
7	Proyecto de iluminación del tramo sector La Champona - La Farmacia, calle principal		L550,000.00	L550,000.00
8	Construcción de gradas en la cancha sintética de la Col. Marvin Umaña #2		L200,000.00	L200,000.00
9	Construcción de Muro y Edificación en la Plaza Luis Cruz	L150,000.00	L450,069.00	L600,069.00
10	Instalación de transformador de 50 KVA En el Instituto Oscar Armando Avila		L100,000.00	L100,000.00
11	Proyecto de mejoramiento del sistema eléctrico de la Comunidad de Maranatha		L100,000.00	L100,000.00
14	<b>FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	<b>L0.00</b>	<b>L850,000.00</b>	<b>L850,000.00</b>
1	Mejoramiento de accesos a los lugares turísticos y productivos del Municipio		L850,000.00	L850,000.00
15	<b>INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	<b>L1M596,842.85</b>	<b>L1M481,931.93</b>	<b>L3M078,774.78</b>
1	Proyecto de Mantenimiento de Oficinas Municipales	L50,000.00	L150,000.00	L200,000.00
2	Proyecto de Mejoramiento a la infraestructura escolar	L50,000.00	L100,000.00	L150,000.00
3	Construcción de Centro comunal en Corte Culebra		L100,000.00	L100,000.00
4	Construcción de cuneta abierta en Aldea Santiago, sector Cuartos fríos		L480,000.00	L480,000.00
5	Proyecto de instalación de cruces de calles en el Municipio		L100,000.00	L100,000.00
6	Construcción de Cuneta en el Bo. El Plantel, sector donde Mario López	L50,000.00	L100,000.00	L150,000.00
7	Mantenimiento del centro cívico del Bo. El Centro	L100,000.00		L100,000.00
8	Mantenimiento de los proyectos ejecutados	L300,000.00		L300,000.00
9	Construcción de galera en el parqueo de la Municipalidad	L300,000.00		L300,000.00
10	Construcción de muros de contención en las viviendas de la Col. Aitos de Villas del Carmen	L500,000.00		L500,000.00
11	Construcción de Cuneta de aguas pluviales en Col. Villas del Carmen, sector donde Hellen		L451,931.93	L451,931.93
12	Construcción de enchapado en Bo. Los Almendros, Aldea Santiago	L191,842.85		L191,842.85
13	Proyecto del cercado de la Esc. Hector Virgilio Barahona	L55,000.00		L55,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>L7,470,551.50</b>	<b>L8,302,147.13</b>	<b>L15,772,698.63</b>

EL SEÑOR REGIDOR MAURICIO REYES SUGIRIO A LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL SE REVISEN ALGUNOS PROYECTOS PEQUEÑOS DE ALDEA SANTIAGO QUE DEBERIAN INCLUIR AL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL, POR LO CUAL EL SEÑOR ALCALDE SE COMPROMETIO QUE SE ANALIZARAN LA PROPUESTA POR ALGUNA ALTERNATIVA DE SOLUCION, YA QUE TAMBIEN EXISTE LA POSIBILIDAD CON FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS, CONCEDORES DE LA SITUACION LOS SEÑORES CORPORATIVOS APROBARON POR UNANIMIDAD EL PLAN DE INVERSION MUNICIPAL ANUAL AÑO 2024.

CERRÓ LA SESION A LAS 6:30 P.M. SELLO Y FIRMA.- DR. RAUL ALFREDO UGARTE ALCALDE MUNICIPAL, LOS SEÑORES REGIDORES: ELSY LORENA RODAS ANDINO, HECTOR EDUARDO FUENTES PERLA, DELMER AGUSTO GUEVARA, DONALDO QUIROZ BAUTISTA, JUAN PABLO CUELLAR REYES, MARIA DEL CARMEN CASTELLANOS, CARLOS MAURICIO REYES, OSCAR ARMANDO PEREZ PAZ, LIC. ALEJANDRO RAMOS MARMOL VICE ALCALDE MUNICIPAL - ANTE LOS MIEMBROS DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA, SELLO Y FIRMA.- SECRETARIA MUNICIPAL ES CONFORME A SU ORIGINAL.- SE EXTIENDE EN PIMIENTA, CORTES A LAS 12:00 HORAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

  
MARGARITA PONCE RUBIO  
SECRETARIA MUNICIPAL



# CONTRATO Y ORDENES DE CAMBIO





# COTIZACIÓN

CONSTRUSERVICIOS ESTRUCTURAS Y DECORACIONES YM S. DE R.L.  
 Colonia la Hacienda Ponce, Calle Principal, Pimienta Cortes.  
 Cel: 8847-7842 Correo: ymaradiaga.coedyn@gmail.com  
**RTN: 05019023561475**

N° DE COTIZACIÓN: **001-2024**  
 FECHA: **26 01 2024**  
 VÁLIDO HASTA: **10 02 2024**

## CLIENTE

SOLICITA: HENRY RODAS  
 EMPRESA: ALCALDIA MUNICIPAL DE PIMIENTA CORTES  
 DNI/RTN : 05049995126357  
 DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, PIMIENTA CORTES

PROYECTO: CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA EN COL. EL JORDAN, PIMIENTA CORTES.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
30	Excavación de agujeros	L 80.00	L 2,400.00
30	Soldadura de pines en los tubos de 2"	L 100.00	L 3,000.00
30	Fundición de tubo de 2" de 2 metros con concreto	L 200.00	L 6,000.00
66	ML. De Instalación de 8 hiladas de alambre de púas	L 140.00	L 9,240.00
1	Limpieza General	L 1,360.00	L 1,360.00

### TÉRMINOS Y CONDICIONES

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

- Duración de la oferta **15 días**
- Todos los pagos se haran mediante efectivo o mediante Cheque
- Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen **devoluciones**

Subtotal	L	22,000.00
Exonerado	L	-
Exento ISV	L	22,000.00
Gravado 18%	L	-
Gravado 15%	L	-
ISV 18%	L	-
ISV 15%	L	-
<b>TOTAL Bs.</b>	<b>L</b>	<b>22,000.00</b>

Edward Fransuha Maradiga  
 Gerente General

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, por favor, póngase en contacto con nosotros

8847-7842

Coedym Hn

Coedym\_hnoficial

**Gracias por la preferencia!**



**CONTRATO**

AMP-005-2024

**PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA HÉCTOR VIRGILIO BARAHONA.**

NOSOTROS DR. RAUL ALFREDO UGARTE FLORENTINO, Mayor de edad, casado, Hondureño, Doctor en Medicina y Cirugía de este vecindario con Documento Nacional de Identificación #0501-1960-01209, RTN #05011960012094 declarado Alcalde por el Consejo Nacional Electoral de fecha 25 de Enero del 2022 según punto único de la Sesión Ordinaria, por una parte quien actúa en carácter de representante legal de la Municipalidad de Pimienta, con facultades suficientes para ejercer la representación de la municipalidad y para celebrar toda clase de actos y contratos, facultad que le otorga la ley de Municipalidades en sus artículos No.10 y 40 numeral 3 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades, quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por otra parte el Señor Sr. EDWARD FRANSUHA MARADIAGA BARRIENTOS con domicilio en la Ciudad de Pimienta, Cortés, con Documento Nacional de Identificación No: 0501-1995-00956 quien actúa en carácter de Gerente General de **CONSTRUSERVICIOS, ESTRUCTURAS Y DECORACIONES YM S. DE R.L.** con Registro Nacional Tributario No: 05019023561475, quien se denomina EL CONTRATISTA hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO NO: AMP-005-2024 "PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA HÉCTOR VIRGILIO BARAHONA"**, que resultado del proceso de contratación llevado a cabo bajo la modalidad de Compra Menor No: **CM-005-AMP-2024**, contrato que se regirá bajo las siguientes clausulas:

**CLAUSULA No... 1 OBJETO DEL CONTRATO:**

Es la instalación de 66 M.L. de cerco de tubo con alambre de púas. En el Presente contrato EL CONTRATISTA Suministrara únicamente la Mano de Obra calificada para la ejecución del Proyecto, el cual cuenta con las siguientes actividades y especificaciones:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Excavación de agujeros	Unidad	30	L80.00	L2,400.00
2	Soldadura de pines en los tubos de 2"	Unidad	30	L100.00	L3,000.00
3	Fundición de tubo de 2" de 2 metros con concreto	Unidad	30	L200.00	L6,000.00
4	Instalación de 8 hiladas de alambre de púas	ML	66	L140.00	L9,240.00
5	Limpieza General	Unidad	1	L1,360.00	L1,360.00
<b>Pago de mano de obra</b>					<b>L22,000.00</b>

**CLAUSULA No... 2 ALCANCE DEL CONTRATO:**

El Contratista se obliga a cumplir con el objeto del contrato, en la fecha comprendida del 29 de Enero al 17 de Febrero del año 2024.

**CLAUSULA No... 3 VALOR DEL CONTRATO:**

El contrato tendrá un valor de **Lps. 22,000.00** (VEINTIDOS MIL LEMPIRAS EXACTOS) los que se cancelaran de manera semanal de acuerdo al avance de la obra presentado, Un pago final al ser recibidas las obras a satisfacción. Se le hará la retención del Impuesto sobre la Renta equivalente al 01% del valor del contrato ya que no posee la Constancia de Pagos a Cuenta.

**CLAUSULA No... 4 INICIO DEL PLAZO DE MULTA:**

En caso que no cumpliera en la fecha establecida, se aplicará una multa de Lps. 500.00 por día de retraso por incumplimiento de la obra, siempre y cuando el atraso sea únicamente por parte del contratista.

**CLAUSULA No... 5 COMPROMISO DEL CONTRATISTA:**

El Contratista deberá utilizar el equipo, materiales, herramientas y personal adecuados para la ejecución de la obra.

**CLAUSULA No...6 GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO:**

El contratista garantiza la calidad de su trabajo y se compromete con un plazo de 30 días a partir de la finalización del contrato, comprometiéndose a realizar mejoras por desperfectos que sucedieren siempre y cuando sean por malas praxis de su trabajo.

**CLAUSULA No....7 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

Quedando el Sr. Henry Javier Rodas Andino Jefe de la Unidad Técnica Municipal, encargado de la supervisión y el departamento de auditoría o cualquier institución contralor del estado podrá supervisar la obra durante su ejecución en cualquier momento.



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortés*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL




**CLAUSULA No.... 8 TRIBUNAL COMPETENTE:**

Cualquier controversia derivada del presente contrato, se resolverá por la negociación directa entre el contratante y el contratista, de no llegar a un arreglo se resolverá por la vía judicial, para lo cual las partes se someterán a la jurisdicción del Juzgado de Paz del Municipio de Pimienta, Cortés y/o Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo así mismo para todo lo no previsto en este contrato, las partes estarán sujetas a lo preceptuado en las leyes vigentes en Honduras.

**CLAUSULA No.... 9 RATIFICACIÓN:**

Ambas partes Contratante y Contratista, manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y cada una de las cláusulas de este Contrato y para los efectos legales correspondientes, suscriben el mismo en dos Ejemplares Originales, quedando uno en poder del Contratante y otro será entregado al Contratista, Pimienta Cortés, 29 de Enero del Año 2024.




  
Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino  
DNI. # 0501-1960-01209  
Contratante



Edward Fransuha Maradiaga Barrientos  
DNI. #0501-1995-00956  
Gerente General  
Construservicios, Estructuras y Decoraciones  
YM S. de R.L.



  
Henry Javier Rodas Andino  
DNI. # 0612-1982-00120  
Supervisor de la Obra



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



# ACTAS DE APERTURA Y RECEPCION DE LA OBRA



## ACTA DE APERTURA DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: **Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona.**

Dirección: **Colonia El Jordán, Pimienta, Cortes.**

Procedencia de fondos: **Municipalidad de Pimienta, Cortes.**

**Nosotros: Henry Javier Rodas Andino** DNI No. **0612-1982-00120** en carácter de jefe de la Unidad Técnica Municipal de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el **Sr. Edward Fransuha Maradiaga Barrientos**, con DNI No: **0501-1995-00956** quien actúa en carácter de Gerente General de **Construservicios, Estructuras Y Decoraciones YM S. De R.L.** con RTN No: **05019023561475** quien se denomina el Contratista, hemos acordado la ejecución del proyecto de: **Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona, Col. El Jordán**, del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en:

Es la instalación de 66 M.L. de cerco de tubo con alambre de púas. En el Presente contrato EL CONTRATISTA Suministrara únicamente la Mano de Obra calificada para la ejecución del Proyecto, el cual cuenta con las siguientes actividades y especificaciones:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Excavación de agujeros	Unidad	30	L80.00	L2,400.00
2	Soldadura de pines en los tubos de 2"	Unidad	30	L100.00	L3,000.00
3	Fundición de tubo de 2" de 2 metros con concreto	Unidad	30	L200.00	L6,000.00
4	Instalación de 8 hiladas de alambre de púas	ML	66	L140.00	L9,240.00
5	Limpieza General	Unidad	1	L1,360.00	L1,360.00
<b>Pago de mano de obra</b>					<b>L22,000.00</b>

El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida del 29 de Enero al 17 de Febrero del año 2024. Con un valor total de la obra **Lps. 22,000.00 (VEINTIDOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. Por parte del **Sr. Edward Fransuha Maradiaga Barrientos**, nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para dar inicio, procediéndose de la siguiente forma:

**Primero:** El **Sr. Edward Fransuha Maradiaga Barrientos** manifiesta que dará inicio a la obra: El día Lunes 29 de Enero del Año 2024, para la ejecución del **Proyecto de Cercado Perimetral De La**



**Escuela Héctor Virgilio Barahona.**


**Segundo:** Se socializo con la comunidad beneficiaria, las diferentes actividades de trabajo acordando dar inicio al proyecto.

**Tercero:** Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 29 días del mes de Enero del Año 2024.





  
Dr. Raúl Alfredo Ugarte Florentino  
DNI #0501-1960-01209  
Contratante




  
Sr. Henry Javier Rodas Andino  
DNI #0612-1982-00120  
Jefe de UTM



  
Lic. Elsa Patricia Andino  
DNI # 0504-1976-00054  
Directora del C.E.B. Héctor Virgilio  
Barahona

  
Sr. Edward Fransuha Maradiaga Barrientos  
DNI # 0501-1995-00956  
Gerente General  
Construservicios, Estructuras y Decoraciones  
YM S. de R.L.

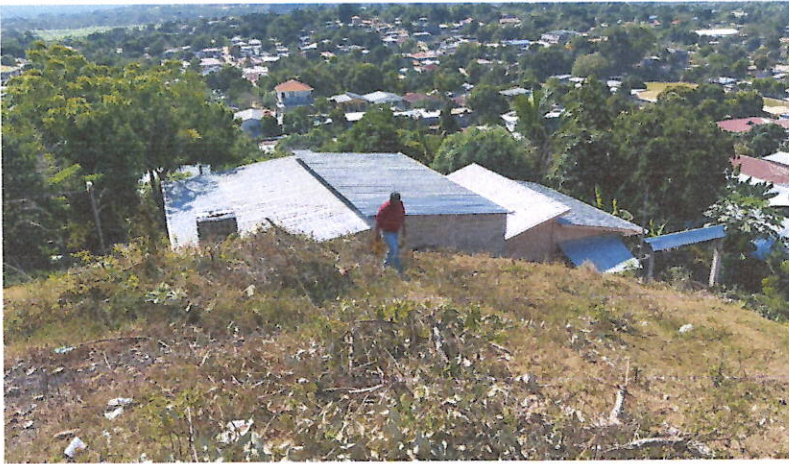



## ACTA DE RECEPCION FINAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: **Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona.**

Dirección: **Colonia El Jordán, Pimienta, Cortes.**

Procedencia de fondos: **Municipalidad de Pimienta, Cortes.**

**Nosotros: Henry Javier Rodas Andino** DNI No. **0612-1982-00120** en carácter de jefe de la Unidad Técnica Municipal de la Municipalidad de Pimienta, Cortes y por otra parte el **Sr. Edward Fransuha Maradiaga Barrientos**, con DNI No: **0501-1995-00956** quien actúa en carácter de Gerente General de **Construservicios, Estructuras Y Decoraciones YM S. De R.L.** con RTN No: **05019023561475** quien se denomina el Contratista, hemos acordado la ejecución del proyecto de: **Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona, Col. El Jordán**, del Municipio de Pimienta, Cortes, el cual consiste en:

Es la instalación de 66 M.L. de cerco de tubo con alambre de púas. En el Presente contrato EL CONTRATISTA Suministrara únicamente la Mano de Obra calificada para la ejecución del Proyecto, el cual cuenta con las siguientes actividades y especificaciones:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Excavación de agujeros	Unidad	30	L80.00	L2,400.00
2	Soldadura de pines en los tubos de 2"	Unidad	30	L100.00	L3,000.00
3	Fundición de tubo de 2" de 2 metros con concreto	Unidad	30	L200.00	L6,000.00
4	Instalación de 8 hiladas de alambre de púas	ML	66	L140.00	L9,240.00
5	Limpieza General	Unidad	1	L1,360.00	L1,360.00
<b>Pago de mano de obra</b>					<b>L22,000.00</b>

El contrato tendrá un alcance en la fecha comprendida del 29 de Enero al 17 de Febrero del año 2024. Con un valor total de la obra **Lps. 22,000.00 (VEINTIDOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**. Por parte del **Sr. Edward Fransuha Maradiaga Barrientos**, nos hemos reunido en el sitio del Proyecto para dar por terminado el proyecto, procediéndose de la siguiente forma:

**Primero:** El **Sr. Edward Fransuha Maradiaga Barrientos** manifiesta que finalizo a la obra: El día **Martes 06 de Febrero del Año 2024.**





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL




**Segundo:** Los presentes procedieron a realizar un recorrido al proyecto, encontrando que este fue construido de acuerdo a las especificaciones técnicas de mano de obra.

**Tercero:** Mediante este documento el **Sr. Edward Fransuha Maradiaga Barrientos** da por finalizado el: **Proyecto de Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona**, traspasando la misma al representante de la Comunidad quienes se comprometen a dar mantenimiento al proyecto finalizado.

**Cuarto:** Todas las partes aceptan lo antes expuesto para fe de lo cual firmamos la presente a los 06 días del mes de Febrero del año 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Alfredo Ugarte Florentino  
DNI #0501-1960-01209  
Contratante


  
\_\_\_\_\_  
Sr. Henry Javier Rodas Andino  
DNI #0612-1982-00120  
Jefe de UTM

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Elsa Patricia Andino  
DNI # 0504-1976-00054  
Directora del C.E.B. Héctor Virgilio  
Barahona

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Edward Fransuha Maradiaga Barrientos  
DNI # 0501-1995-00956  
Gerente General  
Construservicios, Estructuras y Decoraciones  
YM S. de R.L.



**Fotografías del Proyecto Terminado**

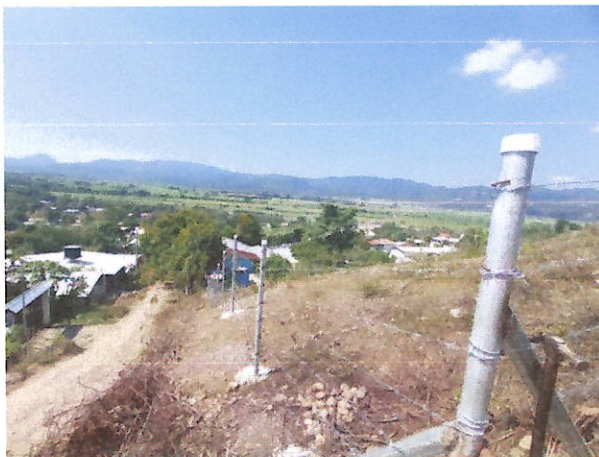



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



# PRESUPUESTO EJECUTADO



## PRESUPUESTO EJECUTADO

Compra de Materiales					
Cant.	Descripción De Materiales	Precio/Unit	Total		
13	Tubo Hg De 2" Liviano	L685.00	L8,905.00		
35	Tapones Para Tubo Hg De 2	L25.00	L875.00		
12	Cemento Bolsa	L217.00	L2,604.00		
5	Varilla Corrug. De 3/8" Leg.	L170.00	L850.00		
5	Varilla Lisa De 1/4"	L65.00	L325.00		
10	Libras De Electrodo 60/11	L55.00	L550.00		
19	Rollo De Alambre De Púas	L850.00	L16,150.00		
5	Disco De Corte De 4	L55.00	L275.00		
1	1/4 De Pegamento	L600.00	L600.00		
1	Viaje De Arena	L1,800.00	L1,800.00		
<b>Total De Materiales</b>			<b>L. 32,934.00</b>		
Descripción De Actividades de Mano de Obra					
No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Excavación De Agujeros	Unidad	30	L80.00	L2,400.00
2	Soldadura De Pines En Los Tubos De 2"	Unidad	30	L100.00	L3,000.00
3	Fundición De Tubo De 2" De 2 Metros Con Concreto	Unidad	30	L200.00	L6,000.00
4	Instalación De 7 Hiladas De Alambre De Púas	ML	66	L140.00	L9,240.00
5	Limpieza General	Unidad	1	L1,360.00	L1,360.00
<b>Pago De Mano De Obra</b>					<b>L22,000.00</b>
<b>Total</b>					<b>L54,934.00</b>



  
**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM



# LIQUIDACION FINANCIERA (ORDENES DE PAGO, FACTURAS, CHEQUES)



## LIQUIDACION DE PROYECTO

**PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA HÉCTOR VIRGILIO BARAHONA**

15 00 008 000 00147110 15-013-01



ORDEN	FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR DE LA ORDEN
30609	27 01 2024	000-001-01-00218934	FERRETERIA EL OBELISCO	PAGO POR COMPRA PARA EL PROYECTO CERCADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA UBICADO EN LA COLONIA JORDAN DE ESTE MUNICIPIO.	L. 30,584.00
30685	3 02 2024	000-001-01-00000001	CONSTRUSERVICIOS ESTRUCTURAS Y DECORACIONES YM S. DE R.L.	PAGO COMO ANTICIPO POR AVANCES PRESENTADOS DEL CONTRATO DE PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA. REALIZANDO: EXCAVACION DE AGUJEROS, SOLDADURA DE PINES EN LOS TUBOS Y FUNDICION DE TUBO	L. 11,400.00
30713	7 02 2024	000-001-01-00213234	FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CERCADO DE LA ESC. HECTOR VIRGILIO BARAHONA.	L. 550.00
30726	8 02 2024	000-001-01-00000343	JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ	CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE ARENA CON VOLQUETA PEQUEÑA EN APORTE AL PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. HECTOR VIRGILIO BARAHONA.	L. 1,800.00
30742	9 02 2024	000-001-01-00000002	CONSTRUSERVICIOS ESTRUCTURAS Y DECORACIONES YM S. DE R.L.	CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. HECTOR VIRGILIO BARAHONA, REALIZANDO A SU CABALIDAD LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 66 ML DE INSTALACIÓN DE 8 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y 1 UNIDAD DE LIMPIEZA GENERAL, DURANTE EL PERIODO DEL DE ENERO AL DE FEBRERO DEL 2024.	L. 10,600.00
<b>TOTAL GENERAL EN ORDENES DE PAGO</b>					<b>L. 54,934.00</b>



HENRY RODAS

JEFE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2024  
Hora : 10:15 a.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30609

L.: 30,584.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16613

Fecha de Emisión: 27/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00020570

Paguese a: FERRETERIA EL OBELISCO

Id/RTN: 05019004003615

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:


PAGO POR COMPRA PARA EL PROYECTO CERCADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA UBICADO EN LA COLONIA JORDAN DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO//OBJETO GASTO	MONTO
15 00 008 000 001 47110 15-013-01	Proyecto de cercado de la Esc. Hector Virgilio Barahona	30,584.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,584.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>30,584.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto  
  
 Firma y Sello de Tesorería  
  
 Firma y Sello de Alcalde (SAMI)  


Recibido por:  
Identidad No.:

Ferreteria El Obelisco  
RTN 05019004003615  
Villanueva, Cortes

0s+rjs/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPif5L4sHGEXYCAZusnoq/Zrrb0/QCS8xMumaFUZdFIkGGMGL2hoqUR+ur  
gui5Cxa49IYqz74fhIjnsQJ7E/Fb1qE

INVERSIONES R M T, S. R.L. DE C. V.  
**FERRETERIA EL OBELISCO**

1 Ave. 8 Calle N. E. Bo. Suyapa  
 Tel: 2670-4219 / Cel: 9420-2476  
 Villanueva, Cortes Honduras C. A.  
**R.T.N. 05019004003615**

CAI: F5C7F8-CB196F-A344AF-90C03E-4D75D8-30  
 N°000-001-01-00218251 000-001-01-00228250  
 Correo: rosymendez52@hotmail.com  
 Fecha Limite de Emisión 23/08/2024

Villanueva cortes 29 de ENERO del 2024

Cliente: Municipalidad de Pimienta

RTN: 05049995126357 Direccion:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL Lps.
12	Cemento bijao	217.00	2604.00
5	vanilla 3/8 leg. Bmaga.	170.00	850.00
5	vanilla 1/4 leg. hmg	65.00	325.00
13	tubo galva. redondo 2ch16	685.	8905.00
5	lbs electrodo 6011	55.00	275.00
19	Alambor Pvas Brohamen	850.	16150.00
1	1/4 Pvc lanceo	600.00	600.00
35	lapon Pvc 2"	25.	875.00

RTN: 05119017951164. OM Impresos Y Mas. S de RL. Telp: 9420-4325

No. Orden de Compra Exento

No. Cons. del Registro de Exonerados

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia

**FACTURA**

N°000-001-01-00 218934

Sub-Total	L. 26,594.78
Importe Exento	L.
Importe Exonerado	L.
Desc. y Rebajas	L.
Flete	L.
Importe Gravado 15%	L. 26,594.78
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/V	L. 3989.22
18% Imp. S/V	L.
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 39,584.00</b>

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor  
 Copia 2: Contabilidad

TOTAL EN LETRAS: treinta mil quinientos ochenta y cuatro

Fecha de Recepción: 23/11/2023





**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A PARQUE PIMIENTA, CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



**CHEQUE No. 00020570**

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

27 de enero de 2024

FERRETERIA EL OBELISCO  
Páguese a la orden de

L 30,584.00

TRINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras

**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆2⑆1⑆1⑆08⑆0000⑆2⑆1⑆1⑆1⑆1⑆0⑆2⑆1⑆6⑆000⑆205⑆20

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

00173

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO POR COMPRA PARA EL PROYECTO CERCADO DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA UBICADO EN LA COLONIA JORDAN DE ESTE MUNICIPIO.	30,584.00
CHEQUE No. <b>00020570</b>	HECHO POR 	REVISADO POR
<b>Ferreteria El Obelisco</b> <b>RTN 05019004003615</b>  <b>RECIBI CONFORME</b>		

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 22400001 (10 LINEAS)



# ORDEN DE COMPRA

Contado  Crédito


N.° 2024-005

Fecha: 22 de enero del 2024.

Señores: FERRETERIA EL OBELISCO

Sírvase entregar los productos detallados en el siguiente cuadro para uso exclusivo de esta Municipalidad de Pimienta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
12 ✓	cemento bijao	L2,604.00
5 ✓	varilla de 3/8 corrugada	L850.00
5 ✓	Varilla lisa 1/4 leg.	L325.00
13 ✓	tubo hg de 2 chapa 16 redondo	L8,905.00
5 ✓	electrodo 6011 libra	L275.00
19 ✓	alambre de púa rollo	L16,150.00
1 ✓	¼ pegamento lanco	L600.00
35 ✓	Tapón potable de 2 .....ul.....	L875.00
	<b>IMPORTE CON ISV</b>	<b>L.30,584.00</b>
	<b>ISV</b>	<b>L.0.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>L.30,584.00</b>



*[Signature]*  
 Dr. Raúl A. Ugarte  
 Alcalde Municipal



*[Signature]*  
 Jesús Dubon  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Osman Rene Fúnez Portillo  
 Jefe de Compras y Suministros





**SOLICITUD**

**No: 2024-005**

Pimienta Cortes  
22 de Enero del año 2024

Sr. Contador municipal  
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de la compra de materiales para el proyecto cercado de la escuela Héctor Virgilio Barahona ubicado en la colonia el Jordán de este municipio. Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque a favor de: **FERRETERIA EL OBELISCO**, con RTN No: **05019004003615** por la cantidad de **Lps. 30,584.00** para realizar la respectiva Compra de productos detallados en las cotizaciones adjuntas.

Se adjunta constancia electrónica de pagos a cuenta otorgada por la Sar.

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

Osman Rene Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



## Solicitud

Pimienta, Cortes. 2/11/2023

Sr. Alcalde Municipal Dr. Raúl Ugarte

Reciba saludos de alumnos, maestras y padres de familia del C.E.B. Héctor Virgilio Barahona ubicado en la colonia San Ramon de este municipio.

El motivo de la presente es para solicitarle la construcción del cerco perimetral en coordinación y apoyo a los padres de familia y docentes.


Sin más que decirle nos despedimos de usted agradeciendo de antemano su colaboración.

Atte.



Licda. Elsa Patricia Andino

Directora



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes.  
20 de Enero de 2023

**Sr. Osman René Fúnez**  
Jefe de Compras y Suministro.  
Su Oficina.

Reciba mi cordial saludo.

El motivo de la presente es para hacerle entrega del material a Cotizar materiales que serán utilizados en el **Proyectos De Cercado de La escuela Héctor Virgilio Barahona** Detallado a continuación:

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1. Tubo hg de 2" liviano	Unidad	13 ✓
2. Tapones para tubo hg de 2	Unidad	35 ✓
3. Cemento	Bolsa	12 ✓
4. Varilla corrug. De 3/8" leg.	Unidad	05 ✓
5. Varilla lisa de 1/4"	Unidad	05 ✓
6. Electrodo electrodos 60/11	Libra	05 ✓
7. Alambre de púas	Rollo	19 ✓
8. 1/4 de pegamento	Unidad	01 ✓

Sin más que decir.

  
**José Luis Paredes Arias**  
Asistente de U.T.M.



## COTIZACION

Fecha: **20 de Enero del 2024**

Cliente: **Municipalidad de Pimienta**

Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total
12 ✓	cemento bijao	L217.00 ✓	L2,604.00 ✓
5 ✓	varilla de 3/8 corrugada	L170.00 ✓	L850.00 ✓
5 ✓	varilla lisa 1/4 leg.	L65.00 ✓	L325.00 ✓
13 ✓	tubo hg de 2 chapa 16 redondo	L685.00 ✓	L8,905.00 ✓
5 ✓	electrodo 6011 libra	L55.00 ✓	L275.00 ✓
19 ✓	alambre de pua rollo	L850.00 ✓	L16,150.00 ✓
1 ✓	1/4 de pegamento lanco	L600.00 ✓	L600.00 ✓
35 ✓	tapon pvc de 2	L25.00 ✓	L875.00 ✓
			L0.00
		Sub-Total	<b>L30,584.00</b> ✓
		Impto	L -
		Total L.	<b>L 30,584.00</b>

N#:

Cotizado por: DELY TORRES

Observaciones: \_\_\_\_\_

### **FERRETERIA EL OBELISCO S. DE R.L**

**RTN: 0501-9004-003615**

1 Avenida, 8 Calle N.O, Barrio Suyapa

1 Cuadra al Oeste de Zip Villanueva



República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 05019004003615

Nombre o Razón Social: INVERSIONES R M T SRL DE CV  
 Domicilio Fiscal: BO SUYAPA Calle 8 CLL 9 AVE N Casa:247  
 Representante Legal: ROSA ARMIDA MENDEZ RODRIGUEZ  
 Actividad Económica Principal: Comercio al por menor de artículos de  
 ferretería y cerrajería y productos de vidrio, excepto pinturas en  
 establecimientos especializados

Inscripciones

<input checked="" type="checkbox"/> Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Imprentas
<input type="checkbox"/> Tragamonedas	<input type="checkbox"/> Prestamista No Bancario
<input type="checkbox"/> Intercambiador	

Fecha de Emisión: 20080904

Fecha de Vencimiento: 20100904

Base Legal Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 54 del Decreto 22 97, Art. 39 del Decreto 194-2002 Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 20880 y el Reglamento de la Prestamista No Bancario Acuerdo N° 13 publicado el 18 de Enero de 1973.



Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarle a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 275998

Transacción 3A84E8



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-24-10500-11375

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES R M T SRL DE CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019004003615**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-11375 en fecha 20/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271704902 de fecha 17/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35741191500, presentada el 20/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-11375** o mediante el siguiente código QR:





## Documento Fiscal Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**RTN:** 05019004003615  
**Nombre o Razón Social:** INVERSIONES R M T SRL DE CV  
**Nombre Comercial:** FERRETERIA EL OBELISCO  
**Teléfono:** 26705051 31903010  
**Email:** rosymendez-52@hotmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:SUYAPA, CALLE: 8, 9 AVENIDA, CASA NO: 247, MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: SUYAPA, 8, 9 AVENIDA, No. 247, MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES

**IMPRESA**

**RTN:** 05119017951164  
**Nombre Comercial:** OM IMPRESOS Y MAS S DE RL

**GENERALES**

**Número del Documento:** 000-001-01-00211084  
**Fecha de Autorización:** 25/05/2023  
**Modalidad:** Impresión por Imprenta  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 25/05/2024  
**CAI:** CE5EA8-145639-6B4A95-4AFB7E-482090-00  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00207751  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00217750

**TRIBUTAR ES PROGRESAR**

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 03/02/2024

Hora : 08:41 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30685

L.: 11,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16679

Fecha de Emisión: 3/2/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 00020636

Paguese a: CONSTRUSERVICIOS ESTRUCTURAS Y DECORACIONES YM S. DE R.L.

Id/RTN: 05019023561475

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO ANTICIPO POR AVANCES PRESENTADOS DEL CONTRATO DE PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCULA HECTOR VIRGILIO BARAHONA. REALIZANDO: EXCAVACION DE AGUJEROS, SOLDADURA DE PINES EN LOS TUBOS Y FUNDICION DE TUBO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 008 000 001 47110 15-013-01	Proyecto de cercado de la Esc. Hector Virgilio Barahona	11,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	114.00
Total de retenciones:		114.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,400.00
- RETENCIONES	114.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,286.00</b>


Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0501-1995-00956

0s+js/j9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNV1529KjyM9/ExkcVJOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPlf5L4sHGEXYCAZusrnoq/Zrrb0/QCS8xMumaFUZdFllksGMGL2hcqUR+ur  
gui5Cxa49tYqz74fhJjnsQJ7E/Fb1qE

# CONSTRUSERVICIOS ESTRUCTURAS Y DECORACIONES YM S. DE R.L.

Colonia La Hacienda, Calle Principal, Telefono: 8847-7842  
Potrerillos, Cortés Correo: ymaradiaga.coedyn@gmail.com  
R.T.N. 05019023561475

Potreriillos, 03 de Febrero del 202 4  
Cliente: Municipalidad de Pimienta  
R.T.N. 05049995126357 DIRECCIÓN B. el Centro

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR
01	Pago de avances al contrato de Mano de obra del Proyecto de Cercado de la Eca. Hecctor Virgilio Barahona del 29-01-24 al 03-02-24	11,400	11,400.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA		Descuentos y Rebajas	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Exonerado	
<b>DATOS DE EXONERADO</b>		Importe Exento ISV 11,400.00	
N° Orden de Compra Exenta: _____		Importe Gravado 15%	
N° Constancia Registro Exonerado: _____		Importe Gravado 18%	
N° Registro SAG _____		ISV 15 %	
Son en Lempiras: <u>Once mil cuatrocientos</u>		ISV 18 %	
<b>FACTURA</b>		<b>TOTALL.</b> 11,400.00	
<b>N° 000-001-01-000000001</b>			
CAI: 5C9A00-334C58-4448AD-38F79D-F09180-2A			
Rango Autori.: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100			
Fecha de Recepción: 13/11/2023 2 Tal. Fecha Limite de Emision: 13/05/2024			
IMPRESM - RTN 06061972003015 - Tel.: 9672-5008 • 9803-9285			
Certificado N° 9231-22-10500-101			



# ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
03	02	2024

Tel. 2650-2180 / 3259-1815  
RTN: 05049995126357

## COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: ConstruServicios Estructuras y Decoraciones RTN: 05019023561475

DIRECCIÓN: Col. La Hacienda Ponce, calle principal, Pimienta, Cortés

CAI / CAEE: 5C9AG0-334CS8-4448AD - 38F79D-F09180-2A NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00000001

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 03 de febrero de 2024

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1-	Retención del I.S.R	L.11,400.00	7%	794.00
				5
			TOTAL L.	794.00

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

Ciento catorce exactos

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00002001 AL 000-002-05-00002400

CAI: EB3155-456612-3E4DBE-F87685-6FFD98-50

000-002-05-00

Nº 002041

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION





**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A PARQUE, PIMIENTA CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



CHEQUE No. 00020636

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

3 de febrero de 2024

CONSTRUSERVICIOS ESTRUCTURAS Y DECORACIONES Y M.S. DE R.L.  
Páguese a la orden de

L 11,286.00

ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

10012130810000211110716100020636

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE PAGO COMO ANTICIPO POR AVANCES PRESENTADOS DEL CONTRATO DE PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA HECTOR VIRGILIO BARAHONA, REALIZANDO: EXCAVACION DE AGUJEROS, SOLDADURA DE PINES EN LOS TUBOS Y FUNDICION DE TUBO	11,286.00
CHEQUE No. <b>00020636</b>	HECHO POR 	REVISADO POR 
<b>RECIBI CONFORME</b>		

B.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL.: 2240-9999 (4 LINEAS) FAX: 2241-1313 FAX

R.R. Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

70239

4  
3  
2  
1



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta Cortes.

01 de Febrero del año 2024.

**Sr. Jesús Alberto Dubon**

Tesorero Municipal

Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:


A Continuación, le solicito el desembolso para **Construservicios, Estructuras Y Decoraciones YM S. De R.L.** Con Registro Nacional Tributario No: **05019023561475** por la cantidad de **L.11,400.00** como anticipo por avances presentados del contrato de **Proyecto De Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona.**

**Nota:** Hacer la retención del 01% del Impuesto sobre la renta ya que no presenta constancia de Pagos a Cuenta.

Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



  
**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta Cortes.  
29 de Enero del año 2024.

**Sr. Jesús Alberto Dubon**  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación, le notifico el contrato que ejecutaremos con el Sr. **Edward Fransuha Maradiaga Barrientos** con Documento Nacional de Identificación No: **0501-1995-00956** quien actúa en carácter de Gerente General de **Construservicios, Estructuras Y Decoraciones YM S. De R.L.** con Registro Nacional Tributario No: **05019023561475** Por Concepto de: **Servicios De Mano De Obra Contratados Para El Proyecto De Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona.**  
Consiste en:

Es la instalación de 66 M.L. de cerco de tubo con alambre de púas. En el Presente contrato EL CONTRATISTA Suministrara únicamente la Mano de Obra calificada para la ejecución del Proyecto, el cual cuenta con las siguientes actividades y especificaciones:

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Excavación de agujeros	Unidad	30	L80.00	L2,400.00
2	Soldadura de pines en los tubos de 2"	Unidad	30	L100.00	L3,000.00
3	Fundición de tubo de 2" de 2 metros con concreto	Unidad	30	L200.00	L6,000.00
4	Instalación de 8 hiladas de alambre de púas	ML	66	L140.00	L9,240.00
5	Limpieza General	Unidad	1	L1,360.00	L1,360.00
<b>Pago de mano de obra</b>					<b>L22,000.00</b>

Por un total de **L. 22,000.00 Exactos.**

FECHA DE INICIO 29/01/2024

FECHA DE FINALIZACION 17/02/2024.

Agradeciendo su colaboración.  
Atentamente:



**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM

CC.Archivo



**INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA**

Pimienta Cortes  
01 de Febrero del Año 2024.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	<b>Proyecto De Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona.</b>
UBICACION	<b>Col. El Jordán, Pimienta, Cortes.</b>
FINANCIAMIENTO	Fondos Propios Código: 15 00 008 000 001 47110 15-013-01
CONTRATISTA	<b>Construservicios, Estructuras Y Decoraciones YM S. De R.L Con RTN 05019023561475</b>
CONTRATO	Valor. <b>L. 22,000.00</b> Inicio: 29/01/2024 Finalización: 17/02/2024

**Sr. Jesús Alberto Dubon.**  
Tesorero Municipal.


A continuación, detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona.** Durante la fecha que comprende del día **Lunes 29 de Enero al Sábado 03 de Febrero del Año 2024.** Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- a) 30, Unidad, de Excavación de agujeros, Equivalente al 100%.
- b) 30 Unidad, de Soldadura de pines en los tubos de 2", Equivalente al 100%.
- c) 30 Unidad, De Fundición de tubo de 2" de 2 metros con concreto, Equivalente al 100%.


Hasta la fecha se han concluido a un 51.82% las actividades del servicio prestado, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 11,400.00 COMO ANTICIPO POR AVANCES AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**



  
**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM





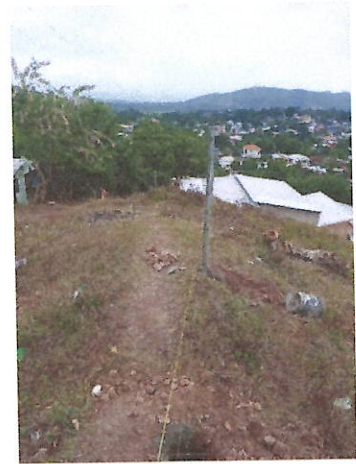



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 07/02/2024  
Hora : 09:23 a.m.  
USUARIO: GN.GALTAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30716

L: 550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16709

Fecha de Emisión: 7/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00020664

Paguese a: FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019015706715

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:


CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CERCADO DE LA ESC. HECTOR VIRGILIO BARAHONA.


CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
15 00 008 000 001 47110 15-013-01	Proyecto de cercado de la Esc. Hector Virgilio Barahona	550.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	71.74
Total de retenciones:		71.74

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	550.00
- RETENCIONES	71.74
<b>TOTAL</b>	<b>478.26</b>

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por:

Identidad No.: 05019015706715

0s+js/9JmeIY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/Exkcvj9EBCh8CT2KPRb3j3gXT4bESbPII5L4sHGEXYCAzusmoq/Zrrb0/QCS8xMumaFUzdFIksGMGL2hcqUR+ur  
gui5Cxa49tYqz74fhlJjnsQJ7E/Fb1qE



RTN: 05019015706715  
 Barrio Cabañas 3 Ave. 8 Calle  
 Villanueva Cortés, Honduras, C.A.  
 Tel: 2670-5150 Whatsapp 9828-1471  
 email: ferreteriacabanas@outlook.com

### Factura de Contado

No. 000-001-01-00213234

Fecha 08/02/2024

**Cliente**

Municipalidad de Pimienta  
 RTN: 05049995126357

Vendedor

Jova

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Identificativo de Registro de la SAG

Descripcion	cantidad	unidad	total
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	5	47.82609	239.13T
Disco de Corte De 4 METABO	5	47.826	239.13T

ORIGINAL

**QUINIENTOS CINCUENTA LPS.**

Valor en Letras

CAI:9F2F2E-8875EF-8346B3F-3CE3A3-83A21C-B2  
 Rango Autorizado  
 No. 000-001-01-00212001 - 000-001-01-00262000  
 Fecha Limite de Emisión: 25/01/2025

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

NO SE ACEPTAN DE VOLUCIONES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Descuento y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
<b>Subtotal</b>		<b>1.478.26</b>
I.S.V. 18%	L.	
I.S.V. 15% (15.0%)		L.71.74
<b>Total a pagar</b>		<b>1.550.00</b>



# ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés

E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
07	02	24

Tel. 2650-2180 / 3259-1815

RTN: 05049995126357

## COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Edificio y Terminal Cortés - Bo. El Centro RTN: 05049995126357

DIRECCIÓN: Bo. Cortés, Calle 3 No. Villa Nueva, Cortés

CAI / CAEE: 000-002-05-00002001 NO. CORRELATIVO: 000-002-05-00002044

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 07 de Febrero del 2024

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	<u>Impuesto de R.V.</u>	<u>475.26</u>	<u>15%</u>	<u>71.29</u>
			TOTAL L.	<u>71.29</u>

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00002001 AL 000-002-05-00002400

CAI: EB3155-456612-3E4DBE-F87685-6FFD98-50

**000 - 002 - 05 - 00**

**Nº 002044**

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION

IMPRENTA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \*RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-82





**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A PARQUE PIMIENTA CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

CHEQUE No. 00020664

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

7 de febrero de 2024

FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R L DE C V

Páguese a la orden de

L 478.26

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**


Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.


Firma(s)

00021130810000211111071600020664

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACION POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CERCADO DE LA BSC. HECTOR VIRGILIO BARAHONA.	478.26
CHEQUE No. 00020664	HECHO POR 	REVISADO POR



**FYTC**  
 FERRETERIA Y  
 TORNILLERIA CABAÑA  
 TEL: 05019015706715  
 TEL: 2670-5150



## ORDEN DE COMPRA

Contado Crédito✓

N.º 2024-026

Fecha: 06 de Febrero del 2024.

Señores: FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS

Sírvase entregar los productos detallados en el siguiente cuadro para uso exclusivo de esta Municipalidad de Pimienta:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VALOR TOTAL
05	Electrodo elefante 6011 libra	239.13
05	Disco de corte #4 Metabo	239.13
	.....ul.....	
	<b>IMPORTE CON ISV</b>	<b>L. 478.26</b>
	<b>ISV</b>	<b>L. 71.74</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>L. 550.00</b>

Dr. Raúl A. Ugarte  
Alcalde Municipal

Jesús Dubon  
Tesorero Municipal

Osán Rene Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros



---

**SOLICITUD**

**No: 2024-026**

Pimienta Cortes  
06 de Febrero del año 2024

Jefe de Presupuesto  
Su Oficina

A continuación, remito las siguientes cotizaciones PREVIAMENTE VERIFICADAS de **la compra de materiales para ser utilizados en el proyecto de Cercado de la Escuela Héctor Virgilio Barahona ubicado en la colonia el Jordán de este municipio**. Para lo cual le solicito la generación de Orden de pago y cheque a favor de: **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R. L. DE C. V**, con RTN No: **05019015706715** por la cantidad de **Lps. 550.00** para realizar la respectiva Compra de productos detallados en las cotizaciones adjuntas,

Se adjunta constancia electrónica de pagos a cuenta otorgada por el Sar.

Agradeciendo de antemano su colaboración.  
Atentamente.

Osman Rene Fúnez Portillo  
Jefe de Compras y Suministros





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Municipalidad De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortes.  
29 de Enero de 2024

**Sr. Osman René Fúnez**  
Jefe de Compras y Suministro.  
Su Oficina.

Reciba mi cordial saludo.

El motivo de la presente es para hacerle entrega del material a Cotizar materiales que serán utilizados en el **Proyectos De Cercado de La escuela Héctor Virgilio Barahona** Detallado a continuación:

DESCRIPCÓN DE MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD
1. Electrodo 6011	Libra	05 ✓
2. Disco de corte #4	Unidad	05 ✓

Sin más que decir.

**José Luis Paredes Arias**  
Asistente de U.T.M.



Barrio Cabanas 3ave Scalle  
Tel: 2670-5150  
Villanueva, Cortes  
RTN: 05019015706715

# Cotización

Fecha 2/2/2024

Numero 2876

### Cliente

Municipalidad de Pimienta  
RTN: 05049995126357

Description	Cantidad	Precio	Total
Electrodo Elefante 6011 de 1/8	5	47.82609	239.13T
Disco de Corte De 4 METABO	5	47.82609	239.13T

QUINIENTOS CINCUENTA LPS.

**Valor en Letras**

<b>Subtotal</b>	L478.26
<b>Impuesto 15% (I.V.A.)</b>	L71.74
<b>Total</b>	L550.00



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R L DE C V**  
Con Registro Tributario Nacional: **05019015706715**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-24-10500-9025 en fecha 13/01/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25271633240 de fecha 05/01/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202401, según Declaración 35747822783, presentada el 18/03/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-9025** o mediante el siguiente código QR:



Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la Aplicación Móvil del SAR.

# Documento Fiscal Válido



## OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**RTN:** 05019015706715  
**Nombre o Razón Social:** FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R L DE C V  
**Nombre Comercial:** FERRETERIA Y TORNILLERIA CABAÑAS S DE R L DE C V  
**Teléfono:** 26705150 98281471  
**Email:** hotelsanjuanhn@gmail.com  
**Dirección de Casa Matriz:** BARRIO:CABAÑAS, CALLE: 8 , 3VENIDA , CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES  
**Dirección de Establecimiento:** DIRECCION: CABAÑAS, 8 , 3VENIDA , No. S/N, MUNICIPIO: VILLANUEVA, DEPARTAMENTO: CORTES

## GENERALES

**Número del Documento:** 000-001-01-00205402  
**Fecha de Autorización:** 10/02/2023  
**Modalidad:** SFC en Red Fijo  
**Tipo de Documento:** FACTURA  
**Fecha de Vencimiento:** 10/02/2024 ✓  
**CAI:** 85D1C8-66D11C-CC45AB-D2F5AB-B13C02-F5  
**Desde (Rango Autorizado):** 000-001-01-00162001  
**Hasta (Rango Autorizado):** 000-001-01-00212000

## TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



República de Honduras  
Servicio de Administración de Rentas  
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión 22/11/2019

RTN: 05019015706715

**FERRETERIA Y TORNILLERIA CABANAS S DE R L DE C V**  
Nombre o Razon Social

Inscripciones		
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 192 de 1974 (reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002); Art. 16 del Decreto N° 25 de la Ley de Ingresos sobre Ventas; Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Recaudación por Bancario Acuerdo 43 de 1973; Art. 30, 39 y 56 Decreto 17-2010; Art. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 65, 69 numeral 1 y 4, 154 del Código Tributario

  
Ministra Directora

  
 **SAR**

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 de Código Tributario

"Tributar es ProgreSAR"

Numero de Documento SAR-412- 3328300

Transaccion 28371E



Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/02/2024  
Hora : 01:15 p.m.  
USUARIO: GN.GALEAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30726

L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16715

Fecha de Emision: 8/2/2024

No. Cheque/Nota de Debito: 00026671

Pagase a: JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ

Id/RTN: 05111981009578

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE ARENA CON VOLQUETA PEQUEÑA EN APOORTE AL PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. HECTOR VIRGILIO BARAHONA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 008 000 001 47110 15-013-01	Proyecto de cercado de la Esc. Hector Virgilio Barahona	1,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00



Firma y Sello del Presupuesto

Handwritten signature and stamp of JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ, with RTN: 05111981009578 and phone numbers: CEL: 9504-6280 / 9889-5062.

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:


Identidad No.: 0511-1981-00957

# INVERSIONES GUTIERREZ

Prop. Joel Edgardo Gutierrez Gutierrez  
 Cel.: 9889-5062 - E-mail: joelegutierrez81@gmail.com  
 Las Flores, 8-9 Calle, 4 Ave., Media Cuadra Antes Del  
 Colegio San Ramon, Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 05111981009578

Cliente: <b>Municipalidad de Pimienta</b>	Fecha: <b>09 / 02 / 24</b>
R.T.N. <b>05049995120357</b>	Tel.:
Dirección: <b>Bo. El Centro</b>	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
01	viaje de Arena	800 00	1,800 00



**FACTURA**  
**00-001-01-00**  
**Nº 000343**

Nº de Orden de Compra Exenta:  
 Nº de Registro Exonerado:  
 Nº de Registro SAG:  
 Fecha de Emisión: 23/03/2023  
 Fecha límite de Emisión 23/03/2024  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Firma:

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,800 00</b>

son: **Mil ochocientos.**

IMPRESA MI BENEFICION, R.T.N.: 0501198038230, Cel.: 3155-5680, Certificado N° 9231-21-10500-95 - QUIMICO



**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE A PARQUE, PIMIENTA CORTES, HONDURAS, C.A.

Cuenta No. 2111110716



**CHEQUE No. 00020671**

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

8 de febrero de 2024

JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ

L 1,800.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CON CER0 CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

001211306000021111071600020671

00274

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN POR CONCEPTO DE UN VIAJE DE ARENA CON VOLQUETA PEQUEÑA EN APORTE AL PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. HECTOR VIRGILIO BARAHONA.	1.800.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00020671		
		RECIBI CONFORME

**INVERSIONES GUTIERREZ**  
RTN. 05111981009575  
CEL: 9504-6280 / 9889-5062  
VILLANUEVA, CORTÉS

Banco DAVIVIENDA, S.A. DE C.V. TEL: 2240-6000 R.C.M. 221 13011306





MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES  
**CONTROL DE VIAJES**  
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Nº  
 2024

FECHA: 29-01-2024  
 PROYECTO: Cercado de la Uector  
 PROPIETARIO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD Viaje de Arena.

BARRIO, COLONIA O SECTOR	TIPO DE VIAJES	MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	TAMAÑO DEL VEHICULO	CANTIDAD
<u>Col. El Jordan</u>	ACARREO <input type="checkbox"/> VIAJE <input checked="" type="checkbox"/>	<u>Arena</u>	<u>Volqueta</u>	GR. <input type="checkbox"/> PQ. <input checked="" type="checkbox"/>	<u>01</u>
	ACARREO <input type="checkbox"/> VIAJE <input type="checkbox"/>			GR. <input type="checkbox"/> PQ. <input type="checkbox"/>	<u>—</u>
	ACARREO <input type="checkbox"/> VIAJE <input type="checkbox"/>			GR. <input type="checkbox"/> PQ. <input type="checkbox"/>	<u>—</u>
	ACARREO <input type="checkbox"/> VIAJE <input type="checkbox"/>			GR. <input type="checkbox"/> PQ. <input type="checkbox"/>	<u>—</u>
	ACARREO <input type="checkbox"/> VIAJE <input type="checkbox"/>			GR. <input type="checkbox"/> PQ. <input type="checkbox"/>	<u>—</u>

SUPERVISOR David Ramirez FIRMA



MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA CORTES  
**CONTROL DE VIAJES VOLQUETAS**  
 UNIDAD TECNICA MUNICIPAL




Nº  
 2024

FECHA: \_\_\_\_\_  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_  
 PROPIETARIO: \_\_\_\_\_

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD \_\_\_\_\_

BARRIO, COLONIA O SECTOR	TIPO DE VIAJES	MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	TAMAÑO DEL VEHICULO	CANTIDAD
_____	ACARREO <input type="checkbox"/> VIAJE <input type="checkbox"/>	_____	_____	GR. <input type="checkbox"/> PQ. <input type="checkbox"/>	_____
_____	ACARREO <input type="checkbox"/> VIAJE <input type="checkbox"/>	_____	_____	GR. <input type="checkbox"/> PQ. <input type="checkbox"/>	_____
_____	ACARREO <input type="checkbox"/> VIAJE <input type="checkbox"/>	_____	_____	GR. <input type="checkbox"/> PQ. <input type="checkbox"/>	_____
_____	ACARREO <input type="checkbox"/> VIAJE <input type="checkbox"/>	_____	_____	GR. <input type="checkbox"/> PQ. <input type="checkbox"/>	_____
_____	ACARREO <input type="checkbox"/> VIAJE <input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____	GR. <input type="checkbox"/> PQ. <input type="checkbox"/>	_____

SUPERVISOR \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_



REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortés*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta, Cortés.  
06 de Febrero del Año 2024.

**Sr. Jesús Alberto Dubon.**  
Tesorero Municipal.  
Su Oficina.

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación, le notifico la cuenta por pagar que tenemos pendiente con el Sr. **Joel Edgardo Gutiérrez Gutiérrez**, con DNI No. **0511-1981-00957**, Por viaje de Arena con volqueta pequeña en aporte al **Proyecto De Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona**.

FECHA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
29/01/2024	01	Viajes de Arena con volqueta Pequeña para reparación de calle hacia <b>Col. El Jordán</b> .	1,800.00	L. 1,800.00
<b>Total</b>			<b>Lps. 1,800.00</b>	

**Total, Lps. 1,800.00 Exactos.**

Agradeciendo su colaboración.  
Atentamente:



**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM



## COTIZACION

PROVEEDOR: JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ  
ID:0511-198100957

PARA: MUNICIPALIDAD DE PIMIENTA  
FECHA: 26 DE ENERO DEL AÑO 2024

CANTIDAD	TRABAJO-LUGAR	PRECIO UNITARIO	TOTAL LPS
1	Viaje de arena con volqueta pequeña.	1,800.00	L. 1,800.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 1,800.00</b>

  
JOEL EDGARDO GUTIERREZ GUTIERREZ  
ID. 0511-1981-00957  
VILLAGEVA, CORTÉS





Honduras, C.A.

PIMIENTA, CORTÉS  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 09/02/2024

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: GN.GALEAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 30742

L.: 10,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 16729

Fecha de Emisión: 9/2/2024

No. Cheque/Nota de Débito: 00020685

Páguese a: CONSTRUSERVICIOS ESTRUCTURAS Y DECORACIONES YM S. DE R.L.

Id/RTN: 05019023561475

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. HECTOR VIRGILIO BARAHONA, REALIZANDO A SU CABALIDAD LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 66 ML DE INSTALACIÓN DE 8 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y 1 UNIDAD DE LIMPIEZA GENERAL, DURANTE EL PERIODO DEL DE ENERO AL DE FEBRERO DEL 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 00 008 000 001 47110 15-013-01	Proyecto de cercado de la Esc. Hector Virgilio Barahona	10,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	106.00
Total de retenciones:		106.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,600.00
- RETENCIONES		106.00
TOTAL		10,494.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 05 01 - 1995 - 0986

0s+tjs/j9JmelY1VwM7KxyE3fDTzUNVt529KyjM9/ExkcVjOBCh6CT2KPRb3r3gXT4bESbPifl5L4sHGEXYCAzusnoq/Zrrb0/QCS8xMumaFUzdfllksGMGL2hcqUR+ur  
gui5Cxa49tYqz74fhIJnsQJ7E/Fb1qE

# CONSTRUSERVICIOS ESTRUCTURAS Y DECORACIONES YM S. DE R.L.

Colonia La Hacienda, Calle Principal, Telefono: 8847-7842  
Potrerillos, Cortés Correo: ymaradiaga.coedyn@gmail.com  
R.T.N. 05019023561475

Potrerillos, 10 de febrero del 202 4  
Cliente: Municipalidad de Pimienta  
R.T.N. 05049995172359 DIRECCIÓN

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	VALOR
01	Cancelación al contrato de Mano de obra del Proyecto de Cercado de La Esc. Hector Virgilio Barahona.	10,600	10,600.00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

**DATOS DE EXONERADO**

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Registro SAG \_\_\_\_\_

Son en Lempiras: Diez Mil Seis-

**FACTURA**

**Nº 000-001-01-00000002**

CAI: 5C9A00-334C58-4448AD-38F79D-F09180-2A

Rango Autori.: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

Fecha de Recepción: 13/11/2023 2 Tal. Fecha Limite de Emision: 13/05/2024

IMPRESM - RTN 08061972003015 - Tel.: 9672-5008 • 9803-9285

Certificado Nº 9231-22-10500-101

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento ISV	
Importe Gravado 15%	
Importe Gravado 18%	
ISV 15 %	
ISV 18 %	
<b>TOTALL.</b>	<b>10,600.00</b>



# ALCALDIA MUNICIPALIDAD NUEVA PIMIENTA

Bo. El Centro, Esquina Opuesta al Parque Central, Nueva Pimienta, Cortés  
E-mail: raulugarte2013@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
09	02	24

Tel. 2650-2180 / 3259-1815  
RTN: 05049995126357

## COMPROBANTE DE RETENCION

CLIENTE: Contratistas Estructurales y Decoraciones YMS de RL RTN: 05019023561475

DIRECCIÓN: Colonia La Herrería Calle Principal Kohenillos Cortés  
509A00-334058-4449AD-351710

CAI / CAEE: 504130 - ZA NO. CORRELATIVO: 000-001-01-00000002

FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE VENTA: 10 de Febrero del 2024

No.	DESCRIPCION DEL IMPUESTO RETENIDO	BASE IMPONIBLE	% DE RETENCION	IMPORTE TOTAL RETENIDO
1	Retención de ISR	10,600.00	1%	106.00
			TOTAL L.	106.00

Original: Retenido 1° Copia: Contabilidad 2° Copia: Obligado Tributario Emisor \* Fecha Límite de Emisión: 09/01/2025

Escribir en Letras el Importe Total Retenido L.

RANGO AUTORIZADO: 000-002-05-00002001 AL 000-002-05-00002400

CAI: EB3155-456612-3E4DBE-F87685-6FFD98-50

000-002-05-00

Nº 002063

FIRMA Y SELLO DEL AGENTE DE RETENCION



IMPRESA VILLANUEVA, TELS. 3369-3704 / 2670-5458. E-mail: imprenta\_villanueva@yahoo.com \*RTN: 05101978005402. RFI: 9231-22-10500-87



**MUNICIPALIDAD DE  
NUEVA PIMIENTA**

Bo. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL FRENTE  
A PARQUE, PIMIENTA  
CORTES, HONDURAS, C.A.



Cuenta No. 2111110716

**CHEQUE No. 00020685**

PIMIENTA  
Lugar y Fecha

9 de febrero de 2024

CONSTRUSERVICIOS ESTRUCTURAS Y DECORACIONES YM S. DE R.L.

L 10,494.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

⑆0 1 2 1 1 3 0 8 ⑆0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 9 1 6 ⑆0 0 0 2 0 6 8 5

R/R Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.


0288

**MUNICIPALIDAD DE NUEVA PIMIENTA**

No. ORDEN DE PAGO	DESCRIPCION	VALOR LEMPIRAS
	PAGO DE CANCELACIÓN AL CONTRATO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO DE CERCADO PERIMETRAL DE LA BSC. HECTOR VIRGILIO BARAHONA, REALIZANDO A SU CABALIDAD LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 66 ML DE INSTALACIÓN DE 8 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS Y 1 UNIDAD DE LIMPIEZA GENERAL, DURANTE EL PERIODO DEL DE ENERO AL DE FEBRERO DEL 2024.	10,494.00
CHEQUE No.	HECHO POR	REVISADO POR
00020685		
		RECIBI CONFORME

R/R DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. N.I.C. 2240-0000-RR-10-223-1271121040





REPUBLICA DE HONDURAS  
*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*  
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



Pimienta Cortes.  
06 de Febrero del año 2024.

**Sr. Jesús Alberto Dubon**  
Tesorero Municipal  
Su Oficina

Reciba mi cordial saludo:

A Continuación, le solicito el desembolso para **Construservicios, Estructuras Y Decoraciones YM S. De R.L.** Con Registro Nacional Tributario No: **05019023561475** por la cantidad de **L. 10,600.00** como Cancelación al contrato de Mano de Obra por el **Proyecto De Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona.**

**Nota:** Hacer la retención del 01% del Impuesto sobre la renta ya que no presenta constancia de Pagos a Cuenta.


Agradeciendo su colaboración.

Atentamente:



  
**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM

CC.Archivo



REPUBLICA DE HONDURAS

*Alcaldía Municipal De Pimienta, Cortes*

UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



**INFORME DE SUPERVISION Y AVANCE DE MANO DE OBRA**

Pimienta Cortes

06 de Febrero del Año 2024.

INFORMACION DEL PROYECTO:

NOMBRE	Proyecto De Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona.
UBICACION	Col. El Jordán, Pimienta, Cortes.
FINANCIAMIENTO	Fondos Propios Código: 15 00 008 000 001 47110 15-013-01
CONTRATISTA	Construservicios, Estructuras Y Decoraciones YM S. De R.L Con RTN 05019023561475
CONTRATO	Valor. L. 22,000.00 Inicio: 29/01/2024 Finalización: 17/02/2024

**Sr. Jesús Alberto Dubon.**

Tesorero Municipal.

A continuación, detallo las actividades realizadas en el avance del proyecto: **Cercado Perimetral De La Escuela Héctor Virgilio Barahona**. Durante la fecha que comprende del día **Lunes 05 de Febrero al Martes 06 de Febrero del Año 2024**. Para lo cual informo lo siguiente:

Se completaron las siguientes actividades:

- a) 66, ML, de Instalación de 8 hiladas de alambre de púas, Equivalente al 100%.
- b) 01 Unidad, de Limpieza General, Equivalente al 100%.

Hasta la fecha se han concluido a un 100.00% las actividades del servicio prestado, por lo cual solicito **LA CANTIDAD L. 10,600.00 COMO CANCELACION AL CONTRATO DE MANO DE OBRA.**



**Henry Javier Rodas Andino**  
Jefe de UTM

CC.Archivo

