



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024  
Hora : 10:58 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12439

L.: 263,111.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14938

Fecha de Emisión: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE

Id/RTN: 0607198800113

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Modulos Sanitarios y Tanque de agua 2500 Lts y fosda septica tipo II en el Centro de Educacion Basica Lucas Quezada de la Comunidad de Tegujal (Programa Nacional de Intervencion de Infraestructura Escolar)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 019 001 000 23400 11-011-08	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS (PRI 5-6 A) Y TANQUE DE AGUA DE 2,500 GAL Y PILETA Y FOSA SÉPTICA TIPO II C.E.B LUCAS QUEZADA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	263,111.07

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	263,111.07
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>263,111.07</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Selvin Javier Baquedano Valle  
 Identidad No.: 0607198800113

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZA9yWJ4nx/VmpyDxCozM/LADCahRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S  
 AhEX5o4v0knFTKcTsXICOBLOi81Np9hXm/4



*Alcaldía Municipal*  
*Municipalidad de Arenal*  
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



## AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al  
Señor (A): SELVIN JABIER BAQUEDANO VALLE Con tarjeta de  
Identidad No. 0607-1988-00113  
La cantidad de Lps 263,111.07

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS CON SIETE  
CENTAVOS.

Cantidad en letras

Por concepto de:

Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Módulos Sanitarios y Tanque de agua 2500 Lts y fosa séptica tipo II en el Centro de Educación Básica Lucas Quezada de la Comunidad de Teguajal (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar)

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 14 días del mes Agosto del Año 2024.

  
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal





**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**ARENAL-YORO**

***INFORME DE AVANCE No.2 (70%)***

**CENTROS EDUCATIVOS:**

- INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO***
- KINDER GABRIELA MISTRAL***
- CEB. LUCAS QUEZADA.***
- ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE***

**FECHA:**

**13-AGOSTO-2024**

**EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES  
BAQUEDANO S. de R.L.**

**CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE YORO.**

EN TODO LOS CENTROS EDUCATIVOS SE ESTA TRABAJANDO EN LAS INSTALACION DE PAREDES, FUNDICION DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES: COLUMNAS, CASTILLOS, JAMBAS Y SOLERAS CARGADOR.

EN LAS PAREDES INTERIORES LA SUPERVISION AUTORIZO USAR BLOQUE DE 5" PORQUE EN ESE MOMENTO NO HABIA PRODUCCION DE BLOQUE DE 4" Y SU PRODUCCION TARDARIA 2 SEMANAS.

SE ESTA FINALIZANDO LA CONSTRUCCION DE LOS TANQUES EN LOS 3 CENTROS EDUCATIVOS CORREPONDIENTE **KINDER GABRIELA MISTRAL, INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO, CEB. LUCAS QUEZADA.**

SE ESTA TERMINADO LA FOSA SEPTICA TIPO II EN EL **CEB LUCAS QUEZADA**  
~~TAMBIEN SE FUNDIERON LOS FIRMES DE CONCRETO, SE TERMINO LA~~  
TUBERIA SANITARIA COMO SER: SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE CON SUS REPECTIVOS CAJAS DE REGISTRO FINALIZANDO 15 DE AGOSTO.

EL DIA 30 DE JULIO INGRESO EL MATERIAL PISO DE GRANITOS Y TERRAZOS.

SE HIZO LA COMPRA DE LOS 3 TANQUES DE 2500 LTS

SE HIZO LA COMPRA DE LAS PLACAS CONMEMORATIVAS TIPO MARMOL DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS.

~~SE ESTA FINALIZANDO LA CULATAS PARA LA ESTRUCTURA DE TECHO.~~


NOTA:

~~SE TUVO PROBLEMAS CON EL ABASTECIMIENTO DE MADERA POR FALTA DE PRODUCCION EN LOS ACERRADEROS CERCANOS.~~

TAMBIEN HUBO ATRAZO DE UNA SEMANA Y MEDIA POR PARTE DE LA BLOQUERA LA MODERNA CON LOS ULTIMOS BLOQUE DE 6".

**ACTIVIDADES:**

**INSTITUTO JACOBO V CARCAMO, MODULO SANITARIO Y TANQUE.**

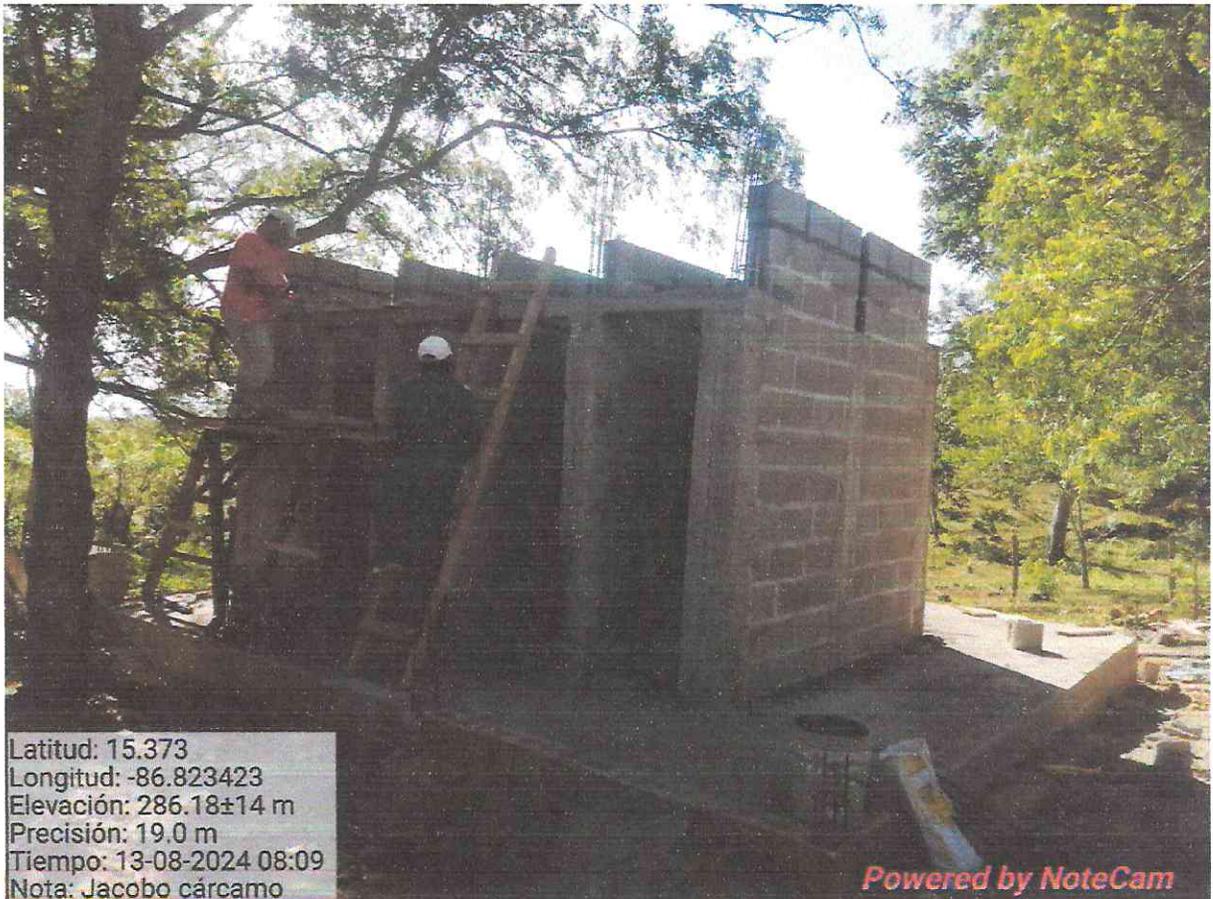


Latitud: 15.373  
Longitud: -86.823423  
Elevación: 286.18±14 m  
Precisión: 19,0 m  
Tiempo: 13-08-2024 08:09  
Nota: Jacobo cárcamo



**ACTIVIDADES:**

**KINDER GABRIELA MISTRAL, MODULO SANITARIO Y TANQUE.**

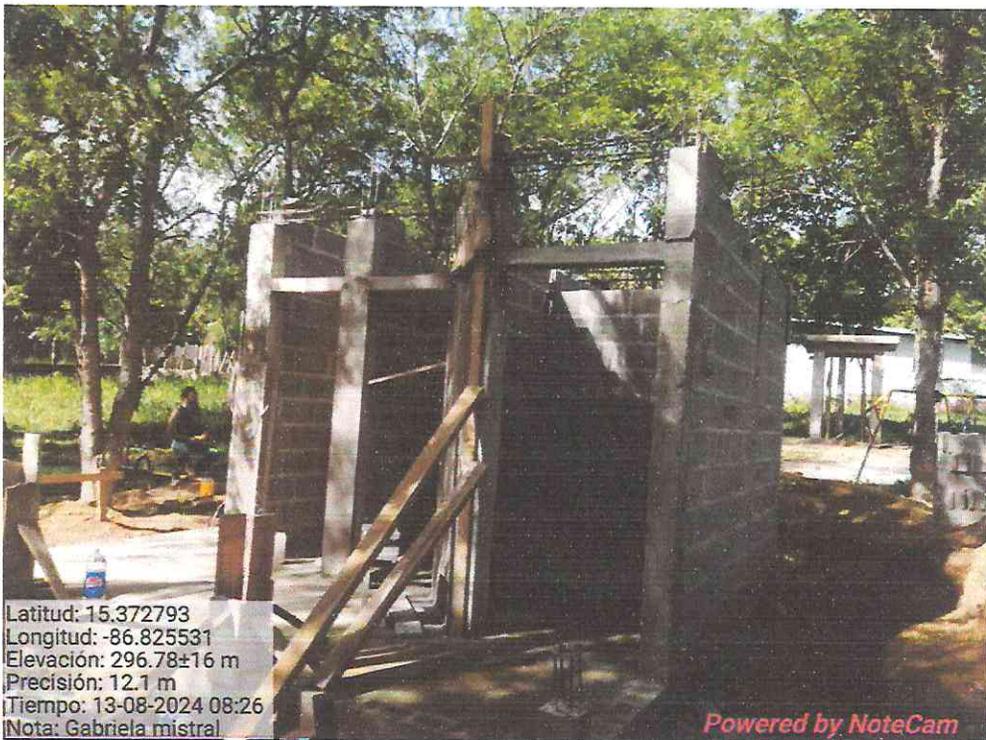





Latitud: 15.372438  
Longitud: -86.825814  
Elevación: 302.97±4 m  
Precisión: 42.5 m  
Tiempo: 13-08-2024 08:25  
Nota: Gabriela mistral

Powered by NoteCam

**ACTIVIDADES:**


**CEB LUCAS QUEZADA, FOSA SEPTICA TIPO II, MODULO SANITARIO Y TANQUE.**

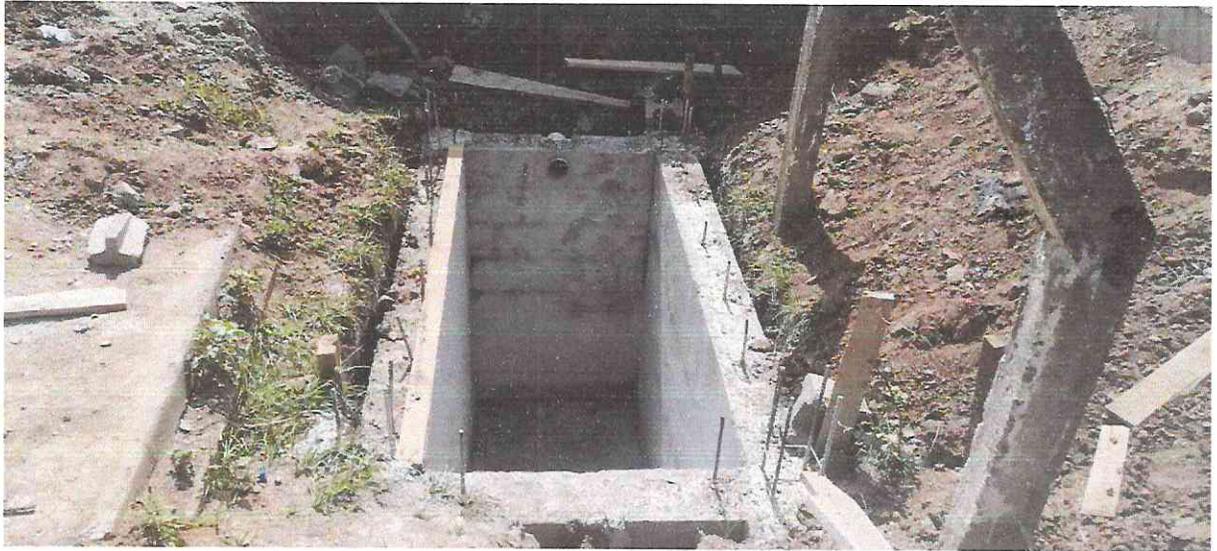

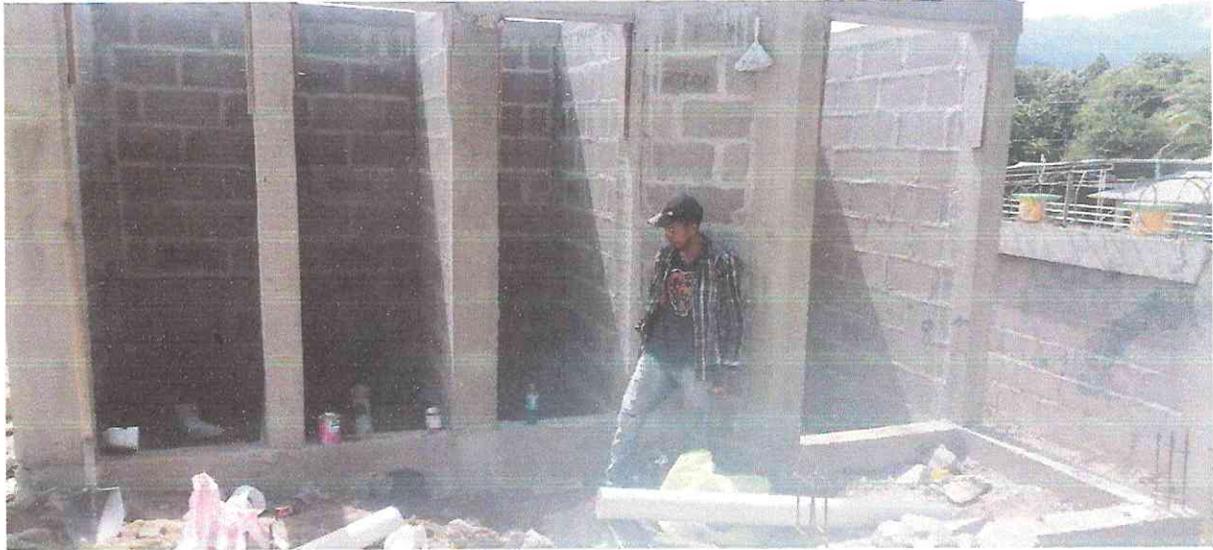

**ACTIVIDADES:**

**ESCUELA CARLOS IZAGUIRREB AULA 6X8 MODULO SANITARIO.**

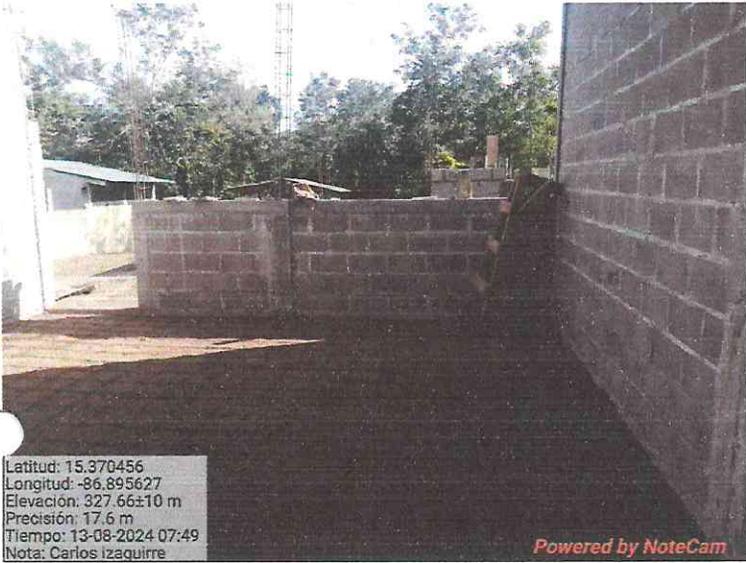



**PLACAS CONMEMORATIVAS:**

