



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024  
Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12441

L.: 168,776.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14940

Fecha de Emision: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE

Id/RTN: 0607198800113

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripcion:

Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Módulos Sanitarios y Tanque de agua elevado 2500 Lts en el Jardín de Niños Gabriela Mistral del Casco Urbano del Municipio (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 017 001 000 23400 11-011-08	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PRI3-4 TANQUE DE AGUA DE 2,500 GAL Y PILETA JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	168,776.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	168,776.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>168,776.01</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Selvin Javier Baquedano Valle  
 Identidad No.: 6607198800113

0s+js/j9Jmd+u0vkylJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyuCUZA9yMTTnVmpyDxCozMjLADCafrRldWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6lx1O40E7Y+S  
 AhEX5o4v0knFTKCsXICOBLOI81Np9hXm/4



Honduras, C.A.

ARENAL, YORO  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/08/2024  
Hora : 11:19 a.m.

USUARIO: MARYORI.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12441

L.: 168,776.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14940

Fecha de Emision: 14/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE

Id/RTN: 0607198800113

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripcion:

Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Módulos Sanitarios y Tanque de agua elevado 2500 Lts en el Jardin de Niños Gabriela Mistral del Casco Urbano del Municipio (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 017 001 000 23400 11-011-08	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PRI3-4 TANQUE DE AGUA DE 2,500 GAL Y PILETA JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	168,776.01

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	168,776.01
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>168,776.01</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Selvin Javier Baquedano Valle  
Identidad No.: 0607198800113

0s+js/f9Jmd+u0vkiJIEOS+PsS0c2vEwDKbhr4SEwWyCUZ49yMTLmVmpyDxCozmjLADCAhRIdWA5dl8cR4mai6eBrVyWCANIQufQT+/02rOR1Z6x1O40E7Y+S  
AhEX5o4v0knFTKctsXICOBLOI81Np9hXm/4



*Alcaldía Municipal*  
*Municipalidad de Arenal*  
Honduras C.A. Teléfono 433-0127, 433-0128, 433-0232



## AUTORIZACIÓN

Yo Carlos Alberto Zuniga Lagos, en mi condición de Alcalde Municipal de Arenal, Departamento de Yoro, por medio de la presente.

Autorizo: al Joven: **Jetse Iván Zuniga Cruz.**

Cargo de: **Tesorero Municipal** para que entregue al  
Señor (A): **SELVIN JABIER BAQUEDANO VALLE** Con tarjeta de  
Identidad No. **0607-1988-00113**  
La cantidad de Lps **168,776.01**


**SIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS**  
**CON UN CENTAVOS.**

Cantidad en letras

Por concepto de:

Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Módulos Sanitarios y Tanque de agua elevado 2500 Lts en el Jardín de Niños Gabriela Mistral del Casco Urbano del Municipio (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar)

Y para constancia de lo anterior firmo la presente en el Municipio de Arenal, Departamento de Yoro a los 14 días del mes Agosto del Año 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Carlos Alberto Zuniga Lagos  
Alcalde Municipal



ARENAL. Fundada en 1856 con el impulso renovador de sus hijos y la ayuda estatal se convertirá dentro de muy poco en uno de los municipios desarrollados del departamento de Yoro



**TABLA DE CUMPLIMIENTO:**

Con base en la visita de campo en el proceso de ejecución de intervención de infraestructura del centro educativo antes mencionado se observa lo siguiente:

DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Calidad de materiales utilizados	✓		
2. Cuenta con mano de obra calificada	✓		
3. Cumple con Normativa (Manual para la planificación y Diseño de Centros Educativos)	✓		Con Observaciones
4. Cumple con especificaciones Técnicas definidas por DIGECEBI	✓		
5. Cuenta con Rotulo informativo del Proyecto a ejecutarse.	✓		
6. Cuenta con Bitácora o doc. de respaldo		✓	


**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**


\* Modulo de Bonos pre 3-4A con gan menos  
 \* Jaque con columnas a 1.50 y no a 1.70

**ENCARGADO/SUPERVISOR:**

Nombre completo:	Rimsky Elliot Nunez Parada
Cargo:	Control de Calidad
Fecha de Evaluación:	29/8/2014

*Elliot Nunez*  
 Ing. Rimsky Elliot Núñez  
 Técnico Supervisor del Proyecto  
 DIGECEBI

Responsable de la Obra:	<i>Teresa Nunez</i> 
-------------------------	---

Educación	<b>FICHA DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>		
	Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles - DIGECEBI		
	<b>PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>		

## INFORME TECNICO DE SUPERVISIÓN POR CENTRO EDUCATIVO

CODIGO DE PROYECTO:

GENERALIDADES DEL CENTRO EDUCATIVO:

Nombre del centro educativo: <i>In. Gabriela Mistral</i>			
Código SACE:			
Nivel Educativo:			
Matrícula SACE:		No. Docentes:	
Departamento:	Yoro	Municipio:	<i>Azuero</i>
Dirección: <i>Cosco Urbano.</i>			
Coordenadas: <i>15° 22' 22.00" N</i>			
<i>96° 49' 31.60" O</i>			

INFORMACIÓN DEL PROYECTO:

Tipo de Intervención:				<i>Construcción Nueva</i> / Remodelación / Construcción y Reparación	
Población Beneficiaria:					
Descripción general del proyecto a ejecutar:				<i>1 Módulo de Baños Pri-3AA 1 tanque de 2500</i>	
No. Aulas Nuevas:		No. De Módulos Sanitarios Nuevos:	<i>1</i>	Contraparte:	L.
No. Aulas reparadas:		No. De Módulos Sanitarios Reparados:		Inversión (Lps; \$; €)	L.
Entidad Ejecutora:		<i>Alcaldía Municipal/ Otras</i>			
Fuente de financiamiento		FONDOS NACIONALES DESCENTRALIZADOS			
Fecha de inicio Programada:			Fecha Final Programada:		
Fecha de finalización:			Duración de ejecución:		
Avance (%):	<i>100%</i>	Estado:	<i>20%</i>		

**ALCALDIA MUNICIPAL**  
**ARENAL-YORO**

***INFORME DE AVANCE No.2 (70%)***

**CENTROS EDUCATIVOS:**

- INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO***
- KINDER GABRIELA MISTRAL***
- CEB. LUCAS QUEZADA.***
- ESCUELA CARLOS IZAGUIRRE***

**FECHA:**

**13-AGOSTO-2024**

**EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES  
BAQUEDANO S. de R.L.**

## **CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE YORO.**

EN TODO LOS CENTROS EDUCATIVOS SE ESTA TRABAJANDO EN LAS INSTALACION DE PAREDES, FUNDICION DE ELEMNTOS ESTRUCTURALES: COLUMNAS, CASTILLOS, JAMBAS Y SOLERAS CARGADOR.

EN LAS PAREDES INTERIORES LA SUPERVISION AUTORIZO USAR BLOQUE DE 5" PORQUE EN ESE MOMENTO NO HABIA PRODUCCION DE BLOQUE DE 4" Y SU PRODUCCION TARDARIA 2 SEMANAS.

SE ESTA FINALIZANDO LA CONSTRUCCION DE LOS TANQUES EN LOS 3 CENTROS EDUCATIVOS CORREPONDIENTE **KINDER GABRIELA MISTRAL, INSTITUTO JACOBO V. CARCAMO, CEB. LUCAS QUEZADA.**

SE ESTA TERMINADO LA FOSA SEPTICA TIPO II EN EL **CEB LUCAS QUEZADA** TAMBIEN SE FUNDIERON LOS FIRMES DE CONCRETO, SE TERMINO LA TUBERIA SANITARIA COMO SER: SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y AGUA POTABLE CON SUS REPECTIVOS CAJAS DE REGISTRO FINALIZANDO 15 DE AGOSTO.

EL DIA 30 DE JULIO INGRESO EL MATERIAL PISO DE GRANITOS Y TERRAZOS.

SE HIZO LA COMPRA DE LOS 3 TANQUES DE 2500 LTS

SE HIZO LA COMPRA DE LAS PLACAS CONMEMORATIVAS TIPO MARMOL DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS.

SE ESTA FINALIZANDO LA CULATAS PARA LA ESTRUCTURA DE TECHO.

### **NOTA:**


SE TUVO PROBLEMAS CON EL ABASTECIMIENTO DE MADERA POR FALTA DE PRODUCCION EN LOS ACERRADEROS CERCANOS.

TAMBIEN HUBO ATRAZO DE UNA SEMANA Y MEDIA POR PARTE DE LA BLOQUERA LA MODERNA CON LOS ULTIMOS BLOQUE DE 6".



**ACTIVIDADES:**

**INSTITUTO JACOBO V CARCAMO, MODULO SANITARIO Y TANQUE.**

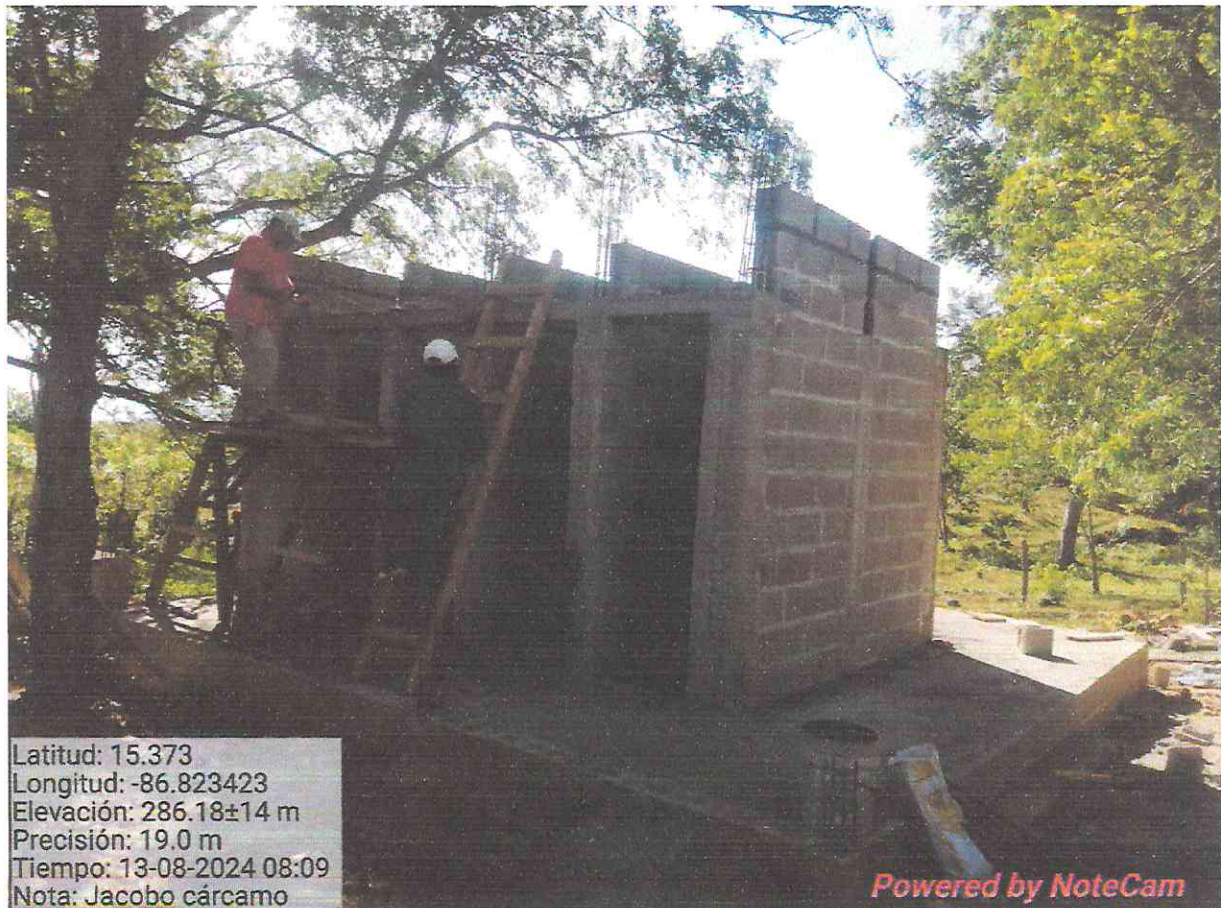



**ACTIVIDADES:**

**KINDER GABRIELA MISTRAL, MODULO SANITARIO Y TANQUE.**





**ACTIVIDADES:**


**CEB LUCAS QUEZADA, FOSA SEPTICA TIPO II, MODULO SANITARIO Y TANQUE.**





**ACTIVIDADES:**





**ESCUELA CARLOS IZAGUIRREB AULA 6X8 MODULO SANITARIO.**

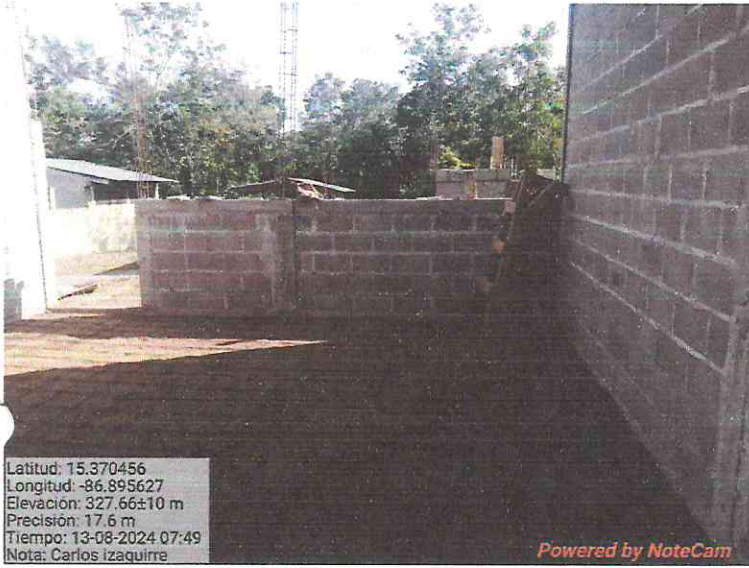





**PLACAS CONMEMORATIVAS:**





**MUNICIPALIDAD DE ARENAL, YORO**  
ARENAL, YORO, HONDURAS

**CHEQUE No. 00017146**

ARENAL

14 de agosto de 2024

Cuenta No. 3101093257

Lugar y Fecha

SELVIN JAVIER BAQUEDANO VALLE

L 168,776.01

Páguese a la orden de

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



**DAVIVIENDA**

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.

Firma(s)

0013103040000310109325700017146

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

02727


**CONCEPTO DEL PAGO**

PAGO DE Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Módulos Sanitarios y Tanque de agua elevado 2500 Lts en el Jardín de Niños Gabriela Mistral del Casco Urbano del Municipio (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar)

CUENTA Y SUB-CUENTA	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	<p>PAGO DE Tercer desembolso del 30% de contrato Proyecto construcción de Módulos Sanitarios y Tanque de agua elevado 2500 Lts en el Jardín de Niños Gabriela Mistral del Casco Urbano del Municipio (Programa Nacional de Intervención de Infraestructura Escolar)</p> 			

CHEQUE No. 00017146

BALANCE



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0600, 2545-0700 / CR.05-23 - 12PTT34501
