



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729

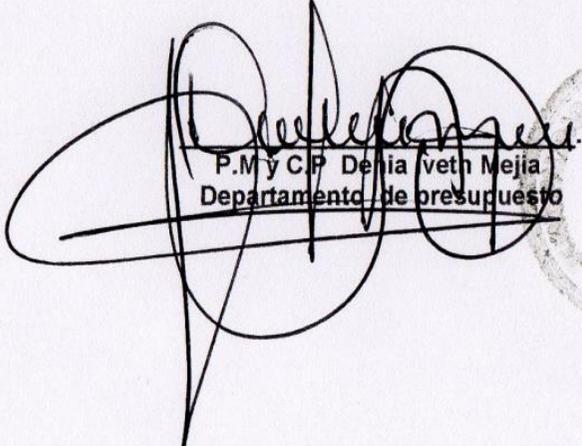


## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS

### ACUMULADO DE ENERO 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		110,000.00	12,075.00	12,075.00	97,925.00
2	Mantenimiento de sistema de agua por bombeo en sector Estadio de Futbol Las Ranas, Barrio San Nicolas y El Escondido	•Se contrató maquinaria especializada para realizar limpieza del pozo y revision de bomba sumergible	150,000.00	45,481.92	45,481.92	104,518.08
3	Construccion de sistema de alcantarillado sanitario en El Porvenir	•Se continúa con la construcción del filtro. El filtro se encuentra en la etapa de repello y pulido de paredes . •Se estima un avance del 90% del proyecto.	130,000.00	5,700.00	5,700.00	124,300.00
4	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano	•Se construyeron cajas de registro domiciliarias, se continúa con las excavaciones para realizar las conexiones domiciliarias. •Se estima un avance del 88% del total del proyecto.	140,000.00	4,800.00	4,800.00	135,200.00
5	Mejoramiento de calles, casco urbano	•Se esta trabajando en la señalizacion (Pintado) de bordillos del casco urbano. •Se contrataron jornales para limpieza de calles y cunetas	448,255.61	35,709.00	35,709.00	412,546.61
6	Construccion de gradas de acceso a Mirador El Pico, Barrio San Francisco	•Se hizo la preparacion del terreno	150,000.00	3,500.00	3,500.00	146,500.00
7	Mejoramiento de calles internas desde don Jose Lara hacia donde Don Margarito Alvarenga, de donde Melvin Carbajal hacia La Angostura y Los Pozos, de donde Paulino Melendez hasta donde Martin Mejia, aldea Nueva Concepcion	•Se ha reparado con las actividades de conformación tipo II, balastado y conformación Tipo I, los tramos de calles internas • Se estima un avance aproximado del 90%	230,000.00	74,500.00	74,500.00	155,500.00

8	Construccion de cancha sintetica, B° San Nicolas	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se fabricaron las puertas de camerinos y puerta y ventana de la caseta de ventas, instalación de placa conmemorativa, se instalaron camaras de seguridad y timbre con cronometro, y se colocaron banner del reglamento y señalizacion.</li> <li>•Se estima un avance aproximado del 99% del total del proyecto.</li> </ul>		55,317.00	55,317.00	(55,317.00)
9	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Se ha reparado con las actividades de conformación tipo II, balastado y conformación Tipo I, los tramos carreteros siguientes: Casco Urbano, El Porvenir, Las Brisas, El Carmen</li> <li>• Se estima un avance aproximado del 55%</li> </ul>	460,000.00	166,100.00	166,100.00	293,900.00
<b>TOTAL</b>				<b>403,182.92</b>	<b>403,182.92</b>	<b>1415,072.69</b>

  
 P.M y C/P Denia Iveth Mejia  
 Departamento de presupuesto

