

Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



26 Abril de 2018

Señorita.

Merary Cárcamo

Oficina de Acceso a la Información Pública

Su oficina.

Como jefe de **Unidad Técnica Municipal** de esta dependencia, por este medio remito a Usted la información correspondiente a las contrataciones Durante el mes de DICIEMBRE de 2016.

Adjunto el RESUMEN DE LAS CONTRATACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO.

Sin otro en particular.

Ing. Milton Porfirio Zambrano


Jefe Unidad Técnica Municipal

"Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo"
Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL RESUMEN DE CONTRATACIONDES EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016

	11	10	9	00		7	0		<u></u>	4	w	2	1	
	11 CUNETA EN NUEVO PROGRESO	10 PLANTA DE TRATAMIENTO	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	8 PLANTA DE TRATAMIENTO	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA		JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	4 PLANTA DE TRATAMIENTO		JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		CONTRATACION I ORNAI - ELIMIGACION MALEZA
	VARIOS	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	VARIOS	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ		VARIOS	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ		VARIOS	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ	VARIOS	MIGUEL ANTONIO FRANCO	NOMBRE DEL CONTRATADO
The distriction of the state of	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEFIC. U.I.MI.	DEBTO III	DEPTO. U.T.M.	DEPTO, U.T.M.		DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	DEPTO. U.T.M.	RESPONSABLE
	MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BARAHONA	SANITARIO	BARAHONA	REMODELACION TECHO ESCUELA MIGUEZ PAZ	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	BARAHONA	REMODELACION TECHO ESCUELA MIGUEZ PAZ	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION AULA ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	CONSTRUCCION ESTADIO JANIO BORJAS	PROYECTO
	L. 1,800.00	L. 900.00	L. 3,600.00	L. 900.00	L. 15,300.00		L. 900.00	L. 17,915.00		L. 900.00	L. 900.00	L. 4,200.00	L. 300.00	MONTO
20/12/2010	20/12/2016	30/12/2016	30/12/2016	23/12/2016	23/12/2016		16/12/2016	16/12/2016		09/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	02/12/2016	FECHA

ING! MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
JEFE UMBAD TECNICA MUNICIPAL



Recibi de la Municipalidad de la Villa de San Francisco Departamento
La Cantidad de: Lecence Santidad de: La Cantidad de Pago por Lonitacion de
En Concepto de Pago por Lonitacion, por el concepto aquí
Walor que he recibido a mi entera satisfaccion, por el concepto aquí
mencionado, y por lo cual firmo el presente recibo a los Solicas del mes de Lollono Entre John Solicas de Loll

. 21000 - 0491 - 4280 bebitinabl

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. AMPLIACION ANEXO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA

Corresponde al período del 28 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2016

	Jose Luis Ponce	Jose Daniel Ponce	Yordi Antonio Maradiaga	Jose Henrique Velasquez	Nombre completo
	0827-1997-00231	0827-1997-00309	0827-1995-00081	0827-1966-00095	N° DE IDENTIDAD
	Pintor	Pintor	Pintor	Pintor	CARGO
SON TO VILLA DE SON MORALESTRUCTURA DE COMORA	Aplicación de Sellador y Pintura	ACTIVIDAD			
103 ch 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6	9.	6	6	Dias trabajados
REVISADO POR	150	150	150	150	Salario diario
l	900	900	900	900	Total lps dias trabajados
	6	6	9	6	Horas extras
	25	25	25	25	Valor lps Horas extras
	150′	150	150	150	Total lps horas extras
L. 4,200.00	L. 1,050.00	L. 1,050.00	L. 1,050.00	L. 1,050.00	Total a pagar
A BOO POOR NAME OF STREET					Recibi conforme

PARA: OSCAR SALGADO ADMINISTRADOR GENERAL

> MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 28 Noviembre al 03 deDiciembre de 2016


		1 01/an	01 Did			^					
SHEET SADO FOR INCO.	L. 900.00					O POR	REVISADO POR	S UNIDAD PROYECTION OF THE PRO			APRODRÁDIOSPOR
	L. 900.00	0	25	0	900	150	6	Planta de tratamiento	VIGILANTE	0827-1998-00235	LESTER EMANUEL RODRIGUEZ
Recibi conforme	Total a pagar	Total lps horas extras	Horas Valor lps extras Horas extras	extras	Total lps dias Horas trabajados extras	Salario s diario	Dias trabajados	ACTIVIDAD	CARGO	N° DE IDENTIDAD	Nombre completo



ADMINISTRADOR GENERAL PARA: OSCAR SALGADO

> ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

Corresponde al periodo del 05 de Diciembre al 10 de Diciembre de 2016

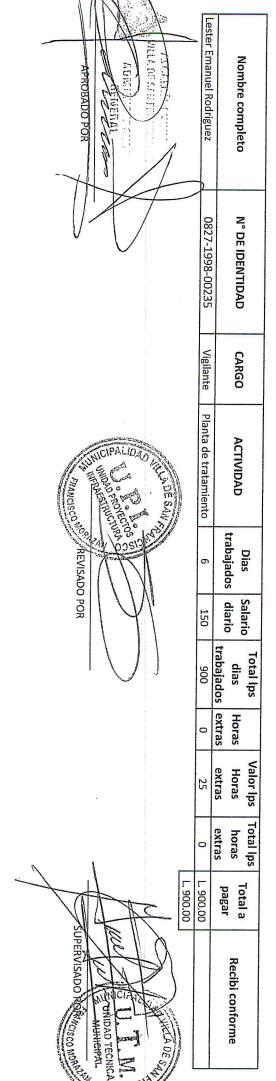





MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. REMODELACION DE TECHO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA

Corresponde al periodo del 08 de Diciembre al 17 de Diciembre de 2016

Carried Parket	SUPERVISADO POR FRANCISCO DO STANCISCO DE STANCISCO DO STANCISCO DE STANCISCO DO STANCISCO DE ST	L 17,915,00					O POR	A OOSIO	EN WILLA DE SAN	VV		ALCALDÍA IS
·	Was the second	L. 1,350.00	0	25	0	1350	150	9	Instalacion de Techo	Ayudante	0101-1991-03785	Carlos Javier Flores
<i>y</i>	Jase Mike	L. 1,175.00	125	25	۲.	1050	150	7	Levanatamiento de Paredes	Ayudante	0827-1997-00223	ose Feliciano Hernandez Amaya
~	L 900.00 . Krodi Meda	L. 900.00 .	0	25	0	900	150	6	Limpieza Escombros	ayudante	0827-1994-00191	Rodi Fernando Pineda Martinez
W		L. 1,575.00	225	25	9	1350	150	9	Instalacion de Techo	Ayudante	0827-1996-00095	ose Henrrique Velasquez
ion	*Wolfer Hernore	L. 600.00	0	25	0	600	150	4	Levanatamiento de Paredes	Ayudante	0827-1976-00107	Walter Leonel Hernandez
	at Jose Rivers,	L. 3,105.00	405	45	9	2700	300	9	Instalacion de Techo	Soldador	0801-1966-00982	ose Alfredo Cortez Rivas
	Jaiso Antonio	L. 1,500.00	0	45	0	1500	300	5	Instalacion de Techo	Soldador	0501-1985-10552	airr)onio Mancia
	Marine House	L. 2,805.00	405	45	9	2400	300	œ	Instalacion de Techo	Soldador	0801-1990-20365	3eno Cristian Herrera
	* Carlos	L. 600.00	0	45	0	600	300	2	Levanatamiento de Paredes	Albañil	0827-1993-00157	Carlos Eduardo Colindres
6	Pulio Cesara	L. 1,200.00	0	45	0.	1200	300	. 4	Levanatamiento de Paredes	Albañil	0827-1978-00050	ulio Cesar Rodriguez
	N. A. S.	L. 3,105.00	405	45	9	2700	300	9	Instalacion de Techo	Soldador	0801-1990-04201	uan Rafael Duron Cortez
	Recibí Conforme	Total a Pagar	Total lps Horas Extras	Valor lps Horas Extras	Horas Extras	Total lps días Trabajados	Salario Diario	Días Trabajados	Actividad	Cargo	N° De Identidad	Nombre completo

PARA: OSCAR SALGADO ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 12 de Diciembre al 17 de Diciembre de 2016

ALCALDÍA MUNICIPAL VILLA DE SAN FRANCE LIVERA PROBADO POR APROBADO POR	Lester Emanuel Rodriguez	Nombre completo
	0827-1998-00235	N° DE IDENTIDAD
	Vigilante	CARGO
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Planta de tratamiento	ACTIVIDAD
TOS REVISADO POR	6	Dias trabajados
O POR	150	Salario diario
	900	Total lps dias Horas trabajados extras
	0	Horas extras
	25	Valor lps Horas extras
	0	Total lps horas extras
50000	L. 900.00	Total a pagar
MUNICIPAL OS	7	Recibi conforme



MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. REMODELACION DE TECHO ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA

Corresponde al periodo del 19 de Diciembre al 24 de Diciembre de 2016

Nombre completo	N° De Identidad	Cargo	Actividad	Días Trabajados	Salario Diario	Total lps días Trabajados	Horas Extras	Valor ips Horas Extras	Total lps Horas Extras	Total a Pagar	Recibí Conforme	
Juan Rafael Duron Cortez	0801-1990-04201	Soldador	. Instalacion de Techo	6	300	1800	0	45	0 ·	L. 1,800.00	* A STATE OF THE S	
Beno Cristian Herrera	0801-1990-20365	Soldador	Instalacion de Techo	o o	300	1800	0	45	0	L 1,800.00	A L	
José Luis Salgado Velásquez	0827-1968-00130	Albañil	Repello y Pulido en Paredes	4	300	1200	0	45	. 0	L. 1,200.00	A CONTRACTOR	2000
Jose Henrrique Velasquez	0827-1996-00095	Ayudante	Instalacion de Techo	თ	200	1200	0	. 25	0	L. 1,200.00		
الد في في الدين ا	0827-1997-00223	Ayudante	Repello y Pulido en Paredes	4	150	600	0	25	0	L. 600.00	* Case Alice	700
Carlos Javier Flores	0101-1991-03785	Ayudante	Instalacion de Techo	4	150	600	0	25	0	L. 600.00	101	70
Jose Alfredo Cortez Rivas	0801-1966-00982	Soldador	Instalacion de Techo	6	300	1800	0	45	0	L. 1,800.00	Paris A	sac y
Jairo Antonio Mancia	0501-1985-10552	Soldador	Instalacion de Techo	4	300 .	1200	0	45	0	L. 1,200.00	Savo A. Manu	
Rodi Fernando Pineda Martinez	0827-1994-00191	ayudante	Limpieza Escombros	6	150	900	0	25	0	L. 900.00	Robo Dueda	
Julio Cesar Rodriguez	0827-1978-00050	Albañil	Repello y Pulido en Paredes	4	300	1200	0	45	0	L. 1,200.00	1 Jobs Rodingues	
Walter Leonel Hernandez	0827-1976-00107	Ayudante	Repello y Pulido en Paredes	თ	200	1200	0	25	0	L. 1,200.00 ,	Norther Hornander	Jan .
Carlos Eduardo Colindres	0827-1993-00157	Albañil	Repello y Pulido en Paredes	6	300	1800	0	45	0	L. 1,800.00	Corpo Ochobis.	
ALCALDÍO INDESAN INCALAS				4						L. 15,300.00	O CONDUMP STORY	


REVISADO POR

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 19 de Diciembre al 24 de Diciembre de 2016

PARA: OSCAR SALGADO ADMINISTRADOR GENERAL

APROBADO POR		Lester Emanuel Roariguez		Mornible completo	
		0827-1998-00235		N DE IDENTIDAD	
		Vigilante		CARGO	
		Planta de tratamiento		ACTIVIDAD	
REVISADO POR		6	awajaaca	2	Dias
POR		150	2		Salario
		900	trabajados extras	dias	Total lps
		0	extras	Horas	
		25	extras	Horas	Valor lps Total lps
		0	extras	horas	Total lps
Som All	L. 900.00	L. 900.00	pagar	l Otal a	
SUPERWISADO POR MONICIPAL SO	}			Recibi conforme	



apic.

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. REMODELACION DE TECHO ESCUELA MIGUEL PAZ BARÂHONA

Corresponde al periodo del 26 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

SINSTANCE STANCE OF THE SAME AND THE SAME AN							A CONTRAME A STATE OF THE STATE	SECTION ALCOHOL			
	L. 3,600.00										OSE Leuriano inclusiones anno 12
N peru	L. 900.00	0	25	0	900	150	o	Limpieza Final	Ayudante	0827-1997-00223	co Coliciano Hernandez Amava
200		C			900	150	6	Limpieza Final	Ayudante	0827-1996-00095	ose Henrrique Velasquez
T. Volume	1 900.00	כ	2	,							arios Edual do Collina es
2	F. 300.00	C	25	0	900	150	6	Limpieza Final	Ayudante	0827-1993-00157	Taliando Colladros
Carlos Col,)								0227-1270 00000	ilio Cesar Rodriguez
ma race	L. 900.00 A	0	25	0	900	150	6	Limpieza Final	Avudante	0877_1978-00050	
in Volume							Handada				Nombre completo
Recibi Contorme	Total a Pagar		Horas Extras	Extras	Total lps dias	Salario Diario	Días	Actividad	Cargo	N° De Identidad	2
		Total inc Horas									

PARA: OSCAR SALGADO ADMINISTRADOR GENERAL

> MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 26 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

									2161		
THE MISADO POR MOISON	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	ï				POR	REVISADO PO		,		APROBABOTOR
E UNIDAD TECNICA CO											& Auron
AZ N.	X										
2000											
TO TO THE PARTY OF	L. 900.00										
	L. 900.00	0	25	0	900	150	6	Planta de tratamiento	Vigilante	V827-1998-00235	restel ciligildel Vodi Baes
	pagar	extras	extras	extras	trabajados extras	aid: 10				7000	Postor Empire Bodicing
Recibi conforme	יטנמו מ	horas	Horas	Horas	dias)	ACTIVIDAD	CARGO	N DE IDENTIDAD	Months a complete
	Tatala	Total lps	Valor lps		Total lps	Salario	Dias)		Nombre complete

()001 de

MA DE SANS

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M. CONSTRUCCION DE CUNETA EN BARRIO NUEVO PROGRESO

Corresponde al periodo del 28 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2016

	D801-1990-20365 Ayudante Construccion de Cuneta 4	Tez	Nombre completo N° De Identidad Cargo Actividad Trabajados
	150	300	Salario Diario
	600	1200	Total lps días Trabajados
	0	0	Horas Extras
	25	25	Valor lps Horas Extras
	0	0	Total lps Horas Extras
1 800 00	L. 600.00	L. 1,200.00	Total a Pagar
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			Recibí Conforme

REVISADO POR
