

Ojojona Francisco Morazán 04 de junio 2018

Señorita
LISSIE GONZALEZ
Oficial Información Publica
Presente

Remito a usted la información solicitada acerca de la ejecución de proyectos realizados por esta Municipalidad durante el mes de mayo del 2018

De usted Atentamente


MARIO R. GARAY
Presupuesto



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2018

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 1 de 4

s, C.A.

	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
Proyecto Mantenimiento de Lineas Electricas del Casco Urbano 000 23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	170,150.10	0.00	0.00	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mantenimiento de Lineas Eléctricas del Casco Urbano	100,000.00	0.00	170,150.10	0.00	0.00	270,150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Perforación de Pozo Casco Urbano 000 47210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Perforación de Pozo Casco Urbano Barrio Yucanteca SANAA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Construcción de Embalse de Agua Chocoarquin 000 24200 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construcción de Embalse de Agua Chocoarquin II Etapa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Mantenimiento de Sistemas de Aguas Negras 000 23400 11-001-01 20 4	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	2.10 %
Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Aguas Negras	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	2.10 %
Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano 000 22220 11-001-01 20 4	300,000.00	0.00	278,458.42	0.00	0.00	578,458.42	70,705.50	70,705.50	0.00	0.00	12.22 %
Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano	200,000.00	0.00	278,458.42	0.00	0.00	478,458.42	55,345.50	55,345.50	0.00	0.00	11.57 %
Proyecto de Manejo y Recoleccion de Desechos Solidos en el Casco Urbano 000 23400 11-001-01 20 4	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	15,360.00	15,360.00	0.00	0.00	15.36 %
Proyecto Mantenimiento de Centro de Usos Multiples 000 23400 11-001-01 20 5	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	381.42	381.42	0.00	0.00	0.76 %
Proyecto Mantenimiento del Centro de Usos Multiples	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	381.42	381.42	0.00	0.00	0.76 %
Construccion Proyecto de Agua Potreritos Saracaran 000 47210 15-013-01 20 5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00	2.03 %
Proyecto Construcción de Sistema de Agua Potreritos Saracaran II Etapa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00	2.03 %
Proyecto de Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones Artesanales 000 23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	4.16 %
Proyecto Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	8,320.00	8,320.00	0.00	0.00	4.16 %
Proyecto de Mantenimiento del Edificio Municipal 000 23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	26,025.24	0.00	0.00	126,025.24	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	3.81 %
Proyecto Mantenimiento del Edificio Municipal	100,000.00	0.00	26,025.24	0.00	0.00	126,025.24	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	3.81 %
Proyecto Mantenimiento del Parque Senderos Turisticos Casco Urbano 000 23400 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	15,457.50	15,457.50	0.00	0.00	6.18 %
Proyecto Mantenimiento de la Plaza central, Parque Ojo de Agua y Senderos Turisticos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	15,457.50	15,457.50	0.00	0.00	6.18 %
Proyecto de Mantenimiento del Cementerio Municipal 000 23400 11-001-01 20 5	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00	7.02 %
Proyecto Mantenimiento del Cementerio Municipal	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00	7.02 %
Proyecto Ampliacion Sistema de Electrificacion Coror, Guerisne 000 47210 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación Coror Guerisne	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto de Construccion Cancha Polideportiva El Circulo 000 47110 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construcción de Cancha Polideportiva en El Circulo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construccion Cajas Puentes Pueblo Viejo, Aragua 000 47210 11-001-01 20 3	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construcción Caja Puente Pueblo Viejo Aragua	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	90,740.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construccion de 1320 Metros de Empedrado en el Casco Urbano 000 47210 11-001-01 20 5	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construcción de 1320 Mt de Empedrado en Barrio El Centro del Casco Urbano	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	749,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construccion Estacion de Buses Barrio El Mirador	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2018

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 2 de 4

s, C.A.

	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
001 47210 11-001-01 20 3 Proyecto Construcción Estación de Buses Barrio El Mirador	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construcción Tanque de Agua Barrio Yucanteca	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 47210 15-013-01 20 5 Proyecto Construcción Tanque de Agua Barrio Yucanteca	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío Ceniceras	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 47210 15-013-01 20 5 Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Las Ceniceras	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 47210 11-001-01 20 5 Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Las Ceniceras	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construcción Sistema de Electrificación Caserío San Sebastian	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 47210 11-001-01 20 5 Proyecto Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 47210 15-013-01 20 5 Proyecto Construcción Sistema de Electrificación San Sebastian	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Filiberto Gonzalez El Plomo Guasucaran	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 7 Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Filiberto Gonzalez El Plomo Guasucaran	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 7 Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Instituto San Juan de Ojojona	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 7 Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 4 Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable La Ciénega Saracaran	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II Las Ceniceras	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 7 Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Reina Isabel II Las Ceniceras	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 7 Proyecto Mejoramiento Centro Educativo Alduvin Diaz Los Encinos El Aguacatal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construcción de Viviendas a Personas de Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas	749,721.40	0.00	123,383.37	0.00	0.00	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 47110 11-001-01 20 5 Proyecto Construcción Viviendas a Personas Escasos Recursos en el Municipio Pre Seleccionadas	749,721.40	0.00	123,383.37	0.00	0.00	873,104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	149,944.28	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	5.22 %
000 23400 11-001-01 20 7 Proyecto Mantenimiento Canchas Deportivas Barrio El Llano	149,944.28	0.00	0.00	0.00	0.00	149,944.28	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00	5.22 %
Proyecto Mantenimiento de Calle Aldea de Aragua	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 3 Proyecto Mantenimiento Calle Aldea de Aragua	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mantenimiento de Calles de Caseríos Ceniceras y San Sebastian	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %

Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2018

Hora : 08:14 a.m.

Pagina: 3 de 4

s, C.A.

		EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO			
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calles Caserios Cenicerias, San Sebastian hasta Rio san Jose	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construcción Sistema de Agua Guasucaran, Santa Cruz y Guayabal		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	180,462.60	180,462.60	0.00	0.00	36.09 %
001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto Construcción de Sistema de Agua Gusucaran, Santa Cruz y Guayabal III Etapa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	180,462.60	180,462.60	0.00	0.00	36.09 %
Proyecto Construcción Red de Distribución de Agua Potable El Llano de Guerisne		135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 47210 15-013-01 20 5	Proyecto Construcción Red de Distribución de Agua Potable El Llano de Guerisne	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	135,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mantenimiento de Calle Coror Guerisne		0.00	0.00	408,508.01	0.00	0.00	408,508.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 15-013-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento de Calle Coror Guerisne	0.00	0.00	277,756.64	0.00	0.00	277,756.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-03 20 3	Proyecto de Mantenimiento de Calle Coror Guerisne	0.00	0.00	88,368.41	0.00	0.00	88,368.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto de Mantenimiento de Calle Coror Guerisne	0.00	0.00	42,382.96	0.00	0.00	42,382.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construcción Parque Vida Mejor		0.00	0.00	123,383.37	0.00	0.00	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Construcción Parque Vida Mejor	0.00	0.00	123,383.37	0.00	0.00	123,383.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 47110 11-001-01 20 5	Proyecto Ampliación Sistema de Electrificación La Cienega Saracaran	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mantenimiento de Calle Suyatal hasta Guasucaran Centro		0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calle Suyatal hasta Guasucaran Centro	0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	436,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mantenimiento de Calle Guasucaran hasta El Plomo		0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calle Guasucaran hasta El Plomo	0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	393,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto de Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	28.00 %
000 23400 14-227-02 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calle con Mano de Obra Los Tablones El Aguacatal	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	63.00 %
Proyecto Mantenimiento de Calle con Mano de Obra desde El Aguacatal hasta San Sebastian		0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 3	Proyecto Mantenimiento de Calle con Mano de Obra desde El Aguacatal hasta San Sebastian	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Construcción de Empedrado Calle Ladislao Valladares		0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Construcción Empedrado Calle Ladislao Valladares	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00	146,766.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Ampliación de Electrificación Quebrada Onda El Circulo		0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
001 47210 11-001-01 20 5	Proyecto Ampliación de Electrificación Quebrada Onda El Circulo	0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00	61,691.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
000 23400 11-001-01 20 6	Proyecto Mantenimiento y Limpieza en Calles del Casco Urbano	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Proyecto Mejoramiento Centro Educativo de Jiniguare		0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Ejecución de Proyectos

Periodo del: 01/05/2018 al 31/05/2018

Moneda Lempiras (L)

Emisión: 04/06/2018

Hora : 08:14 a.m.

Página: 4 de 4

s, C.A.

	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
000 23400 11-001-01 20 7 Proyecto Mejoramiento Centro Educativo de Jiniguare	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
	9,145,607.16	0.00	2,622,716.92	0.00	0.00	11,768,324.08	320,342.02	320,342.02	0.00	0.00	

os al Reporte

:/05/2018

/05/2018

to:

YJYXJfKmt7LEpuCoNQFypXd6WrPvfhcGiDSinmcNpP2kKMFBDVos/nEraxKe0TQRX6vdONj/qW4HI6SPrt1InaHISTCub59axd



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA

San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.

Tels. 2767-0173, 2767-0035, 2767-0491

E-mail: alcaldía_ojojona@yahoo.es



UNIDAD TECNICA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

San Juan de Ojojona, 4 de junio del 2018.

Lic. Lissie Gonzalez Zelaya.
Oficial de información Pública (OIP).

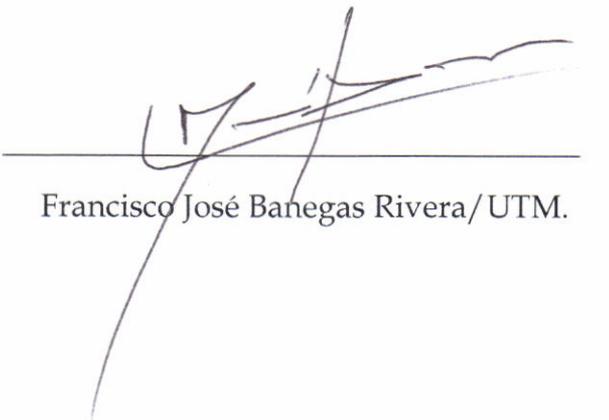
Presente.

Reciba un cordial saludo, así mismo le deseo el mayor de los éxitos en sus delicadas funciones. El motivo de la presente es para presentarle el resumen de los programas y proyectos que durante el mes mayo del presente año se realizaron en el término municipal. Se continúa con la ejecución de proyectos iniciados en el periodo anterior.

Así mismo le adjunto el resumen de los programas y proyectos que se están continuando en su ejecución.

Agradeciendo de antemano por su tiempo, se suscribe de usted.

Atentamente.



Francisco José Banegas Rivera/UTM.

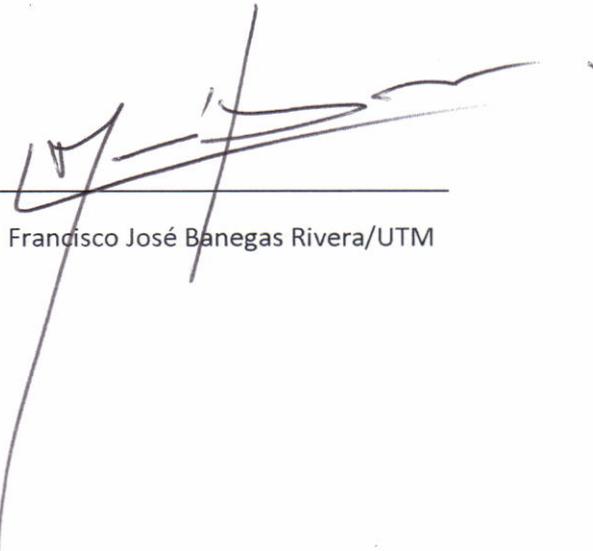


MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS

N°	NOMBRE	UBICACION	BENEFICIARIOS	% AVANCE	GASTO	OBSERVACION
1	Construcción del sistema de agua Potreritos Zaracaran II Etapa.	Caserío de Potreritos, aldea de Zaracaran.	30 Viviendas, Aprox. 150 personas.	50% de avance, falta construcción del tanque de abastecimiento y línea de distribución.	L. 1,800.00 en mano de obra. L. 3,275.00 Compra de materiales.	Continuidad de la primera etapa iniciado en el periodo anterior. (La inversión del proyecto es con contraparte de Visión Mundial quien comprara todos los materiales y la logística, mano de obra calificada la alcaldía y la mano de obra no calificada la comunidad). * El proyecto presentó un atraso debido a que la línea de conducción tuvo que rectificarse. (Tramo final defectuoso).
2	Proyecto de Electrificación de Cenicerias.	Caserío de Cenicerias aldea de Surcos de Caña.	55 Viviendas, Aprox. 275 personas.	20% de avance, falta terminar agujeros, para 20 postes, agujeros para retenidas, colocar cableado transformadores lámparas.	0	El proyecto viene desde el periodo pasado. No se empezó si no hasta este año; argumenta ASODECO empresa encargada de ejecutar el proyecto, debido a que los agujeros no se hicieron donde dice el plano, a la empresa le cancelaron el 50% de la obra por lo que la contraparte restante se cancelara cuando se finalice el proyecto. Faltan algunos materiales los cuales se tramitarán en la ENEE.
3	Construcción del sistema de agua de las comunidades de Guazucarán, El Plomo, Santa Cruz y Guayabal.	Aldeas de Guazucarán, El Plomo, Tierra Amarilla, Guayabal, Santa Cruz.	500 viviendas, Aprox. 2,500 personas.	30 % de avance, falta terminar línea de conducción, realizar prueba de verificación del sistema, construir el tanque de distribución y las	L. 180,462.00	El proyecto fue iniciado el periodo pasado. Es con contraparte, Visión Mundial esta poniendo los materiales y la alcaldía la logística y mano de obra calificada, la no calificada la pone la comunidad.



				líneas de distribución domiciliarias.		<ul style="list-style-type: none">• Información soporte consultar en administración.
--	--	--	--	---------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------


Francisco José Banegas Rivera/UTM



SOLICITUD DE PROYECTO

Fecha:

24 de Mayo del 2018.

Nombre del solicitante u organización:

- Junta de Agua del caserío de Potreritos representado por Gabriel Ilovaes.

Localización:

Caserío del Potrerito, aldea de Zaracaran, Ojojona F.M.

Nombre del proyecto:

Proyecto de agua para la comunidad de Potreritos

Situación o Problemática:

Los representantes del caserío de Potreritos, están solicitando respetuosamente al alcalde José Armando García Andino, se les colabore con la compra de unos materiales de fontanería, para hacer los cambios respectivos en la línea de conducción, según especifican los informes de inspección realizado por la Unidad Técnica de la alcaldía.

El sistema presenta problemas de gravedad en el tramo final de la línea de conducción, los niveles de altura en esta parte reducen la fuerza del agua a tal grado que no llega al sitio donde estará el tanque. Por lo cual se determinó hacer un pequeño ajuste en este tramo.

Beneficiarios:

40 viviendas existentes en el caserío.

Alcance del proyecto:

El proyecto de agua para beneficiar a la comunidad de Potreritos está ubicado en la fuente denominada el Tular, y está situado aproximadamente a 3 Km de donde estará el tanque de 5,000 galones y la comunidad esta unos 1.5 km del tanque. Falta construcción del tanque y red de distribución.

Punto de la línea de conducción donde el agua llega a razón de 15 gal por minuto, a unos 300 metros del tanque.



Materiales que se ocupan
para el proyecto de agua potreritos.

- 8 - 10 adaptadores 2" para válvulas. presión.
- 9 - 1 válvula check. 2".
- 2 válvulas 2" balón.
- 10 - 5 Uniones 2" PVC. Presión.
- 10 codos 45° presión PVC.
- 11 - 10 adaptadores hembras 2" presión. PVC.
- 20 rollos de teflón.
- 12 - 1/8 pegamento PVC.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Notas



Comercial Gabriela S. de R. L.

DISTRIBUIDORA DE PINTURAS

Principal:
Barrio El Centro, Frente a Agropecuaria
San José, Ojozona, F.M. Tels.: 2767-0018
2767-0019, Cel. 8814-1216

Sucursal A-1: Domicilio Fiscal
Carretera al Sur, Km 17, frente a
antiguo DERIMASA, Tels.: 2226-0115,
2226-0091, 9680-0337

E-mail: comercialgabriela@hotmail.com

R.T.N.: 08019001001330

CAI: 44208A-589659-C54EAB-E7FE20-4199FE-1C

FACTURA N° 001-001-01-000 43653

Sucursal - A - 1 Fecha: 26 de 5 de 20 18

Cliente: Alcaldía Municipal OJOZONA

Dirección: _____ RTN: 081399953553377

Por lo siguiente: CONTADO CRÉDITO DEBE

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	adap machos 2"	2200	22000
1	valvula cheq 2" italy	71000	71000
2	— Balin 2" for	70000	140000
5	causos pu 2"	20000	100000
10	codos 2x45 pot.	25000	250000
10	adap Heabr 2"	22000	220000
20	Rollo teflon	10000	200000
1/8	pegamento pu dote		175000

Comercial Gabriela S. de R.L.
Tel: 2226-6187 / 2226-8621 / 2226-5621

CANCELADO

DISTRIBUIDORA MEDERAS S. de R.L. del 2767-6663
RTN: 08019005002634 CERTIFICADO N° 8230451050011
Fecha Límite de Emisión: 31/05/2018
Numeración del 001-01-00040001 al 001-001-01-00045000

CONSUMIDOR FINAL
Original: Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad, 2da. Copia: Archivo
Son: Seisenta y cinco mil quinientos LEMPIRAS
(En Letras)

Importe Exento L. _____
Importe Gravado L. _____
15% Impuesto S/V L. _____
TOTAL L. 3275000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

[Firma]
Firma y Sello

② valvula 2 f
① valvula
It
10 doto
10 mas
y lino
que

INFORME

SUPERVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO DE AGUA DE POTRERITOS, ZARACARAN

Ing. Francisco José Banegas/UTM.
21 de Mayo del 2018.

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE OJOJONA
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL



RESUMEN

El día viernes 18 de mayo del 2018, nos trasladamos al caserío de Potreritos aldea de Zaracaran, junto con la comisión de regidores integrado por: Omar Ramos, Nelson Flores; y el Ing. David Amador para hacer una supervisión del avance de la obra del proyecto de agua para esta comunidad.

Se hizo un recorrido de todo el tramo (3 km), desde la toma de agua hasta el sitio donde están los arranques para construir el tanque, la línea de conducción está siendo instalada por el señor Hermes Johel Aguilar Rivera.

A continuación se detallan las actividades realizadas:

1. Inspección de la obra toma:



Imagen de la toma de agua (paredes de captación).



Salida de la obra toma (caja de válvula).

Observaciones:

La obra toma esta bien construida, lo que no se observo es que no posee filtro (pazcón), faltan tapaderas superiores (está tapada con tablas de madera), la válvula de descarga a la tubería esta obstruida (mal estado).

2. Inspección en la línea de conducción.



Observaciones:

En todo el recorrido se observaron tres curvas que se colocaron codos de 90°, los cuales sería recomendable cambiarlos a codos de 45° para disminuir fricción del agua.

Hay cuatro tramos aéreos que el tubo es de pvc, es recomendable cambiarlos a HG.

No hay válvulas check en el tramo, es recomendable poner 2.

Solo se observó una válvula de compuerta la cual tiene fuga en la unión, además se recomienda poner unas 2 válvulas de balón (2") para dar mantenimiento al sistema.

Hay un tramo largo de la tubería (PVC SDR 26), que está por sobre el suelo, si fuera posible sustituirlo por PVC SDR21 o HG.

El tramo de inicio tiene una pendiente pronunciada, pero de la mitad al tanque solo es subida y llega a un punto al final del tramo, que se encuentra a la misma altura de la toma de agua.



Imagen de la tubería antes de llegar al punto del tanque.



Fuga de la válvula que está a mitad del recorrido.

3. Inspección del sitio donde estará el tanque de 5,000 galones.



Observaciones:

El sitio donde estará el tanque está a una altura similar a la toma de agua, es un buen suelo para hacer la cimentación del tanque ya se encuentra la arena, grava y piedra en el lugar, ya está hecho el plantel donde estará el tanque.

CONCLUSION

El tramo está finalizado en un 90%, se necesitan hacer unos cambios en la línea de conducción, pero primordialmente es necesario hacer una prueba al sistema para verificar si el agua llega al tanque con buena fuerza y de esa forma saber qué cambios son los más necesarios de ejecutar.

RECOMENDACIÓN

1. Hacer la prueba al sistema, para verificar si el agua llega con fuerza al tanque y las posibles fallas al sistema.
2. Verificar la válvula de salida (2"), de la fuente, si esta mala cambiarla por una de balón de 2".
3. Cambiar la tubería de PVC SDR26 que esta aérea por tubería 2" HG. (20 lances, son 4 tramos).
4. Cambiar los 3 codos de 90° por codos de 45° (se ocuparían 6). Para reducir fricción al sistema.
5. Reparar fugas en el tramo y colocar 2 válvulas de balón 2" con accesorios, para dar mantenimiento al sistema.
6. Es necesario colocar 2 válvulas check de 2" con accesorios.
7. Es necesario colocarle tapaderas a la toma de agua y un pascón que sirva de filtro.
8. Falta hacer las obras de anclajes y rompe cargas de acuerdo al diseño.
9. Cambiar tramos de tubería PVC SDR26 que esta vista, por sobre el suelo, por tubería PVC SDR21 (si amerita el caso, 40 lances).

No.



Por L.

1800-


Recibí de: Alcaldía Municipal de Ojozona.

La Cantidad de: Mil Ochocientos Lempiras.

Por Concepto de: Anticipo proyecto de Agua Potrentos
(6 días trabajados).

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

71 de Mayo del 2018


FIRMA

INFORME II

SUPERVISION DEL AVANCE DEL PROYECTO DE AGUA DE POTRERITOS, ZARACARAN

Ing. Francisco José Banegas/UTM.
24 de Mayo del 2018.





AYUDA A MEMORIA

VISITA DE CAMPO.

PROPOSITO: Supervisar el avance del proyecto del sistema de agua de las 5 comunidades.

31 de mayo del 2018.

Participantes:

- 1.- Ing. Francisco Banegas. Unidad Técnica Municipal 2018-22.
- 2.- Sr. Oscar Alonzo. Encargado de cuadrilla de peones.

El proyecto de las 5 comunidades es un proyecto grande, de una misma fuente llamada Las Posas Azules se abastecerán las comunidades de Guazucarán, El Plomo, Tierra Amarilla, Guayabal y Santa Cruz. El proyecto es con contraparte de Visión Mundial quien está comprando todo el material y la municipalidad está poniendo la logística y apoyo técnico. En el sitio me reuní con los jornaleros y el Sr. Oscar Alonzo el en cargado de los peones y me comento lo siguiente:

- La actividad que se estaba ejecutando ese día era el traslado de tubería Hg de 6" de arriba hacia el sitio donde se procederá a continuar con la unión de la misma.
- La línea de conducción tiene aproximadamente 7 Km de distancia.
- El sitio de distribución aún no se construye.
- La tubería se está pegando o uniendo por tramos. El tramo de Guazucarán por un lado y el de Guayabal por otro.
- Falta redes de distribución para las 5 comunidades.
- Construcción de tanque de distribución.
- Falta colocar 2Km de la línea de conducción.

Acuerdos:

- Se programó otra visita de campo en la fuente y supervisar la obra toma, la línea de conducción para observar la calidad de la misma y de esa forma dar los lineamientos a seguir.





Sitio de reunión con los Jornaleros y el Sr. Oscar Alonzo jefe de cuadrilla.





AYUDA A MEMORIA

VISITA DE CAMPO.

PROPOSITO: Supervisar el avance del proyecto de electrificación de la comunidad de Ceniceras, Surcos de Caña, Ojojona F.M.

2 de mayo del 2018.

Participantes:

- 1.- Ing. Juan Cerrato. Ejecutor del proyecto.
- 2.- Ing. Carlos Caballero. Encargado de la Unidad Técnica Municipal, periodo 2014-18.
- 3.- Ing. Francisco José Banegas. Unidad Técnica Municipal 2018-22.
- 4.- Jornaleros.

Se desarrolló una visita de campo en vista que el proyecto tiene un atraso en su ejecución, se visitó todo el proyecto y se encontraron las siguientes observaciones:

- Se estaban elaborando agujeros por parte de los jornales, se quejaban por el suelo rocoso y que eso estaba atrasando el proyecto.
- Otros jornales estaban levantando postes. 43 postes se han colocado, faltan por colocar aproximadamente 30 postes.
- Falta por hacer los agujeros de las retenidas.
- Falta colocar líneas, transformadores, lámparas.

Acuerdos:

- Debido a que ya se le pago el 50% del proyecto (cancelado en el periodo anterior), se le exigió al Ing. Juan Cerrato no parar en la ejecución del proyecto ya que tiene mucho retraso del mismo.



Imagen de jornaleros levantando postes.



Imagen mostrando la elaboración de agujeros.
