



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



1924

08 OCTUBRE DE 2018

Señorita.

Merary Cárcamo

Oficina de Acceso a la Información Pública

Su oficina.

Como jefe de Unidad Técnica Municipal de esta dependencia, por este medio remito a Usted la información correspondiente a las contrataciones Durante el mes de SEPTIEMBRE de 2018.

Adjunto el RESUMEN DE LAS CONTRATACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO.

Sin otro en particular.



Ing. Milton Porfirio Zambrano
Jefe Unidad Técnica Municipal


“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”
Telefax: 2769-6333, Tels.: 2769-6655. 2769-6657

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018

DESCRIPCION DE CONTRATACION	NOMBRE DEL CONTRATADO	RESPONSABLE	PROYECTO	MONTO	FECHA
1 CONTRATACION DE JORNALES- ANIVERSARIO ,DESMONTAJE DE ESCENARIO	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	ANIVERSARIO	L. 900.00	07/09/2018
2 CONTRATACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	EMPACADO DE CONFITES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	L. 9,300.00	07/09/2018
3 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REPARACION DE AULAS EN IPVSF 2018	L. 8,100.00	07/09/2018
4 CONTRATACION JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE RAFAEL ESPINO, APERTURA DE ZANJAS, PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE	L. 5,071.50	07/09/2018
5 CONTRATACION JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE RAFAEL ESPINO, CONFORMACION DE ZANJAS, INSTALACION DE TUBERIA Y ATERRADO DE LA MISMA	L. 7,000.00	07/09/2018
6 CONTRATACION JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 2,400.00	07/09/2018
7 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE CALLE, ALDEA EL COYOLITO	L. 2,250.00	07/09/2018
8 MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE BAÑOS MUNICIPALES EN EDIFICIO PLAN EN HONDURAS	L. 3,000.00	07/09/2018
9 CONTRATACION JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE RAFAEL ESPINO, APERTURA DE ZANJAS, PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE	L. 1,858.50	15/09/2018

10	CONTRATACION JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO, CONFORMACION DE ZANIAS, INSTALACION DE TUBERIA Y ATERRADO DE LA MISMA	L. 4,800.00	15/09/2018
11	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE BAÑOS MUNICIPALES EN EDIFICIO PLAN EN HONDURAS	L. 2,700.00	15/09/2018
12	MANO DE OBRA CALIFICADA- REPARACION DE CABEZALES	CRISTOBAL FIDEL TORRES	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE CALLE, ALDEA EL COYOLITO	L. 300.00	15/09/2018
13	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	REPARACION DE AULAS EN IPVSF 2018	L. 6,900.00	15/09/2018
14	JORNALES - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 2,850.00	15/09/2018
15	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE BAÑOS MUNICIPALES EN EDIFICIO PLAN EN HONDURAS	L. 3,150.00	21/09/2018
16	CONTRATACION JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 9,900.00	21/09/2018
17	MANO DE OBRA CALIFICADA- INSTALACION ELECTRICA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE AULA EN ANEXO NUEVO PROGRESO EMPB	L. 300.00	21/09/2018
18	CONTRATACION JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 12,250.00	21/09/2018
19	CONTRATACION JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CONSTRUCCION DE BAÑOS MUNICIPALES EN EDIFICIO PLAN EN HONDURAS	L. 2,700.00	21/09/2018

ING. MILTON POHERRIO ZAMBRANO
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO E.N.A.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNAL, PROYECTO "ANIVERSARIO" DESMONTAJE DE ESCENARIO

Corresponde al periodo del 03 de SEPTIEMBRE al 08 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
LEONEL HENRIQUEZ MEJA	0827-1969-00069	SUPERVISOR	DESMONTAJE DE ESCENARIO	1	300	300				300	
LUIS ANTONIO MARADIAGA	0827-1993-00112	JORNAL	DESMONTAJE DE ESCENARIO	1	150	150				150	
MILGEN FABRICIO PINEDA	0827-1995-00162	JORNAL	DESMONTAJE DE ESCENARIO	1	150	150				150	
OSCAR JEAN CARLOS MEJA HENRIQUEZ	0827-2000-00199	JORNAL	DESMONTAJE DE ESCENARIO	1	150	150				150	
SERGIO JOSE FRANCO	0827-2000-00205	JORNAL	DESMONTAJE DE ESCENARIO	1	150	150				150	
										L. 900,00	

[Handwritten signature]
APROBADO POR

REVISADO POR

[Handwritten signature]
SUPERVISOR

Nota:
El Desarrollo Fue Realizado el día Domingo 02-9-2018

Recebi Vestido Rodriguez

06/09/18

9:45 AM



Corresponde al periodo del 03 de SEPTIEMBRE al 08 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Días trabajados	Salario diario	Total ipse días trabajados	Horas extras	Valor ipse horas extras	Total ipse horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
WILTON ADOLFO MENDOZA	0827-1992-00250	JORNAL	ARMADO DE BOLSAS DE CONFITE PARA DIA DEL NIÑO	6	150	900				900	
HECTOR RAMON PONCE	0827-1996-00223	JORNAL	ARMADO DE BOLSAS DE CONFITE PARA DIA DEL NIÑO	6	150	900				900	
JUNIOR FRANCISCO PONCE RAMOS	0827-1997-00098	JORNAL	ARMADO DE BOLSAS DE CONFITE PARA DIA DEL NIÑO	4	150	600				600	
LEONEL HENRIQUEZ MEJIA	0827-1969-00069	SUPERVISOR	ARMADO DE BOLSAS DE CONFITE PARA DIA DEL NIÑO	6	300	1800				1800	
LUIS ANTONIO MARADIAGA	0827-1993-00112	JORNAL	ARMADO DE BOLSAS DE CONFITE PARA DIA DEL NIÑO	6	150	900				900	
WILGEN FABRICIO PINEDA	0827-1995-00162	JORNAL	ARMADO DE BOLSAS DE CONFITE PARA DIA DEL NIÑO	6	150	900				900	
DANIEL ALEJANDRO MEJIA	0827-2001-0001	JORNAL	ARMADO DE BOLSAS DE CONFITE PARA DIA DEL NIÑO	5	150	750				750	
OSCAR JEAN CARLOS MEJIA HENRIQUEZ	0827-2000-00199	JORNAL	ARMADO DE BOLSAS DE CONFITE PARA DIA DEL NIÑO	6	150	900				900	
SERGIO JOSE FRANCO	0827-2000-00205	JORNAL	ARMADO DE BOLSAS DE CONFITE PARA DIA DEL NIÑO	6	150	900				900	
ANYELI FERNANDA MEJIA	0827-2000-00173	JORNAL	ARMADO DE BOLSAS DE CONFITE PARA DIA DEL NIÑO	5	150	750				750	
										L. 9.300,00	

SE TRABAJA TARDE EL DIA SABADO Y SE LABORO EL DOMINGO, Y LAS PERSONAS UTILIZADAS EN ESTA ACTIVIDAD TAMBIEN SE EMPLEARON PARA PINTADO DE BORDILLOS.

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO
ABERADO POR

REVISADO POR



Recibi: *Vesica Rod*
06/09/18 G: d/ AAD

SUPERVISOR


ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO
SUPERVISOR

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "REPARACION DE AULAS EN IMPVF 2018 - FABRICACION DE BALCONES"

BARRIO NUEVO PROGRESO
Corresponde al periodo del 02 de SEPTIEMBRE al 08 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
RENNER DIOME MEJA CHACON	0827-1978-0001	SOLDADOR	FABRICACION DE BALCONES	6	300	1800	0	25	0	1800	
HENRY OMAR DIAZ MEJA	0827-1991-00029	SOLDADOR	FABRICACION DE BALCONES	7	300	2100	0	25	0	2100	
MILTON LEONEL COLINDRES RIVERA	0827-1996-00006	AYUDANTE	FABRICACION DE BALCONES	5	150	750	0	25	0	750	
WILMER ALFREDO SALGADO TRIMINIO	0827-1994-00067	AYUDANTE	FABRICACION DE BALCONES	6	200	1200	0	25	0	1200	
FRANKLIN IZAGUIRRE HERRERA	0801-1076-06442	ALBAÑIL	RESANE DE PAREDES	5	300	1500	0	25	0	1500	
MANUEL DE JESUS LARA SERRANO	0511-1991-00116	AYUDANTE	RESANE DE PAREDES	5	150	750	0	50	0	750	
										L. 8.100,00	

APROBADO POR 


REVISADO POR


Jessica Rodriguez

06/09/18


9:45 AM




REVISADO POR 

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL ESPINO APERTURA DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE
 PAGO POR OBRA // FECHA: 01 SEPTIEMBRE AL 07 SEPTIEMBRE 2018

Nombre completo	N° De Identidad	Actividad	EXCAVACION NATURAL				EXCAVACION Y DEMOLICION DE CONCRETO				Total a Pagar	Recibí Conforme
			Mts. Lineales S R	H prom.	VALOR	SUB TOTAL	Mts. Lineales S	H prom.	VALOR	SUB TOTAL		
1 ELVIN RAMON GONZALES PAGUAGA	0827-1977-00144	EXCAVACION DE ZANJOS	29.00	80cm	45.00	1305.00		80cm		0.00	L. 1,305.00	
4 JOSE RANDULFO AMAYA RICO	0827-1965-00043	EXCAVACION DE ZANJOS	26.00	80cm	45.00	1170.00		80cm		0.00	L. 1,170.00	
6 JEAN CARLOS ALEXANDER DIAZ	0827-2002-00114	EXCAVACION DE ZANJOS	20.00	80cm	45.00	900.00	0.00	80cm	60.00	0.00	L. 900.00	
7 JOSE JORGE GONZALES RODRIGUEZ	0827-1995-00082	EXCAVACION DE ZANJOS	20.00	80cm	45.00	900.00		80cm		0.00	L. 900.00	
10 JUAN RAMON MONCADA GARCIA	0826-1949-00035	EXCAVACION DE ZANJOS	17.70	80cm	45.00	796.50		80cm		0.00	L. 796.50	
											L. 5,071.50	


 ALCALDIA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

APROBADO POR


 SUPERVISOR POR

REVISADO POR

Recibí: *Yessica Rodríguez*
 06/09/18
 9:45 AM



MUNICIPALIDAD VILLA DEL SAUL HERRANDEZ S.A.
 PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PAVIMENTACION CALLE RAFAEL ESPINO"
 CONFORMACION DE ZANJAS, INSTALACION DE TUBERIA Y ATERRIDADO DE LA MISMA


PARA: OSCAR SALGADO
 ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 01 de SEPTIEMBRE al 07 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
JOSE RUIÑO GARAY RODRIGUEZ	0715-1956-00030	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	6	200	1200				1200	
VICTOR MANUEL SALGADO MENDOZA	0827-1970-00050	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	4	200	800				800	
JOSE LUIS VERMUDES COLINDRES	0827-1984-00117	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	6	200	1200				1200	
REYNALDO RAFAEL ESPINO MENDOZA	0827-1984-00176	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	6	200	1200				1200	
SANTOS ERNESTO PINEDA RODRIGUEZ	0715-1976-00240	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	6	200	1200				1200	
LESTER ENMANUEL RODRIGUEZ DIAZ	0827-1998-00235	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	1	200	200				200	
JUAN PABLO RODRIGUES AMADOR	0801-1975-07941	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	6	200	1200				1200	
L. 7.000,00											



NOTA: EL HORARIO DE TRABAJO ES DE 6 AM HASTA LAS 4 PM, SE TOMO LA DECISION DE PAGARLES 200 LEMPIRAS POR DIA POR LO EXTENSO DE LA JORNADA DE TRABAJO Y LA DUREZA DEL MISMO.

APROBADO POR



REVISADO POR

Raelbi Vessari Rodriguez
 06/09/18
 9:45 AM






PARA: OSCAR SAIGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION


Corresponde al periodo del 03 de SEPTIEMBRE al 09 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
OSCAR AQUILES BANEGAS	0827-1955-00006	OPERADOR PLANTA	Mantenimiento Planta de tratamiento	7	150	L. 1,050.00	
JEAN CARLOS ALEXANDER DIAZ	0827-2002-00114	PEON	LIMPIEZA HUMEDAL	3	150	L. 450.00	
JOSE ARTURO AVILA	0801-1954-00112	PEON	LIMPIEZA HUMEDAL	6	150	L. 900.00	
						L. 2,400.00	


APROBADO POR


REVISADO POR




Jessica Rodríguez

06/09/18

9:45 AM

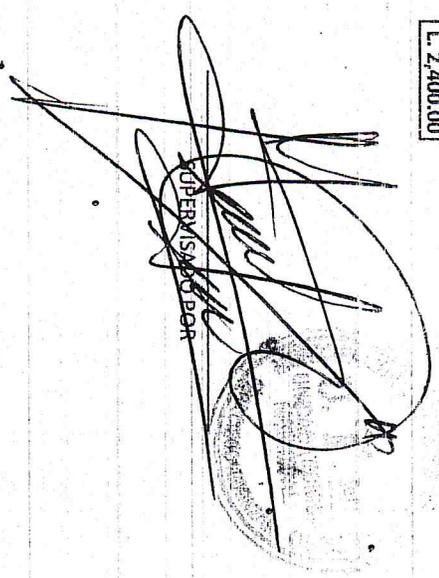
REVISADO POR

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO P.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE CALLE, ALDEA EL COYOLITO"

BARRIO EL CENTRO DEL COYOLITO
Corresponde al periodo del 03 de SEPTIEMBRE al 03 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Días trabajados	Salario diario	Total lps días trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
CRISTOBAL FIDEL TORRES	0827-1993-00021	ALBAÑIL	REPARACION DE CABEZALES	5	300	1500	0	25	0	1500	
JOSE MANUEL SALGADO VELASQUEZ	0826-1981-00232	AYUDANTE	REPARACION DE CABEZALES	5	150	750	0	25	0	750	
										L. 2.250.00	

APPROBADO POR

REVISADO POR

APPROBADO POR



Recibi Yessier Kodriguez

06/09/18

9:45 AM

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO S.R.L.
 PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "CONSTRUCCION DE BAÑOS MUNICIPALES EN EDIFICIO PLAN EN HONDURAS"

PARA: OSCAR SALGADO
 ADMINISTRADOR GENERAL

BARRIO EL CENTRO
 Corresponde al periodo del 02 de SEPTIEMBRE al 08 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
WILMER GABRIEL MARTINEZ ROMERO	1804-1977-01992	ALBAÑIL	SOLETA Y CONSTRUCCION DE PILA	7	300	2100	0	25	0	2100	
HULICER OMAR CALIX GANZALES	0827-2000-00005	AYUDANTE	SOLETA Y CONSTRUCCION DE PILA	6	150	900	0	25	0	900	
ALEX JAVIER FLORES SANCHEZ	0827-1972-00136	ALBAÑIL	SOLETA Y CONSTRUCCION DE PILA	2	150	300	0	25	0	300	
										L. 3,000.00	

[Handwritten Signature]
 APROBADO POR

REVISADO POR





[Handwritten Signature]
 SUPERVISADO POR

[Handwritten Signature]
 Rabi Yessica Rodriguez
 06/09/18
 9:45 AM

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.I.
 PROYECTO: PAVIMENTACION DE CALLE RAFAEL ESPINO APERTURA DE ZANJAS PARA INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE
 PAGO POR OBRA // FECHA: 10 SEPTIEMBRE AL 15 SEPTIEMBRE 2018

Nombre completo	N° De Identidad	Actividad	EXCAVACION NATURAL			EXCAVACION Y DEMOLICION DE CONCRETO			Total a Pagar	Recibí Conforme	
			Mts. Lineale s R	H prom.	VALOR	Mts. Lineale s	H prom.	VALOR			SUB TOTAL
JOSE JORGE GONZALES RODRIGUEZ	0827-1995-00082	EXCAVACION DE ZANJOS	41.30	80cm	45.00	1858.50		80cm	0.00	L. 1,858.50	
										L. 1,858.50	

ALCALDIA MUNICIPAL
 VILLA DE SAN FRANCISCO

 APROBADO POR

REVISADO POR

 SUPERVISADO POR

Recibi: *José Jorge*
 fecha: 13 / Sept / 2018
 Hora: 12:00 M

COMUNIDAD VECINA DE SAN FRANCISCO DE
 MANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO (ATA ADICIONAL)"
 CONFORMACION DE ZANJAS, INSTALACION DE TUBERIA Y ATERRADO DE LA MISMA

PARA: OSCAR SALGADO
 ADMINISTRADOR GENERAL.

Corresponde al periodo del 10 de SEPTIEMBRE al 15 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
JOSE RUIFNO GARAY RODRIGUEZ	0715-1956-00030	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	5	200	1000				1000	
JOSE LUIS VERMUDES COLINDRES	0827-1984-00117	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	5	200	1000				1000	
REYNALDO RAFAEL ESPINO MENDOZA	0827-1984-00176	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	5	200	1000				1000	
SANTOS ERNESTO PINEDA RODRIGUEZ	0715-1976-00240	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	4	200	800				800	
JUAN PABLO RODRIGUES AMADOR	0801-1975-07941	JORNAL	CONFORMACION DE TERRENO E INSTALACION DE TUBERIA	5	200	1000				1000	
										L. 4.800.00	

NOTA: EL HORARIO DE TRABAJO ES DE 6 AMI HASTA LAS 4 PM, SE TOMO LA DECISION DE PAGARLES 200 LEMPIRAS POR DIA POR LO EXTENSO DE LA JORNADA DE TRABAJO Y LA DUREZA DEL MISMO.

ALC. LIDIA PINO
 APROBADO POR

REVISADO POR

Recibi: *Jessica Rodríguez*
 Fecha: *13/Sept 2018*
 Hora: *12:00 H*

SUBSCRIPCIÓN POR

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO S.A.S.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS MUNICIPALES EN EDIFICIO PLAN EN HOMBRES"

BARRIO EL CENTRO
Corresponde al periodo del 10 de SEPTIEMBRE al 15 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Días trabajados	Salario diario	Total lps días trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
DARWIN ALEXANDER RODRIGUEZ	0827-1980-00258	ALBAÑIL	LEVANTAMIENTO DE PAREDES	6	300	1800	0	25	0	1800	
HUIJER OMAR CALIX GANZALES	0827-2000-00005	AYUDANTE	LEVANTAMIENTO DE PAREDES	6	150	900	0	25	0	900	
										L. 2.700,00	

[Handwritten Signature]
Aprobado por:
APROBADO POR

REVISADO POR _____

[Handwritten Signature]
SUPERVISOR
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO S.A.S.

Recibi: *Jessica Rodríguez*
Fecha: *13/ Sept 2018*
hora: *12:00 M*

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO E.M.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS LOCALES, PROYECTO: "MANTENIMIENTO DE CALLE ALDEA EL COYOLITO"


BARRIO EL CENTRO DEL COYOLITO
Corresponde al periodo del 10 de SEPTIEMBRE al 15 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias	Salario	Total ips	Horas	Valor ips	Total ips	Total a	Recibi conforme
				trabajados	diario	dias trabajados	extras	extras	horas extras	pagar	
CRISTOBAL FIDEL TORRES	0827-1993-00021	ALBAÑIL	REPARACION DE CABEZALES	1	300	300	0	25	0	300	L. 300,00

ALCALDIA

APROBADO POR

REVISADO POR


SUPERVISOR

Recibi: *Jessica Rodriguez*
Fecha: 13/Sept 12018
hora: 12:00PM

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO E.L.M.
 PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "REPARACION DE MUJAS EN IPUVF 2018 - FABRICACION DE BALCONES"

PARA: OSCAR SALGADO
 ADMINISTRADOR GENERAL

BARRIO NUEVO PROGRESO
 Corresponde al periodo del 10 de SEPTIEMBRE al 15 de SEPTIEMBRE de 2018


Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
RENNER DIOME MEJIA CHACON	0827-1978-0001	SOLDADOR	FABRICACION DE BALCONES	4	300	1200	0	25	0	1200	
HENRY OMAR DIAZ MEJIA	0827-1991-00029	SOLDADOR	FABRICACION DE BALCONES	6	300	1800	0	25	0	1800	
MILTON LEONEL COLINDRES RIVERA	0827-1996-00006	AYUDANTE	FABRICACION DE BALCONES	6	150	900	0	25	0	900	
WILMER ALFREDO SALGADO TRIMINIO	0827-1994-00867	AYUDANTE	FABRICACION DE BALCONES	6	200	1200	0	25	0	1200	
FRANKLIN IZAGUIRRE HERRERA	0801-1076-06442	ALBAÑIL	RESANE DE PAREDES	4	300	1200	0	25	0	1200	
MANUEL DE JESUS LARA SERRANO	0511-1991-00116	AYUDANTE	RESANE DE PAREDES	4	150	600	0	50	0	600	
										L. 6.900.00	

ALC. DIAZ
 APROBADO POR

REVISADO POR

SUPERVISADO

Recibi: *Jessica Rodriguez*
 Fecha: *13/ Sept 2018*
 hora: *12:00M*




MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION


PARA: OSCAR SALGADO
 ADMINISTRADOR GENERAL

Corresponde al periodo del 10 de SEPTIEMBRE al 16 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
OSCAR AQUILES BANE GAS	0827-1955-00006	OPERADOR PLANTA	Mantenimiento Planta de tratamiento	7	150	L. 1,050.00	
JEAN CARLOS ALEXANDER DIAZ	0827-2002-00114	PEON	LIMPIEZA HUMEDAL	6	150	L. 900.00	
JOSE ARTURO AVILA	0801-1954-00112	PEON	LIMPIEZA HUMEDAL	6	150	L. 900.00	
						L. 2,850.00	

ALCANTARILLADO
 APROBADO POR 

REVISADO POR


 SUPERVISORA GENERAL

Recibi: Jessica Rodriguez
 Fecha: 13/Sept/2018
 hora: 12:00M

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNIALES, PROYECTO: "CONSTRUCCION DE BAÑOS MUNICIPALES EN EDIFICIO PLAN EN HONDURAS"

BARRIO EL CENTRO
Corresponde al periodo del 17 de SEPTIEMBRE al 22 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias	Salario	Total	Horas	Valor	Total	Total a	Recibi conforme
				trabajados	diario	ips	extras	ips	extras	pagar	
DARWIN ALEXANDER RODRIGUEZ	0827-1980-00258	ALBAÑIL	LEVANTAMIENTO DE PAREDES	6	300	1800	0	25	0	1800	
HENRY OMAR DIAZ MEJIA	0827-1991-00029	AYUDANTE	LIMPIEZA	3	150	450	0	25	0	450	
HULICER OMAR CALIX GANZALES	0827-2000-00005	AYUDANTE	LEVANTAMIENTO DE PAREDES	6	150	900	0	25	0	900	
										L. 3.150.00	

[Signature]
APROBADO POR

REVISADO POR

[Signature]
SUPERVISADO POR

Rubi: Yessir Rodriguez
Fecha: 20/09/18
13:07 pm hora



Corresponde al periodo del 17 de SEPTIEMBRE al 23 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Días trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
PEDRO REYES BAQUEDANO	0601-1945-00386	OPERADOR PLANTA	Mantenimiento Planta de tratamiento	7	150	L. 1,050.00	
JEAN CARLOS ALEXANDER DIAZ	0827-2002-00114	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	150	L. 900.00	
JOSE RUFINO GARAY RODRIGUEZ	0715-1956-00030	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	200	L. 1,200.00	
JOSE LUIS VERMUEDES COLINDRES	0827-1984-00117	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	150	L. 900.00	
REYNALDO RAFAEL ESPINO MENDOZA	0827-1984-00176	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	150	L. 900.00	
SANTOS ERNESTO PINEDA RODRIGUEZ	0715-1976-00240	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	150	L. 900.00	
JUAN PABLO RODRIGUES AMADOR	0801-1975-07941	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	150	L. 900.00	
OSCAR ANTONIO SALGADO SALGADO	0827-1991-00041	ALBAÑIL	REPARACION DE CAJAS	3	300	L. 900.00	
JORGE LUIS REYES FERRERA	0827-1993-00246	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	5	150	L. 750.00	
RODIL HARISON ALVAREZ LANZA	0715-1998-00134	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	4	150	L. 600.00	
JOSE ARTURO AVILA	0801-1954-00112	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	150	L. 900.00	
						L. 9,900.00	

NOTA: RUFINO GOZA DE UN PAGO DE 200 LP PORQUE DESPUES DE LA JORNADA DE TRABAJO EN LA PLANTA REALIZA LABORES DE INSPECCION DE DOMICILIO PARA DETECTAR PROBLEMAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO CON LOS FONTANEROS Y EL SUPERVISOR ENCARGADO



APROBADO POR

REVISADO POR

SUPERVISADO POR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Recibi: *[Handwritten signature]*
Fecha: 2018/09/18

hora: 13:07 pm


PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO S.M.
PLANTILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "CONSTRUCCION DE AULA EN ANEXO NUEVO PROGRESO EMPE"

BARRIO NUEVO PROGRESO
Corresponde al periodo del 17 de SEPTIEMBRE al 22 de SEPTIEMBRE de 2018


Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
JUNIOR FRANCISCO PONCE RAMOS	0827-1997-00098	ELECTRICISTA	INSTALACION ELECTRICA	1	300	300	0	50	0	300	
										L. 300.00	

APROBADO POR



REVISADO POR

REVISADO POR




Recibi: *Jessica Rodriguez*
Fecha: 20/09/18
hora: 13:07 pm

Corresponde al periodo del 24 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
PEDRO REYES BAQUEDANO	0601-1945-00386	OPERADOR PLANTA	Mantenimiento Planta de tratamiento	7	150	L. 1,050.00	
JEAN CARLOS ALEXANDER DIAZ	0827-2002-00114	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	200	L. 1,200.00	
JOSE RUFINO GARAY RODRIGUEZ	0715-1956-00030	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	200	L. 1,200.00	
JOSE LUIS VERMUDES COLINDRES	0827-1984-00117	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	200	L. 1,200.00	
REYNALDO RAFAEL ESPINO MENDOZA	0827-1984-00176	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	200	L. 1,200.00	
SANTO ERNESTO PINEDA RODRIGUEZ	0715-1976-00240	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	200	L. 1,200.00	
JUAN PABLO RODRIGUES AMADOR	0801-1975-07941	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	4	200	L. 800.00	
CESAR ANDRES RAUBALES PINEDA	0827-1995-00081	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	4	200	L. 800.00	
JORGE LUIS REYES FERRERA	0827-1993-00246	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	200	L. 1,200.00	
RODIL HARISON ALVAREZ LANZA	0715-1998-00134	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	200	L. 1,200.00	
JOSE ARTURO AVILA	0801-1954-00112	JORNAL	LIMPIEZA HUMEDAL	6	200	L. 1,200.00	
						L. 12,250.00	

NOTA: TODOS GOZAN DE UN PAGO DE 200 LP PORQUE DESPUES DE LA JORNADA DE TRABAJO CONTINUAN TRABAJANDO HASTA LAS 4PM LABORANDO ASI DE 6 AM A 4 PM ESTO FUE PLANTEADO ASI PORQUE NECESITAMOS QUE EL HUMEDAL FUNCIONE LO MAS RAPIDO POSIBLE

APROBADO POR





REVISADO POR

SUPERVISADO POR

Fecha: 27/09/2018
 h h m m : 11' 20"

RECIBI: Jessica & Rodriguez




PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNIALES, PROYECTO: "CONSTRUCCION DE BAÑOS MUNICIPALES EN EDIFICIO PLAN EN HONDURAS"

BARRIO EL CENTRO
Corresponde al periodo del 24 de SEPTIEMBRE al 29 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps Horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
DARWIN ALEXANDER RODRIGUEZ	0827-1980-00258	ALBAÑIL	REPELLO	6	300	1800	0	25	0	1800	
HULICER OMAR CALIX GANZALES	0827-2000-00005	AYUDANTE	REPELLO	6	150	900	0	25	0	900	
										L. 2.700.00	

ALCALDIA MUNICIPAL
APPROBADO POR



REVISADO POR



Recibi: *Vessica*
Fecha: 27/09/2018
Hora: 14:38 pm

GOBIERNO MUNICIPAL
SUPERVISADO POR

