



Municipalidad Villa de San Francisco F.M.



11 FEBRERO DE 2019

Señorita.

Merary Cárcamo

Oficina de Acceso a la Información Pública

Su oficina.

Como jefe de **Unidad Técnica Municipal** de esta dependencia, por este medio remito a Usted la información correspondiente a las contrataciones Durante el mes de ENERO de 2019.

Adjunto el **RESUMEN DE LAS CONTRATACIONES DE ESTE DEPARTAMENTO.**

Sin otro en particular.



Ing. Milton Porfirio Zambrano
Jefe Unidad Técnica Municipal

“Trabajando de la mano del pueblo y para el pueblo”
Telefax: 2769-6333, Tel.: 2769-6655, 2769-6657

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
RESUMEN DE CONTRATACIONES EN EL MES DE ENERO 2019

DESCRIPCION DE CONTRATACION	OMBRE DEL CONTRATADA	RESPONSABLE	PROYECTO	MONTO	FECHA	
3	CONTARACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CAMBIO DE TECHO DE KINDER ALDEA EL HATO	L. 1,500.00	5/1/2019
4	CONTARACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,800.00	11/1/2019
6	CONTARACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO	L. 9,400.00	11/1/2019
7	CONTARACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CAMBIO DE TECHO DE KINDER ALDEA EL HATO	L. 3,450.00	11/1/2019
8	CONTARACION DE JORNALES	PEDRO REYES VAQUEDANO	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,050.00	18/1/2019
9	CONTARACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO	L. 13,350.00	18/1/2019
10	CONTARACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CAMBIO DE TECHO DE KINDER ALDEA EL HATO	L. 3,000.00	18/1/2019
11	CONTARACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO	L. 10,500.00	25/1/2019
12	CONTARACION DE JORNALES	PEDRO REYES VAQUEDANO	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 2,550.00	1/2/2019
13	CONTARACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CAMBIO DE TECHO EN ESCUELA, MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 27,600.00	1/2/2019
14	CONTARACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CAMBIO DE TECHO DE KINDER ALDEA EL HATO	L. 3,500.00	1/2/2019
15	CONTARACION DE JORNALES	OSCAR AQUILES BANEAGAS	DEPTO. U.T.M.	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	L. 1,050.00	25/1/2019

16	MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CAMBIO DE TECHO DE KINDER ALDEA EL HATO	L. 3,000.00	25/1/2019
17	CONTARACION DE JORNALES	VARIOS	DEPTO. U.T.M.	CAMBIO DE TECHO EN ESCUELA, MIGUEL PAZ BARAHONA	L. 5,750.00	25/1/2019
18	COMPRA DE MATERIAL DE RIO	JOSE LORENZO CARRASCO	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO	L. 4,400.00	11/1/2019
19	CONSTRUCCION DE REJILLAS	MELVIN JOHEL RODAS	DEPTO. U.T.M.	REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANOP	L. 14,700.00	ENERO 2019
20	CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS	GUSTAVO ADOLFO AMAYA	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO	L. 6,750.00	11/1/2019
21	COMPRA DE MATERIAL DE RIO	JOSE LORENZO CARRASCO	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO	L. 5,300.00	30/1/2019
22	PAGO POR SUPERVISION DE TRABAJO	FREDY RAMON CASTRO	DEPTO. U.T.M.	PAVIMENTACION CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ	L. 8,000.00	30/1/2019
23	CONSTRUCCION DE TECHO, PUERTAS Y VENTANAS	MELVIN JOHEL RODAS	DEPTO. U.T.M.	CAMBIO DE TECHO DE KINDER ALDEA EL HATO	L. 19,800.00	30/1/2019



ING. MILTON PORFIRIO ZAMBRANO
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Villa de San Francisco, F.M

10 ENERO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal


Por medio de la presente le solicito se realice un pago al señor: **MELVIN JOHEL RODAS** con identidad N° **0827-1985-00079** con un monto de: **7,350.00 Lempiras** por concepto de pago por fabricación e instalación de 2 rejilla metálica con marco de Angulo de 1 ½" x 3/16" y rejilla con Angulo de 1 ½" x ¼", angular del mismo tipo a cada 1.5" de separación soldadura eléctrica E6011.

Para el proyecto de Reparación de calles casco urbano (CUNETAS EN PARQUE CENTRAL).

OBRA TERMINADA 100% DE AVANCE

Sin otro más en particular.

ATTE.



Milton Porfirio Zambrano Lanza
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


Villa de San Francisco, F.M

30 de ENERO 2019


Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice el pago al señor: **FREDY RAMON CASTRO ROSALES** con identidad **0101-1957-01263**, por un monto de **LPS. 8,000.00** Quien desarrollo actividades de supervisión y logística en el proyecto: **PAVIMENTACION CLEMENTINA HENRIQUEZ**. Del 24 de **DICIEMBRE DE 2018** al 24 de **ENERO DEL PRESENTE AÑO**.

ATTE.



Milton Porfirio Zambrano Lanza
JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Villa de San Francisco, F.M

30 DE ENERO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: MELVIN JOEL RODAS con identidad N° 0827-1985-00079, por un monto de LPS 19,800.00079 por concepto de pago por CONSTRUCCION DE TECHO DE CANALETA Y LAMINA DE ALUZINC, CONSTRUCCION E INSTALACION DE PUERTAS Y BALCONES EN PROYECTO: REMODELACION KINDER ALDEA EL HATO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	SUB TOTAL
1	INSTALACION DE TECHO DE CANALÑETA Y LAMINA DE ALUZINC.	MTS	120	105	L12,600.00
2	FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES DE TUBO ESTRUCTURAL Y MALLAD ESPLEGADA	UNID	5	600	L3,000.00
3	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS CON LAMINA TROQUELADA DOBLE HOJA	UNID	1	1400	L1,400.00
4	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS METALICAS CON LAMINA TROQUELADA HOJA SENCILLA	UNID	1	2800	L2,800.00
TOTAL					L19,800.00

Sin otro más en particular.

ATTE.


Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Villa de San Francisco, F.M

30 DE ENERO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal

Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO con identidad 0714-1949-00156, por un monto de LPS 5,300.00 por concepto de compra de ARENA LAVADA DE RIO Y SEIS FLETES DE TIERRA PARA RELLENO, Proyecto: PAVIMENTACION CALLE CLEMENTINA HENRIQUEZ"

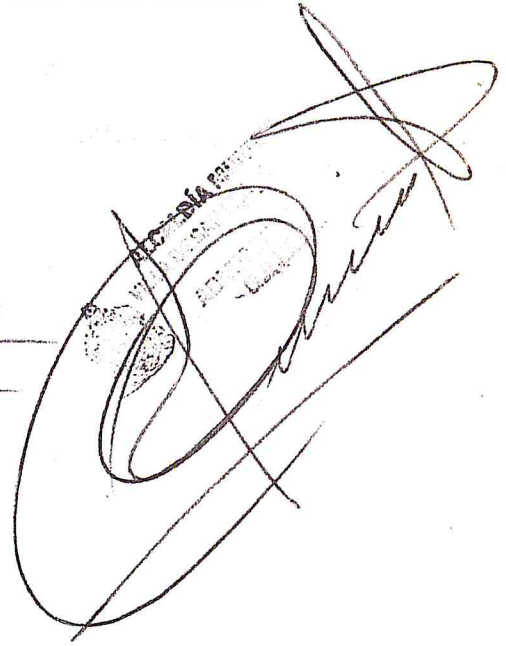
DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
ACARREO DE TIERRA PARA RELLENO	6 VOLQUETADA	LPS.700	LPS.4,200.00
COMPRA DE ARENA LAVADA	1 VOLQUETADA	LPS.1,100.00	LPS. 1,100.00
TOTAL			LPS. 5,300.00

Sin otro más en particular.

ATTE.


Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL





Villa de San Francisco, F.M

03 ENERO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se realice un pago al señor **GUSTAVO ADOLFO AMAYA MEDINA** con identidad N° **0827-1958-00096** con un monto de: **6,750.00** Lempiras por concepto de **CONSTRUCCION DE 5 CAJAS DE PROTECCION DE VALVULAS DE AGUA POTABLE POSTERIOR A LA PAVIMENTACION DE LA CALLE.**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	CAJAS DE PROTECCION DE VALVULA, DE BLOQUE DE 6" CON SUS RESPECTIVAS TAPADERAS	1350	L6,750.00

PAGO DEL 100% DE AVANCE

PROYECTO: PÁVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO

Sin otro más en particular.

ATTE.


Milton Porfirio Zambrano Lanza
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


02-enero-2019
Copia.

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO, F.M.
ADOLFO GUSTABON
GENERAL

Villa de San Francisco, F.M

10 DE ENERO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero municipal


Por medio de la presente le solicito se realice pago al señor: **JOSE LORENZO CARRASCO VAQUEDANO** con identidad **0714-1949-00156**, por un monto de **LPS 4,400.00** por concepto de compra de piedra de rio, arena. Proyecto: **PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO"**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUB TOTAL
COMPRA DE PIEDRA DE RIO	2 VOLQUETADAS	LPS.1,100.00	LPS. 2,200.00
COMPRA DE ARENA	2 VOLQUETADA	LPS.1,100.00	LPS. 2,200.00
TOTAL			LPS. 4,400.00

Sin otro más en particular.

ATTE.


Milton Porfirio Zambrano
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Villa de San Francisco, F.M

03 ENERO 2019

Para: Jaime Amaya
Tesorero Municipal

Por medio de la presente le solicito se realice un pago al señor: **MELVIN JOHEL RODAS** con identidad N° **0827-1985-00079** con un monto de: **7,350.00 Lempiras** por concepto de pago por fabricación e instalación de 2 rejilla metálica con marco de Angulo de 1 1/2" x 3/16" y rejilla con Angulo de 1 1/2" x 1/4", angular del mismo tipo a cada 1.5" de separación soldadura eléctrica E6011.

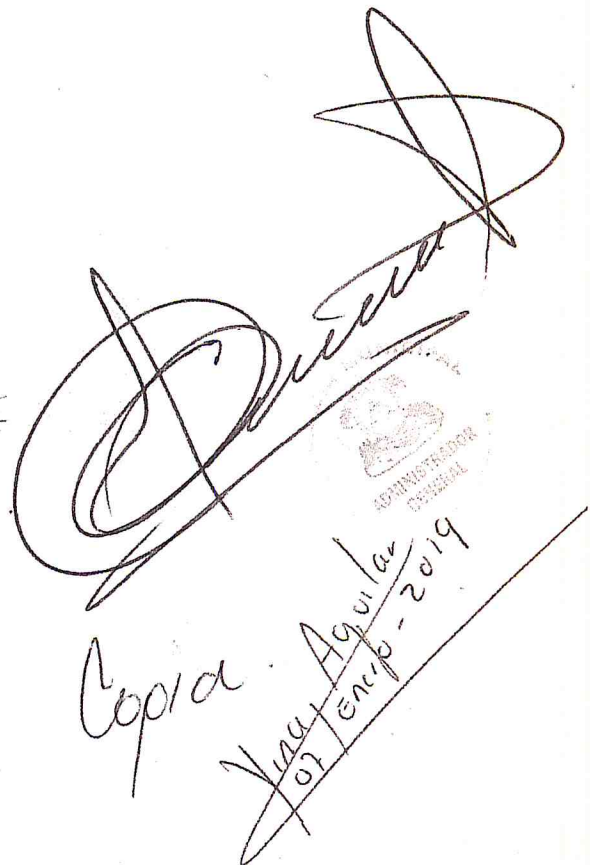
Para el proyecto de Reparación de calles casco urbano (CUNETAS EN PARQUE CENTRAL).

PAGO DEL 50% DE AVANCE

Sin otro más en particular.

ATTE.


Milton Porfirio Zambrano Lanza
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


Copia
Yana Aguilar
07 Enero - 2019


PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: CAMBIO DE TECHO, KINDER ALDEA EL HATO

BARRIO EL CENTRO; ALDEA EL HATO

Corresponde a actividades realizadas entre 05 de ENERO y 11 de ENERO

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
CRISTOBAL FIDEL TORRES	0827-1993-00021	ALBAÑIL	REPELLO Y RESANES	6	350	L. 2,100.00	
SANTOS GUILLERMO SALGADO MENDOZA	0827-1964-00076	AYUDANTE	LIMPIEZA	3	150	L. 450.00	
JOSE ANTONIO UMANZOR IRIAS	0801-1962-09748	AYUDANTE	REPELLO Y RESANES	6	150	L. 900.00	
						L. 3,450.00	

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCALDE PRESIDENTE
GENERAL

APROBADO POR


SUPERVISADO POR

Recibi: *Jessica Rodríguez*
Fecha: 30/ Enero/ 19
Hora: 11:02 AM




PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL


PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO
CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y FUNDICION DE BOCAS CALLES EN CALLE

Corresponde al periodo del 05 de ENERO al 11 de ENERO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
JAEETH ALEJANDRO IZAGUIRRE	0826-1998-00054	AYUDANTE	FUNDICION DE BATEAS	6	150	900				900	
MILTON LEONEL COLINDRES RIVERA	0827-1996-00006	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	7	150	1050				1050	
GUSTABO ADOLFO AMAYA MEDINA	0827-1958-00096	ALBAÑIL	FUNDICION DE BATEAS	7	300	2100				2100	
PEDRO TREJO MONCADA	0827-1981-00149	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	2	200	400				400	
CARLOS ALBERTO MIDENCE PALADA	0826-1945-00016	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	6	200	1200				1200	
JUAN FRANCISCO COLINDRES HENRIQUEZ	0827-1977-00042	AYUDANTE	FUNDICION DE BATEAS	8	150	1200				1200	
KRISTIAN OBED ESCALANTE COELLO	0825-1999-00031	AYUNABTE	FUNDICION DE BATEAS	1	150	150				150	
WILMER ALFREDO SALGADO TRIMINIO	0827-1994-00067	AYUDANTE	FUNDICION DE BATEAS	4	150	600				600	
SANTOS CORONADO CERRATO PALADA	0826-1942-00091	ALBAÑIL	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	6	300	1800				1800	
										L. 9,400.00	


 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO
 ALBAÑIL
 APROBADO POR

REVISADO POR


 SUPERVISADO POR:

Recibi: *Pessia Rodríguez*
 Fecha: 30/01/19
 Hora: 11:02 AM




PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 07 de ENEROE al 13 de ENERO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
JOSE ARTURO AVILA	0801-1954-00112	JORNAL	MANTENIMIENTO HUMEDAL	5	150	L. 750.00	
PEDRO REYES BAQUEDANO	0601-1945-00386	OPERADOR PLANTA	Mantenimiento Planta de tratamiento	7	150	L. 1,050.00	
						L. 1,800.00	

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.

APROBADO POR

REVISADO POR


SUPERVISADO POR

Recibi: *Jessica Rodriguez*
Fecha: 10/ Enero/ 19
Hora: 11:02 AM




PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: CAMBIO DE TECHO, KINDER ALDEA EL HATO


Corresponde a actividades realizadas entre 02 de ENERO y 05 de ENERO
BARRIO EL CENTRO; ALDEA EL HATO

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
CRISTOBAL FIDEL TORRES	0827-1993-00021	ALBAÑIL	LEVANTAMIENTO DE PAREDES	3	350	L. 1,050.00	
JOSE ANTONIO UMANZOR IRIAS	0801-1962-09748	AYUDANTE	LEVANTAMIENTO DE PAREDES	3	150	L. 450.00	
						L. 1,500.00	

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ADMINISTRADOR GENERAL

APROBADO POR




SUPERVISADO POR

Recibi: 
Fecha: 08 Enero 2019

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "CAMBIO DE TECHO DE 4 AULAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA"
DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE, CONSTRUCCION DE TECHO DE CANALETA Y LAMINA DE ALUZNIC

Corresponde al periodo del 21 de ENERO al 25 de ENERO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias	Salario	Total Ips	Horas	Valor Ips	Total Ips	Total a	Recibi conforme
				trabajados	diario	trabajados	extras	extras	horas extras	pagar	
SANTIAGO PAGUADA ELVIR	0827-1958-00132	AYUDANTE	DESMONTAJE DE TECHO	6	150	900				900	
JOSE ARTURO AYALA MONCADA	0827-2000-00182	AYUDANTE	DESMONTAJE DE TECHO	4	150	600				600	
OLVIN PAGUADA ENRIQUEZ	0708-1993-00181	AYUDANTE	DESMONTAJE DE TECHO	5	150	750				750	
KRISTIAN OBED ESCALANTE COELLO	0825-1999-00031	AYUNABTE	DESMONTAJE DE TECHO	4	150	600				600	
WILMER ALFREDO SALGADO TRIMINIO	0827-1994-00067	AYUDANTE	DESMONTAJE DE TECHO	4	200	800				800	
JOSE DONALDO PAGUAGA RODRIGUEZ	0827-1949-00022	ALBANIL	DESMONTAJE DE TECHO	6	350	2100				2100	
										L. 5,750.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

Recibi: *Jessica Rodriguez*
Fecha: *24/ Enero/ 2019*
hora: *13:53 pm*

[Signature]
SUPERVISADO POR

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
 PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: CAMBIO DE TECHO, KINDER ALDEA EL HATO

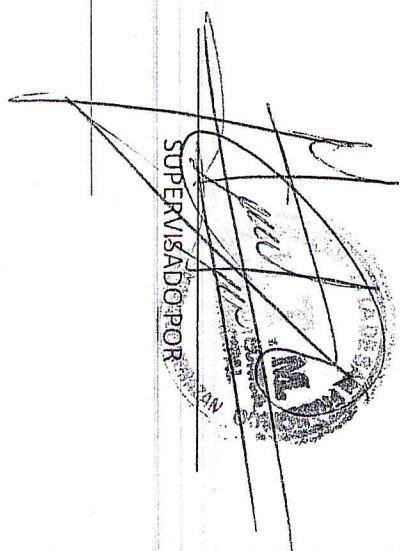
PARA: OSCAR SALGADO
 ADMINISTRADOR GENERAL

BARRIO EL CENTRO, ALDEA EL HATO

Corresponde a actividades realizadas entre 19 de ENERO y 25 de ENERO

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
CRISTOBAL FIDEL TORRES	0827-1993-00021	ALBAÑIL	REPELLO Y RESANES	6	350	L. 2,100.00	
JOSE ANTONIO UMANZOR IRIAS	0801-1962-09748	AYUDANTE	REPELLO Y RESANES	6	150	L. 900.00	
						L. 3,000.00	

APROBADO POR _____


 SUPERVISADO POR

Recibi: Jessica Rodríguez
 Fecha: 24/Enero/2019
 Hora: 18:53 pm.

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

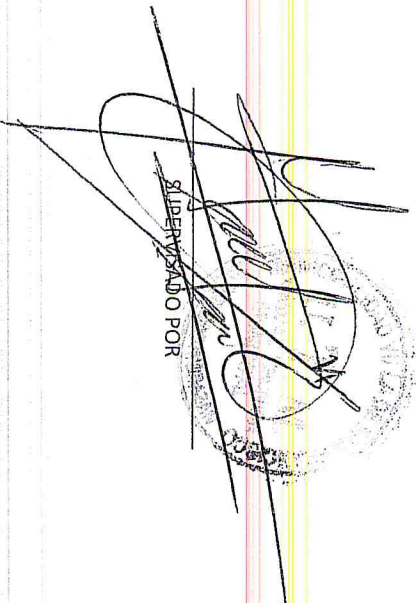
MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 21 de ENEROE al 27 de ENERO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
OSCAR AQUILES BANEGAS	0827-1955-00006	OPERADOR PLANTA	Mantenimiento Planta de tratamiento	7	150	L. 1,050.00	
						L. 1,050.00	

APROBADO POR

REVISADO POR


REVISADO POR

Raibhi : *Jessica Rodríguez*
Fecha : *24/ Enero/ 2019*
hora : *13:53 pm*


PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: CAMBIO DE TECHO, KINDER ALDEA EL HATO

BARRIO EL CENTRO; ALDEA EL HATO


Corresponde a actividades realizadas entre 26 de ENERO y 01 de FEBRERO

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
CRISTOBAL FIDEL TORRES	0827-1993-00021	ALBAÑIL	REPELLO Y RESANES	7	350	L. 2,450.00	
JOSE ANTONIO UMANZOR IRIAS	0801-1962-09748	AYUDANTE	REPELLO Y RESANES	7	150	L. 1,050.00	
						L. 3,500.00	


APROBADO POR



Recibido: 
Fecha: 31 Enero / 2019


RECIBIDO POR

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL


PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "CAMBIO DE TECHO DE 4 AULAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA"
DESMONTAJE DE TECHO EXISTENTE, CONSTRUCCION DE TECHO DE CANALETA Y LAMINA DE ALUZINC

Corresponde al periodo del 25 de ENERO al 01 de FEBRERO de 2019

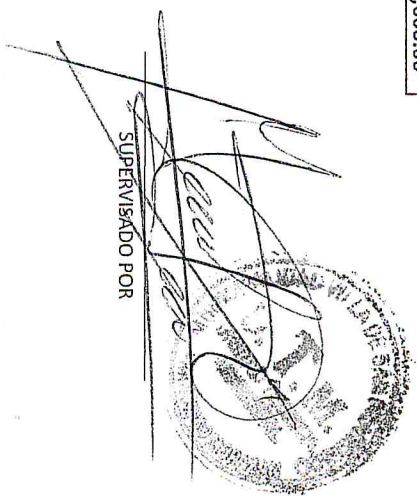
Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps dias trabajados	Total a pagar	Recibi conforme
FRANKLIN IZAGUIRRE HERRERA	0801-1076-06442	ALBAÑIL	CONSTRUCCION DE PAREDES	9	300	2700	2700	
JAIRO ANTONIO MANCIA ALVARES	0501-1985-10552	SOLDADOR	CONSTRUCCION DE TECHO	9	350	3150	3150	
EDGAR LEONEL SALGADO PEREIRA	0827-1993-00038	SOLDADOR	CONSTRUCCION DE TECHO	8	350	2800	2800	
JOSE ARTURO AVILA	0810-1957-00112	AYUDANTE	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	5	150	750	750	
JUNIOR FRANCISCO PONCE RAMOS	0827-1997-00098	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE PAREDES	5	200	1000	1000	
OSCAR ANTONIO SALGADO SALGADO	0827-1991-00041	ALBAÑIL	CONSTRUCCION DE PAREDES	5	350	1750	1750	
ALEX JAVIER FLORES SANCHEZ	0827-1972-00136	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE PAREDES	4	200	800	800	
WILMER DANILLO RODRIGUEZ SANTOS	0827-1974-00046	ALBAÑIL	CONSTRUCCION DE PAREDES	4	300	1200	1200	
BRAYAN ALDAIR HERNANDEZ RAMOS	0801-2000-09434	AYUDANTE	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	4	150	600	600	
BAYRON JOSUE BORJAS AYALA	0827-1985-00034	SOLDADOR	CONSTRUCCION DE TECHO	3	350	1050	1050	
WILTON ADOLFO MENDOZA MENDOZA	0827-1992-00250	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE TECHO	9	200	1800	1800	
HELSYN MANUEL RODRIGUEZ	0827-1981-00020	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE TECHO	9	200	1800	1800	
SANTIAGO PAGUADA ELVIR	0827-1958-00132	AYUDANTE	LIMPIEZA DE ESCOMBRO	8	150	1200	1200	
JOSE ARTURO AYALA MONCADA	0827-2000-00182	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE PAREDES	8	150	1200	1200	
OLVIN PAGUADA ENRIQUEZ	0708-1993-00181	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE PAREDES	8	150	1200	1200	
KRISTIAN OBED ESCALANTE COELLO	0825-1999-00031	AYUNABTE	CONSTRUCCION DE PAREDES	5	150	750	750	
WILMER ALFREDO SALGADO TRIMINIO	0827-1994-00067	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE TECHO	7	200	1400	1400	

JOSE DONALDO PAGUAGA RODRIGUEZ	0827-1949-00022	ALBAÑIL	CONSTRUCCION DE PAREDES	7	350	2450	2450	L. 27,600.00
--------------------------------	-----------------	---------	-------------------------	---	-----	------	------	--------------

NOTA: POR LA PREMURA DEL INICIO DE CLASES SE HAN DOBLADO LOS ESFUERZOS POR TERMINAR LO ANTES POSIBLE, ENTONCES SE ESTA PAGANDO MEJOR Y LAS JORNADAS DE TRABAJO SON MAS EXTENSAS.


 APROBADO POR

REVISADO POR _____


 SUPERVISADO POR




Revisado por Jessica Rodríguez
 Fecha: 31/Enero/2019

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 28 de ENERO al 03 de FEBRERO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
OSCAR AQUILES BANEGAS	0827-1955-00006	OPERADOR PLANTA	Mantenimiento Planta de tratamiento	7	150	L. 1,050.00	
JAFETH ALEJANDRO IZAGUIRRE	0826-1998-00054	AYUDANTE	Limpieza Humedal	5	150	L. 750.00	
MILTON LEONEL COLINDRES RIVERA	0827-1996-00006	AYUDANTE	Limpieza Humedal	5	150	L. 750.00	
						L. 2,550.00	


 APROBADO POR

REVISADO POR


 SUPERVISADO POR

Recibi: *Jessica Rodríguez*
 Fecha: 31 de Enero 2019



PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO
CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y FUNDICION DE BOCAS CALLES EN CALLE

Corresponde al periodo del 19 de ENERO al 25 de ENERO de 2019

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps trabajados	Horas extras	Valor lps horas extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
NIXON EDGARDO RIVERA	0827-1997-00324	AYUDANTE	PINTURA DE BORDILLOS	2	150	300				300	
IVAN ALEXANDER BENITEZ	0820-1999-00209	AYUDANTE	PINTURA DE BORDILLOS	2	150	300				300	
RICARDO ANTONIO ALVARADO	0827-1999-00185	AYUDANTE	PINTURA DE BORDILLOS	2	150	300				300	
LUIS ANTONIO MARADIAGA	0827-1993-00112	AYUDANTE	PINTURA DE BORDILLOS	2	150	300				300	
JAFETH ALEJANDRO IZAGUIRRE	0826-1998-00054	AYUDANTE	LIMPIEZA FINAL	7	150	1050				1050	
MILTON LEONEL COLINDRES RIVERA	0827-1996-00006	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	5	150	750				750	
GUSTABO ADOLFO AMAÑA MEDINA	0827-1958-00096	ALBAÑIL	FUNDICION DE BATEAS	3	300	900				900	
CARLOS ALBERTO MIDENCE PALADA	0826-1945-00016	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	4	200	800				800	
JUAN FRANCISCO COLINDRES HENRRIQUEZ	0827-1977-00042	AYUDANTE	FUNDICION DE BATEAS	7	150	1050				1050	
KRISTIAN OBED ESCALANTE COELLO	0825-1999-00031	AYUNABTE	FUNDICION DE BATEAS	6	150	900				900	
WILMER ALFREDO SALGADO TRIMINIO	0827-1994-00067	AYUDANTE	FUNDICION DE BATEAS	3	200	600				600	
JOSE ARTURO AVILLA	0810-1957-00112	AYUDANTE	FUNDICION DE BATEAS	7	150	1050				1050	
LUIS ALDUVIN PONCE RODRIGUEZ	0827-1998-00223	AYUDANTE	REPARACION DE ACERAS	2	150	300				300	
JOSE DONALDO PAGUAGA RODRIGUEZ	0827-1949-00022	ALBAÑIL	REPARACION DE ACERAS	2	350	700				700	
SANTOS CORONADO CERRATO PALADA	0826-1942-00091	ALBAÑIL	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	4	300	1200				1200	
										L. 10,500.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

Recibi: *Jessico Rodriguez*
Fecha: 24 Enero 2019
Hora: 13:53 pm



[Handwritten signature]
SUPERVISADOR POR

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: CAMBIO DE TECHO, KINDER ALDEA EL HATO

BARRIO EL CENTRO;ALDEA EL HATO

Corresponde a actividades realizadas entre 12 de ENERO y 18 de ENERO

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
CRISTOBAL FIDEL TORRES	0827-1993-00021	ALBAÑIL	REPELLO Y RESANES	6	350	L. 2,100.00	
JOSE ANTONIO UMANZOR IRIAS	0801-1962-09748	AYUDANTE	REPELLO Y RESANES	6	150	L. 900.00	
						L. 3,000.00	

APROBADO POR _____

Recibi: *Jessica Rodríguez*
Fecha: *16/enero/19*
Hora: _____


SUPERVISADO POR

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL

PLANILLA DE EMPLEADOS JORNALES, PROYECTO: "PAVIMENTACION CALLE CHILA LOZANO
CONSTRUCCION DE BORDILLOS Y FUNDICION DE BOCAS CALLES EN CALLE

Corresponde al periodo del 12 de ENERO al 18 de ENERO de 2019

Nombre completo	Nº DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total lps trabajados	Horas extras	Valor lps extras	Total lps horas extras	Total a pagar	Recibi conforme
JAFETH ALEJANDRO IZAGUIRRE	0826-1998-00054	AYUDANTE	FUNDICION DE BATEAS	7	150	1050				1050	
MILTON LEONEL COLINDRES RIVERA	0827-1996-00006	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	7	150	1050				1050	
GUSTABO ADOLFO AMAYA MEDINA	0827-1958-00096	ALBAÑIL	FUNDICION DE BATEAS	7	300	2100				2100	
MAURICIO ALEXANDER RODRIGUEZ CERNA	0827-1993-00247	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	1	150	150				150	
CARLOS ALBERTO MIDENCE PALADA	0826-1945-00016	AYUDANTE	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	7	200	1400				1400	
JUAN FRANCISCO COLINDRES HENRRIQUEZ	0827-1977-00042	AYUDANTE	FUNDICION DE BATEAS	7	150	1050				1050	
KRISTIAN OBED ESCALANTE COELLO	0825-1999-00031	AVUNABTE	FUNDICION DE BATEAS	4	150	600				600	
WILMER ALFREDO SALGADO TRIMINIO	0827-1994-00067	AYUDANTE	FUNDICION DE BATEAS	6	200	1200				1200	
JOSE ARTURO AVILA	0810-1957-00112	AYUDANTE	FUNDICION DE BATEAS	5	150	750				750	
LUIS ALDUVIN PONCE RODRIGUEZ	0827-1998-00223	AYUDANTE	REPARACION DE ACERAS	4	150	600				600	
OSCAR MAURICIO RICO MARTINEZ	0827-1981-00300	AYUDANTE	REPARACION DE ACERAS	1	200	200				200	
JOSE DONALDO PAGUAGA RODRIGUEZ	0827-1949-00022	ALBAÑIL	REPARACION DE ACERAS	4	350	1400				1400	
SANTOS CORONADO CERRATO PALADA	0826-1942-00091	ALBAÑIL	CONSTRUCCION DE BORDILLOS	6	300	1800				1800	
										L. 13,350.00	

APROBADO POR

REVISADO POR

Recibi: *Jessica Rodriguez*
Fecha: 26 Enero 19

[Signature]
SUPERVISADOR POR

PARA: OSCAR SALGADO
ADMINISTRADOR GENERAL


MUNICIPALIDAD VILLA DE SAN FRANCISCO F.M.
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN B° SAN FRANCISCO Y CONCEPCION

Corresponde al periodo del 14 de ENEROE al 20 de ENERO de 2019

Nombre completo	N° DE IDENTIDAD	CARGO	ACTIVIDAD	Dias trabajados	Salario diario	Total a pagar	Recibi conforme
PEDRO REYES BAQUEDANO	0601-1945-00386	OPERADOR PLANTA	Mantenimiento Planta de tratamiento	7	150	L. 1,050.00	L. 1,050.00

APROBADO POR _____

REVISADO POR _____


SUPERVISADO POR

Revisado por: Jessica Rodríguez
Fecha: 16/Enero/19
