



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com



Colomoncagua, Intibucá 03 de junio del 2019

Señor:

Nelson Alfredo González Yanes

Oficial de acceso a la información pública

Municipalidad de Colomoncagua, Intibucá

Su Oficina

Remito a usted la información de este departamento de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Mayo del 2019 para que sea cargada a las postales del Instituto de Acceso a la información Pública

Adjunto al cuadro de gastos ejecutados en proyectos en el mes de Mayo.

Firma encargado de U.T.M



Firma encargado de proyectos



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.
corp.municolomoncagua@gmail.com



N	nombre del proyecto	ubicación del proyecto	proposito	descripcion del proyecto	fuentes de financiamiento	monto presupuestado del proyecto	ampliacion del proyecto	monto ejecutado en e mes	estado del proyecto	observaciones
1	mejoras en kinder Rafael pineda ponce	casco- urbano	reparar y techar mesas de comedor para los niños	se hicieron varias mejoras en el kinder, entre ellas un arampa para entrar a las aulas y clases, se reparó y se techó las mesas para el comedor infantil	municipal	40,000.00	0	27,701.00	ejecutado	se hizo cambio de proyecto de: construcción de cocina comedor kinder de casco urbano
2	mejoramiento de sistema de agua potable	el llanito los amates	mejorar sistema de agua	se perforó y se hizo anillado de pozo.	municipal	100,000	0	14,250.00	ejecucion	
3	mejoramiento centro de educación	el carrizal	mejorar las condiciones del centro educativo	sistema de electrificación	municipal	120,000	0	6,000.00	ejecucion	
4	sistema de bombeo de agua	los mangos llano grande	mejorar sistema de agua	se instaló línea primaria y una bomba para bombeo de agua	municipal	0.00	10,000.00	10,000.00	ejecutado	se hizo desembolso de diez mil lempiras por la cantidad de garantía de proyecto
5	cocina comido en la escolar	San Antonio Vados	proporcionar un lugar adecuado para cocinar y para que los niños puedan adquirir sus alimentos	construcción de cocina y comedor en el Centro Educativo	Municipal	150,000.00	0	150,000.00	ejecutado	construcción de una cocina comedor en el centro educativo de san antonio vados
6	construcción de escenario	B. San Sebastian	proporcionar un lugar para poder realizar eventos sociales y culturales	Construcción de escenario para eventos camerinos y baños	Municipal		600,000.00	211,117.41	ejecutado	se realizó el escenario moderno para poder tener un lugar adecuado para realizar diferentes eventos
7	construcción Muro de Contención en carretera	trapiche el almendro		se construyó un muro de contención para evitar deslaves	Municipal		300,000.00	6,000.00	ejecutado	
8	construcción de muro de contención	B ^o La Travesilla casco urbano							en ejecución	
9	construcción Modulo Sanitario	El Copinol			Municipal		65,000.00	67,000.00	en ejecución	se hizo un traspaso por sobre giro
10	construcción de Casa Comunal	Barrio Nuevo	construir una sala comunal donde la comunidad pueda desarrollar las reuniones y eventos	compra de los materiales para la construcción de la casa comunal	Municipal		20,000.00	5,925.00	ejecutado	construcción de casa comunal para eventos de la comunidad
11	construcción de modulos sanitarios en escuela	crucitas Los Amates			Municipal		11,000.00	65,000.00	ejecucion	se construyeron modulos sanitarios en la escuela
12	construcción de cerca perimetral en centro de salud	Santa Ana	d cerca perimetral para la seguridad del equipo de centro de salud	se realizó la cerca perimetral del centro de salud	municipal		53,690.00	12,316.50	ejecutado	se realizó una cerca con muro de contención para la seguridad del centro educativo



**Informe de Supervisión
Municipalidad de Colomocagua**

Fecha de Supervisión: 07 de mayo 2019

Hora de llegada al proyecto Hora de salida

Nombre del proyecto: Continuación de módulos sanitarios

Ubicación: Comunidad Copinal

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución Abandono Terminada

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se encuentra en proceso de ejecución están terminando paredes mas cemento con que hace faltan Grava. Para seguir la construcción tambien la gente esta trabajando con voluntad y no han parado de trabajar estan bien agradevidos porque Tienen Fe que se va a terminar el Proyecto.
faltarón 2 bloques y una bolsa de cemento en la hora de entrega

Firma del Supervisor Asignado

Contratista

Cristian Martínez

Visto Bueno de:

de Presidente de Patronato

Fotos de proceso de construcción de módulos sanitarios en comunidad de copinol





**Informe de Supervisión
Municipalidad de Colomocagua**

Fecha de Supervisión: 12 de Mayo 2019

Hora de llegada al proyecto Hora de salida

Nombre del proyecto: Constuccion de Muro de Contencion

Ubicación: Barrio La Travesia, Casco Urbano

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución Abandono Terminada

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

el dia viernes 1 de febrero se visito el barrio la travesia donde se encontro los vecinos del barrio trabajando en la construcción de un muro de contención, como primera parte del proyecto el cual esta contemplado en tres tramos el primero, de 15 metros de largo por tres metros de alto. donde se va evitar tanto la laceración de la carretera y la seguridad de la casa de habitación.

Firma del supervisor Asignado [Firma]



Firma del Contratista [Firma]

Visto Bueno de:

de Precedente de Patronato





Municipalidad de Colomocagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: 12 Marzo 2019

Hora de llegada al proyecto Hora de salida

Nombre del proyecto: Instalación de ventiladores

Ubicación: Centro Educativo El Carrizal

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución Abandono Terminada

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

los maestros del centro Educativo Jose Cecilio del valle. solicitaron a la municipalidad para que se aporte en un pequeño Proyecto de ventiladores. Por motivo de la fuerte calor el cual estan agoviados por el Proyecto que lla se esta ejecutando se encontro al compañero Cresencio mendota haciendo la Instalación de los ventiladores y comentaron los maestros que ya van a estar mas tranquilos, al impartir las clases

Firma del supervisor Asignado

Contratista



Visto bueno

DIRECTOR

Proyecto de ventilación en el centro básico educativo de la comunidad el carrizal





Municipalidad de Colomocagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: 14 Mayo 2019

Hora de llegada al proyecto 2:00 Pm Hora de salida 2:15 Pm.

Nombre del proyecto: Construcción de Proyecto Potable

Ubicación: Casero llanito Amates Colomocagua

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución Abandono Terminada

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

el día martes 26 de marzo 2019 se hizo la supervisión del Proyecto de Agua Potable de el casero el llanito Amates colomocagua Proyecto que esta en ejecución estando los vecinos y albaniles constructores de la obra quienes comentaron que estan en la limpieza del Poso para luego en pesar con la construcción de las paredes quienes solo esperan el material para dar inicio


Firma del supervisor Asignado

Contratista

Miguel Espinoza

Visto bueno

De Presidente Patronato

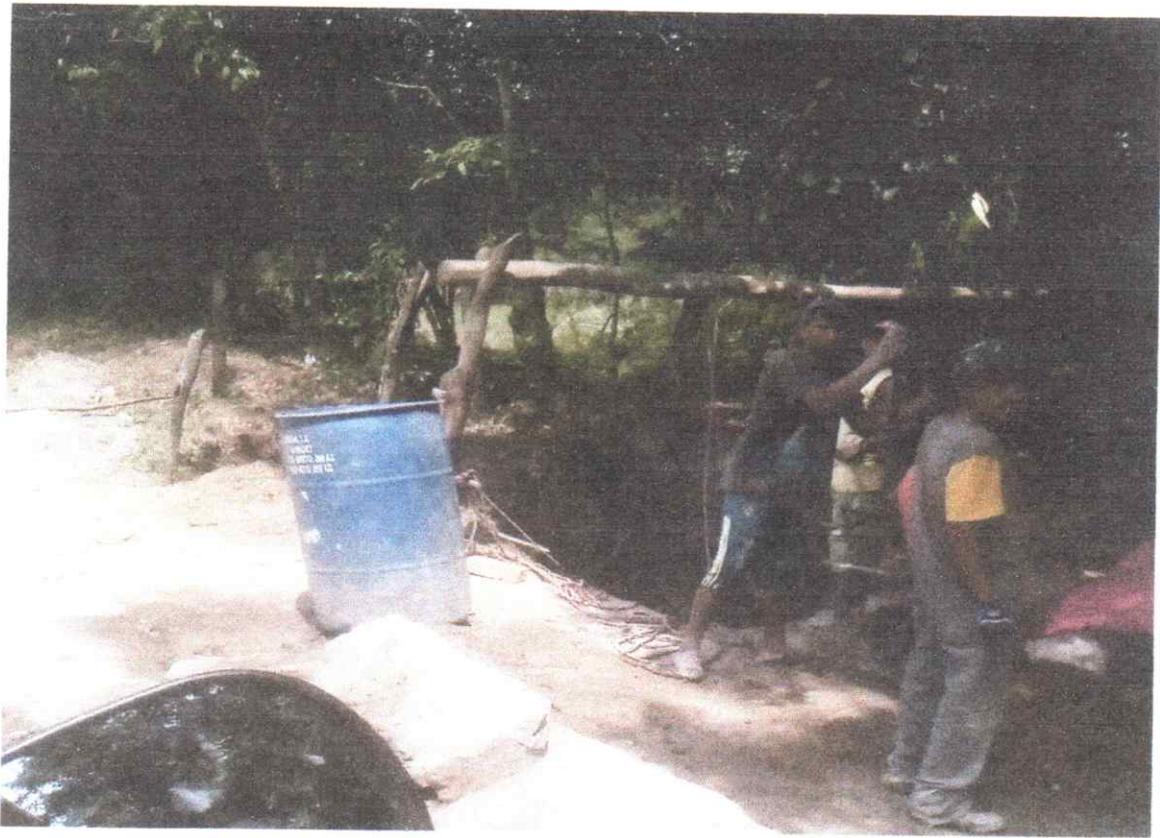





Municipalidad de Colomoncagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: 30 mayo 2019

Hora de llegada al proyecto

Hora de salida

Nombre del proyecto: Mejoras en kinder Casco Urbano

Ubicación: Casco Urbano Colomoncagua

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución Abandono Terminada


Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

En los avances en construcción de mejoras en kinder de Casco urbano se encuentra trabajando en pegado de cerámica para mesas de comedor y soldadura de las canaleras para el techo.


Firma del supervisor Asignado


Visto bueno




Contratista

De _____

Mesas para comedor Kínder Rafael Pineda Ponce

