



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# **COMISION PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)**

Al Cuarto Trimestre, 2018

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Enero, 2019

## IV. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

### 4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) institución capaz de: organizar, dirigir, adoptar medidas preventivas y de coordinación e integrar esfuerzos participativos para proteger la vida, bienes y el entorno de los habitantes del territorio nacional. La inversión pública al cuarto trimestre del año 2018 asciende a un monto de L.90,689,917 su ejecución financiera se detalla en el Cuadro No. 5

La Ejecución del cuarto trimestre alcanzó un porcentaje del (27%) que representó en términos monetarios un monto de L.24,045,899 la ejecución acumulada anual fue por un monto de L.67,291,076.41 representando el 74% con relación al presupuesto vigente.


**Cuadro No. 5**  
**Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2018**

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	81,509,917
Presupuesto Vigente	90,689,917
Devengado IV Trimestre - 18	24,045,899
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim. / Vigente Ajustado)</b>	<b>27%</b>
Devengado Anual	67,291,076
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)</b>	<b>74%</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

**Gráfico No.6**  
**Financiamiento de Inversión Por Organismo**  
Cifras en lempiras

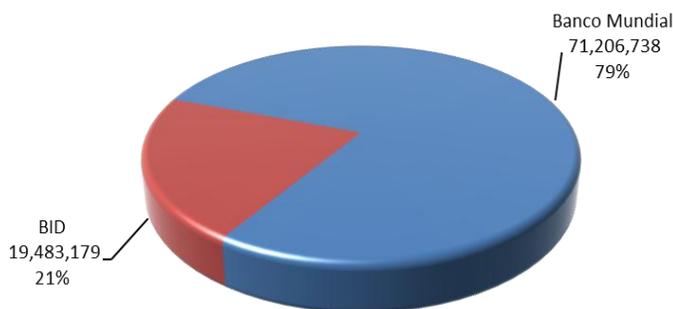

El presupuesto vigente es financiado totalmente por fondos de crédito externo: L90,689,917 de los cuales L.71,206,738 (79%) proveniente de fondos IDA-Banco Mundial y L.19,483,179 (21%) de fondos BID.

### 4.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión pública de La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en el año 2018 se concentró en los dos siguientes proyectos:

**Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO)** dicho proyecto tenía como objetivo la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales.

SECRETARÍA DE FINANZAS

El Proyecto ha finalizado su cierre financiero y administrativo en el mes de agosto de 2018, realizando los últimos pagos de la construcción del puente sobre el río blanco en San Luis, Santa Bárbara y pago de la auditoría financiera.

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al cuarto trimestre de 2018 y cierre del Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales</b>	2152/BL-HO	460,278,800	2011-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	7,034,554	19,483,179	2,779,214	14
Acumulado 2018	7,034,554	19,483,179	18,761,149	96
Acumulado Vida del Proyecto*/	460,278,800	460,278,800	397,935,265	86

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

**Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN)** tiene por objetivos: (a) continuar fortaleciendo su capacidad de gestión integral de riesgos de desastres a nivel municipal y nacional. (b) Mejorar su capacidad de respuesta inmediata y efectiva ante una emergencia elegible.

El avance físico obtenido al cuarto trimestre del 2018 ha sido muy importante, lográndose ejecutar muchas de las actividades reflejadas en el POA, al cuarto trimestre ha realizado las siguientes acciones:

A) **Obras:** 6 de construcción, finalizadas 5 al cuarto trimestre y la de Villanueva en febrero 2019.

Las medidas estructurales son:

- Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Helado y Puente Colgante para Reducir el Riesgo en la Aldea Buenos Aires-La Jutosa en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
- Canalización de aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal, Poder Ciudadano 1, y Callejas Maradiaga, para Reducción del Riesgo en el municipio de Potrerillos, Cortés.
- Construcción de Caja Puente sobre río Naco para Reducción del Riesgo en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
- Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Chiquito y Canalización de Aguas Pluviales en Colonia La Paz en el municipio de San Francisco de Yojoa, Cortés.
- Construcción de caja puente triple sobre la quebrada Chasnigua en sector El Sauce para Reducción del Riesgo en el municipio de Villanueva, Cortés.

El Proyecto tiene pendiente de pago L.12.2 millones que corresponden a estimaciones de cierre, devolución de retenciones y supervisión de las medidas de reducción de la vulnerabilidad construidas en 6 diferentes municipios, aunque 5 de estas quedaron ejecutadas físicamente al 100% su ejecución financiera quedó retrasada. Estos pagos pasaran para la gestión 2019. Dado a las últimas instrucciones de cierre emitidas por la Secretaría de Finanzas.



- B) **Bienes:** entregado el Equipo de cómputo para la UCP, Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT), entregadas 3 estaciones meteorológicas, Repuestos para radar banda X, tarjetas para radar banda S, se adjudicaron la compra 3 drones con cámara HD serán entregados en el 2019 Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de COPECO, entregadas a la Dirección Nacional de Recursos Hídricos (Miambiente), 6 pluviografos y heliógrafos equipo especial para la recolección de datos de precipitación por hora y recolección de datos de sol por hora.
- C) **Consultorías:** Auditoría externa en un 50% para la gestión de 2018 se revisó el 1er. semestre; Finalización de la elaboración de 2 planes de manejo de microcuencas para la reducción de riesgos en los municipios de El Negrito, Yoro y Omoa, Cortes. 2 planes de intervención con población autóctona con avance en un 80%, el 20% queda para ser finalizado el 2019. Supervisión de 5 Medidas estructurales a través de firma supervisora, para las medidas estructurales de los municipios Santa Cruz de Yojoa, Potrerillo, San Francisco de Yojoa, Villanueva del departamento de Cortes, Quimistan del departamento de Santa Bárbara, queda un 15% de ejecución de este contrato por la supervisión de la medida de Villanueva la cual se finalizará en el 2019. Finalizada la supervisión de 1 medida estructural a través de un consultor individual, en Santa Rita, Yoro.
- D) **Servicios de No Consultoría:** Sitio Web creación y mantenimiento y testimonios de satisfacción de obras en un 100%; y
- E) **Capacitaciones:** Taller de Reasentamiento, Taller de Manual del Constructor, Taller Regional de Alcaldes, Taller SIG en un 100% y Talleres de sistematización en un 80%.

El siguiente cuadro detalla la ejecución financiera al cuarto trimestre de 2018 del Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto*/	Inicio-Fin	
<b>Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres</b>	IDA 5190-HN	482,846,000	2013-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
IV Trimestre 2018	74,475,363	71,206,738	24,045,899	34
Acumulado 2018	74,475,363	71,206,738	48,529,927	68
Acumulado Vida del Proyecto*/	482,846,000	482,846,000	282,419,236	58

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Ejecución Física en Anexo No. 5

#### 4.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

##### Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD):

La DGIP otorgó Enmienda a Nota de Prioridad y ampliación de plazo por 20 meses a partir del 30 de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2020, a fin de concluir con las actividades programadas para dicho periodo y efectuar un cierre satisfactorio.



Se efectuaron dos modificaciones presupuestarias de traslado entre Objetos del Gasto de un mismo Programa, a fin de apoyar en la ejecución del POA programado para el presente año.

### Conclusiones

- Los dos proyectos ejecutados por COPECO muestran al cuarto trimestre 2018 una ejecución financiera acumulada de 74%, MITIGAR alcanzó una ejecución acumulado del 96% y el Proyecto Gestión de Riesgo de Desastres (PGRD) con 68%, con relación a sus respectivos presupuestos vigentes, cabe mencionar que el Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO) cerro su ejecución el 31 de agosto.
- El Proyecto PGRD tiene pendiente de pago L.12.2 millones que corresponden a estimaciones de cierre, devolución de retenciones y supervisión de las medidas de reducción de la vulnerabilidad, obras ejecutadas en un 100% pero que no se pudieron cargar los F01 dado a las últimas instrucciones de cierre emitidas por la Secretaría de Finanzas, pagos que afectaran el presupuesto de la gestión 2019.

### Recomendaciones

- Coordinar reuniones de seguimiento en conjunto con el Banco Mundial y la Secretaría de Finanzas con el objetivo de ajustar todas las actividades planificadas y programadas del proyecto para lograr parámetros aceptables de ejecución al cierre del presente año fiscal.
- Se recomienda al Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales presentar el informe de cierre a la Secretaría de Finanzas tal como lo establece los Lineamientos de Política Presupuestaria 2018 contenido en Lineamientos Generales de Política Presupuestaria índice d) sobre la inversión pública.
- Tomar las medidas referentes a las instrucciones que emite la Secretaría de Finanzas para la ejecución de los recursos en el tiempo programado, para que no les afecte la ejecución de los proyectos.



## SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Vigente Ajustado		Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado)		Ejecutado Anual (Devengado)		
				Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/Vigente Ajustado)
2	0041 - Comisión Permanente de Contingencias			81,509,917	81,509,917	90,689,917	90,689,917	90,689,917	90,689,917	24,045,899	24,045,899	67,291,076	67,291,076	74
1	PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	IDA 5190-HN	18/12/2012 30/04/2019	74,475,363	74,475,363	71,206,738	71,206,738	71,206,738	71,206,738	24,045,899	24,045,899	48,529,927	48,529,927	68
2	PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/ BL-HO)	2152/BL-HO	16/07/2010 31 /07/ 2018	7,034,554	7,034,554	19,483,179	19,483,179	19,483,179	19,483,179	-	-	18,761,149	18,761,149	96

Fuente: SIAFI, 31/12/2018



## SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre del 2018**

Institución / Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre- 18		
			Programado	Ejecutado	% Ejecución	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<b>Comisión Permanente de Contingencias</b>								
001 - PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	10 - Estaciones sismicas funcionando a nivel nacional	Estación	15	15	100%	15	15	100%
	07 - Comités de Emergencia Municipal (CODEM) del Valle de Sula reestructurados	Acta	20	20	100%	20	20	100%
	08 - Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	Acta de recepción de Obra	5	5	100%	5	5	100%
	09 - Ejecución del proyecto auditada por un ente externo.	Informe de Auditoría	1	1	100%	1	1	100%
002 - PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT	14 - Validación de Documento para Auditoria	Documento	2	1	50%	1	0	0%
	13 - Supervison de la Construcción de medidas estructurales para reducción de riesgos	Informe de Ejecución	2	0	0%	1	0	0%

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

