



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.

Colomoncagua Intibucá 7 de Mayo del 2021

Señor:

Nelson Alfredo Gózales Yáñez

Oficial de acceso a la información pública

Municipalidad de Colomoncagua Intibucá


Su oficina

Remito a usted la información de este departamento de la Unidad Técnica Municipal correspondiente al mes de Abril del 2021 para que sea cargada a los postales del instituto de acceso la información pública

Adjunto el cuadro de gastos en proyectos en el mes de Abril


ENCARGADO DE UTM AMPI




ENCARGADA DE UTM





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMNCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



n	Nombre del proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del proyecto	Fuentes de financiamiento	Monto presupuestado del proyecto	Ampliación del proyecto	Monto ejecutado en el mes	Estado del proyecto
1	Mejoramiento de carretera	El Porvenir		Reparación de tramos en mal estado	Municipal	0.0	30,642.77	11,000.00	En ejecución
2	Construcción de kinder	Los Amates	Proporcionar un lugar adecuado para que los niños reciban clases	Construcción de aula para kinder	Municipal	0.0	45,000.00	20,595.00	En ejecución
3	Ampliación de cerca de cancha de futbol	Pueblo viejo	Proporcionar un lugar adecuado para la sana recreación	Ampliación de la cancha, construcción de muro	Municipal	0.0	73,683.37	39,740.00	Ejecución
4	Mejoramiento de cancha de futbol	Los amates	Proporcionar un lugar adecuado para la sana recreación	Se construirá muro de contención en cancha de futbol	Municipal	0.0	95,604.00	11,000.00	En ejecución
5	Enchapado en tramo de carretera	San José de la montaña	Mejorar las condiciones de tramo de carretera	Enchapar tramo de carretera	Municipal	0.0	9175.00	8,700.00	Ejecutado
6	Reparación y mantenimiento de carretera	El Picacho	Mejorar el acceso de vehículos y transeúntes mediante el invierno	Arreglo con maquina	Municipal	0.0	249,965.00	55,125.00	En ejecución



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



7	Construcción de casa Comunal	La tejera	Proporcionar un lugar adecuado los pobladores puedan desarrollar eventos comunales	Construcción de casa comunal	Municipal	0.0	100,000.00	9,130.00	En ejecución
8	Construcción de muro de contención cancha de futbol	El carrizal		Construcción de muro de contención	Municipal	0.0	200,000.00	14,035.71	En ejecución



ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: 02-05-21

Hora de llegada al proyecto 2:30pm hora de salida 3:00pm

Nombre del proyecto: Empedrado y enchapado tramo de calle

Ubicación San José de la Montaña

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Al momento de realizar la visita a la comunidad de
San José de la Montaña se observó que los
habitantes están involucrados en el proceso
de ejecución del proyecto

Juan Luis
Firma del supervisor asignado

contratista



[Firma]

Visto bueno de:

MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EL CARRIZAL





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: 21 / 04 / 2021

Hora de llegada al proyecto ☐ hora de salida ☐

Nombre del proyecto: Construcción de muro Contención

Ubicación: El Camizal

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Al llegar al lugar de la construcción del muro de Contención de Campo de Fútbol de El Camizal, se encontro a los jóvenes a compañeros del presidente patronato trabajando en la fundición del muro.

Camin Martinez

Firma del supervisor asignado



Visto bueno de:

Presidente Patronato

Mantenimiento y reparación actual de carretera de rio lajitas, hasta picacho





ALCALDIA MUNICIPAL DE COLOMONCAGUA
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ HONDURAS C.A.



Ficha de supervisión: día miércoles 7 de abril 2021

Hora de llegada al proyecto 9:30 AM hora de salida 4:50 PM.

Nombre del proyecto: Construcción de casa Comunal.

Ubicación tejero

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ abandonado ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Se visitó la comunidad de Tejero donde se reunió el material del techo para la construcción de la Casa Comunal. Por lo que ya solo se está esperando poner cargadores y terminar con las paredes. Los comentarios según los vecinos es terminar antes de que venga la temporada de lluvia pero solo este material no ajusta lo demás se hará en tres curso del año como ser Puertas, piso, y refello son los comentarios de los vecinos.


[Firma]
Firma del supervisor asignado



contratista

[Firma]
Visto bueno de:

Construcción de casa comunal en comunidad tejera

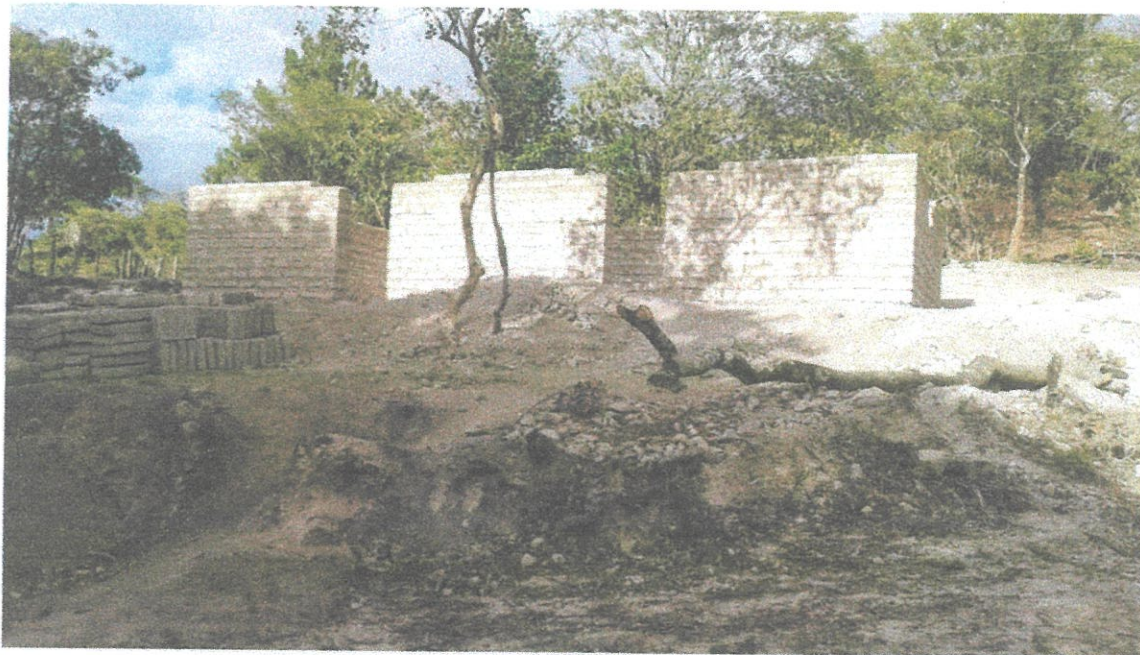



Municipalidad de Colomoncagua

Informe de Supervisión

Fecha de Supervisión: 12-11-2020

Hora de llegada al proyecto 11:30 AM Hora de salida 12:00 PM

Nombre del proyecto: Construcción cerca perimetral cancha de futbol

Ubicación: Pueblo Viejo

Descripción del estado en que se encuentra la obra:

En proceso de ejecución ☒ Abandono ☐ Terminada ☐

Comentario observaciones encontradas durante la visita al proyecto:

Durante se realizo la visita a la comunidad de Pueblo Viejo se encontro que el proyecto construcción de cerca perimetral de la cancha de futbol esto en proceso de ejecución y se observo que los habitantes son involucrados en el proceso.

Firma del supervisor Asignado

Contratista

De



MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL PUEBLO VIEJO

