



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe de actividades mes de mayo

Jefe Unidad Técnica Municipal:

Arq. Josué David Serrano Alvarado

Alcalde Municipal

Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz,

30 de mayo del 2022.



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe De Supervisión
PAREDES, BATIENTES, TALLADO DE BOQUETES Y
COLUMNAS

Jefe Unidad Técnica Municipal:
Arq. Josué David Serrano Alvarado

Días de ejecución:
15 días

Fecha De Presentación:
14 de marzo del 2022.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz,
20 de mayo 2022.



Memoria Descriptiva

La unidad técnica municipal, realizó supervisiones en la casa de la cultura en esta primera quincena del mes de mayo con el propósito de evaluar avances y calidad de obra.

Las actividades realizadas en el inmueble son:

- Construcción de paredes de bloque de 6”
- Picado y Tallado de columnas
- Tallado de boquetes
- Solera Inferior área de baños
- Fundición de batientes



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN: BARRIO CONCEPCIÓN	
BENEFICIARIOS	VISITANTES DE LA CASA DE LA CULTURA Y POBLACIÓN EN GENERAL
INSTITUCIÓN SOLICITANTE O EJECUTORA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
DURACIÓN DEL PROYECTO	15 DÍAS DE TRABAJO, TERCERA QUINCENA
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	EN PROCESO
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ
EJECUTOR	ARQ. JOSUÉ DAVID SERRANO
DEPARTAMENTO	UTM



SUPERVISIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS

FECHA DE INICIO: 7 DE MAYO 2022

FECHA DE AVANCE DE ESTIMACIÓN: 20 DE MAYO DE 2022

TRABAJOS REALIZADOS EN 15 DIAS

- EXVACACIÓN PARA CIMENTACIÓN
- SOLERA INFERIOR AREA DE BAÑOS
- PAREDES DE BLOQUE
- TALLADO DE BOQUETES







ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

DISEÑO Y PRESUPUESTO
CASA DE LA CULTURA

Jefe Unidad Técnica Municipal:
Arq. Josué David Serrano Alvarado

Días de trabajo:
10

Fecha De Presentación:
24 de mayo del 2022.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz,
30 de mayo 2022.



Memoria Descriptiva

La unidad técnica municipal, primeramente, realizó la inspección del inmueble para evaluar las condiciones del mismo y luego proceder al diseño arquitectónico.

Actividades realizadas:

- Levantamiento
- Evaluación de estructura existente
- Diseño arquitectónico




IDENTIFICACION DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN: BARRIO EL CIPRES	
BENEFICIARIOS	JOVENES, CIUDADANOS Y VISITANTES
INSTITUCIÓN SOLICITANTE O EJECUTORA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
DURACIÓN DEL PROYECTO	SE ESTA DESARROLLANDO POR ETAPAS
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	EN PROCESO
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ
DISEÑADOR	ARQ. JOSUÉ DAVID SERRANO
DEPARTAMENTO	UTM



DISEÑO ARQUITECTÓNICO

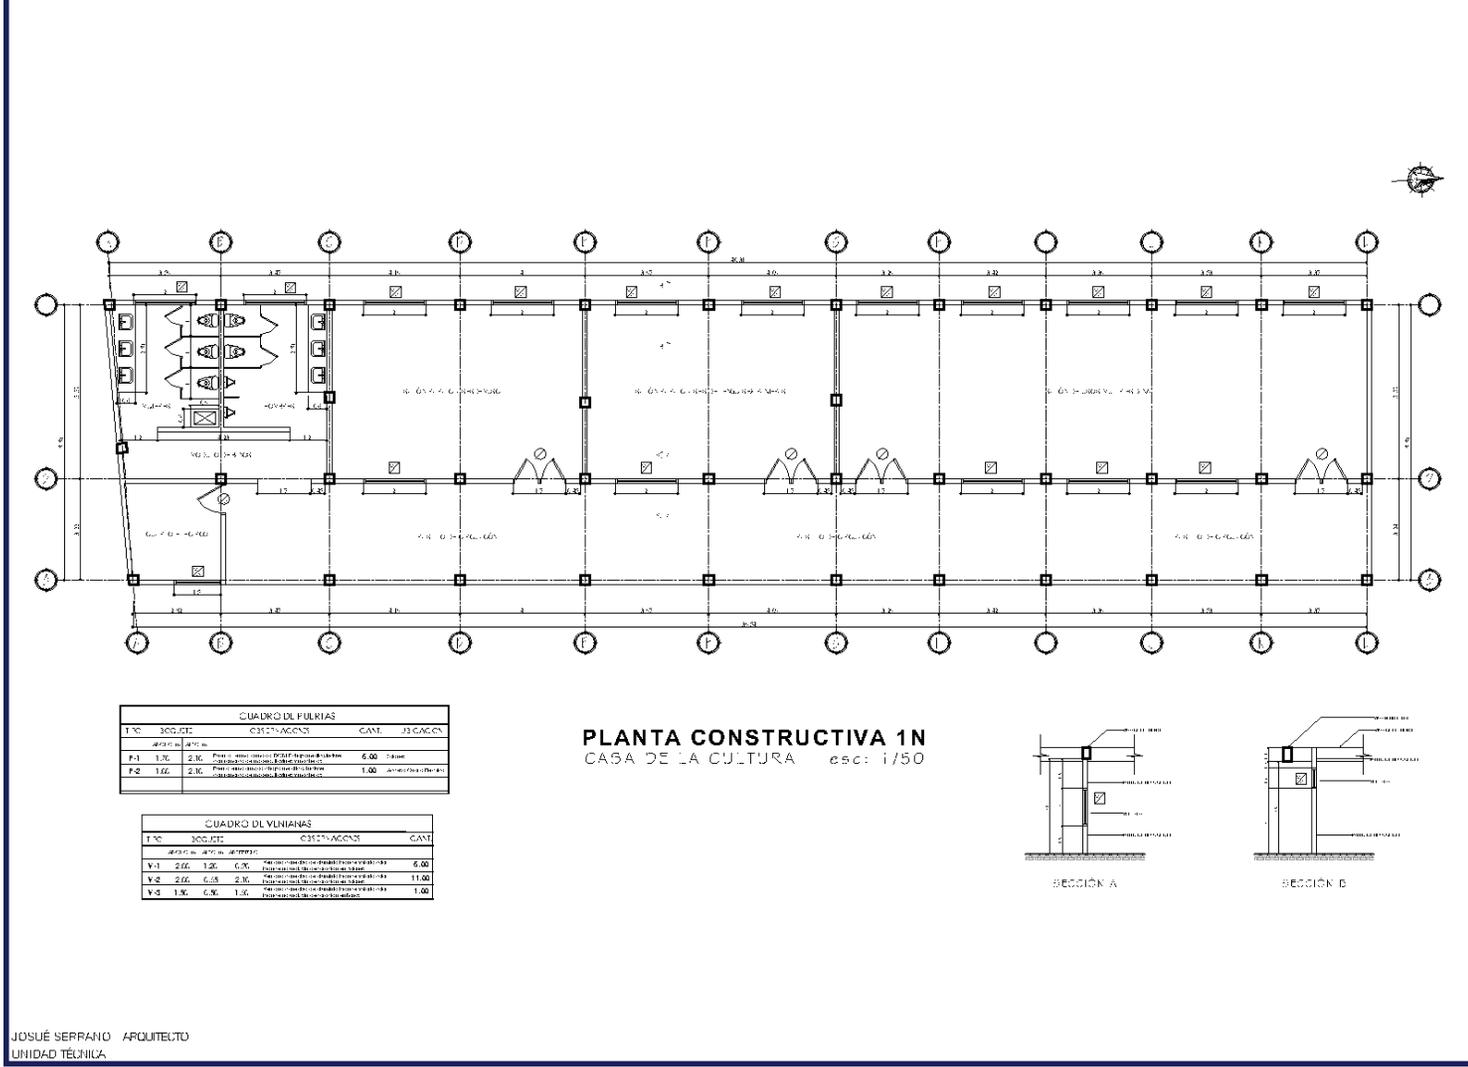



MODELO 3D





ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

DISEÑO Y PRESUPUESTO
MODULO SANITARIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO
DE GONZALES

Jefe Unidad Técnica Municipal:
Arq. Josué David Serrano Alvarado

Días de trabajo:
5

Fecha De Presentación:
24 de mayo del 2022.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz,
30 de mayo 2022.



Memoria Descriptiva

La unidad técnica municipal, realizó la inspección de las instalaciones de dicho centro para evaluar técnicamente la construcción del módulo sanitario con el propósito de mejorar las condiciones en este centro educativo.

Actividades realizadas:

- Reconocimiento del espacio disponible para la construcción
- Factibilidad del proyecto
- Revisión de acuerdo y presupuesto
- Diseño y aprobación por parte de la junta de los padres de familia
- presupuesto




IDENTIFICACION DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN: BARRIO SAN RAFAEL	
BENEFICIARIOS	NIÑOS QUE ESTUDIAN EN EL CENTRO, FAMILIARES Y VISITANTES
INSTITUCIÓN SOLICITANTE O EJECUTORA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
DURACIÓN DEL PROYECTO	25 DIAS
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	EN ANALISIS
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ Y ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
DISEÑADOR	ARQ. JOSUÉ DAVID SERRANO
DEPARTAMENTO	UTM



DISEÑO ARQUITECTÓNICO

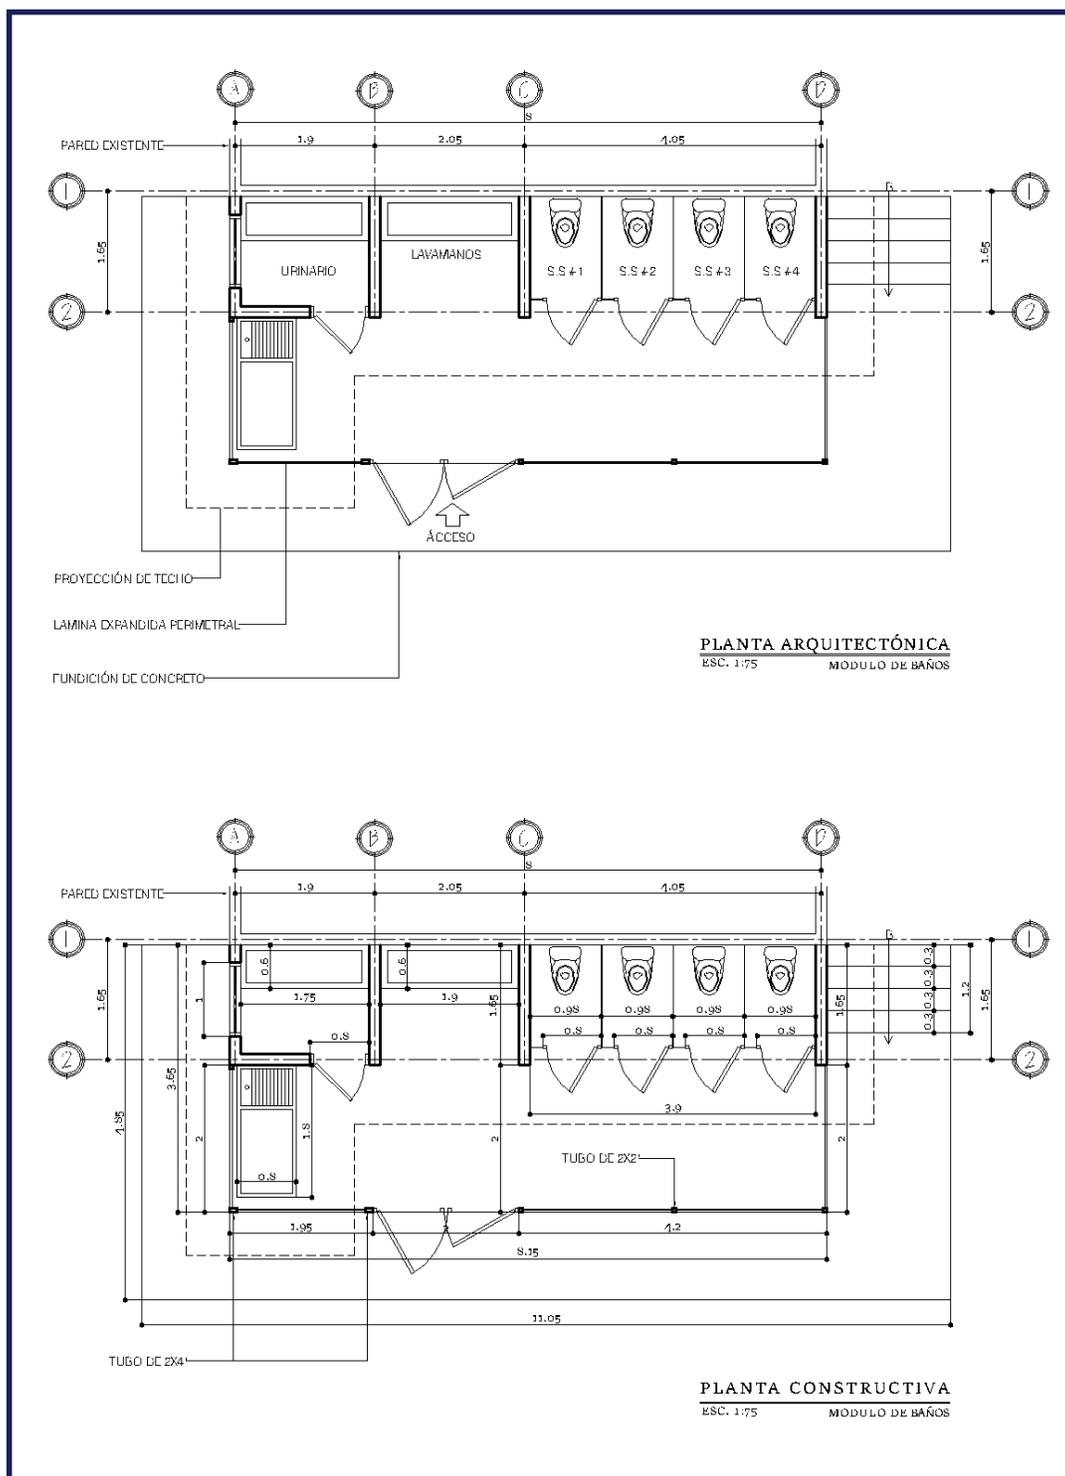



MODELO 3D





PRESUPUESTO

No.	PARTIDAS	UNIDAD	CANTIDAD DE OBRA	PRECIO	COSTO
1.-PRELIMINARES					L6,325.00
1.1	EXCAVACIÓN PARA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	GLOBAL	1	2,300.00	2,300.00
1.2	EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN	M ²	5	230.00	1,150.00
1.3	CONEXIÓN DE TUBERIA NUEVA A RED EXISTENTE	GLOBAL	1	2,875.00	2,875.00
2.-CIMENTACIÓN					L41,963.50
2.1	CIMENTACIÓN DE MAMPOSTERIA	M ³	4	1,840.00	7,360.00
2.2	SOLERA INFERIOR 15X20 4#3 Y #2 @ 15 cm	M	8	391.00	3,128.00
2.3	RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL SELECTO	M ³	5	425.50	2,127.50
2.4	FIRME DE CONCRETO E=7 c.m MALLA ELECTROSOLDADA 6/6	M ²	58	506.00	29,348.00
3.-ESTRUCTURA Y PAREDES					L27,496.50
3.1	PARED DE BLOQUE	M ²	23	655.50	15,076.50
3.2	CASTILLO	M	22	414.00	9,108.00
3.3	SOLERA DE CIERRE	M	8	414.00	3,312.00
4.-TECHO					L22,804.50
4.1	TECHO DE CANALETA DE 2X4" mm Y CUBIERTA DE LAMINA DE ALUZINC CAL.26	M ²	27	747.50	20,182.50
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIA	M	6.0	437.00	2,622.00
5.-DETALLES Y ACABADOS					L28,580.00
5.1	CERCO PERIMETRAL DE TUBO Y MALLA DESPLEGADA	M	12	1,840.00	22,080.00
5.2	GRADAS DE CONCRETO	GLOBAL	1	8,050.00	6,500.00
6.-PUERTAS Y VENTANAS					L24,150.00
6.1	PUERTA METALICA	UNIDAD	1	5,175.00	5,175.00
6.2	DIVISIONES DE METAL DE INODOROS	GLOBAL	1	17,250.00	17,250.00
6.3	VENTANA DE CELOSIA BAÑOS	M ²	1	1,725.00	1,725.00
7.-INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					L. 50,485.00
7.1	RED DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS DE 4"	M	25	253.00	L. 6,325.00
7.2	RED DE TUBERIA DE AGUAS GRISES DE 2"	M	10	132.25	L. 1,322.50
7.3	RED DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 1/2"	M	30	86.25	L. 2,587.50
7.4	RED DE TUBERIA DE 3" DE AGUA LLUVIA	M	10	184.00	L. 1,840.00
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODOROS	UNIDAD	4	4,025.00	L. 16,100.00
7.6	LAVAMANOS DE CONCRETO	GLOBAL	1	6,325.00	L. 6,325.00
7.7	URINARIO DE CONCRETO	GLOBAL	1	6,497.50	L. 6,497.50
7.8	PILA	UNIDAD	1	5,520.00	L. 5,520.00
7.9	CAJAS DE REGISTRO DE AGUAS NEGRAS Y GRISES	UNIDAD	3	1,322.50	L. 3,967.50
8.-INSTALACIONES ELECTRICAS					L19,481.00
8.1	CIRCUITO PARA LAMPARAS	M	48	161.00	L7,728.00
8.2	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	3	276.00	L828.00
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 4 ESPACIOS	UNIDAD	1	1,380.00	L1,380.00
8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCOS	UNIDAD	6	402.50	L2,415.00
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS DECORATIVAS DE PARED	UNIDAD	2	1,150.00	L2,300.00
8.6	BREAKER 15 AMP	UNIDAD	1	230.00	L230.00
8.7	ACOMETIDA 2#8 Y 1#10	GLOBAL	1	4,600.00	L4,600.00

COSTO ESTIMADO TOTAL **L221,285.50**



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe
CERCO DE MALLA CANCHA DEL RASTRO

Jefe Unidad Técnica Municipal:
Arq. Josué David Serrano Alvarado

Días de ejecución:
20 días

Fecha De Presentación:
2 de mayo de 2022.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz,
31 de mayo del 2022.



Memoria Descriptiva

La unidad técnica municipal realizó la supervisión de la construcción del cerco de malla en la cancha del rastro, cerco construido al perímetro de la cancha.

Este proyecto inicialmente era un proyecto de electrificación, pero la junta decidió hacer el cambio y se aceptó en reunión de corporación.

A continuación, se enumeran Las actividades realizadas:

- Trazado y marcado
- Excavación de agujeros
- Fundición de pedestales de concreto e instalación de tubos de 2"
- Travesaño horizontal de tubo de 2" en parte superior de la malla
- Colocación de varilla en la parte inferior de la malla
- Instalación de malla ciclón de 8 pies

El presupuesto para el proyecto de electrificación en esta zona era de L.200,000, con este presupuesto únicamente se pudo desarrollar el 70% del trabajo, el porcentaje restante del trabajo fue cubierto por la liga de futbol.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN: BARRIO EL CIPRES	
BENEFICIARIOS	HABITANTES DE LA ZONA Y POBLACIÓN EN GENERAL, AYUDARA A REESGUARDAR LA SEGURIDAD DE LOS JUGADORES.
INSTITUCIÓN SOLICITANTE O EJECUTORA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
DURACIÓN DEL PROYECTO	20 DÍAS
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	FINALIZADO
COSTO ESTIMADO	L 200,000
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ
EJECUTORES	JORGE GRACINIANO ARGUETA VASQUEZ



SUPERVISIÓN DE TRABAJO REALIZADO

FECHA DE INICIO: 10 DE MAYO DE 2022


FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 DE MAYO DE 2022







ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
Márcala, ciudad de la amistad y aroma de café

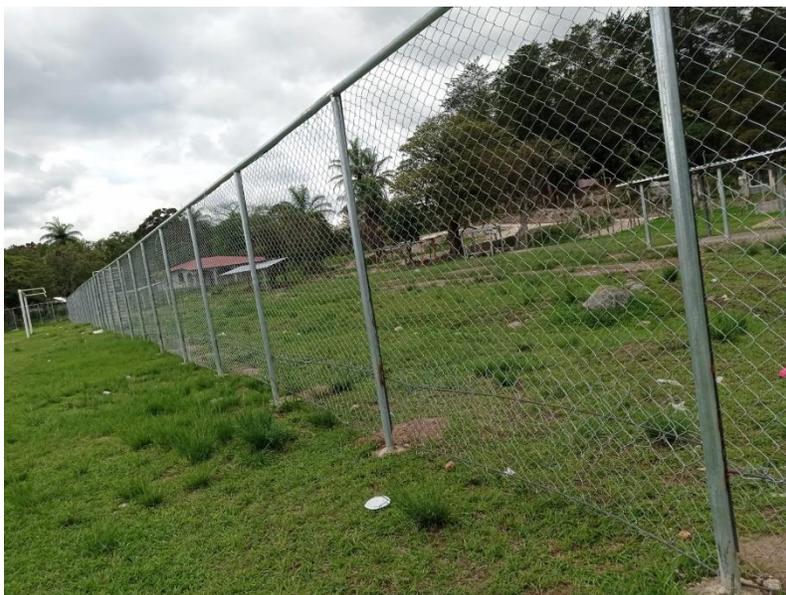



ALCALDIA MUNICIPAL MARCALA LA PAZ
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Informe
RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SEDE POLICIAL

Jefe Unidad Técnica Municipal:
Arq. Josué David Serrano Alvarado

Días de ejecución:
45 días

Fecha De Presentación:
1 DE MARZO de 2022.

Alcalde Municipal
Sr. Juan Manuel Melgar

Márcala La Paz,

5 de mayo de 2022.



Memoria Descriptiva

La unidad técnica municipal realizó la supervisión de la reconstrucción y mejoramiento de la sede policial ubicada en el barrio El Ciprés, dichos trabajos eran de carácter urgente debido al daño que había sufrido la estructura por las fuertes tormentas en nuestra comunidad.

A continuación, se enumeran Las actividades realizadas:

- Demolición de paredes dañadas.
- Excavación para zapatas.
- Estructuras de columnas y vigas.
- Paredes nuevas de bloque.
- Viga canal nueva y reparación existente.
- Ventanas
- Fundición de concreto en área exterior.
- Acera perimetral.
- Acarreo de material de desperdicio.



IDENTIFICACION DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN: BARRIO EL CIPRES.	
BENEFICIARIOS	MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL Y COMUNIDAD.
INSTITUCIÓN SOLICITANTE O EJECUTORA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MARCALA
DURACIÓN DEL PROYECTO	45 DÍAS
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	FINALIZADO
COSTO ESTIMADO	L 248,954.60
FUENTE FINANCIERA	ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA LA PAZ
EJECUTORES	CONSULDI & ASOCIADOS. ING. NELVIN DIAZ.



SUPERVISIÓN DE TRABAJO REALIZADO

FECHA DE INICIO: DEL 14 MARZO DE 2022

FECHA DE FINALIZACIÓN: 24 DE MAYO DEL 2022





ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
Márcala, ciudad de la amistad y aroma de café



Edificio Municipal, Barrio San Miguel, Frente a Plaza Soberanía, Márcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel. (504) 2764-5329/3975

E-mail: alcaldiamarcala@yahoo.es
www.facebook.com/alcaldiamarcala1208



Arq. Josué David Serrano Alvarado
Jefe unidad Técnica Municipal
