



Republica de Honduras
Alcaldía Municipal de Taulabe
Taulabe; Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


CUADRO TRABAJO REALIZADO EN CAMPO.

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	DETALLE	LUGAR DE VISITA
02/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda UTM/Proyecto Aldea Global/Oficina de la mujer	Visita recepción de materiales para proyecto d techos, pisos y letrinas	El Cerrón; Taulabe
02/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales/ Alcalde Denis Omar Membreño	Visita técnica y levantamiento de datos para proyecto de huellas	Las Conchas; Taulabe
	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales/ Alcalde Denis Omar Membreño	Visita técnica y levantamiento de datos para reparación de puente hamaca	Cerro Azul; Taulabe
03/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita técnica y supervisión para mantenimiento de rastro municipal	Rastro municipal; Taulabe; Comayagua
03/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita supervisión, proyecto de construcción cafeteria de Escuela Salvador Hernández	Jardines; Taulabe
03/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita técnica para resolución de falla (volteo) muro de contención	Prado Alto; Taulabe
03/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita técnica para cálculo de material de relleno	La Laguna; Taulabe
03/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM/Oficina de la mujer OMM/Equipo de desarrollo comunitario	Visita de inspección para proyecto Aldea Global.	San Cristóbal; Taulabe, Comayagua

06/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM/Oficina de la mujer OMM/	Visita técnica para desarrollo de proyecto de pisos saludable; convenio hábitat para la humanidad-municipalidad de Taulabe	Jardines; Taulabe
06/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM/Oficina de la mujer OMM/Equipo de desarrollo comunitario	Distribución de materiales a beneficiario de proyecto pisos saludables	Rancho Alegre; Taulabe
07/06/2022	Ing. Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita Técnica; proyecto agua potable	Jardines, Barrio Suyapa; Taulabe, Comayagua
07/06/2022	Ing. Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita técnica para levantamiento de datos de medidas para pavimento	Barrio El Codo; Jardines Taulabe.
07/06/2022	Ing. Edin Reynaldo Pineda Morales UTM/Equipo de desarrollo comunitario EDC/Oficina de la mujer OMM	Entrega de materiales, arena y cemento a beneficiarios de proyecto pisos saludables	Jardines, Barrio Las Flores; Rancho Alegre
08/06/2022	Ing. Edin Reynaldo Pineda Morales UTM/Equipo de desarrollo comunitario EDC/Oficina de la mujer OMM	Entrega de materiales, arena para proyecto pisos saludables	Jardines; Taulabe
09/06/2022	Ing. Edin Reynaldo Pineda Morales UTM/Unidad de Medio Ambiente UMA/ Equipo de desarrollo Comunitario EDC/Jefe Recursos Humanos Ing. Lorenzo	Taller de capacitación para seguimiento de formulación del PDM	Lago de Yojoa; AMUPROLAGO; Taulabe; Comayagua
10/06/2022	Ing. Edin Reynaldo Pineda Morales UTM/Unidad de Medio Ambiente UMA/ Equipo de desarrollo Comunitario EDC/Jefe Recursos Humanos Ing Lorenzo	Taller de capacitación para seguimiento de formulación de ficha de proyecto	Lago de Yojoa; AMUPROLAGO; Taulabe; Comayagua
13/06/2022	Ing. Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita técnica para diseño de nuevo edificio	Centro de salud; Taulabe, Comayagua
13/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita supervisión construcción de pisos saludables	La Misión; Taulabe, Comayagua

13/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita supervisión para construcción de pisos saludables	Jardines; Taulabe, Comayagua
14/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita supervisión para construcción de pisos saludables	La Misión; Taulabe, Comayagua
15/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita supervisión para construcción de pisos saludables	La Misión; Taulabe, Comayagua
15/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita supervisión para construcción de pisos saludables	El Cedral; Taulabe Comayagua
16/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita supervisión para construcción de pisos saludables	Jardines; Taulabe, Comayagua
16/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Recepción de materiales proyecto Aldea Global, bodega de Taulabe	Taulabe; Comayagua
23/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita de supervisión proyecto aldea global	El Cedral; Taulabe Comayagua
23/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita técnica para verificación de datos a solicitud	Los Llanos; Taulabe, Comayagua
23/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM/Alcalde	Inauguración de cafetería Escuela Salvador Hernández	Jardines; Taulabe
24/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM/Alcalde/Habitat para la humanidad/OMM	Entrega de proyectos; pisos saludables	Rancho Alegre; La Misión; Jardines
27/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita Tecnica; proyecto Agua Potable	Palmichal; Carmen
27/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Marcaje y toma de niveles para instalación de sistema de alcantarillado sanitario	Brisas del Bosque; Taulabe; Comayagua
28/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Visita Tecnica; proyecto Agua Potable	El Carrizal; Taulabe

28/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM	Supervisión de proyecto de alcantarillado sanitario	Brisas del Bosque; Taulabe; Comayagua
29/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda Morales UTM/Auditoria Interna	Supervisión de proyecto cafetería; escuela salvador Hernández	Jardines; Taulabe
		Supervisión de proyecto mantenimiento de calle	Bacadía; san Francisco; Varsovia y Cerro Azul
		Supervisión de proyecto; Agua Potable	Barrio Suyapa; Jardines Taulabe
		Supervisión de proyecto cancha multiusos	Prado Alto; Taulabe
		Supervisión de proyectos; anexo alcantarillado sanitario	Brisas del Bosque; Taulabe; Comayagua


 Jefe de Unidad Técnica Municipal
 Ing. Edin Pineda Morales



República de Honduras
Municipalidad de Taulabe
Taulabe; Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE CONTRATOS MES DE JUNIO 2022

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	DETALLE	PROYECTO O ACTIVIDAD	EJE	CONTRATISTA	LUGAR
02/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda.	Informe de Supervisión	Suministro de materiales de construcción para reparación de pasamanos en puente de río taulabe	Mantenimiento Social	José Wilmer Ponce Flores	Barrio las Acacias; Taulabe; Comayagua
06/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda.	Informe de Supervisión	Suministro de materiales de construcción para proyectos de techos, pisos, letrinas y casas	Vivienda	Convenio Proyecto Aleda Global-Municipalidad de Taulabe	El cedral; san Cristóbal; El Peñón
07/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda.	Informe de Supervisión	Suministro de materiales de construcción y mano de obra para proyecto de pisos saludables.	Vivienda	Convenio Hábitat para la Humanidad-Municipalidad de Taulabe	Racho Alegre; La Misión; Jardines
10/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda.	Informe de Supervisión	Reparación de portones en represa el Zapotal	Agua y Saneamiento	Cristian Santiago Argueta Meléndez	Taulabe; Comayagua
13/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda.	Informe de Supervisión	Alquiler de maquinaria para acarreo de material	Mantenimiento vial	Melvin Medina Fuentes	Las Conchas; Taulabe

14/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda.	Informe de Supervisión	Registro y digitalización de división territorial con coordenadas UTM, EN SOFTWARE DE DISEÑO AutoCAD	Geografía	Eliany Paola Macías	Taulabe, Comayagua
17/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda.	Informe de Supervisión	Suministro e instalación de aires frío e Oficina Municipal de la Mujer	Mantenimiento Social	Fausto Nahúm Cruz Gonzales	Taulabe, Comayagua
25/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda.	Informe de Supervisión	Suministro e instalación de poste de madera clase 5 de 30 ft	Mantenimiento social	Mario Alexander Sánchez Cáliz	Taulabe, Comayagua
30/06/2022	Ing Edin Reynaldo Pineda.	Informe de Supervisión	Suministro e instalación de cortinas existentes en palacio municipal	Mantenimiento social	Angel Padilla	Taulabe, Comayagua

Jefe de Unidad Técnica Municipal

Ing. Edin Pineda Morales





CIO
GLOBAL

**INFORME DE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, TAULABÉ, MEDIANTE
MUNICIPALIDAD DE TAULABÉ Y ALDEA GLOBAL, 2022.**



EL CEDRAL

Nº	Nombre	Nº Identidad	Nº Celular	Beneficio	Metros ² Pared	Metros ² Techo	Metros ² Piso	Módulo Sanitario	Materiales
1	Maria Idalia Cardona Méndez	0318-1989-01144	95183132	Módulo Sanitario Pila				Módulo Sanitario	
2	Marta de la Paz Mejía Arias	0318-1945-00045	99107424	Módulo Sanitario Piso					
3	Irma Chacón Rosa	0318-1974-00923	33084902	Módulo sin pila				Módulo sin pila	
4	Crescencio Reyes Vásquez	0318-1963-01039	33065827	Techo		9.1x7m			
5	Nury Lisbeth Varela Velásquez	0313-1990-00613	88942903	Módulo sin letrina Piso				Ya tiene letrina	
6	Ada Aracely Lorenzo Sorto	1013-1991-00128	9525-5676	Techo Piso		8.50x3.10	8.50x3.10		
7	Ma Anita Javier	1003-1959-00097	97147186	Techo Módulo Sanitario Parte de piso		8.40x7m	8.40x7m	Módulo	
8	Lidia Reyes Vásquez	0318-1948-00618	96450088	Pila Letrina				Letrina	
9	Jairo Manuel Reyes	0321-1992-00460	87576977	Techo Módulo Sanitario				Módulo Sanitario	
10	Rosibel Benítez Montoya	0318-1987-01575	98598693	Casa completa					
11	Guilmer Eusebio Rodas	1810-1982-00075	93361923	Módulo Sanitario Techo Piso		8.50x6.90m	8.50x6.90m	Módulo Sanitario	
12	Nelly Evangelina Arriaga	0318-1983-01784	93567842	Pila Techo		8.2x6.10m			

13	Antonia Arana Santos	0318-1961-00483	94696615	Techo Módulo Sanitario		6.10x5m		Módulo Sanitario	
14	Rosa Reyes Vásquez	0318-1949-00338	99306786	Casa Completa Pila Módulo Sanitario				Módulo Sanitario	
15	Dilcy Jessenia Reyes Vásquez	0321-1989-00081	33634498	Techo Paredes Restauración de Letrina Módulo Sanitario	12.40x5.20m	12.40x5.20		Módulo Sanitario	

EL PEÑÓN

Nº	Nombre	Nº Identidad	Nº Celular	Beneficio	Metros ² Pared	Metros ² Techo	Metros ² Piso	Módulo Sanitario	Materiales
1	Diana Paola Hernández Rivera	0321-2000-00046	99078968	Módulo Sanitario Tiene pila, techo madera mal estado.		70.35 m ²		Módulo sin pila	
2	Martín Ramos Ayala	0318-1973-00876		Techo de letrina.		7.60 m ²			
3	José Ricardo Rivera	0318-1979-00453		Módulo Sanitario sin pila					
4	Iris Jesenia Enamorado Cartagena	1801-1997-02061		Pila Piso			31.28 m ²	Módulo sin pila Pila	
5	Maria Dolores Portillo - Ángel María Medina Carranza	0318-1935-00003		Módulo Sanitario y Piso de cocina			8.82 m ²	Modulo	
6	Carlos Manuel Cartagena Martínez	1801-1989-03093		Piso Módulo Sanitario			59.82 m ²	Módulo	
7	Doris Dalila Gómez	1207-1987-00083		Piso					
8	Telma Elizabeth Martínez	0321-2001-00069	87421639	Módulo Sanitario Piso				Módulo	
9	Edin Marina Rivera	0318-1984-01472		Techo		2.5x3.4m			
10	Blanca Lidia Carranza	0318-1975-01191	97416991	Techo Piso		8.4m ²	4.3x3.1m		
11	José Guadalupe Díaz Pineda	0318-1979-01185		Techo Piso		7x10.8m	7x3.6m		
12	Betty Josseline Rivera	0321-1998-00156		Piso		14.6x4.3m		Módulo	
13	Basilio Ramírez	0318-1969-01260	97866978	Módulo Sanitario Techo Piso		8x4m	8x4m		

SAN CRISTÓBAL									
Nº	Nombre	Nº Identidad	Nº Celular	Beneficio	Metros ² Pared	Metros ² Techo	Metros ² Piso	Módulo Sanitario	Materiales
1	Maria de los Angeles Amaya	0318-1981-00359	94885793	Techo de Cocina		3.10x7.80m			
2	Rita Maria Montoya Flores	0303-2001-00442	9943734	Techo (una agua)		5.4x4.20m	5.4x4.20m		
3	María Teresa Benítez Lorezo	0321-2002-00065	93324213	Piso		5.80x2.85m	5.80x2.85m		
4	Fito Gómez Osorio	1007-1946-00065		Techo					
5	Concepción Domínguez	1208-1952-00196		Módulo Sanitario sin pila Techo Piso (2 aguas)		14x5.90m	2.95x1.4m	Módulo Sanitario sin pila	
6	Idania Patricia Medina Escobar	0318-1989-00696	98117094	Módulo Sanitario Techo Paredes (2 aguas)	6x9m	6x9m		Módulo Sanitario	
7	Reina Isabel Nicolás Domínguez	0321-1989-00102	98040600	Techo (una agua) Piso		9.10x6.30m	9.10x6.30m	Módulo Sanitario	
8	Gloria Nicolás Domínguez	0318-1986-00634		Piso Paredes Techo Módulo Sanitario	9x5m	9x5m	5x4m	Módulo Sanitario	
9	María Santos Nicolás Domínguez	0318-1978-01662		Techo Piso		10.20x6.50m	3x3m		
10	Tomás Fabián Mejía Reyes	1619-1984-00128	88905728	Techo		5.7x3.70m			

Nº	Nombre	Nº Identidad	Nº Celular	Beneficio	Metros ² Pared	Metros ² Techo	Metros ² Piso	Módulo Sanitario	Materiales
1	Maria de los Angeles Amaya	0318-1981-00359	94885793	Techo de Cocina		3.10x7.80m			
2	Rita Maria Montoya Flores	0303-2001-00442	9943734	Techo (una agua)		5.4x4.20m	5.4x4.20m		
3	Maria Teresa Benitez Lorezo	0321-2002-00065	93324213	Piso		5.80x2.85m	5.80x2.85m		
4	Fito Gómez Osorio	1007-1946-00065		Techo					
5	Concepción Domínguez	1208-1952-00196		Módulo Sanitario sin pila Techo Piso		14x5.90m	2.95x1.4m	Módulo Sanitario sin pila	
6	Idania Patricia Medina Escobar	0318-1989-00696	98117094	Módulo Sanitario Techo Paredes (2 aguas)	6x9m	6x9m		Módulo Sanitario	
7	Reina Isabel Nicolás Domínguez	0321-1989-00102	98040600	Techo (una agua) Piso		9.10x6.30m	9.10x6.30m	Módulo Sanitario	
8	Gloria Nicolás Domínguez	0318-1986-00634		Piso Paredes Techo	9x5m	9x5m	5x4m	Módulo Sanitario	
9	Maria Santos Nicolás Domínguez	0318-1978-01662		Módulo Sanitario Techo		10.20x6.50m	3x3m		
10	Tomás Fabián Mejía Reyes	1619-1984-00128	88905728	Piso Techo		5.7x3.70m			



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **CONSTRUCCION DE PISOS; CONVENIO HABITAT PARA LA HUMANIDAD-MUNICIPALIDAD DE TAULABE**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Rancho Alegre, La Misión y Jardines

Responsables:

Ejecutor: Ignacio Pérez Díaz

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	11 de junio de 2022.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con Lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Suministro completo en tiempo y forma por parte del contratista.

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno ☒

Regular ☐

DESEARROLLO DE LA OBRA:

- Se da comienzo con la selección de pisos donde realmente se necesita obra de construcción, en primera instancia se hace el diagnóstico y levantamiento de datos oficiales para las cantidades de obra por cada beneficiario.
- Se procede a la distribución y entrega de materiales en las casas de las diferentes aldeas comprendidas con todos los nombres; número de identidad, cantidad de obras que necesita y número de teléfono; mismo que se adjunta en la documentación de este archivo.
- Se comienza con el trabajo de mano de obra calificada
- Se realiza su respectiva supervisión.


CONCLUSIONES:


- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo de ninguna clase.

Edin Pineda
13/12/04

SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:



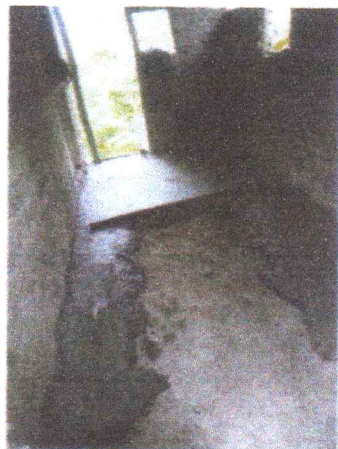

Que es Habitat?

Es una institución privada sin fines lucrativos, que promueve la erradicación de la vivienda inadecuada.

Visión

Un mundo donde todas tengan un lugar adecuado para vivir

Misión


Hábitat para la Humanidad convoca a la gente para construir viviendas, Comunidades y esperanzas, y así mostrar el amor de Dios en acción

VIVIENDA SALUDABLE

Es el espacio físico donde se-res humanos transcurren la mayor parte de su vida; este espacio, por sus característi-cas y especificaciones, brinda condiciones para prácticas saludables de sus moradores

RESPONSABILIDADES DE LA FAMILIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PISO:

1. TENER NIVELADO EL PISO
2. ABASTECER DE AGUA
3. TENER AL AYUDANTE DE ALBAÑIL
4. MANTENER EL MATERIAL EN UN LUGAR ADECUADO
5. TRASLADAR LOS MATERIALES AL SITIO DE CONSTRUCCION

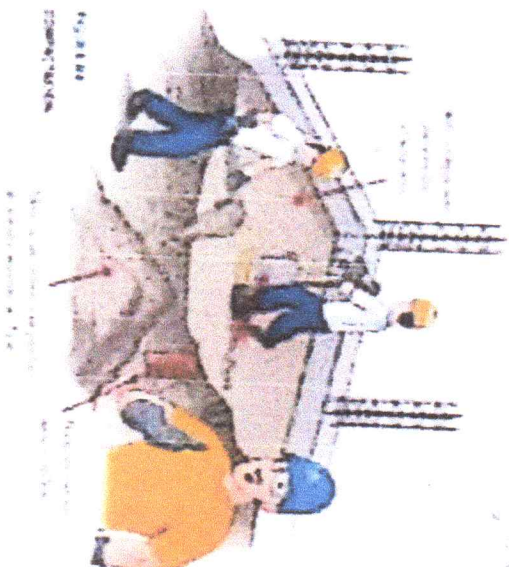


“Construyendo viviendas, co-munidades y esperanzas con el pueblo de Dios”.

PROYECTO PISOS SALUDABLES CONVENIO HABITAT—MUNICIPALIDAD



Pisos

HACIA UNA VIVIENDA SALUDABLE



HABITAT PARA LA HUMANIDAD HONDURAS
REGIONAL SIGUATEPEQUE
LISTADO DE BENEFICIARIOS SUBSIDIO COMPLETO Taulabe, COMAYAGUA
lunes, 23 de mayo de 2022

No.	Nombre del Beneficiario	Teléfono	Sector	Dirección de la Construcción	Area de piso M2	DISTRIBUCION DE MATERIALES				
						CEMENTO BOLSAS	ARENON M3	BOLSAS DE CEMENTO	LIBRAS DE CEMENTO	CUBETAS DE ARENON
1	Johnny Joel Del Cid	9923-9138	Rancho Alegre		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
2	Maio Enrique Del Cid	9269-0882	Rancho Alegre		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
3	Hermilio Perez Ortiz	3241-5751	Rancho Alegre		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
4	Emmel Flores Lomas	9635-0941	Rancho Alegre		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
5	Juan Antonio Alvarado	9136-6444	Rancho Alegre		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
6	Gregorio Araldo Bofra	8732-5651	Rancho Alegre		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
7	And Julia Alecano	9834-4444	Rancho Alegre		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
8	Luis Orlando Portales	8848-5026	La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
9	Juan Jose Yancina	3226-0003	La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
10	José Dolado Alecano	8902-7236	La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
11	Kelly Rocío Velazquez	9616-2306	La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
12	Juan Gabriel Mendira	8925-1056	La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
13	Juan Mejia		La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
14	Ricardo Alcero Dolado	3449-4612	La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
15	Rosa Melio Portales	3235-5616	La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
16	Norma Alvarado		La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
17	Lidia Suspe Mejia	9836-0505	La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
18	Mama Alicia Argueta	9814-8131	La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
19	Maria Santos Ramirez	9999-5756	La Misión		20	6.811428571	1.46	6.5	29	77

20	Duque's Muelle Negro	9907-5391	Sordina	20	6.811428571	1.46	6.5	29	77
21	Monic Estela Hernandez	9836-4333	Sordina						
22	Mauricio Correa.	9867-2049	Sordina						
23	Dennis Omar Montoya	9838-8369	Sordina						
24	Pablo Franco Reyes	9614-1467	Sordina						
25	Diana Gisela Flores	9703-4189	Sordina						
26	Bernardo Franco Zepeda	9509-3808	Sordina						
27	Gabriel Patricio Mejia	8911-6683	Sordina						



CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TAULABE, Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD HONDURAS

Mediante esta carta de entendimiento, se formaliza la cooperación técnica y financiera entre la Municipalidad de Taulabe, Comayagua y Hábitat para la Humanidad Honduras. Queda establecido que este entendimiento servirá de base para la construcción de **20 a 27 Pisos** para familias en extrema pobreza. La cantidad oscilante de familias se debe a que las áreas no cubren los 20M². El Sr. **Denis Omar Membreño Galindo**, Mayor de edad, con Cédula de Identidad No.0318-1970-00292, actuando en su condición de Alcalde Municipal, con facultades de Representante Legal, y La Lic. **Isbela Orellana Ramírez**, Presidente de la Junta Directiva de Hábitat, serán firmantes de esta Carta, como representantes de sus respectivas instituciones.

DISPOSICIONES GENERALES:

- 1) El Municipio de Taulabe, es el Municipio con los índices de pobreza más altos en el departamento de Comayagua.
- 2) Considerando que la visión de Hábitat es **"Un Mundo donde todos tengan un lugar adecuado para vivir"**, Hábitat para la Humanidad Honduras ha destinado fondos para desarrollar Proyectos de Pisos, para mejorar las condiciones de salud de familias en extrema pobreza, haciendo incidencia en las enfermedades gastrointestinales, como al igual de preservación y conservación del medioambiente y los recursos naturales.
- 3) Tomando en cuenta los niveles de pobreza según datos de diagnósticos del Municipio de Taulabe, se estarán priorizado en el sector de La Misión, Rancho Alegre y Jardines. adiciones menores con subsidio (Pisos saludables). Para la ejecución de adiciones menores con subsidio de Hábitat y de la Municipalidad de Taulabe, Comayagua.
- 4) El tiempo de ejecución de los **20 o 27 soluciones habitacionales (Pisos)** será máximo de 2 meses, contados a partir de la firma del presente documento, debiendo estar terminadas a más tardar al 25 de junio del 2022.
- 5) Reconocemos que el aporte comunitario será indispensable para el aproplamiento del proyecto, por lo que las familias beneficiarias de Pisos, aportarán la mano de obra no calificada y otro material local que sea accesible a las familias.
- 6) Que el monto requerido para la construcción de los **20 o 27 Pisos** es de aproximadamente L. 51,825.⁰⁰ (**CIENCUENTA Y UN MIL OCHOSCIENTOS VEINTI CINCO LEMPIRAS CON 80/100**), el presupuesto final de cada obra

determinará el monto definitivo, del cual la corporación municipal aportará el **54%** del costo de los Pisos, y **Hábitat Para La Humanidad**, el **46%** para la construcción de dichos pisos. Con un área a cubrir de **20 o 10 metros cuadrados por 5 cm de espesor por cada beneficiario**.

RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TAULABE, COMAYAGUA:

- 1) Aportar **54%** recursos financieros o materiales para la construcción de los **20 o 27 pisos** en la aldea antes mencionada.
- 2) Apoyar a través de desarrollo comunitario la conformación de los expedientes, con la documentación requerida por Hábitat.
- 3) Apoyar en el proceso de capacitación a las familias según manuales y metodología de capacitación diseñada por Hábitat según tipo de solución.
- 4) Apoyar en la recolección de firmas y verificación para totalizar los pisos en la comunidad.

RESPONSABILIDADES DE HABITAT PARA LA HUMANIDAD:

- 1) Realizar las evaluaciones técnicas y socioeconómicas de las familias con el fin de asegurar que son familias en extrema pobreza.
- 2) Aportar **46%** de los recursos financieros, material y mano de obra para la construcción de los **20 o 27 Pisos**.
- 3) Supervisar el avance de las obras para asegurar la calidad técnica de las construcciones.
- 4) Capacitar a las familias beneficiarias en la forma de uso de Pisos saludables como de sus beneficios, según manuales de capacitación de Hábitat.

El presente acuerdo tendrá vigencia a partir del 30 de abril del 2022 con una vigencia de dos meses, sujeto a modificación con la aprobación de las partes.




Sr. Denis Omar Membreño Galindo
Alcalde Municipal
Taulabe, Comayagua.
Honduras


Lic Isbela Orellana Ramírez
Presidente Junta Directiva
Hábitat para la Humanidad Honduras
Honduras

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

Nosotros **JUAN GABRIEL MOREIRA LOPEZ**, mayor de edad, hondureño, casado, con número de identidad 0318-1987-00569 actuando en mi condición de presidente del patronato de la comunidad de Rancho Alegre, de Taulabe del Departamento de Comayagua y en representación de 27 beneficiarios del proyecto de pisos, de las comunidades de La Misión, Rancho Alegre y Jardines: quien en lo sucesivo se designará como **El Contratante**. Y el señor: **IGNACIO PEREZ DIAZ**, mayor de edad, con tarjeta de Identidad No. 0318-1972-00544, hondureño y con domicilio en el municipio de La misión, Taulabe, departamento de Comayagua, para efectos de este contrato se denominara **El Contratado** y autorizados por las leyes de la República de Honduras acuerdan celebrar el presente contrato de Servicios profesionales para realización de actividades de construcción de 27 Pisos de concreto firme con una área aproximadamente de más o menos 20 metros cuadrados, de los cuales Habitat para Humanidad Honduras pagara la cantidad de valor unitario de L. 191.99 por cada beneficiario en mano de obra calificada total, en estas comunidades de Taulabe, Departamento de Comayagua, cuyo listado de beneficiarios se adjunta al presente contrato. De los cuales **Hábitat para la Humanidad Honduras** pagará el valor de **L. 3,839.80**. El mismo se regirá por las siguientes cláusulas. **PRIMERO:** El contratante manifiesta que el objetivo del presente contrato es realizar la construcción de los 27 pisos con una dimensión aproximada de más o menos 20 M² y un espesor de 5cm. Acuerda contratar los servicios del **Sr. IGNACIO PEREZ DIAZ**, para realizar los trabajos en mención. **SEGUNDO:** El contratado se compromete a realizar las actividades con las especificaciones técnicas establecidas por Hábitat para la Humanidad y acordada con la Municipalidad de Taulabe. **TERCERO:** El contratado se compromete a entregar los trabajos mencionados en periodo de 2 mes calendario desde la entrega del material a las familias hasta la culminación de los 27 pisos para los beneficiarios en mención. **CUARTO: EL CONTRATADO** se compromete a aceptar la participación de las familias en la ayuda mutua como ayudante de la construcción, a emplear sus propias herramientas de trabajo en las construcciones de las mejoras. **QUINTO: EL CONTRATADO** se compromete a reparar daños que se produzca por mala ejecución de las obras, la cual será reparada bajo su propia responsabilidad y costo. **SEXTO:** El contratante se compromete a pagar al contratado la cantidad de L. 191.⁹⁹ de construcción por piso, o la cantidad estipulada o medida al final de terminado el proyecto, por lo que proyectando una construcción 27 pisos. El monto del presente contrato asciende a la cantidad de **TRES MIL OCHOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100 (L. 3,839.80)** misma que será cancelada una vez terminada y

señor IGNACIO PEREZ DIAZ se solicita en vista que la comunidad donde se construyen los pisos están lejos a la institución bancaria. **DECIMO:** En caso de controversia en la ejecución o interpretación del presente contrato, ambas partes renuncian al fuero de su domicilio y se someten de mutuo acuerdo al juzgado que oportunamente designe el contratante. **UNDECIMO:** Ambas partes manifiestan estar de acuerdo con lo establecido en las cláusulas que anteceden, por lo cual firman el presente contrato en la Ciudad de Siguatepeque, el día 07 días del mes de junio del 2022.


Ignacio Perez Díaz
Contratista


Juan Gabriel Moreira Lopez
Presidente del Patronato
Rancho Alegre, Taulabe,
Comayagua



República de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE FRIO EN OFICINA DE LA MUJER MUNICIPAL**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Instalaciones del palacio municipal.

Responsables:

Ejecutor: Fausto Nahúm Cruz Gonzales

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	18 de junio de 2022.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	1
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Suministro completo en tiempo y forma.

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:

Bueno

☒

Regular

☐

DESARROLLO DE LA OBRA:



- Anteriormente se había instalado una bajada de 220 voltios para instalar nuevo aire acondicionado.
- Se procede con las actividades de instalación de aire acondicionado.
- El contratista suministra completamente el dispositivo.
- El funcionamiento cuenta con todos los requerimientos necesarios para su buen funcionamiento.

CONCLUSIONES:

- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo de ninguna clase.


SUPERVISION UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

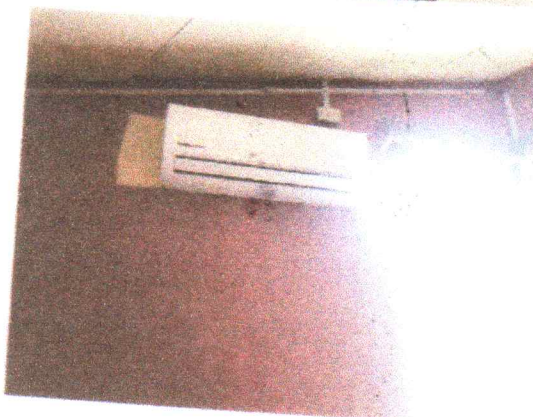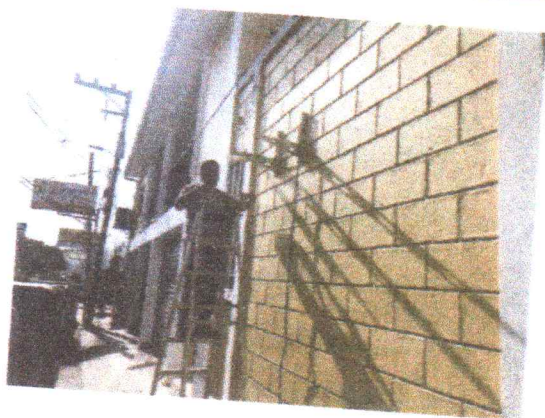



República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319. :

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **INSTALACION DE LLAVINES EN PARQUE CENTRAL DE TAULABE; BODEGAS MUNICIPAL Y SALON COMUNAL DE LA ALDEA EL PEÑON, REPARACION DE CANAL DE AGUA LLUVIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE TAULABE; REPARACION DE PASA MANOS EN EL PUENTES DEL RIO TAMALITO Y REPARACION DE TECHO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Responsables:

Ejecutor: José Wilmer Ponce Flores

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	24 de junio de 2022.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	1
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Suministro completo en tiempo y forma.

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:

Bueno

☒

Regular

☐

DESARROLLO DE LA OBRA:



- Se hace cambio de todos los llavines de las puertas principales, por razones de proteger todo el equipo y materiales que se encuentran dentro de las instalaciones de los espacios establecidos en el parque.
- Se hace cambio de llavin en el salón comunal de la aldea el Cedral, y se repara el contramarco que se dañó, se hace esta intención con el fin de que el salón será utilizado como almacén de materiales para proyecto en convenio con ALDEA GLOBAL-MUNICIPALIDAD.
- Se cambia por completo todos los llavines de las bodegas municipales, algunos se reemplazaron porque estaban deteriorados.
- Se toma la decisión de reparar y colocar una capa protectora de lámina de zinc, cubierta con tapagoterías, debido a la alta filtración de agua dentro de las instalaciones de la municipalidad.




CONCLUSIONES:

- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo de ninguna clase.

SUPERVISION UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES

REGISTRO FOTOGRAFICO:

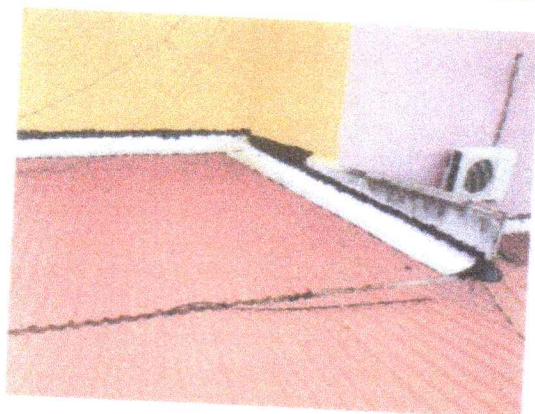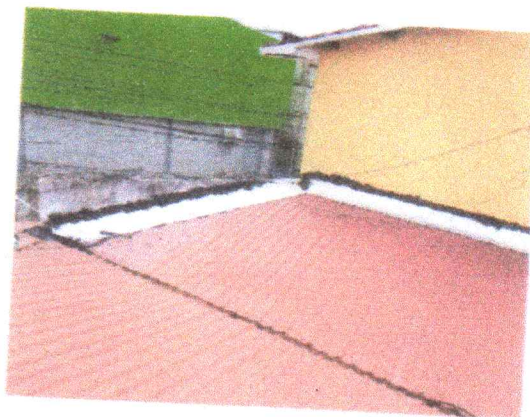

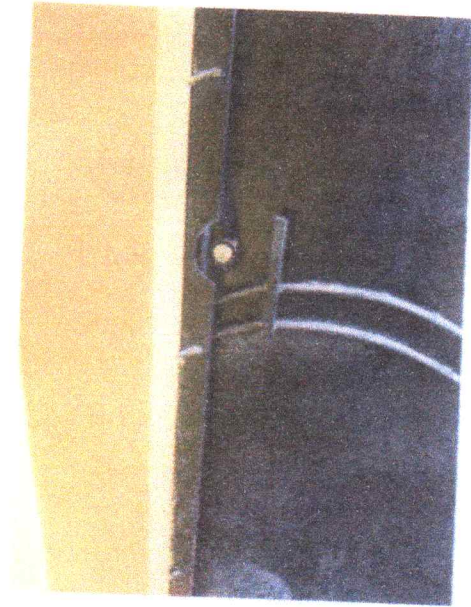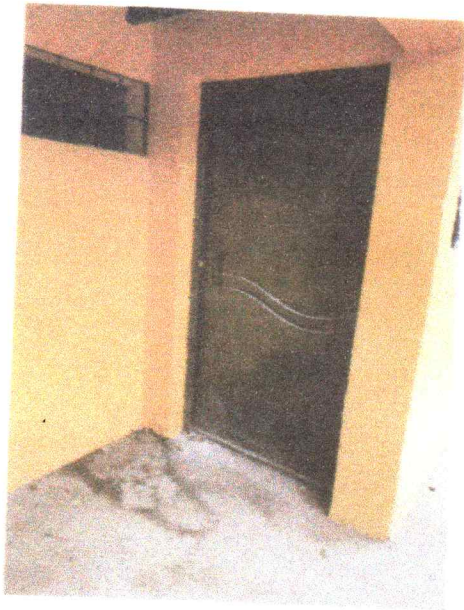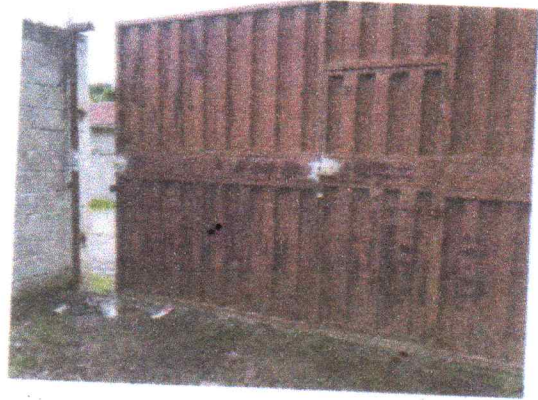





República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #2

Nombre del proyecto: **INSTALACION DE LLAVINES EN PARQUE CENTRAL DE TAULABE; BODEGAS MUNICIPAL Y SALON COMUNAL DE LA ALDEA EL PEÑON, REPARACION DE CANAL DE AGUA LLUVIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE TAULABE; REPARACION DE PASA MANOS EN EL PUENTES DEL RIO TAMALITO Y REPARACION DE TECHO EN LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Responsables:

Ejecutor: José Wilmer Ponce Flores

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	24 de junio de 2022.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	1
				Peón	

REGISTRO FOTOGRAFICO:







República de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **ALQUILER DE MAQUINARIA PARA ACARREO DE MATERIAL DE ASFALTO**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Las Conchas.

Responsables:

Ejecutor: Melvin Medina Fuentes

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.


Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	24 de junio de 2022.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Operador de Maquinas	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

REGISTRO FOTOGRAFICO:

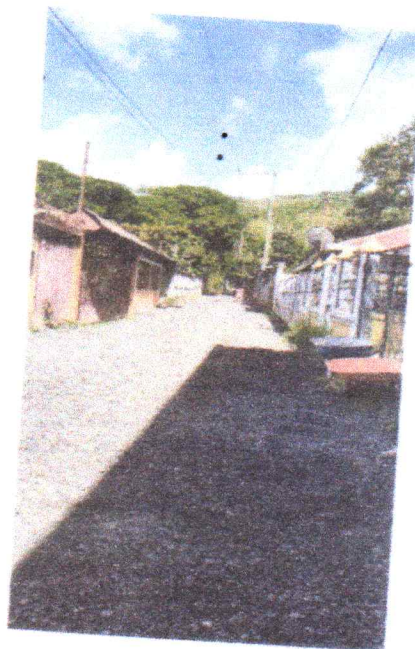



Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE MADERA CLASE 5 DE 30 FT**
Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Casco Urbano de Taulabe.

Responsables:

Ejecutor: Mario Alexander Sánchez Cálix

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	28 de junio de 2022.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	2
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Suministro completo en tiempo y forma por parte del contratista.

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:

Bueno

☒

Regular

☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se suministra el poste eficientemente, de muy buena calidad, frondosos de madera de ocote en específico contabilizando una cantidad de 6 unidades.
- Se toma la decisión de cambiar un poste que presentare un peligro para la vida humana en el barrio monte fresco.
- Se realiza todo el cableado e inspección necesaria para evitar más daños.
- Se realiza todo el cambio completo de poste, y además se repara todo el sistema de iluminación de alumbrado público que ese encontraba deteriorado.

CONCLUSIONES:

- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo de ninguna clase.

SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES



REGISTRO FOTOGRAFICO:





República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE DIVISIÓN TERRITORIAL CON COORDENADAS UTM EN SOFTWARE DE DISEÑO (CIVIL CAD 3D)**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Responsables:

Ejecutor: Ing. Eliany Paola Macías.

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	30 de junio de 2022.

Observaciones Generales:

CLIMA:	ACCESO:	PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	Bueno	Digitalizacion	1
Con Lluvia	Malo	Ayudantes	
		Peón	

Materiales:	
Suficiente:	
Aprobado:	
No suficiente:	
Rechazado:	

CALIDAD DE OBRA: Bueno ☒

Regular ☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se realizan la digitalización de mapa territorial del municipio de Taulabe; donde se incluye la división de todo las aldeas que comprende el, municipio de Taulabe.
- La información de mapas incluye todo las delimitaciones áreas y perimetro por aldeas.
- Además se toma a bien realiza el trazo general de calle y accesos de todo el municipio, digitalización las calles importante de cada una del casco rural y casco urbano del municipio de Taulabe.

CONCLUSIONES:

- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Tecnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo de ninguna clase.


SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES



Aprobo:



Mapa General

30/06/2022

30/06/2022

ESCALA:

1:1000

1:1000


MAPA ZONA A




MAPA ZONA B



MAPA ZONA C

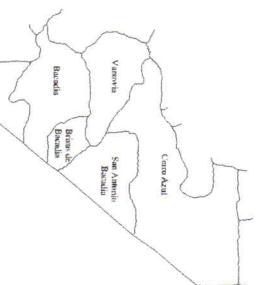


MAPA ZONA D

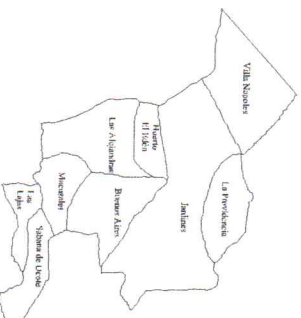

PROYECTO:
DISTRIBUCION
GEOGRAFICA DE TAULABE
PROPIETARIO:
MUNICIPALIDAD DE
TAULABE
UBICACION:
TAULABE, COMAYAGUA.

Aprobo:

Ing: Edin Pineda
CICH 913



Contenido:
ZONALES A,B,C,D.
FECHA:
30/06/2022
ESCALA:
1:1000
HOJA:
#2

Aprobo;


 FIRMA: [Signature]
 C.I.C.H.N.º 1616-1216



Contenido:
ZONALES I,J

FECHA:	HOJA:
30/06/2022	

ESCALA:
1:1000

#4



República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **SUMINISTRO Y REPARACION DE CORTINAS EXISTENTES EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Instalaciones del palacio municipal.

Responsables:

Ejecutor: Angel Gabriel Padilla Sánchez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	30 de junio de 2022.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	1
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Suministro completo en tiempo y forma.

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA:

Bueno

☒ X

Regular

☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Actualmente, las cortinas se encontraban en mal estado, llegando a su finalidad de vida útil.
- Se realiza el diagnóstico y se cambian todos los llavines de las dos entradas principales.
- Se reemplazan todo los materiales en mal estado


CONCLUSIONES:

- La ejecución de la obra, cumple con todo el funcionamiento y visto bueno por parte de la Unidad Tecnica Municipal (UTM), en tiempo y forma.
- Las condiciones climáticas fueron favorables durante el desarrollo de la obra.
- No se presenta contratiempo de ninguna clase.

SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES



REGISTRO FOTOGRAFICO:

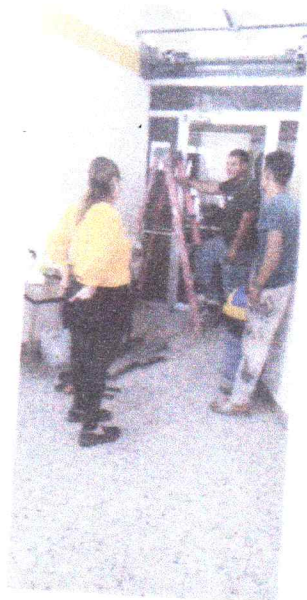



República de Honduras C.A.
Alcaldía Municipal de Taulabe
Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE AYUDAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEMESTRAL

ITEM	ENCARGADO	PROYECTO	UBICACIÓN	EJE TEMATICO	DOCUMENTO	FECHA	MONTO DE MATERIALES	COMERCIAL O FERRETERIA	TOTAL DE GASTO DE PROYETOS
1	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales necesarios por la sociedad de padres de familia de la Escuela Alvaro Contreras	Quebradas, Yurés	Educación	Solicitud presentada por la presidenta de la sociedad de padres de familia de la escuela Alvaro Contreras	08/02/2022	L. 2,100.30	Comercial Peña Blanca	L. 2,100.30
2	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para reparación de baños en la Escuela Salvador Hernández	Jardines, Taulabe	Educación	Solicitud presentada por maestros y sociedad de padres de familia de la escuela Salvador Hernández	08/02/2022	L. 3,520.00	Comercial Peña Blanca	L. 3,520.00
3	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para el mantenimiento de áreas verdes en parque central de Taulabe	Taulabe, Comayagua	Parque	Actividad realizada por el departamento UTM	22/02/2022	L. 1,360.00	Comercial y ferreteria Najar	L. 1,360.00
4					N/a	28/02/2022	L. 2,060.00	Comercial Peña Blanca	L. 2,260.00

	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para mejorar en el palacio municipal	Taulabe, Comayagua	Municipalidad de Taulabe		28/04/2022	L. 200.00		
5	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministros de material necesario para la construcción de marcos de portería de cancha de fútbol	Las Conchas, Taulabe	Mantenimiento Social	Solicitud presentada por el comité pro-chanca de las conchas y el patronato pro mejoramiento	30/03/2022	L. 8,510.00	Comercial Peña Blanca	L. 8,510.00
6	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para proyecto de acera en la iglesia católica	San Francisco, Taulabe	Religión	Solicitud presentada por el delegado de la palabra Alberto Martínez	17/02/2022	L. 3,984.75	Comercial Ferreteria peña blanca	L. 3,984.75
7	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales para la construcción de modulo sanitario	Las Alejandra	Educación	Solicitud presentada por la sociedad de padres de familias de la escuela Braulio Lazo	15/03/2022 30/05/2022 30/05/2022	L. 23,413.99 L. 333.13 L. 1,516.74	Comercial Ferreteria peña blanca	L. 25,263.86
8	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para la restauración de pintura en el templo de iglesia Cristo Misionera de la aldea Quebraditas	Quebradas, Yurés	Religión	Solicitud presentada por Dubis Oneidad López	21/03/2022	N/A	La pintura fue donada de la promoción que se obtuvo con la compra de materiales del Salón Comunal en Taulabe	L. 0.00
9	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para mejoras de vivienda	Huerto del Edén, La Unión	Vivienda	Solicitud presentada por el ciudadano Denis Omar Castañeda	25/03/2022	L. 8,257.00	Comercial Kalin	L. 8,257.00
10	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para estructura de techo en vivienda	Camalotales, Taulabe	Vivienda	Solicitud presentada por la ciudadana Maria Consuelo Larios	28/03/2022	L. 11,422.38	Comercial Kalin	L. 11,422.38
11	Municipalidad de Taulabe/Unidad	Suministro de materiales para sistema eléctrico de alumbrado publico	Jaitique Taulabe	Mantenimiento Social	Solicitud presentada por el ciudadano por e pro	07/04/2022	L. 12,773.00	Comercial Ferreteria peña blanca	L. 12,773.00

	Tecnica Municipal				mejoramiento de la comunidad de Jaitique				
12	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales de construcción en Centro de Educación Básica Miguel Morazán	Jaitique Taulabe	Salud	Solicitud presentado por el Ejercito de Fuerzas Armadas de Honduras	19/04/2022	L. 4,245.00	Electro todo Comercial	L. 5,354.00
							L. 1,109.00		
							--		
							L. 5,354.00		
13	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para el acondicionamiento del centro básico de educación básica Cristóbal Colon	Las Conchas, Taulabe	Educación	Solicitud presentada por el consejo de maestro y patronato pro mejoramiento de la escuela Cristóbal colon	20/04/2022	L. 7,500.00	Pinturas Americanas	L. 7,500.00
15	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para mejoras en palacio Municipal	Taulabe, Comayagua	Mantenimiento Social	N/A	21/04/2022	L. 11,752.40	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L. 14,074.40
						21/04/2022	L. 342.00		
						21/04/2022	L. 1,980.00		
16	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales de construcción para la elaboración de una pila	Camalotales, Taulabe	Vivienda	Solicitud presentado por la ciudadana Johana Murillo	29/04/2022	L. 3,107.25	Comercial Peña Blanca	L. 3,107.25
17	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales de construcción para la construcción de cerca perimetral en la Iglesia católica	Bacadia, Taulabe	Iglesia Católica de Bacadia	Solicitud presentada por miembros de la iglesia católica de Bacadia	02/05/2022	L. 15,591.10	Comercial Peña Blanca	L. 15,591.10
18	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales para construcción de estructura de techo	Jardines, Taulabe	Vivienda	Solicitud presentada por el ciudadano Nelson Ramón Márquez Manuales	03/05/2022	L. 3,830.65	Kalin Comercial	L. 3,830.65
19	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales de construcción para la reparación de la estructura de techo en el salón comunal	Rancho Alegre, Taulabe, Comayagua	Centro Social	Solicitud presentada por el patronato pro mejoramiento	03/05/2022	L. 10,156.08	Comercial Peña Blanca	L. 13,080.73
						18/05/2022	L. 2,924.65	Comercial Peña Blanca	

20	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales de construcción	Las Alejandra		Solicitud presentada por la ciudadana Miriam Suyapa Rivas	03/05/2022	L. 3,880.00	Comercial Peña Blanca	L. 3,880.00
21	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales de construcción para reparación de vivienda	Buenas Vista de Varsovia		Solicitud presentada por la ciudadana Sipriano Hernández	03/05/2022	L. 2,207.40	Comercial Peña Blanca	L. 2,207.40
22	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales de reparación de cerco perimetral en la escuela José Trinidad Cabañas	Las Flores Jaitique	Educación	Solicitud presentada por la presidenta de la sociedad de padres de familia, directora y alumnos	03/05/2022	L. 9,722.00	Comercial Peña Blanca	L. 9,722.00
23	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales de construcción para la elaboración de cabezales	Terrero Blanco, Taulabe Comayagua	Obras Publicas	Solicitud presentada por el Presidente del patronado	06/05/2022	L. 1,950.00	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L. 10,275.00
							L. 2,925.00	Comercial Najar	
							L. 5,400.00	Transporte Mi Julita	
							L. 10,275.00		
24	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales de construcción para la elaboración de proyecto de Huellas	Buenas Vista de Varsovia; Taulabe, Comayagua	Infraestructura Vial	Solicitud presentada por el Presidente del patronado	06/05/2022	L. 9,750.00	Comercial Peña Blanca	L. 9,750.00
25	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para mejoras de vivienda	La Vegas, Jaitique	Vivienda	Solicitud presentada por el ciudadano Apoligeno Sorto Díaz	11/05/2022	L. 1,765.50	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L. 1,765.50
26	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para mantenimiento de centro de triaje	Taulabe, Comayagua	Salud	Solicitud de materiales por parte del personal de trabajo en centro de triaje	17/05/2022	L. 1,214.41	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L. 1,408.21
						23/05/2022	L. 193.80	Comercial Ferreteria Peña Blanca	
26	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para reparación de vivienda	Terrero Blanco, Taulabe Comayagua	Vivienda	Solicitud presentada por el ciudadano Hipólito Ochoa	20/05/2022	L. 2,300.00	Kalin Comercial	L. 2,300.00

27	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para reparación de estructura de techo en vivienda	La Misión, Taulabe	Vivienda	Solicitud presentada por el ciudadano Carlos Alfredo Portales	21/05/2022	L. 3,000.00	Comercia y Ferreteria Najar	L. 3,000.00
28	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para instalación de agua potable en vivienda	Terrero Blanco, Taulabe Comayagua	Agua y Saneamiento	Solicitud presentada por la ciudadana Francis Ondina Dominguez Iscoa	21/05/2022	L. 1,000.00	Comercia y Ferreteria Najar	L. 1,000.00
29	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para construcción de estructura de techo	Barrio Las Flores, Taulabe, Comayagua	Vivienda	Solicitud presentada por la ciudadana Rosa Gilma Hernandez	22/04/2022	L. 3,450.00	Kalin Comercial	L. 3,450.00
30	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para restauración de sistema de agua potable	Palmichal, Carmen	Educación	Solicitud presentada por la Sociedad de padres de familia y maestros de la escuela Pompilio Ortega y CCEPREB Enrique Medina Castillo	23/05/2022	L. 13,806.55	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L. 13,806.55
31	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para construcción de estructura de techo	Brisas de Bacadia	Vivienda	Solicitud presentada por la Cuidada Elsa Dominga Urquia Medrano	02/06/2022	L. 8,165.00	Kalin Comercial	L. 8,165.00
32	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para reparación de llavín y contramarco en salón comunal	El Peñón	Salón Comunal	N/A	02/06/2022	L. 625.00	Comercial Peña Blanca	L. 625.00
33	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para restauración pinturas en centro educativos del municipio de Taulabe	Varios	Educación	Solicitud presentada por el secretario de educación distrital en Taulabe SERGIO RAUDALES	03/06/2022	L. 4,494.00	Pinturas Americanas	L. 4,494.00

34	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales para reparación del sistema de agua potable	San Francisco	Educación	Solicitud presentada por la sociedad de padres de familia de la escuela Rafael Heliodoro Valle	03/06/2022	L. 756.56	Comercial Peña Blanca	L. 756.56
35	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales de construcción para reparación de sistema eléctrico	Camalotales	Vivienda	Solicitud presentada por el ciudadano Luis Miguel Padilla Leiva	06/06/2022	L. 569.00	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L. 569.00
36	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales para construcción de socalo en IGLESIA	Palmichal Carmen	iglesia	Solicitud presentada por el ciudadano por el comité pro-iglesia	07/06/2022	L. 19,655.13	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L. 19,655.13
37	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales para reparación de hamaca	Cerro Azul	Mantenimiento Social	Solicitud presentada por el patronato pro mejoramiento	07/06/2022	L. 40,003.85	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L. 40,003.85
38	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales para restauración de pintura	Jaitique Taulabe	Salón Comunal	Solicitud presentada por el ciudadano por el comité pro-iglesia	08/06/2022	L. 8,994.00	Pinturas Americanas	L. 12,794.00
							L. 3,800.00	Comercial Medina	
39	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales de construcción para reparación de Iglesia		iglesia	Solicitud presentada por el ciudadano Carlos Efraín Rodríguez	08/05/2022	L. 11,395.44	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L. 11,395.44
40	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales para restauración de pintura	San Antonio De Yurú	Educación	Solicitud presentada por el Junta Directiva y Patrona de CCEPREB Nuevo Amanecer	08/06/2022	L. 5,198.00	Pinturas Americanas	L. 5,198.00
41	Municipalidad de Taulabe/Unidad Tecnica Municipal	Suministro de materiales para instalación de agua potable	Maculases Taulabe	Agua y Saneamiento	Solicitud presentada por el ciudadano Francisca Osorio	10/06/2022	L. 731.95	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L. 731.95

42	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para construcción de estructura de techo	Las Conchas	Vivienda	Solicitud presentada por el ciudadano German Ariel Teruel	13/06/2022	L. 9,644.09	Comercial Ferreteria Peña Blanca	L. 9,644.09
43	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para construcción de un templo	Jardines, Taulabe	iglesia	Solicitud presentada por representante de la Iglesia cristiana pentecostal Dionisio García Sánchez	13/05/2022			L. 0.00
44	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para reconstrucción de muro de contención	Taulabe, Comayagua	Vivienda	Solicitud presentada por el ciudadano Miguel Ángel Castro Cardona	13/05/2022	L. 4,675.00	CACORA	L. 4,675.00
45	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para la reconstrucción de estructura de techo en Instituto técnico liberación	Taulabe, Comayagua	educación	Solicitud presentada por el director Héctor Gómez	13/05/2022	L. 40,946.75	ALUTECH	L. 40,946.75
46	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales necesarios para la construcción de techo	Taulabe, Comayagua	Vivienda	Solicitud presentada por la ciudadana Edna Medina	13/05/2022	L. 1,585.00	Kalin Comercial	L. 1,585.00
47	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para construcción de vivienda	Taulabe, Comayagua	Vivienda	Petición a cargo de Brenda y Denis, Bernarda Flores	13/05/2022	L. 6,842.50	Kalin Comercial	L. 6,842.50
48	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para mantenimiento de rastro municipal y actividades de reforestación	Taulabe, Comayagua	Agua y Saneamiento, Medio Ambiente	Jefe de recursos Humanos	13/05/2022	L. 2,654.20	Kalin Comercial	L. 2,654.20
49	Municipalidad de Taulabe/Unidad	Suministro de materiales para el mantenimiento del	Taulabe, Comayagua	Agua y Saneamiento, Medio Ambiente	Coordinador de Agua Potable	13/05/2022	L. 137.12	Peña Blanca	L. 137.12

	Técnica Municipal	manejo de agua potable							
50	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales solicitados para reparación de estructura de techo	Las Conchas	Vivienda	Solicitud presentada por el ciudadano German Ariel Teruel	13/05/2022	L. 9,644.09	Peña Blanca	L. 9,644.09
51	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para instalación de agua potable	Barrio El Carmen	Agua y Saneamiento	Solicitud presentada por el ciudadano José Ramón Flores	20/06/2022	L. 372.30	Peña Blanca	L. 372.30
49	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de material para mantenimiento de casa cultura	Taulabe, Comayagua	Mantenimiento Social	Coordinador de casa de la cultura	22/06/2022	L. 283.00	Electrotodo Comercial	L. 283.00
52	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales de construcción	Jardines, Taulabe	Vivienda	Solicitud presentada por el ciudadano Juan Guerra	22/06/2022	L. 1,870.00	CACORA	L. 1,870.00
53	Municipalidad de Taulabe/Unidad Técnica Municipal	Suministro de materiales para reparación general de escuela rural mixta pedro nufio	Ocomán	educación	Solicitud presentada por presidenta de la sociedad de padres de familia y directora de escuela	27/06/2022	L. 9,355.00	Comercial Najar	L. 9,355.00



Jefe Unidad Técnica Municipal
 Ing. Edin Reynaldo Pineda Morales
