



**"PROGRAMAS Y PROYECTOS 2022"**




**JUNIO, 2022**

*Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)*

**TRIMESTRE: 02**

Número de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual

**No se registra ejecución de fondos en programas y proyectos para el mes de Junio, 2022**


*Por:*   
**Lic. Ronny Adalid Garza**  
**Director de Proyectos**





## SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)


### DIRECCIÓN DE PROYECTOS



**INFORME NARRATIVO SOBRE PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO, (911).**

**TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.**

**JUNIO, 2022**

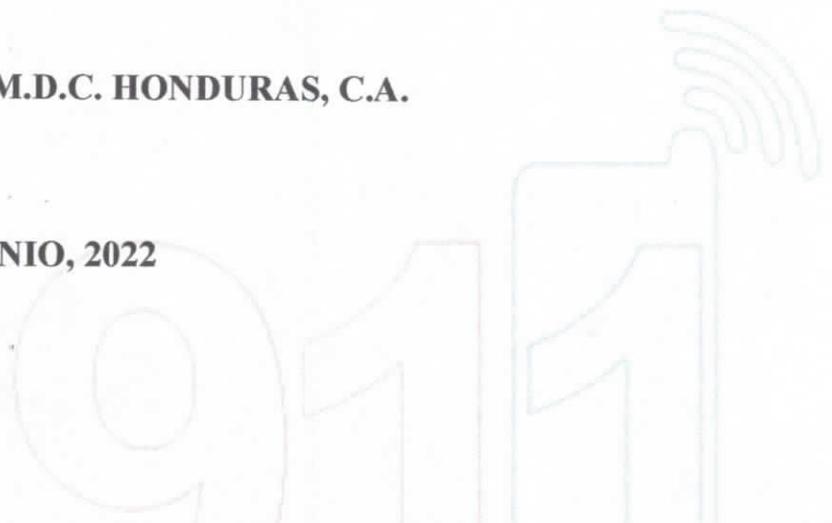

## INTRODUCCIÓN



El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar control, diseño, ejecución y seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

## OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en ciertas ciudades del país, como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde actualmente se cuenta con un centro de Coordinaciones y Operaciones del SNE911. Mismos que efectúan la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencias del SNE911.

## DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS	INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN
<b>Propietario</b>	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).
<b>Sector</b>	Seguridad/ Seguridad Ciudadana.
<b>Proyecto en ejecución</b>	Ciudad Segura Comayagua, Siguatepeque.
<b>Zona de Influencia</b>	Comayagua, Siguatepeque y Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua.
<b>Empresa ejecutora</b>	Dynamic Corporation.
<b>Propósito de ejecución</b>	Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras.
<b>Patrocinador principal</b>	Gobierno de la República de Honduras, por medio de la Tasa de Seguridad Poblacional.
<b>Patrocinador Secundario</b>	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911).
<b>Director de Proyecto</b>	Lic. Ronny García
<b>Descripción del proyecto</b>	Construcción de obra civil (centro de operaciones) y ejecución de actividades prioritarias, relacionadas con proceso de socialización, selección de sitios para ubicación de dispositivos de seguridad y validación de estos lugares, para el óptimo funcionamiento y operatividad del SNE911, conforme los lineamientos establecidos por el Gobierno de la República de Honduras.



HONDURAS  
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS



## DATOS ESPECIFICOS DE LOS PROYECTOS

CARACTERÍSTICAS	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE EJECUTAN
<b>Alcance del proyecto</b>	Construcción del edificio para el funcionamiento del Centro de Coordinaciones y operaciones de la ciudad de Comayagua e hincado de postes para la instalación de dispositivos de seguridad (cámaras), cajas utilitarias (UB) y brazos para realizar transmisión en tiempo real.
<b>Datos de Contacto</b>	Lic. Ronny García, Director de Proyectos del SNE911.
<b>Fuente de Financiamiento</b>	Tasa de Seguridad Poblacional
<b>Presupuesto de proyecto</b>	Bajo administración y responsabilidad económica, financiera y gerencial de Tasa de Seguridad.
<b>Fecha de aprobación (inicio).</b>	01 de septiembre de 2021.
<b>Estado actual del proyecto (etapa/fase)</b>	Fase de ejecución e implementación.
<b>Fecha estimada de finalización del proyecto</b>	Se tiene contemplado culminar la obra civil (construcción del edificio), en el tercer trimestre del año 2022 y comenzar con la operatividad y funcionamiento de la plataforma tecnológica durante el resto del año 2022, ya que el proyecto en su totalidad tiene una duración aproximada de 07 años y 04 meses (2021-2028).
<b>Observaciones al proyecto</b>	Aunque al culminar el primer semestre del 2022 (junio), ciertas actividades técnicas aun registran un avanzado retraso, y se continúa dando énfasis al trabajo de obra civil, plataforma tecnológica y PBX (planta telefónica) que se requiere para la óptima ejecución del proyecto. Por ser este de importancia nacional, el mismo está siendo desarrollado con la agilidad y relevancia que amerita, pero se requiere de fondos para su finalización.





## ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS EN LOS PROYECTOS DEL SNE911

Para el mes de junio de 2022 (primer semestre), el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), se continua en la fase de ejecución e implementación del Proyecto Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque (construcción de la obra civil, trabajo con la plataforma tecnológica por medio del diseño, implementación, configuración e integración de esta). Se realizaron levantamientos técnicos por parte del equipo eléctrico para comenzar los trabajos de energía y fuerza del edificio y se tiene culminada la construcción estructural del cuarto eléctrico principal.

Se está agilizando la obtención de las directrices para la instalación de aguas negras y servidas, aguas lluvias, agua potable, permiso de energía eléctrica, instalación de fibra óptica y líneas telefónicas del proyecto. Se tuvieron retrasos en la obra, asociados a la alta intensidad y frecuencia de las lluvias en la zona de Comayagua y adicionalmente se presentan limitantes en la integración y configuración de la planta telefónica del Cecop Comayagua, debido a la necesidad de la recepción del Siptrunk que servirá para efectuar y recibir llamadas.

En cuanto a la obra civil, se cuenta con avances en los niveles del edificio, la loza del segundo piso fue fundida, se realizó la fundición de dos lozas del cielo, se terminó la fundición de las vigas del segundo piso para la preparación de las fundiciones de loza de cielo pendientes y se concluyó el agregado de hierro para las columnas del segundo piso. La finalización en la fundición de las columnas, encofrado y fundición de la viga intermedia y la colocación de los joist de metal para la fundición de la loza del segundo piso se encuentra lista.

Se comenzó con la construcción del muro de contención del ala izquierda y trasera del edificio y se dio continuidad a las actividades de estructuración de sitios con la instalación de las UBS, Brazos, red de tierra y cableados en la ciudad de Siguatepeque, por lo que se registra un ochenta y cinco (85%) de avance en esta actividad. En lo referente a las integraciones, diseños, auditorias y preparación para las configuraciones, los avances del presente mes han sido significativos y ya se cuenta con las plataformas cliente.





A la fecha (junio, 2022), ya se cuenta con la autorización de parte de la Concesionaria Vial Honduras S.A de C.V, donde aprueba efectuar el hincado de postes, sobre la carretera CA-5, por lo que se continuará con la estructuración de los sitios restantes en la ciudad de Siguatepeque y Comayagua, así como en la Villa de San Antonio, Comayagua.

En conclusión, una serie de actividades se han visto limitadas y han generado retrasos con respecto a su tiempo de programación, debido a la falta de presupuesto en la institución, por lo que es fundamental contar con una asignación presupuestaria específica para la ejecución de proyectos por parte de la Secretaría de Finanzas de Honduras, así como de la Tasa de Seguridad Poblacional, ya que esto representa un pilar en el crecimiento y avance institucional de esta institución y en el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras.

↳ **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic. Ronny Adalid García.

↳ **Cargo:** Director de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias.

↳ **Firma y Sello:**

por: 
