



*República de Honduras*  
*Municipalidad de Taulabé*  
*Taulabé, Comayagua.*




Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

**DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**CUADRO RESUMEN DE CONTRATOS MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022**

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	DETALLE	PROYECTO O ACTIVIDAD	EJE	CONTRATISTA	LUGAR
13/9/2022 2	Ing Edin Pineda Morales	Informe de Supervisión	Reparación de tableros en cancha Principal	Deportes	José Wilmer Ponce	Taulabé, Comayagua
			Elaboración de corona para busto de cabañas	Fiestas patrias		
			Reparación de carpas	Fiestas patrias		
			Reparación de Volqueta	Agua y Saneamiento		
			Reparación de techo en salón comunal	Mantenimiento Social		
20/9/2022	Ing Edin Pineda Morales	Informe de Supervisión	Sellado de Juntas en cancha principal	Deportes	Rolando Pineda Maehado	Taulabé, Comayagua
23/9/2022	Ing Edin Pineda Morales	Informe de Supervisión	Habilitación de paso vehicular por derrumbe	Mantenimiento vial	Melvin Medina Fuentes	Bella Vista
4/10/2022	Ing Edin Pineda Morales	Informe de Supervisión	Habilitación de paso vehicular por derrumbe	Mantenimiento vial	Melvin Medina Fuentes	Huerto del Edén
28/10/2022 2	Ing Edin Pineda Morales	Informe de Supervisión	Iluminación de cementerios Municipales	Seguridad	Mario Alexander Sanchez	Taulabé, Comayagua

28/10/2012	2	Ing Edin Pineda Morales	Informe de Supervisión	Sistema de iluminación y tomacorrientes en oficinas del Palacio municipal	Mantenimiento Social	Mario Alexander Sánchez	Taulabé, Comayagua
28/10/2012	2	Ing Edin Pineda Morales	Informe de Supervisión	Activación de fusibles en transformadores en las cuevas de Taulabé	Mantenimiento Social	Mario Alexander Sánchez	Taulabé, Comayagua
28/10/2012	2	Ing Edin Pineda Morales	Informe de Supervisión	Mantenimiento de sistema de iluminación y tomacorrientes en jefatura municipal	Seguridad	Mario Alexander Sánchez	Taulabé, Comayagua

  
  
**Jefe de Unidad Técnica Municipal**  
 Ing. Edin Pineda Morales

*República de Honduras*

*Municipalidad de Taulabé*

*Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

**DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

**CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAMPO MES DE OCTUBRE 2022**

**INFORME UTM**

**INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE 2022**

Sirva el presente para dar a conocer las diferentes actividades que formaron parte de las intervenciones de la Unidad Técnica Municipal (UTM). Durante el mes de OCTUBRE, detallado de la siguiente manera:

**A) Visitas Técnicas**

<b>FECHA</b>	<b>ENCARGADO DE OFICINA</b>	<b>LUGAR DE VISITA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>RECORRIDO</b>
3/10/2022	Ing. Edin Pineda, alcalde Demis Omar Membreno	Inspección de calle que conduce a carnalotales	Taulabé, Comayagua	N/A
	Ing. Edin Pineda, alcalde Demis Omar Membreno	Inspección, cuneta y dragado de cunetas	Aldea Macusales	N/A
	Ing. Edin Pineda, alcalde Demis Omar Membreno	Inspección para proyecto en parque central	Taulabé, Comayagua	N/A
10/10/2022	Ing. Edin Pineda	Inspección para proyecto en graderías	Estadio Municipal, Rafael Leonardo Callejas, Taulabé, Comayagua	N/A
	Ing. Edin Pineda, alcalde Demis Omar Membreno	Inspección para proyecto de huellas vehiculares	Las conchas	N/A

25/10/2022	Ing Edin Pineda, Oficina de la Mujer (OMM) Brenda Cortes	Visita técnica para proyecto de pisos saludables	Aldea El Cerrón Sabanas de Ocote	31.4 km
26/10/2022	Ing Edin Pineda, Oficina de la Mujer (OMM) Brenda Cortes	Visita técnica para proyecto de piso	Piedra Prieta	27.7 km
27/10/2022	Ing Edin Pineda	Inspección para proyecto de construcción de filtros de aguas mieles	Palmichal Carmen	31.3 km
28/10/2022	Ing Edin Pineda	Supervisión de proyecto de piso saludables	Barrio Visita Hermosa y Barrio Las Flores	N/A
	Ing Edin Pineda	Visita técnica para mantenimiento de calle en casco urbano	Taulabé, Comayagua	6.1 km

  
  
 Ing. Edin Pineda T. M.  
 JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

11/10/2022	Ing Edin Pineda (UTM), Proyecto Aldea Global, Oficina de la Mujer (OMM); Brenda cortes	Inspección para beneficiarios de construcción de casas habitacionales	Inspección para mantenimiento de calle, casco urbano de taulabé	Barrio el Carmen, Taulabé	N/A
				Col. Juan Abejar	N/A
12/10/2022	Ing Edin Pineda	Inspección para instalación de postes Inspección para proyecto de construcción de muro perimetral	Inspección para levantamiento de datos, para construcción de Huellas Vehiculares	Barrio Las Flores, Jardines	N/A
				Brisas de Bacadia	N/A
13/10/2022	Ing Edin Pineda, alcalde Denis Omar Membreño	Visita técnica para levantamiento de datos, para construcción de Huellas Vehiculares	Entrega de materiales para construcción de filtro	Sabanas de Ocote	N/A
				Taulabé, Comayagua	N/A
14/10/2022	Ing Edin Pineda	Entrega de materiales para construcción de filtro	Entrega de materiales para proyecto pisos saludables	Cementerio Municipal	N/A
				La Misión	N/A
18/10/2022	Ing Edin Pineda, Alcalde Denis Omar Membreño, Oficina de la Mujer (OMM); Brenda Cortes	Visita técnica para levantamiento de datos para proyecto de pisos saludables	Entrega de materiales para proyecto pisos saludables	San Antonio de yurés	N/A
				Bacadia	N/A
19/10/2022	Ing Edin Pineda	Entrega de materiales para proyecto pisos saludables	Visita Técnica para proyecto de agua potable	Jardines	N/A
				Palmichal Carmen	N/A
20/10/2022	Ing Edin Pineda	Visita técnica para proyecto apertura de calle	Visita técnica para asesoramiento de construcción de muro de contención	Barrio Lectonio Maldonado, Taulabé, Comayagua	N/A
				Barrio Lectonio Maldonado, Taulabé, Comayagua	N/A
21/10/2022	Ing Edin Pineda	Supervisión de proyecto de drenaje de aguas mieles	Supervisión de proyecto de drenaje de aguas mieles	Aldea Chaguates	N/A
				Barrio Las Flores Jaritique	N/A
24/10/2022	Ing Edin Pineda, Alcalde Denis Omar Membreño	Supervisión de proyecto de drenaje de aguas mieles	Supervisión de proyecto de drenaje de aguas mieles	Palmichal Fátima	N/A
				La Laguna	N/A
24/10/2022	Ing Edin Pineda, Oficina de la Mujer (OMM) Brenda Cortes	Visita técnica para proyecto de pisos saludables	Visita técnica para proyecto de pisos saludables	Barrio Lectonio Maldonado, Taulabé, Comayagua	N/A
				Taulabé, Comayagua	N/A
24/10/2022	Ing Edin Pineda, Alcalde Denis Omar Membreño	Supervisión de drenaje área proyecto de drenaje de aguas mieles	Supervisión de drenaje área proyecto de drenaje de aguas mieles	Palmichal Carmen	22.7 km
				Ojo de Agua	9:35 am - 1:30 pm
24/10/2022	Ing Edin Pineda, Oficina de la Mujer (OMM) Brenda Cortes	Visita técnica para proyecto de pisos saludables	Visita técnica para proyecto de pisos saludables	Barrio Las Flores, Vista Hermosa, Taulabé, Comayagua	9:35 am - 1:30 pm



*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

Nombre del proyecto: **REPARACION DE TABLEROS EN CANCHA PRINCIPAL.**

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Taulabé, Comayagua

**Responsables:**

**Ejecutor:** Jose Wilmer Ponce

**Supervisor:** Ing. Edin Reynaldo Pineda.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	Estimación de Avance: 100%
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	13 de septiembre de 2022.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** Cumple con todas las especificaciones

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno

Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**


- Se realizan trabajos de soldadura e instalación de arcos en la cancha principal del parque central.
- Se contabiliza en total 2 unidades de arcos.

**CONCLUSIONES:**

- No se presenta contratiempos de ningún tipo.

  
  
SUPERVISIÓN UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL  
ING EDIN PINEDA MORALES

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**

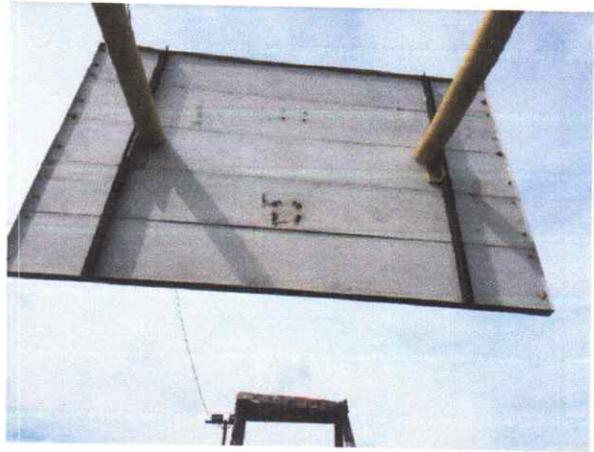



*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

Nombre del proyecto: **ELABORACION DE CORONA PARA BUSTO DE CABAÑAS**

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Taulabé, Comayagua

**Responsables:**

**Ejecutor:** Jose Wilmer Ponce

**Supervisor:** Ing. Edin Reynaldo Pineda.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	<b>Estimación de Avance: 100%</b>
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	13 de septiembre de 2022.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** Cumple con todas las especificaciones

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno

Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se realizan trabajos de elaboración de corona para busto y trípode para celebración de fiestas patrias del 15 de septiembre.

**CONCLUSIONES:**

- No se presenta contratiempos de ningún tipo.

  
SUPERVISION UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL  
ING EDIN PINEDA  


**REGISTRO FOTOGRAFICO:**





*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

Nombre del proyecto: <b>REPARACION DE CARPAS</b>
<b>Departamento:</b> Comayagua.
<b>Municipio:</b> Taulabé
<b>Ubicación:</b> Taulabé, Comayagua

<b>Responsables:</b>
<b>Ejecutor:</b> Jose Wilmer Ponce
<b>Supervisor:</b> Ing. Edin Reynaldo Pineda.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	Estimación de Avance: 100%
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	13 de septiembre de 2022.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** Cumple con todas las especificaciones

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno


Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- La municipalidad de Taulabé, cuenta con estructuras para carpas, las cuales serán destinadas para eventos sociales donde amerite su uso, por lo que se toma a bien la reparación metálica de mencionadas carpas.

**CONCLUSIONES:**

- No se presenta contratiempos de ningún tipo.

  
SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING EDIN PINEDA MORANES  


**REGISTRO FOTOGRAFICO:**





Republica de Honduras C.A  
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

Nombre del proyecto: <b>REPARACION DE VOLQUETA</b>
<b>Departamento:</b> Comayagua.
<b>Municipio:</b> Taulabé
<b>Ubicación:</b> Taulabé, Comayagua

<b>Responsables:</b>
<b>Ejecutor:</b> Jose Wilmer Ponce
<b>Supervisor:</b> Ing. Edin Reynaldo Pineda.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	Estimación de Avance: 100%
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	13 de septiembre de 2022.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** Cumple con todas las especificaciones

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:**      Bueno     

   Regular     

**DESARROLLO DE LA OBRA:**



- Se realizan, reparación completa de volqueta, lijado y pintado de toda la paila, parchos de soldadura y paila, reparación de bomper y pintado del mismo,
- Reparación de bocina, reparación de gradas de tanque,
- Pintado de rines
- Instalación de loderas y instalación de tubos de compuerta.

**CONCLUSIONES:**

- No se presenta contratiempos de ningún tipo.

  
SUPERVISION UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL  
ING EDIN PINEDA MORALES

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**

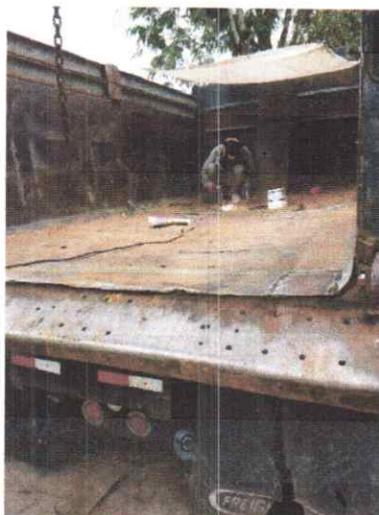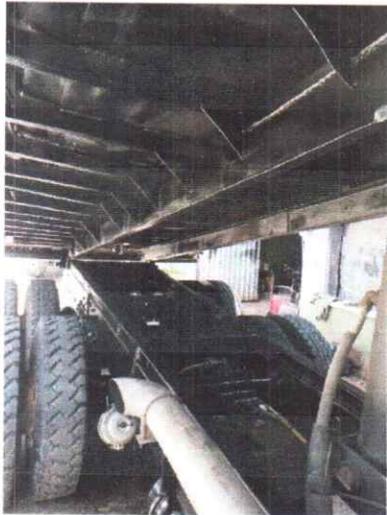





*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

Nombre del proyecto: <b>REPARACION DE TECHO EN SALON COMUNAL</b>
<b>Departamento:</b> Comayagua.
<b>Municipio:</b> Taulabé
<b>Ubicación:</b> Taulabé, Comayagua

<b>Responsables:</b>
<b>Ejecutor:</b> Jose Wilmer Ponce
<b>Supervisor:</b> Ing. Edin Reynaldo Pineda.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	Estimación de Avance: 100%
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	13 de septiembre de 2022.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia		Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** Cumple con todas las especificaciones

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno

Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se repara techo en la bodega lateral del salón comunal, actualmente se esta almacenando abono, y se toma a bien la reparación del mismo, ya que una parte se encontraba dañada.



**CONCLUSIONES:**

- No se presenta contratiempos de ningún tipo.

  
\_\_\_\_\_  
SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING EDIN PINEDA TORRES



**REGISTRO FOTOGRAFICO:**

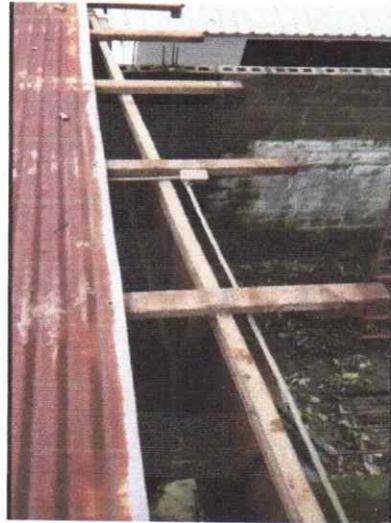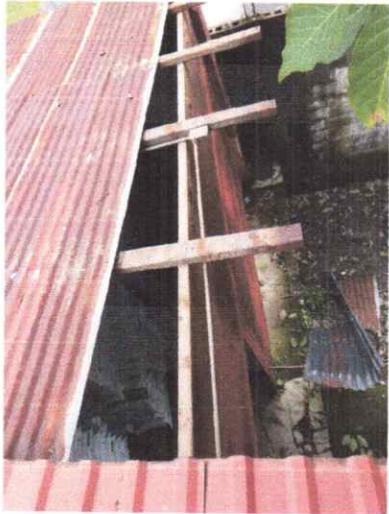



*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

Nombre del proyecto: <b>SELLADO DE JUNTAS</b>
<b>Departamento:</b> Comayagua.
<b>Municipio:</b> Taulabé
<b>Ubicación:</b> Cancha de parque central

<b>Responsables:</b>
<b>Ejecutor:</b> Rolando Pineda Machado.
<b>Supervisor:</b> Ing. Edin Reynaldo Pineda.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	Estimación de Avance: 100%
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	20 de septiembre de 2022.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia		Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia	X	Malo		Ayudantes	
				Peón	

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** Cumple con todas las especificaciones

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno


Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se inician actividades con la limpieza general de todas las juntas.
- Se procede al vaciado de concreto en toda la cancha, contabilizando 252.94 ml.
- Se mantiene en proceso de fraguado humedeciendo las juntas; constantemente con agua

**CONCLUSIONES:**

- NO se presentan contratiempos de clima, que tengan retraso en las actividades realizadas.
- El suministro de materiales en tiempo y forma estuviera pendiente del desarrollo de la obra.
- Se desarrollo completamente todo el sellado de juntas

  
SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING EDIN PINEDA MORALES  


**REGISTRO FOTOGRAFICO:**





*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

Nombre del proyecto: **HABILITACION DE PASO VEHICULAR POR DERRUMBE.**

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Bella Vista.

**Responsables:**

**Ejecutor:** Melvin Medina Fuentes

**Supervisor:** Ing. Edin Reynaldo Pineda.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	Estimación de Avance: 100%
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	28 de septiembre de 2022.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia		Bueno		Operador de Maquinaria	1
Con lluvia	X	Malo	X	Ayudantes	
				Peón	

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:**

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:**    Bueno   

                                 Regular   

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- La comunidad en la fecha indicada presenta fuertes derrumbe por saturación de material, lo que obstaculiza el paso vehicular quedando completamente incomunicada la comunidad de Bella Vista, Camalotales y la comunidad vecina del municipio de Siguatepeque, Santa Rosita.
- Se comienza a limpiar toda el área afectada.
- Se bota todo el material de desperdicio
- Se perfilan completamente todas las cunetas
- Se habilita el paso.

**CONCLUSIONES:**

- Las condiciones del clima siguen afectando la zona, pero se realiza toda la limpieza general para poder habilitar el paso en su totalidad.
- L saturación de material, ocasión por segunda vez el mismo derrumbe en el mismo lugar.
- Se logra habilitar todo el paso de las comunidades antes mencionadas.

<b>CONTROL DE MAQUINARIA</b>					
<b>RETROEXCAVADORA</b>					
FECHA	INICIA	TERMINA	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR DIA
21/9/2022	2680.8	2704.2	23.4	L. 1,000.00	L. 23,400.00
<b>TOTAL HORAS MAQUINAS</b>					<b>L. 23,400.00</b>
<b>ISV 15%</b>					<b>L. 3,510.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>L. 26,910.00</b>



SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
 ING EDIN PINEDA MORALES

**REGISTRO FOTOGRAFICO.**







*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

Nombre del proyecto: **HABILITACION DE PASO VEHICULAR POR DERRUMBE.**

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Huerto del Eden .

**Responsables:**

**Ejecutor:** Melvin Medina Fuentes

**Supervisor:** Ing. Edin Reynaldo Pineda.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	<b>Estimación de Avance: 100%</b>
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	4 de octubre de 2022.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia		Bueno		Operador de Maquinaria	1
Con lluvia	X	Malo	X	Ayudantes	
				Peón	

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:**

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno

Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- La comunidad debido a las tormentas ocasionadas se encuentra en total saturación, para el caso, la calle se encuentra socavada.
- Se comienza hacer la limpieza del terreno.
- Se hace corte de material, identificado los bancos de materiales existente que hay cerca de las zonas.
- Se comienza a rellanar todas las partes afectadas.
- Se completa todo el trabajo y se habilita el tramo a reparar.
- 

**CONCLUSIONES:**

- Las condiciones del clima siguen afectando la zona, pero se realiza toda la limpieza general para poder habilitar el paso en su totalidad.
- Se reparan rellena toda la parte afectada, la tubería afectada se logra reparar en tiempo y forma.
- Se completa todo el relleno y limpieza, del lugar.

<b>CONTROL DE MAQUINARIA</b>					
<b>RETROEXCAVADORA</b>					
FECHA	INICIA	TERMINA	TOTAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL, POR DIA
30/9/2022	7259.8	7266.5	6.7	L. 1,000.00	L. 6,700.00
<b>TOTAL HORAS MAQUINAS</b>					<b>L. 6,700.00</b>
<b>ISV 15%</b>					<b>L. 1,005.00</b>
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>L. 7,705.00</b>


  
 SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
 ING EDIN PINEDA MORALES

**REGISTRO FOTOGRAFICO.**





*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

Nombre del proyecto: **ILUMINACIÓN DE CEMENTERIOS MUNICIPALES.**

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Barrio Santa Barbara.

**Responsables:**

**Ejecutor:** Mario Alexander Sánchez

**Supervisor:** Ing. Edin Reynaldo Pineda.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	Estimación de Avance: 100%
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	28 de octubre de 2022.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	2
				Peón	

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** Cumple con todas las especificaciones

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno

Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se toma a bien la decisión de iluminar ambos cementerios municipales, por las altas incidencias en los lugares.
- Se trasladan de las bodegas 2 postes clase 5.
- Se identifica el lugar estratégico en el cementerio para poder instalar.
- Se realizan las excavaciones.
- Cada poste cuenta con 3 reflectores.
- Además se instala un tomacorriente, para poder hacer uso de energía eléctrica en casos de emergencia.

**CONCLUSIONES:**



- No se presenta ningún contratiempo al proyecto.
- Se realiza todas las instalaciones necesarias en ambos postes con sus reflectores.
- Los trabajos realizados cuentan con todas las especificaciones técnicas recomendadas.




SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING EDIN PINEDA MORALES

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**



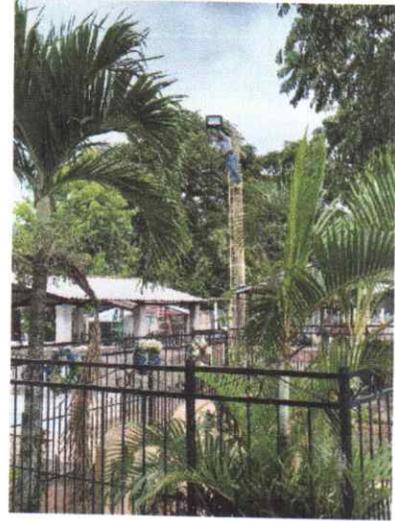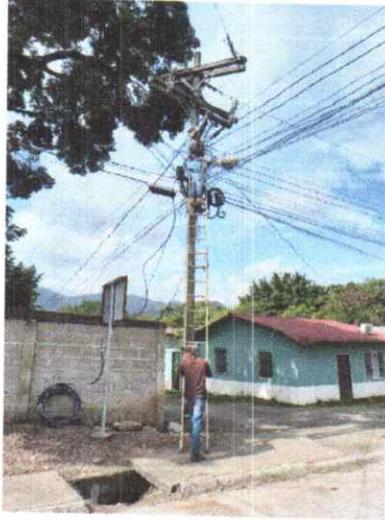



**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** Cumple con todas las especificaciones

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno

Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**


- Se realiza la apertura de nuevo sistema de iluminación en las instalaciones del palacio municipal.
- Se instalan lámparas tipo spot.
- Se instalan tomacorrientes en la nueva oficina de la municipalidad.

**CONCLUSIONES:**

- No se presenta ningún contratiempo al proyecto.
- El trabajo realizado en todas las instalaciones cumple con todas las especificaciones técnicas presentadas al contratista.

  
  
SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING EDIN PINEDA MORALES

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**

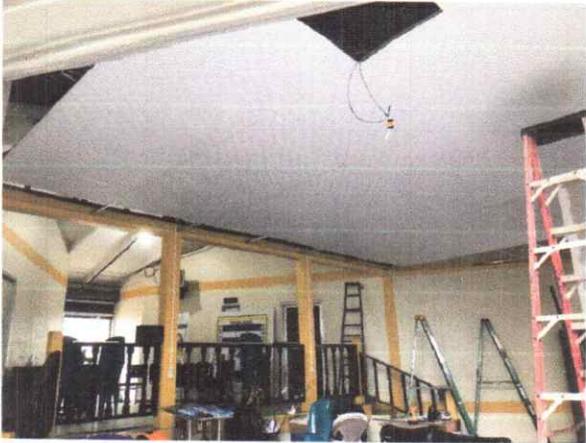





*Republica de Honduras C.A*  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

Nombre del proyecto: **ACTIVACIÓN DE FUSILES EN TRANSFORMADORES EN LAS CUEVAS DE TAULABÉ.**

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Cuevas de Taulabé.

**Responsables:**

**Ejecutor:** Mario Alexander Sánchez

**Supervisor:** Ing. Edin Reynaldo Pineda.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	Estimación de Avance: 100%
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	28 de octubre de 2022.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	2
				Peón	

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** Cumple con todas las especificaciones

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno

Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se da mantenimiento, al sistema eléctrico de las cuevas, lugar donde se encuentra presenta, vulnerabilidad.
- En tres ocasiones se han activado, los fusibles

**CONCLUSIONES:**

- No se presenta ningún contratiempo al proyecto.
- Se restablece la energía satisfactoriamente.

  
SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
ING EDIN PINEDA MORALES

**REGISTRO FOTOGRAFICO:**





Republica de Honduras C.A  
*Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.*



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

**INFORME DE SUPERVISION #1**

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTE EN JEFATURA MUNICIPAL.**

**Departamento:** Comayagua.

**Municipio:** Taulabé

**Ubicación:** Cuevas de Taulabé.

**Responsables:**

**Ejecutor:** Mario Alexander Sánchez

**Supervisor:** Ing. Edin Reynaldo Pineda.

**Según Estimación:**

<b>Estimación de campo: 100%</b>	Estimación de Avance: 100%
<b>Fecha de Presentación de Informe</b>	28 de octubre de 2022.

*Observaciones Generales:*

<b>CLIMA:</b>		<b>ACCESO:</b>		<b>PERSONAL EN OBRA:</b>	
Sin Lluvia	X	Bueno	X	Maestro de Obra	1
Con lluvia		Malo		Ayudantes	2
				Peón	

**Materiales:**

**Suficiente:**

**Aprobado:** Cumple con todas las especificaciones

**No suficiente:**

**Rechazado:**

**CALIDAD DE OBRA:** Bueno

Regular

**DESARROLLO DE LA OBRA:**

- Se da mantenimiento al sistema de iluminación de la jefatura policial de Taulabé.
- Se mejora todo el sistema de iluminación y el sistema de tomacorriente de todo el edificio.

**CONCLUSIONES:**

- No se presenta ningún contratiempo al proyecto.
- Se cumple a cabalidad todas los detalles especificados.

  
SUPERVISION UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL  
ING EDIN PINEDA MORAN  


**REGISTRO FOTOGRAFICO:**

